වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව

வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை

ANNUAL PERFORMANCE REPORT

2018

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය

நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சு

MINISTRY OF CITY PLANNING AND WATER SUPPLY

අංක 35 , "ලක්දිය මැදුර", නව පාර්ලිමේන්තු පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
இல 35,"லக்தியமெதுர",புதிய பாராளுமன்ற வீதி, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல
No. 35, "LakdiyaMedura", New Parliament Road, Pelawatta, Battaramulla

வருடாந்த

செயற்திறன் அறிக்கை

2018

நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு

இல 35 "லக்திய மெதுர" புதிய பாராளுமன்ற வீதி,
பெலவத்த, பத்தரமுல்ல
தொலைபேசி 011-2177240,011-2177241
தொலைநகல்- 011-2177242
மின்னஞ்சல் - secretary@mcpws.gov.lk
இணையதளம் –www.mcpws.gov.lk

இலக்கு

சிறந்த வாழ்க்கைக்கு திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட சுகநல வசதிகளை வழங்குதல்

பணி

உயிரியல் சுற்றாடல் மற்றும் நீர் வளம் என்பவற்றின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி நிலையான நகர திட்டமிடல், பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் போதுமான அளவு மேம்படுத்தப்பட்ட சுகநல வசதிகளை வழங்கல் போன்றவற்றின் மூலம் பொது மக்களின் சிறப்பான வாழ்க்கைத் தரத்தை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பொது மக்களுக்கான வசதிகளை வழங்குதல்

கௌரவ அமைச்சரின் செய்தி

மனிதன் உட்பட அனைத்து உயிரினங்களினதும் தோற்றம், உயிர் வாழ்வு,பரிணாமம் நிலைத்து நிற்கும் தன்மையை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி நீராகும். எனவே இன்றைய சர்வதேச சமூகத்தாலும் மற்றும் நிறுவனங்களாலும் நீர் ஒரு அடிப்படை மனித உரிமையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் அனைவருக்கும் நீருக்கான சம வாய்ப்புக்களை உருவாக்கவும் பிரபஞ்சத்தின் நிலைத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு நீரை பாதுகாக்கவும் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை உலகளாவிய சமூகத்தின் மேலே கூறப்பட்ட நோக்கத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றுவதன் மூலம் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் போதிய அளவு சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்குவதற்கு பெரும் முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அரசாங்கத்தின் இந்த விசேட பொறுப்பை என் அமைச்சுக்கு வழங்கியுள்ளது.

இப்பொறுப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை மற்றும் தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களமும் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக மேற்கொன்ட முயற்சியின் காரனமாக 2015 ஆம் ஆண்டில் 86% மாக இருந்த பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கல் 90.60% மாக அதிகரிக்க முடிந்துள்ளது. மேலும் 2015 ஆம் ஆண்டில் 45.09% மாக இருந்த பாதுகாப்பான குழாய் நீர் வழங்கல் 2018 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 50.5% மாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை அதிகரிப்பதற்கு விசேட முயற்சிகளுடன் பணியாற்றிய ஒரு ஆண்டாக 2018 ஆம் ஆண்டை குறிப்பிடலாம் இந்த அமைச்சுகும் மற்றும் இதன் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய வரவு செலவு திட்ட பத்திரத்தின் மூலம் 35 பில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த முழு ஒதுக்கீட்டு நிதியையும் பயன் படுத்தி அந்த ஆண்டுக்குள் நீர் வழங்கும் பாரிய கருத்திட்டங்கள் 04 பணிகளை நிறைவு செய்யவும் புதிய கருத்திட்டங்கள் 08 இன் பணிகளை ஆரம்பிக்கவும் முடிந்துள்ளதுடன் மேலும் உள்நாட்டு வங்கிகடன் நிதியின் கீழ் 5,000 மில்லியன் ரூபா அளவு நிதியை பயன்படுத்தி பாரிய அளவிலான நீர் வழங்கும் உத்தேச முறைகள் 15 செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் அமைச்சுக்கு வழங்கபட்ட விசேட பொறுப்புக்களில் ஒன்றாக மூலகாரணம் கண்டறியப்படாத சிறுநீரக நோய் பரவி வரும் 11 மாவட்டங்களில் வாழும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குவதாகும். அப்பிரதேசத்தில் வாழும் மக்களுக்கு குறுகிய காலத்திற்குள் பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குவற்கு நீர் நீடிப்புக்கள் மற்றும் மறுவடிகட்டல் கருவிகள் முலம் நீர் வழங்குவதற்கு 500 மில்லியன் ரூபா அளவு நிதியை பயன்படுத்தியுள்ளதுடன் நீண்ட காலத்திற்க்கு நீரை வழங்கும் உத்தேச முறைகளை ஏற்படுத்துவதற்கு படிமுறைகள் மேற் கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் சீனா அரசாங்கத்தின் ஆதரவின் கீழ் பேராதெனிய பிரதேசதில் இஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள சீனா இலங்கை பிரதான ஆராய்ச்சி செயற்திட்டத்தின் பணிகள் 2018 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆரம்பிக்க முடிந்தமை இவ்ஆண்டில் அடைந்த பெரும் வெற்றியாகும் இவை அனைதினதும் பிரதி பலனாக தற்போது சிறுநீரக நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து காணப்படுவதாக தகவல்கள் மூலம் கானப்படுகின்றது இது மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயமாகும்.

அமைச்சுக்கு வழங்கபட்ட விசேட பொறுப்புக்களில் இன்னும் ஒரு முக்கிய பொறுப்பாக காணப்படுவது குறைந்த அபிவிருத்தி உள்ள நகரங்களின் உட்கட்ட அமைப்பை மேம்படுத்துவதாகும். இதற்காக 3500 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அதனை பயன் படுத்தி 427 கருத்திட்டங்கள் செயறபடுத்தப்பட்டுள்ளன

அனைத்து கருத்திட்டங்களையும் மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களையும் திட்டமிட்டு நடைமுறை படுத்துவதில் எனக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அமைச்சின் செயலாளர் உட்பட அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும், ஊழியர்களுக்கும், தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை தலைவர், பொதுமுகாமையாளர் உட்பட அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களத்தின் அதிகாரிகள் உட்பட அனைத்து ஊழியர்களுக்கும். நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என் செய்தியை முடித்துக் கொள்கின்றேன்.

ரவூப் ஹக்கீம் (பா.உ)
நகர திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர

கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சரின் செய்தி

நீர் வழங்குவதற்கு பெரும் முயற்ச்சியுடன் அதிகமான முதலீட்டை பயன்படுத்தி குடிநீர் பொது மக்களுக்கு பகிர்ந்தலளிக்க பட்டபோதிலும் அதை மிகவும் நியாயமான விலைக்கு பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதில் ஏற்படும் சிக்கல்களுக்கு இன்று நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு மற்றும் தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை ஆகியன முகம் கொடுக்கும் சவால்கலாகும் இந்த சவாலை வெற்றி பெற அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களின் செயற்திறன், முன்னேற்ற திறன் ஆகியன இந்த சவாலை வெற்றி பெற மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும் இப்பிரச்சினைகளை தீர்பதற்க்கும் தீர்வுகான்பதற்க்கும் அரச மற்றும் அரச சார்பற்ற அமைப்புகளினதும், நிறுவனங்களினதும் ஒத்துழைப்பு மிகவும் முக்கியமாகும்.

நாம் வழும் புவியானது நீர் நிறைந்த கிரகமாக இருந்தாலும் பயன்படுத்த கூடிய நீரின் அளவும் மிகவும் குறைவானதே எனினும் உலகில் வேகமாக அதிகரித்து வரும் சனத்தொகை கேட்ப நீரின் நுகர்வும் அதிகரிக்கின்றது.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மதிப்பீட்டின்படி 2050 ஆண்டளவில் 60 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் கடுமையான நீர் பற்றாக்குறைக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்படுவதுடன் இலங்கையில் அண்மைக்காலத்தில் ஏற்பட்ட இயற்கை பேரழிவுகளை பார்க்கும்போது நீரினால் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கு களை மறக்க முடியாது எமது நாட்டின் சமீப கால அனுபவமாக இருப்பது கடுமையான வறட்சியை எதிர்கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் கடுமையான வெள்ள பெருக்குகளையும் எதிர்கொள்ள வேண்டி ஏற்பட்டமை சுத்தமான குடிநீர் இல்லாத சந்தர்பத்தில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் பெரும் சிக்கலானவை அதற்கமைய குறிப்பிட்ட அளவு நீரை முகாமைத்துவத்துடன் குடிநீர் மற்றும் மற்றய அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் பயனபடுத்துதல் இன்று எம் முன் உள்ள நாம் சந்திக்கும் சவாலாகும்.

நிறந்தற அபிவிருத்தி இலக்குகளில் 6 வது இலக்காக அமைவது அனைவருக்கும் பகதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் சுகநல வசதிகளை வழங்குதலாகும் எனவே இவ் இலக்குகலை வெற்றி பெற்று இன் நாட்டின் அனைதது மக்களுக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குவதுடன் சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி பொதுமக்களிடையே விழிப்புனர்வை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் சூழலை பாதுகாப்பதோடு பருகுவதற்கு உகந்த குடிநீரை வழங்கும் பணியில் நாங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதுடன் இப்பணியில் எங்கள் அர்ப்பணிப்பை இந்த வருடாந்த செயற்திரன் அறிக்கை ஊடாக இப்பணியில் ஆர்வம் காட்டுபவர்களுக்கு பார்க்கமுடியும்.

மேலும் சுகநல வசதிகள் தொடர்பாக கண்டறிவதற்கு குறைந்த கவனத்தை செலுத்துவது ஒரு சிக்கலான விடயமாகும் அமைச்சு மூலம் சுகநல வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற் கொள்ளப்படுவதுடன் அவற்றை சரியான முறையில் பராமரித்து நடைமுறைப்படுத்தி செல்வது ஒரு குழுவிற்க்கு மட்டும் இயன்ற காரியம் அல்ல. பொதுவாக பார்த்தால் சுத்தமான குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் சுகநல வசதிகளை மேம்படுத்தும் பொறுப்பு எமது பொறுப்பாக இருந்தபோதும் பாடசாலை, சமுதாய அமைப்புக்கள், ஊடகங்கள் மூலம் இவற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அரிதான வளமாகிய நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த மக்களை ஊக்குவிப்பது அனைவரதும் பொருப்பு என்பதை நினைவில் வைக்க விரும்புகிறேன்.

அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையுடனும் மற்றும் தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களத்துடனும் இணைந்து இப்பாரிய பொருப்பை சரியான முறையில் முகாமைத்துவம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதற்காக நாடு என்ற ரீதியாகவும் ஒரு அமைச்சு என்ற ரீதியாகவும் இந்த சவாலை வெற்றி பெற என் அதிகபட்ச பங்களிப்பை வழங்குவேன்.

லகீ ஜயவர்தன (பா.உ)
நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர்

அமைச்சு செயலாளரின் செய்தி

புவியின் மூன்றில் ஒரு பங்கை விட அதிகமாக நீர் மூடியிருந்தாலும் அன் நீரில் 97% உவர் நீராகும் 3% மான சிறிதலவு நீரே நன்நீராக காணப்படுகின்ரது. இதில் மனிதன் பயன் படுத்த கூடிய நீரின் அளவு உலகில் உள்ள மொத்த நீரில் 06% விட குறைந்த அளவு நீரயே காலநிலை மற்றங்கள் மற்றும் மனித நடவடிக்கைகள் காரணமாக இந்த மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நீர் வளமும் வேகமாக குறைந்து வருகிறது. எனவே இப் பிரபஞ்சத்தில் வாலும் அனைத்து மக்களினதும் கடமை நீர் வளத்தை பாதுகாப்பது.

அதிகரத்து வரும் மக்கள் தொகைக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் வசதிகலை வழங்குதல், அனைவருக்கும் சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை உருதிப்படுத்துதல் மற்றும் பின்தங்கிய நகரங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்ய வள ஒதுக்கீட்டின் முக்கிய பொறுப்புக்கள் நகர திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நமது நாட்டின் அனைத்து மக்களுக்காகவும் பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் சுகநலபாதுகாப்பு வசதிகழ் வழங்குவதை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாப்பான குழாய் நீர் உள்ளடக்கம் 60% மாக உயர்த்துவதற்க்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சின் வழிகாட்டலின் கீழ் நகர மற்றும் கிராம பகுதிகளில் கருத்திட்ட நிகழ்ச்சிகளை நடைமுறை படுத்துவதில் முக்கிய நிறுவனங்களான தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை, தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களம் ஆகியன முக்கிய பங்கு வகின்றன. மேலும் 07 மாவட்டங்களில் உலக வங்கி நிதியில் இயங்கும் நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் கருத்திட்டம் (WASSIP) இத்திட்டத்தின் மூலம் மேல் குறிப்பிடப்பட்ட நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒத்துழைப்பு இதன் மூலமும் வழங்கப்படுகின்றன.

நாட்டு மக்கள் தொகையில் 90.6% பாதுகாப்பான குடிநீருக்கான அனுகள் உள்ளதுடன் பாதுகாப்பான குழாய் நீர் உள்ளடக்கம் 50.5% மாகும் இதுவரையும் வழங்கப்பட்டுள்ள முழு குழாய் நீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை 2.32 மில்லியன் அளவாகுவதுடன் இவ் ஆண்டுக்குள் மாத்திரம் குழாய் நீர் இணைப்புக்கள் 109,462 வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2015 தொடக்கம் 2018 ஆம் ஆண்டுவறையான காலத்துக்குள் பாரிய நீர் வழங்கல் மற்றும் மலக்கழிவகற்றும் கருத்திட்டங்கள் 18 இன் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளதுடன் நீர் வழங்கும் புதிய கருதிட்டங்கள் 07 இன் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

பாரிய கருத்திட்டங்களை நடைமுறை படுத்துவதுடன் மூலகாரணம் கண்டறியப்படாத சிறுநீரக நோய் பரவுவதை தடுக்கும் நோக்கத்துடன் விசேட நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டுத்துவதுடன் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டங்கள், WASH போன்ற செயற்திட்டங்களும் அமைச்சின் மூலம் நடைமுறை படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் நீரின் தரத்தை பரிசோதிப்பதற்க்கும், மூலகாரணம் கண்டறியப்படாத சிறுநீரக நோய்க்குறிய காரணங்களை கண்டறியவும், உலர் வலய பிதேசங்களிள் மழைநீரை சேகரித்தல் மற்றும் பயன்படுத்தும் முறைகள் தொடர்பாகவும் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை அபிவிருத்தி செய்யவும் சீன இலங்கை பிரதான ஆராய்ச்சி செயற்திட்டத்தின் மூலம் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த கருத்திட்ட நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் முடிக்கும் குறிக்கோலுடன் மிகவும் திறமையகன முறைகளை பின்பற்றி நிலையான அபிவிருத்தி நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற் கொள்வேன்.

எம்.எம்.பீ.கே.மாயாதுன்னே
செயலாளர்
நகர திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சு

இராஜாங்க அமைச்சு செயளாலரின் செய்தி

அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீர் போதிய சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் நாட்டின் பின்தங்கிய பிரதேசங்களின் சிறுநகரங்களின் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல் நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சின் முதன்மை பொறுப்புகளாகும்.

2018 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் ஏற்பட்ட பல சவால்களுக்கு மத்தியில் மக்கள் தொகையில் 50.5 வீதத்தினருக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்வும், 2.06 வீதத்தினருக்கு குழாய்கள் வழியாக மல கழிவகற்றும் வசதிகளை வழங்கவும் மற்றும் பின்தங்கிய சிறுநகரங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்க்கு 3,500 மி.ரூபா அளவு நிதியை பயன் படுத்தி அபிவிருத்தி பணிகளை மேற்கொள்ள முடிந்துள்ளது.

இந்த சவால்களை வெற்றி பெறும் பாரிய பொருப்புக்கு நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சும், தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையும், தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களத்தினதும் மற்றும் இந்த அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் கருத்திட்டங்களினதும் ஒத்துழைப்பு கரணமாக இப்பணிகளை வெற்றிகரமாக நிறை வேற்றிக்கொள்ள முடிந்துள்ளது.

மேலும், வரலாற்றில் மழைநீர் சேகரிக்கும் ஒரு வளமான கலாச் சாரத்திற்க்கு உருமையுள்ள ஒரு நாடாகும் எமது நாடு இந்த தேசிய அறிவை பயன்படுத்தி மழைநீரை சேகரித்து பயன் படுத்த விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த அமைச்சுக்கு கீழ் இயங்கும் தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களம் கிராமிய மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்க 200 மில்லியன் ரூபா நிதியை பயன்படுத்தி கருத்திட்ட நிகழ்ச்சிகல் பல நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது.

நீர் எமது உயிருக்கு நிகர் அதை பாதுகாப்பது எம் அனைவரினதும் பொறுப்பு.

ஜே .எம். மங்கலதிஸ்ச
செயலாளர்
நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சு

உள்ளடக்கம்

முதலாவது அத்தியாயம் 1

1.1 அறிமுகம் 2

1.2 கருமங்கள் 3

1.3 அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் கருத்திட்டங்கள் 3

1.4 இலங்கையின் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் சுக நல வசதிகளின் உள்ளடக்கம் 4

1.5 நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கள் அமைச்சின் – 2018.12.31 திகதிக்கு அங்கிகரிக்கப்பட்ட ஆளணி 7

1.6 2015-2018 ஆண்டுக்குள் அடைந்து கொள்ளப்பட்ட செயற்திறன் 8

1.7. 2015 – 2018 வரை வழங்கப்பட்ட நீர் இணைப்புக்கள் தொகை 9

(மாகாண, மாவட்ட ரீதியியாக) 9

இரண்டாவது அத்தியாயம் **10**

2.1 2018 ஆண்டு நிதி ஒதுக்கீட்டின் 2018.12.31 திகதிக்கான மொத்த முன்னேற்றம் 11

2.2 அமைச்சினால் நேரடியாக அமுல்படுத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கருத்திட்டங்கள் 12

2.3 தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் நிறைவேற்றிய பணிகள் 21

2.4 தேசிய சமூக நீர் வழங்கல் திணைக்களத்தினால் 2018 ஆம் ஆண்டில் அமுல்படுத்திய கருதிட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் 27

முதலாவது அத்தியாயம்

1.1 அறிமுகம்

வளி, நீர், உணவு ஆடை அணிகலன்கள் மனித இனத்தின் அடிப்படைத் தேவைகளாகும். வளி மனிதனின் அடிப்படைத் தேவையாக இருந்தபோதிலும் தூய்மையான வளி மிகவும் வரையறுக்க பட்ட சுற்றாடல் தவிர்ந்த ஏனைய இடங்களில் இன்னும் இயல்பாகப் பெறக்கூடிய இயலுமையுள்ளது. கடந்தகாலங்களில் தூய்மையான நீரை இலகுவாகப் பெறக்கூடியதாக இருந்த போதிலும் சனத்தொகை அதிகரிப்பு, கைத் தொழில்களின் அதிகரிப்பு போன்ற வற்றால் இயற்கைச் சூழல் அழிவடைதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் தூய்மையான குடிநீரை பெற்றுக் கொள்வது இன்று சிரமமான விடயமாக மாறியுள்ளது. நீரானது உயிரொன்றின் பிறப்பிலும் இருப்பிலும் கைத்தொழில் அபிவிருத்தியிலும் முதன்மையான தீர்மானிக்கும் காரணியென்பதனால் அனைத்து அரசாங்கங்களுக்கும் தமது நாட்டு மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குதல் மற்றும் கைத்தொழில் அபிவிருத்திக்குத் தேவையான நீரை வழங்கவேண்டிய பொறுப்புள்ளது.

அனைத்து நாடுகளிலுமுள்ள மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குவதன் முக்கியத்துவம் காரணமாகவே இது தொடர்பில் சர்வதேச ரீதியிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டதன் பெறுபேறாக ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பினால் மிலேனியம் அபிவிருத்தி இலக்கு உருவாக்கப்படும்போது இலக்குக் குறிக்கோள் இல. 07 இல் 1990 ஆண்டில் 64% ஆக இருந்த பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்களை 2018 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 90.60% வரை அதிகரிப்பதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், அதனை அடைய முடிந்துள்ளது.

மிலேனியம் அபிவிருத்தி இலக்கை இற்றைப்படுத்தி நிலைபேறான அபிவிருத்தி இலக்கினை உருவாக்கும் போது பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கலின் முக்கியத்துவம் காரணமாக 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நீரின் தரத்தை மேம்படுத்துதலும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பான குடிநீர் சுகாதாரம் தொடர்பாக சர்வதேச ரீதியில் இலங்கை எட்டியுள்ள உடன்பாடுகள் மற்றும் தமது நாட்டு மக்களுக்கு குடிநீரை வழங்கும் பொறுப்பும் விசேடமாக குடிநீர் சார்ந்ததாக நாட்டின் சில பிரதேசங்களில் மக்கள் முகங்கொடுத்துள்ள சீறுநீரக நோய் நிலையும் காரணமாக இலங்கை அரசும் பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கல் தொடர்பில் சிறப்பான கவனத்தைச் செலுத்தியுள்ளது.

பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கல் தொடர்பிலான அரசின் இந்த முன்னுரிமையான, சிறப்பான குறிக்கோளை அடைவதற்காக கொள்கை வகுத்தல், அமுல்படுத்துதல், மதிப்பீடு செய்தல் செயற்பாடுகளுக்காக அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமுகமாக தனியான அமைச்சொன்று அனைத்து அரசுகளாலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய 2015 ஜனாதிபதித் தேர்தலின் பின்னரும் நகர அபிவிருத்தி, நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு எனும் பெயருரைய அமைச்சு 1897/15 இலக்க 2015.01.18 திகதிய வர்த்தமானி மூலம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைச்சின் கீழ் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை, தேசிய சமதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களம், நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை, காணி மீட்பு கூட்டுத்தாபனம் ஆகிய திணைக்களங்களும் நிறுவனங்களும் உள்ளடங்குகின்றன.

2015 ஆகஸ்ட் பொதுத்தேர்தலின் பின்னர் அமைச்சின் விடய தானம் மீலாய்வின் பின்னர் அதற்கமைய 1933/13 இலக்க 2015 செப்டெம்பர் 21 திகதி வர்த்தமானி மூலம் நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு பிரகடனப் படுத்தப்பட்டதுடன் இந்த அமைச்சின் கீழ் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை, தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களமும் உள்ளடங்குகின்றன.

அதன் பிறகு 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 28 ஆம் திகதி நடைபெற்ற திருத்ததின் மூலம் வெளியிடப்பட்ட 2103/33 ஆம் இலக் விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் மூலம் நகர திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அதன் கீழ் தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை மற்றும் தேசிய சமுதாய நீர்வழங்கல் திணைக்களமும் அடங்கும் விடய தானம் திருத்தம் செய்ய பட்டாமும் குாடிநீர் மற்றும் சுகநல வசதிகளை வழங்கும் பொறுப்பு இவ் அமைச்சுக்கு தொடர்ந்து உள்ளது.

1.2 கருமங்கள்

- நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் விடயங்களுடன் தொடர்புடைய கொள்கைகள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் கருத்திட்ங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் உரிய திணைக்களங்கள், நியதிச் சபைகளின் விடயப்பரப்புக்களுடன் தொடர்புடைய விடயங்களின் மேற்பார்வை மற்றும் மதிப்பீடு.

- விசேட நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி விடயங்கள்.

- நகர அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின்போது தேசிய பௌதீக திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அனைத்து நிர்மாண நடவடிக்கைகளையும் நெறிப்படுத்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல்.

- அனைத்து குடிமக்களுக்கும் தூய குடிநீரை வழங்குதலை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

- நீர் வழங்கல் சேவைகள், மலக்கழிவகற்றல் முறைமை மற்றும் சுகாதார வசதிகள் தொடர்பில் பரிசோதித்தல், திட்டமிடுதல், திட்டத்தைத் தயாரித்தல், நிர்மாணங்களை நெறிப்படுத்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.

- சமூக நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகாதாரக் கருத்திட்டங்களை வினைத்திறனாகவும், முறைப்படியும் அமுல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

- தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை, தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களம் ஆகியவற்றுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள ஏனைய அனைத்து விடயங்கள் தொடர்பிலும் நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

- தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை, தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களம் ஆகியவற்றின் செயற்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்தல்.

1.3 அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் கருத்திட்டங்கள்

2018 ஆம் ஆண்டு 28 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட 2103/33 ஆம் இலக் விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் மூலம் நகர திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சு ஸ்தாபிக்கப்பட்டதுடன் அதன் கீழ் பின்வறும் நிறுவனங்கள் மற்றும் கருத்திட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

- தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை
- தேசிய சமுதாய நீர்வழங்கல் திணைக்களம்
- சுகநலம் தொடர்பான பிரதேச மத்திய நிலையம் (SACOSAN)
- நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான செயற்திட்டம் (WaSSIP)
- சீனா இலங்கை பிரதான ஆராய்ச்சி செயற்திட்டம்

1.4 இலங்கையின் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் சுக நல வசதிகளின் உள்ளடக்கம்

1.4.1 நீர் ஆதாரங்களின் படி பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கல் உள்ளடக்கம் – 2018

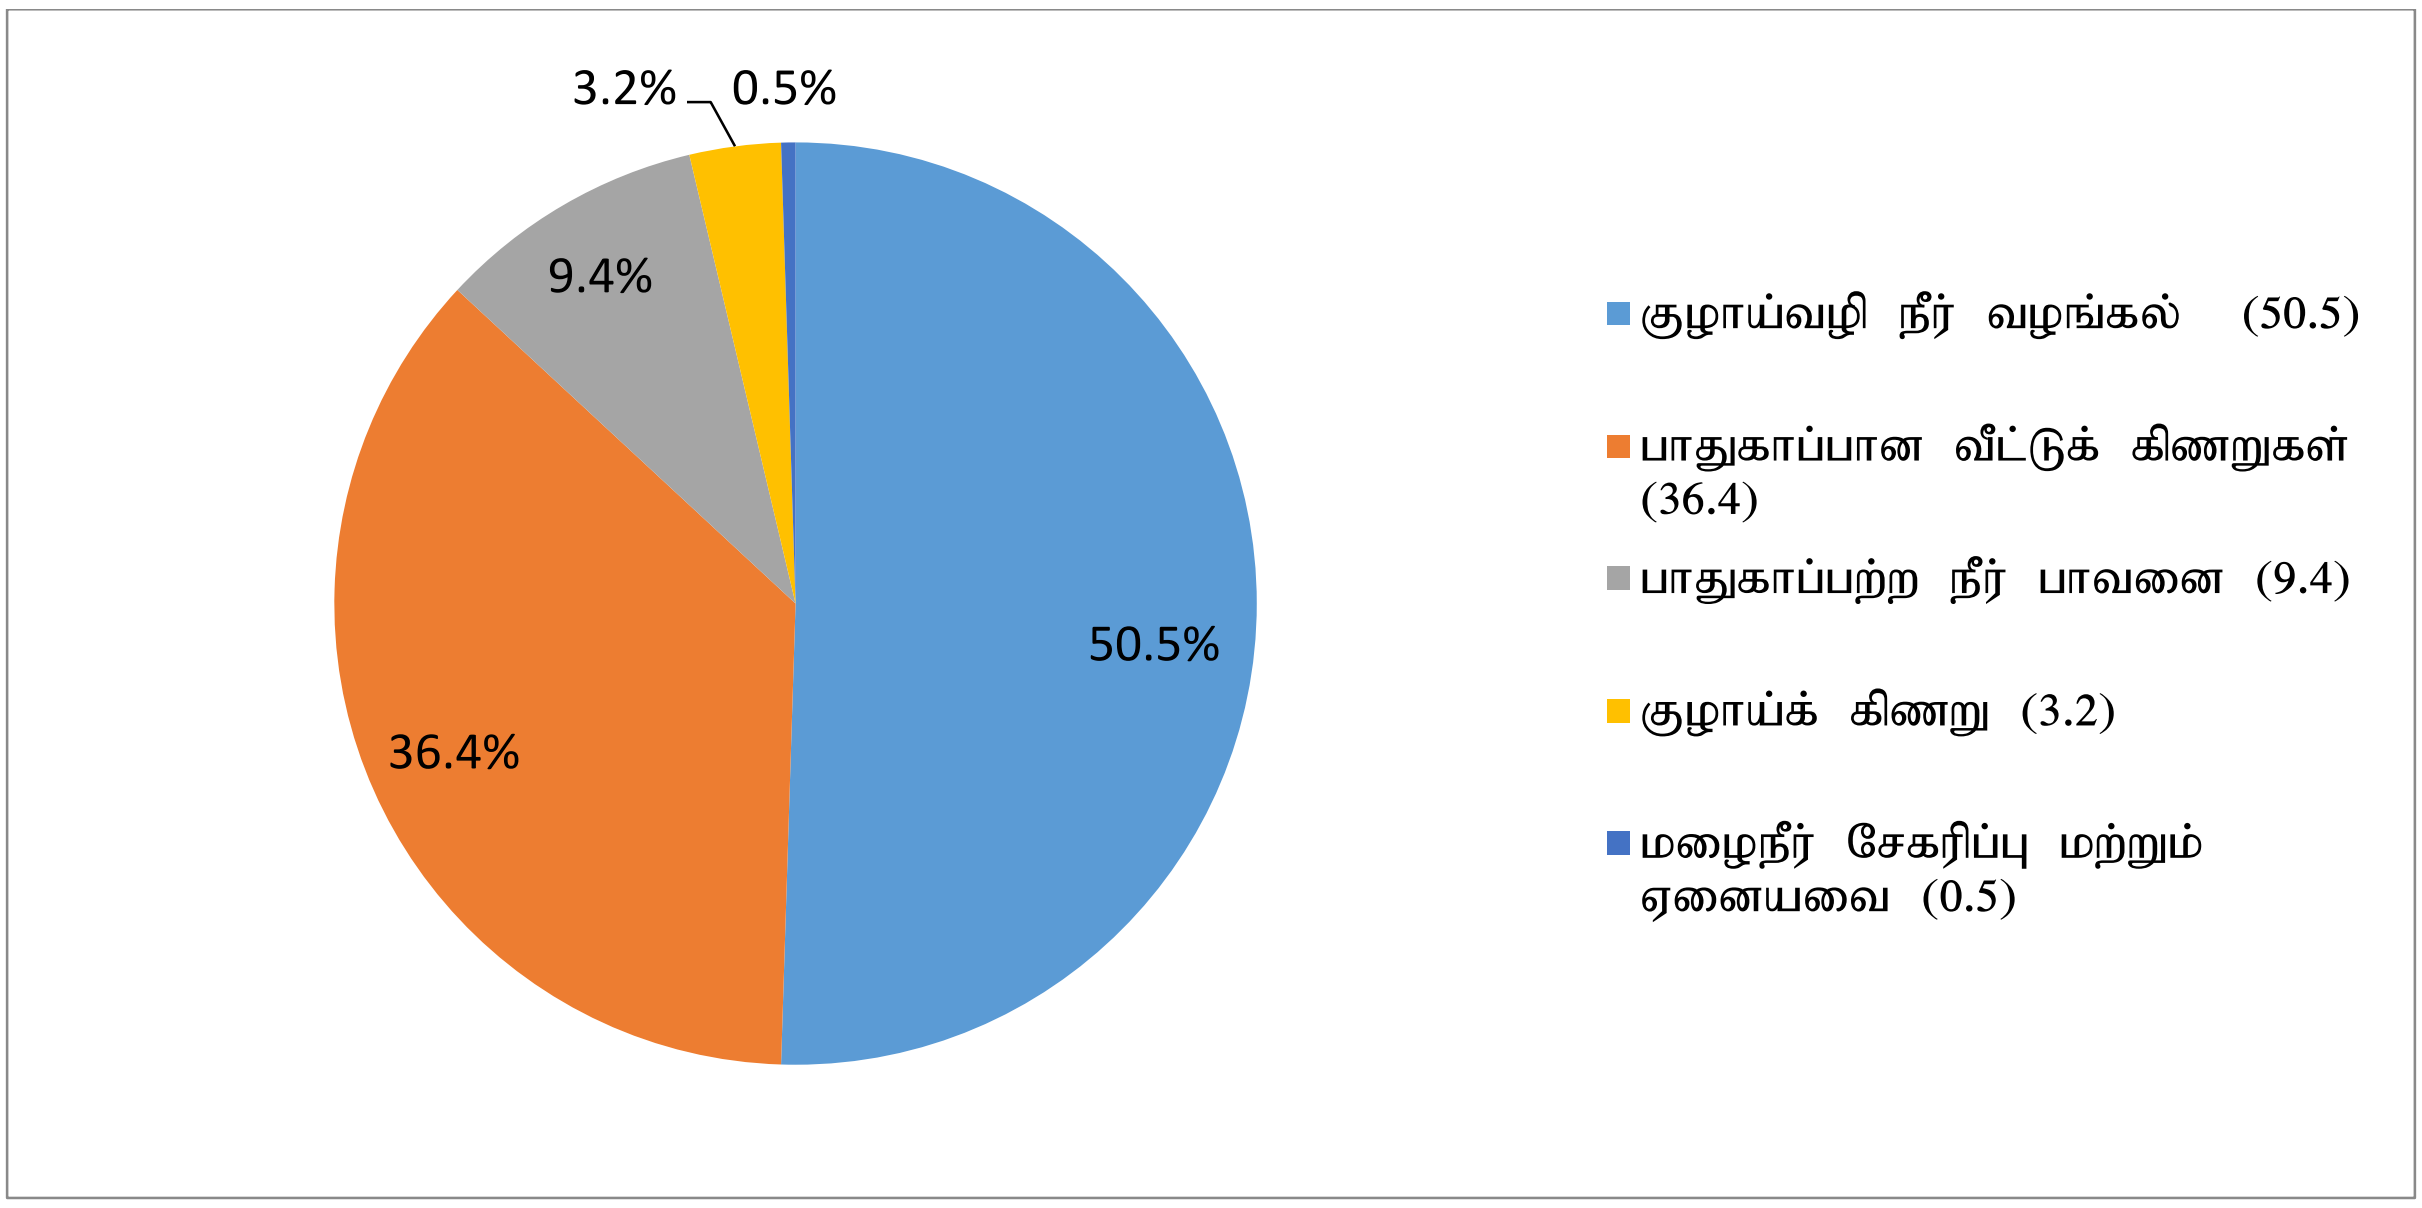

வரைபு இல - 01
மூலம் : தே.நீ.ம.வ.ச

1.4.2 ஆதாரங்களின் படி இலங்கையில் சுகநல வசதிகள் - 2018

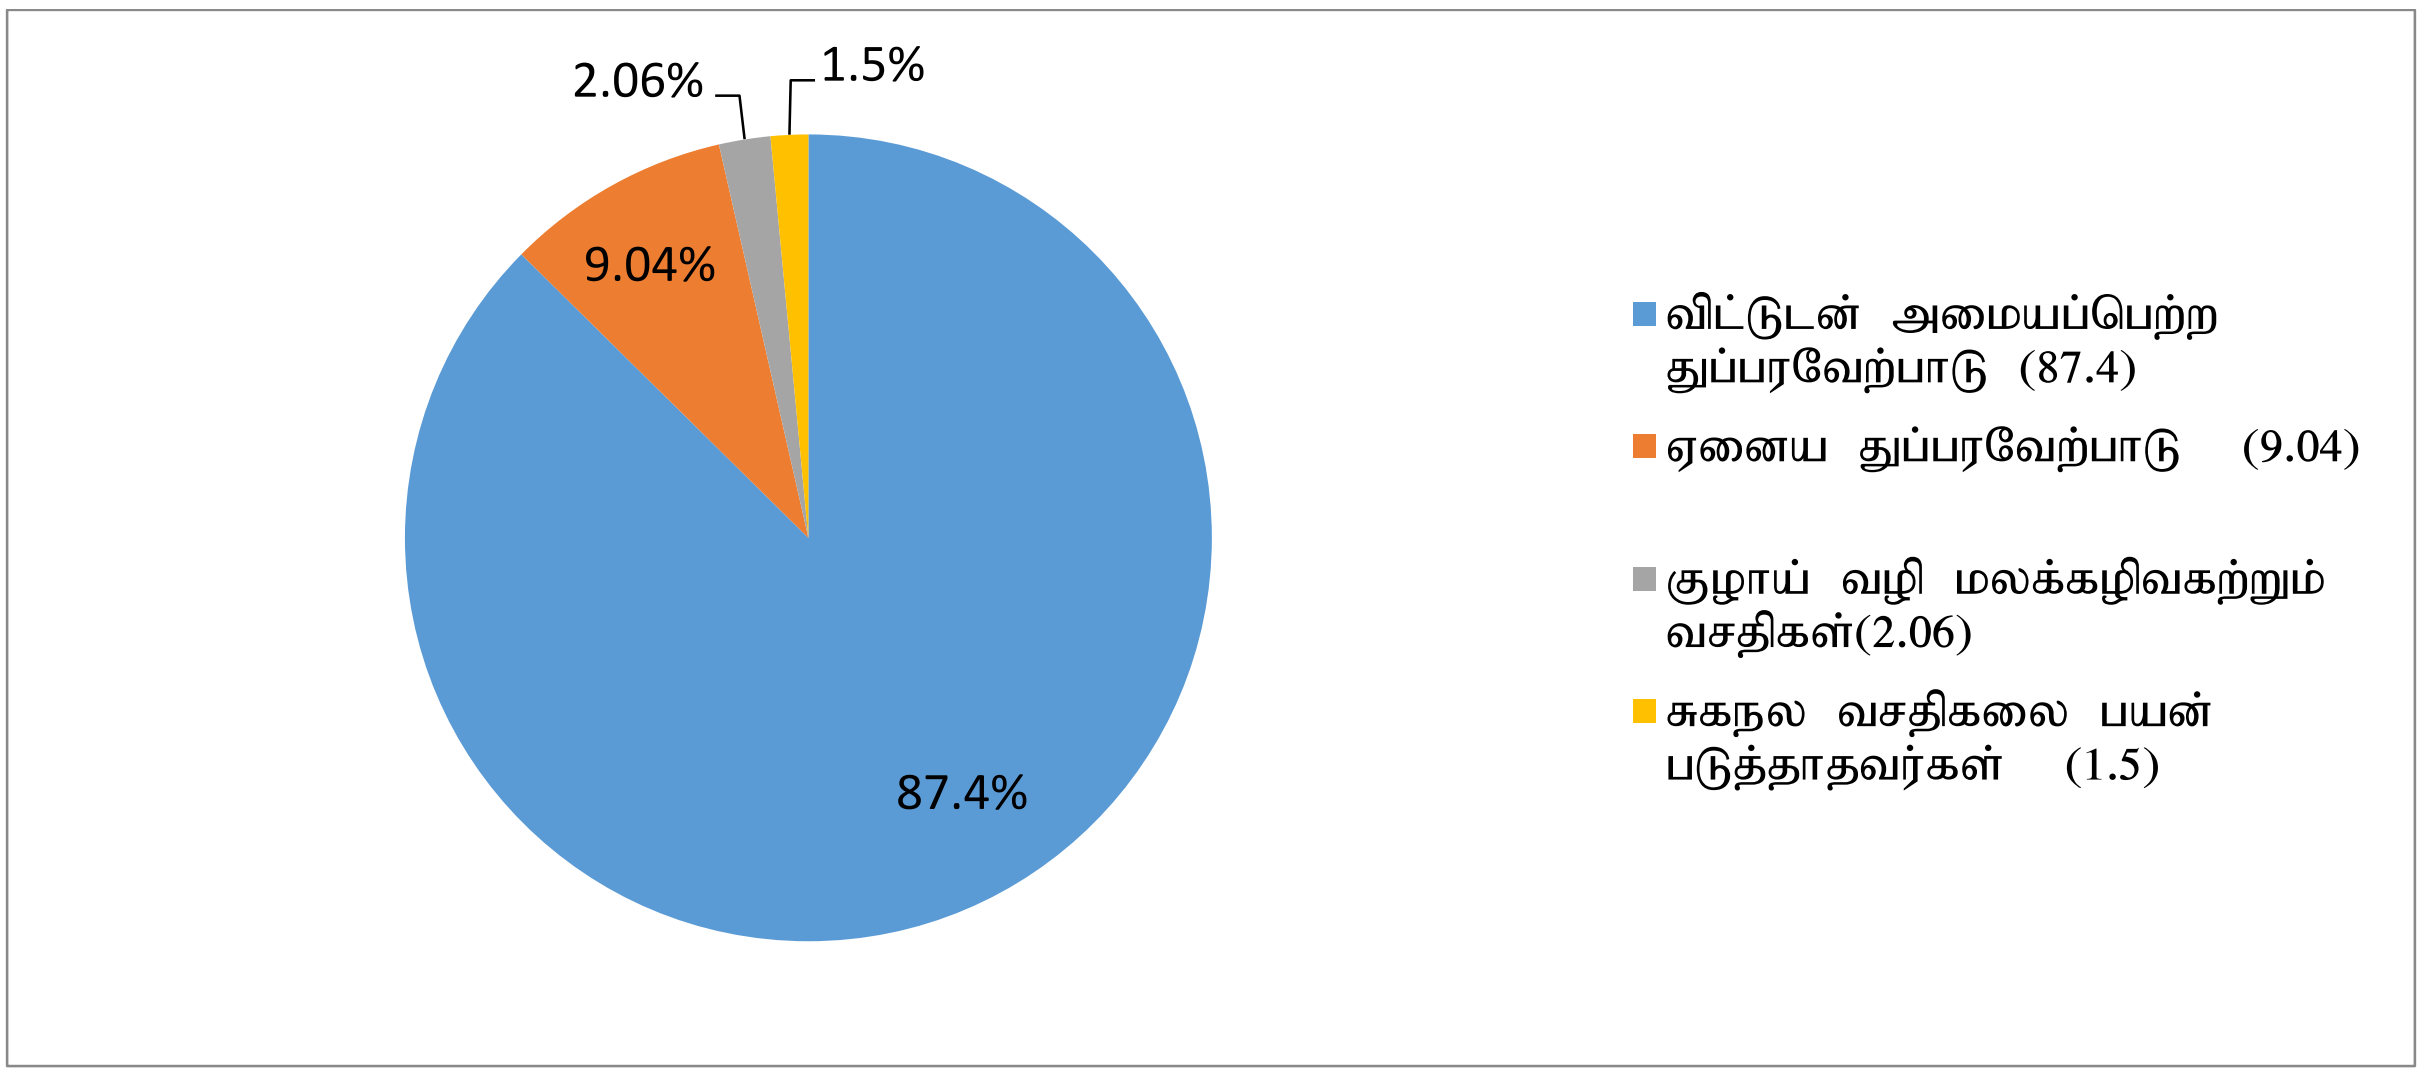

வரைபு இல - 02
மூலம் : தே.நீ.ம.வ.ச

*குழாய் மலக் கழிவகற்றல் வீதம் 2.07ஆகும் 2018 இல் அது 2.06% குறைந்துள்ளது இதற்கு காரணம் மக்கள் தொகை அதிகரிப்புடன் குழாய் மலக் கழிவகற்றல் வீதம் குறைந்துள்ளது.

1.4.3 பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் சுகநலப்பாதுகாப்பு தொடர்பான வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான உபாயங்கள்

நாட்டிலுள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் பாதகாப்பான குடிநீர் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்குவது அரசின் முதன்மைக் கொள்கையாகும். அதற்காக பின்வரும் உபாயங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

1.4.4 பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கல் தொடர்பான உபாயங்கள்

- அதிகரித்துவரும் வீடு மற்றும் வீடு சாராத கேள்வியைக் கருத்தில் கொண்டு குழாய் நீர் வழங்கலை அதிகரித்தல்.
- பாதுகாப்பான குடிநீர் பெற்றுக் கொள்ளும் போது பிரதேச ரீதியா நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைத்தல்.
- பிரதேசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட காரணிகள் மற்றும் ஆகுசெலவு போன்றவற்றைக் கருத்திலெடுத்து புதிய உத்தேச நீர் வினியோகத் திட்டங்களை திட்டமிடுதல்.
- மூலகாரணம் இனங்காணப்படாத சிறுநீரக நோய் பரவியுள்ள பிரதேசங்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குதல்.
- நீர்மூலங்கள்/உள்ளுளிப்பு நீர்வழிகள்/சமூக மட்ட அமைப்புக்களால் முகாமைத்துவம் செய்யப்படும் திட்டங்களின் நீரின் தன்மை மற்றும் அளவைக் கூட்டுதல்.
- நீர்க் கருவிகள்/ஏனையஉதிரிப்பாகங்களுக்கு தராதரத்ங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் குழாய் நீர் வழங்கல் முறைமைகளை மேம்படுத்தல்.
- மூலகாரணம் இனங்காணப்படாத சிறுநீரக நோய்க்கான அடிப்படைக் காரணத்தை இனங்காண்பதற்காகவும் அந்த நோயைத் தவிர்ப்பதற்காகவும் நிலக்கீழ் நீரைத் தூய்மையாக்குவதற்காக மிகவும் சாத்தியம் மிக்க தூய்மையாக்கல் முறைமையை அறிமுகம் செய்வதற்காக தரமுயர்ந்த மற்றும் நவீன ஆராய்ச்சிகள் / ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளல்.
- கைத்தொழில் துறைக்கு 24 மணித்தியாலமும் நிலையான குழாய் நீர் பெறுதலுக்காக அதிகரித்துவரும் கேள்வியை நிறைவுசெய்தல்.
- குழாய் நீர் வழங்கல் சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் கொள்லளவை அதிகரித்தல்.
- மக்கள் நேயமிக்க இலாபமீட்டும் நிறுவனமாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையினை இயக்குவதற்கான வழிகாட்டல் வழங்கல்.

1.4.5 பாதுகாப்பான குடிநீர் தொடர்பான இலக்குகள்

- 2020 ஆண்டளவில் அனைத்து இலங்கையருக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குதல்.
- 2020 ஆண்டளவில் குழாய் நீர் வழங்கல் கொள்லளவை 55% வரை அதிகரித்தல்.
- மூலகாரணம் இனங்காணப்படாத சிறுநீரக நோய் பரவியுள்ள பிரதேசங்களுக்கு குழாய் நீர் வசதிகளை வழங்குதல்.
- நீரின் தரத்தை 100% உறுதி செய்தல்.
- நீரின் தரத்தை 100% உறுதி செய்தல்.
- குடிநீர் வசதிகளை வழங்கும் நிறுவனக் கட்டமைப்பை வினைத்திறனாக்குதல்.

1.4.6 சுகநல பாதுகாப்பு தொடர்பான உபாயங்கள்

- விசேடமாக கிராமிய மற்றும் தோட்டத்துறையும் அடங்கலாக பாதுகாப்பு வசதிப் பயன்பாட்டை உயர்த்துதல்.
- சுகநல பாதுகாப்பு மற்றும் சுகதாரம் தொடர்பிலான கல்வி அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகளை நடாத்தல்.
- பிரதான நகரங்களின் மலக் கழிவகற்றல் வசதிகலை உயர்த்துதல்.
- நாட்டில் கழிவுநீர் அகற்றும் சேவைகளுக்கு உதவுவதற்காக தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் செயற்பாடுகளை மேலும் திறம்பட மீளமைத்தல்.

1.4.7 சுக நல பாதுகாப்பு தொடர்பான இலக்குகள்

- நாடு பூராவும் 100% ஆரோக்கியமான சுகாதாரப் பாதுகாப்பு வசதிகளை உறுதிப்படுத்தல்.
- 2020 ஆகும்போது நகர்ப்புற சனத்தொகையின் 2.25% த்தினருக்கு குழாய் மூலமான மலக்கழிவு அகற்றும் வசதிகளை வழங்குதல்.

1.5 நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கள் அமைச்சின் – 2018.12.31 திகதிக்கு அங்கிகரிக்கப்பட்ட ஆளணி

இல	பதவி	சேவை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆளணி	இருக்கும் தொகை	வெற்றிடம்
1	செயலாளர்		01	01	இல்லை
2	மேலதிக செயலாளர்	இ.நி.சே (விசேட	01	01	இல்லை
3	மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி)	இ.நி.சே (விசேட)	01	01	இல்லை
4	மேலதிக செயலாளர் (தொழிநுட்பம்)	பொ.சே (விசேட)	01	01	இல்லை
5	சிரேஸ்ட நிகழ்ச்சித்திட்டப் பணிப்பாளர்	இ.தி.சே (விசேட)	01	01	இல்லை
6	சிரேஸ்ட உதவி செயலாளர் (நிர்வாகம்)	இ.நி.சே I	01	01	01
7	பணிப்பாளர் (காணி)	இ.நி.சே I	01	0	இல்லை
8	பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)	இ.நி.சே I	01	01	இல்லை
9	பணிப்பாளர் (பெறுகை)	இ.பொ.சே I	01	01	இல்லை
10	பணிப்பாளர் (விசேட புலனாய்வு)	இ.நி.சே I	01	0	01
11	பணிப்பாளர் (திட்டமிடல், கண்கானிப்பு)	இ.தி.சே I	01	01	இல்லை
12	பிரதான கணக்காளர்	இ.க.சே I	01	01	இல்லை
13	பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்	இ.க.சே I	01	01	இல்லை
14	கணக்காளர்	இ.க.சே III/II	01	01	01
15	பிரதி /உதவிப் பணிப்பாளர்(அபிவிருத்தி)	இ.நி.சே III/II	01	0	01
16	பிரதி /உதவிப் பணிப்பாளர்(காணி)	இ.நி.சே III/II	02	0	01
17	பிரதி /உதவிப் பணிப்பாளர்(அபிவிருத்தி)	இ.நி.சே III/II	02	02	இல்லை
18	பிரதி /உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல், கண்கானிப்பு)	இ.தி.சே III/II	02	02	இல்லை
19	பிரதி /உதவிப் பணிப்பாளர்(விசேட புலனாய்வு)	இ.நி.சே III/II	01	01	இல்லை
20	பிரதி /உதவிப் பணிப்பாளர் (பெறுகை)	இ.பொ.சே III/II	01	01	இல்லை
21	பிரதி /உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)	இ.தி.சே III/II (மிகைஆளணி)	02	02	இல்லை
22	சட்ட அதிகாரி	இ.நி.சே III/II	01	0	01
23	உதவி செயலாளர்	இ.நி.சே III	01	01	இல்லை
24	நிர்வாக அலுவலர்	பொ.மு.உ.சே (அதிசிறப்பு)	02	01	01
25	மொழி பெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்/ஆங்கிலம்)	மொழி பெயர்ப்பாளர் சேவை	03	01	02
26	செயலாளரின் இணைப்புச் செயலாளர்	தற்காலிகம	01	01	இல்லை
27	பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவை	பொ.மு.உ.சே I/II/III	32	28	04
28	அபிவிருத்தி உதவியாளர்	அ.உ.சே	45	28	17
29	தகவல், தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உதவியாளர்	இ.த.தொ.சே	02	01	01
30	சாரதி	சாரதி சேவை I/II/III	16	10	06
31	அலுவலக பணியாளர் சேவை I/II/III	அ.ப.சேவை	21	17	04
32	தொழிநுட்ப உதவியாளர்	திணைக்களத்துக்குரிய	01	0	01
33	ஒளிப்படப்பிடிப்பாளர் (காணொளி)	தற்காலிகம்	01	0	01
34	ஒளிப்படப்பிடிப்பாளர்	தற்காலிகம்	01	0	01
35	ஒளிப்படப்பிடிப்பாளர் (உதவியாளர்)	தற்காலிகம்	01	01	இல்லை
36	பட்டதாரி உதவி அலுவலகர்	பட்டதாரி பயிற்சி	0	07	01
இராஜாங்க அமைச்சர் அலுவலகம்					
37	இராஜாங்க அமைச்சு செயலாளர்		01	0	0
38	பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்	பொ.மு.உ.சே I/II/III	01	0	01
39	சாரதி I/II/III		01	01	இல்லை
40	அலுவலக பணியாளர் சேவை I/II/III	அ.ப.சேவை	01	0	01
	மொத்தம்		**156**	**116**	**47**

*வுரவ செலவு, கணக்குகள், மனித வள, அபிவிருத்தி, பெருகை, தகவல் தொழில்நுட்பம், கணக்காய்வு உதவியாளர் பதவிகளில் சேர்க்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவைக்கு உள்வாங்கப்பட்டுள்ளனர்.

1.6 2015-2018 ஆண்டுக்குள் அடைந்து கொள்ளப்பட்ட செயற்திறன்

	சுட்டிகள்	2015	2016	2017	2018
சுகாதார பாதுகாப்பு துறைக்காக					
1.	சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகள் வீதம்	86%	87.43%	87.48%	87.40%
2.	குழாய் மூலம் மலக்கழிவகற்றல் வசதிகள் வீதம்	2%	2.08%	1.99%	2.06%
குடிநீர் வசதிகள் துறைக்காக					
3.	பாதுகாப்பான குடிநீர் வசதிகள் வீதம்	86%	87.8%	89.3%	90.60%
4.	குழாய் நீர் உள்ளடக்க வீதம்	45.9%	47.7%	49.2%	50.50%
5.	குழாய் நீர் வழங்கல் வீதம் (தே.நீ.வ.வ.சபையின்)	35.2%	37.1%	38.7%	40.00%
6.	நாடுமுலுவதும் வருமானமீட்டாத நீர் வழங்கல் வீதம்	27.83%	26.26%	25.98%	24.90%
7.	கொழும்பு நகரில் வருமானமீட்டாத நீர் வழங்கள் வீதம்	46.16%	45.72%	43.14%	41.65%
8.	முழுக் குழாய் நீர் இனைப்புக்கள் (தே.நீ.வ.வ சபையாழ் வழங்கிய)	மில்லியன் 1.95	மில்லியன் 2.09	மில்லியன் 2.23	மில்லியன் 2.33
9.	ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட புதிய குழாய்நீர் இணைப்புக்கள் (தே.நீ.வ.வ.சபையால வழங்கிய)	121,723	138,750	126,701	109,462
நிறுவன திறன் சுட்டிகள்					
10.	குழாய் நீர் இணைப்புக்கள் 1000 க்கு உள்ள உழியர்கள் எண்ணிக்கை	5.5	4.95	4.72	4.31

மூலம் - (தே.நீ.வ.வ.சபை மற்றும் அமச்சு அறிக்கைகள்)

1.7. 2015 – 2018 வரை வழங்கப்பட்ட நீர் இணைப்புக்கள் தொகை (மாகாண, மாவட்ட ரீதியியாக)

மாகண / பிரதேச உதவிச் சேவை நிலையம்	வலயம்	2015 டிசம்பர் அளவில் வழங்கப்பட்ட மொத்த குழாய்நீர் இணைப்புக்களின் எண்ணிக்கை	2016 டிசம்பர் அளவில் வழங்கப்பட்ட மொத்த குழாய்நீர் இணைப்புக்களின் எண்ணிக்கை	2017 டிசம்பர் அளவில் வழங்கப்பட்ட மொத்த குழாய்நீர் இணைப்புக்களின் எண்ணிக்கை	2018 டிசம்பர் அளவில் வழங்கப்பட்ட மொத்த குழாய்நீர் இணைப்புக்களின் எண்ணிக்கை
மேற்கு – மத்தி	முன்னுரிமை	2,290	2,293	-	-
	கொழும்பு நகா	138,100	140,841	144,890	146,592
	கோட்டே TEC வடக்கு	154,809	160,781	166,770	171,910
	மகரகம (TEC South)	126,120	140,083	150,630	159,956
மேற்கு வடக்கு	களணி (TNC)	169,717	183,519	194,207	203,622
	கம்பஹா	67,544	72,984	77,528	80,184
மேற்கு- தெற்கு	தேகிவளை(TSC)	102,479	105,136	107,363	109,330
	களுத்துறை	60,345	63,912	67,570	70,113
	பாணதுறை	56,975	67,687	77,970	85,089
மத்திய	கண்டி	236,052	248,735	261,356	272,690
வடமேல்	குருணாகல்	69,182	73,782	78,036	82,950
வடமத்தி	அனுராதபுரம்	100,668	107,686	114,351	121,609
சப்ரகமுவ	கேகாலை	51,565	53,468	55,387	57,200
	இரத்தினபுரி	43,219	47,489	51,219	55,102
தெற்கு	ஹம்பாந் தோட்டை	97,728	102,406	106,237	109,804
	மாத்தறை	91,709	94,646	97,267	99,443
	காலி	103,780	106,371	108,520	111,276
ஊவா	பண்டாரவ ளை	46,213	48,706	53,409	59,265
	மொனராகல	35,094	37,567	41,385	43,987
வடக்கு	யாழ்ப்பாணம்	14,834	17,817	21,653	24,015
கிழக்கு	அம்பாறை	38,891	50,967	58,005	62,609
	மட்டக்களப்பு	34,759	40,748	46,948	50,780
	திருகோணமலை	47,756	55,902	63,866	72,829
	அக்கரைப்பற்று	63,892	68,935	74,605	78,279
மொத்தம்		**1,953,721**	**2,092,471**	**2,219,172**	**2,328,634**

இரண்டாவது அத்தியாயம்

2.1 2018 ஆண்டு நிதி ஒதுக்கீட்டின் 2018.12.31 திகதிக்கான மொத்த முன்னேற்றம்

	கருதிட்டம்	ஒதுக்கிடு (மி.ரூபா)	2018.12.31திகதிக்கன நிதி முன்னேற்றம்		கையிருப்பு பில்கள்	நிதி முன்னேற்றம் 2018.12.31 திகதிக்கு கையிருப்பு (பில்களுடன்)	
			மி.ரூபா	%	மி.ரூபா	மி.ரூபா	%
நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு							
1	மூலகாரணம் அறியப்படாத சிறுநீரக நோய் பரவும் பிரதேசங்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர்வ வவழங்குதல் குடிநீர் வழங்குதல்	585	492.56	84.20	60.67	553.23	94.57
2	கிராமிய நீர்வழங்கல் மற்றும் சுகநலப் பாதுகாப்பு செயற்திட்டங்களை மேம்படுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்	130	82.46	63.43	34.99	117.45	90.35
3	சுகாதார பாதுகாப்பு தொடர்பான தெற்காசிய மாநாட்டின் மீழாய்வு –அகில இலங்கை சுகாதார நிகழ்ச்சி திட்டம்	20	19.67	98.39		19.67	98.39
4	சுகநலப் பாதுகாப்பு தொடர்பான தெற்காசிய மாநாட்டிற்கான ஒரு பிராந்திய செயலகத்தை நிறுவுதல்	13	7.27	55.92		7.27	55.92
5	மழைநீர் சேகரிப்பு நிகழ்சித்திட்டம்	5	0.67	13.40	2.11	2.78	5.56
6	நீரேந்து பகுதிகளை பாதுகாப்பதும் மற்றும் நீராதாரங்கள் மாசடைவதைத் தடுக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்	5	4.10	82.00	0.90	5.00	100
7	கேகாலை மாவட்டத்தில் மீள்குடியேற்றப்பட்ட கிராமங்களுக்கான குடிநீர் வசதிகளை வழங்குதல்	112	90.35	80.67	20.13	110.48	98.64
8	நகர திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி நிகழ்சிதிட்டங்கள்	3,500	1,773.86	50.68	444.25	2,218.11	63.37
A	**உப மொத்தம் (1+2+3+4+5+6+7+8)**	**4,370**	**2,470.94**	**56.54**	**563.05**	**3,033.99**	**69.43**
09	நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநலப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தல் தொடர்பான செயற்திட்டம் (உலக வங்கி) (WASSIP)	4,767	4,691.4	98.41	75.6	4,767	100
10	சீனா-இலங்கை ஆராய்ச்சி செயற்திட்டம்	325	247.42	76.13	0.59	248.01	76.31
B	**அமைச்சின் கூட்டுத்தொகை (A+09+10)**	**9,462**	**7,409.76**	**78.31**	**639.24**	**8,049.00**	**85.07**
தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை							
11	அந்தரகஸ்யாய நீர் வழங்கள் உத்தேச முறை	20	4.56	22.80	1.77	6.33	31.65
12	மாத்தறை குருகிய கால மேம்பாட்டு திட்டம்	75	57.54	76.72	7.11	64.65	86.2
13	உலர் வலய நகரப்புர நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பு கருத்திட்டம் -V (ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி) (ADB v)	50	49.9	99.80		49.9	99.80
14	கொழும்பு பிரதேச வீட்டுக் கழிவுநீர் இணைப்புக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்புக்கான வாய்ப்புக்களை மக்களுக்கு அதிகரித்தல் (உலக வங்கி)	315.15	315.10	99.98		315.10	99.98
15	பண்டாரவெல நீர் வழங்கள் உத்தேசயை முறை	70	31.39	44.84	38.61	70	100
16	திஸ்ஸமாராம நீர் வழங்கள் உத்தேச முறை	20	8.3	41.50	1.45	9.75	48.75
17	பெரிய அளவிலான நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் திட்டங்கள். (Disbursement of Ongoing Projects)	24,182.7	23,982.40	99.17		23,982.4	99.17
18	திருகோணமலை நீர் வழங்கள் உத்தேச முறையை புனரமைத்தல்	155	132.05	85.19	22.95	155	100
19	காணி கையகப்படுத்தல்	200	162.65	81.33		162.65	81.33
20	விரைவுபடுத்தப்பட்ட பிரதேச சபை வீதி அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் காரணமாக பயன்பாட்டு சேவைகள் ∴ இடங்களை மாற்றல்	250	168.92	67.57	81.08	250	100
C	**தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் கூட்டுத்தொகை**	**25,337.85**	**24,912.81**	**98.32**	**152.97**	**25,065.78**	**98.93**
தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களம்							
21	சமுதாய நீர் வழங்கல் முரைகலை மேம்படுத்தல்	200	56.77	28.39	100.44	157.21	78.60
	முழு மொத்தம் (B+C+21)	**34,999.85**	**32,379.34**	**92.51**	**892.65**	**33,271.99**	**95.06**

2.2 அமைச்சினால் நேரடியாக அமுல்படுத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கருத்திட்டங்கள்

2.2.1 நாள்பட்ட சிறுநீரக செயலிழப்பு நோய் தடுப்பு திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி குறிக்கோள்	பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குவதன் மூலம் சிறுநீரக செயலிழப்பு நோயை கட்டுப்படுத்தல்				
2018 ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு	முன்- மி.ரூபா 800		திருத்தப்பட்ட- மி.ரூபா 585		
கருத்திட்டக் காலம்	2018.01.01 – 2018.12.31				
பயனாளிகள் தொகை	குடும்பங்கள் 22,492, பாடசாலை மாணவர்கள் 19,121				
சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	வடக்கு, வட மத்திய ,வட மேல், கிழக்கு, மத்திய, சப்ரகமுவ, ஊவா, தெற்க்கு				
2018.12.31 திகதிக்கு நிதி முன்னேற்றம் (மி.ரூபா)	இலக்கு	அடைவுகள்	2018.12.31 திகதிக்கு பௌதீகமுன்னேற்ம்	இலக்கு	அடைவுகள்
	585	492.56		100%	80%

2.2.2 கிராமிய நீர்வழங்கல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் செயற்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி குறிக்கோள்	கிராமப்புர மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குவதற்கும் அவர்களின் சுகநல மேம்பாட்டை மேம்படுத்தவும்				
2018 ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு	முன்- மி.ரூபா 200		திருத்தப்பட்ட- மி.ரூபா 130		
கருத்திட்டக் காலம்	2018.01.01 – 2018.12.31				
பயனாளிகள் தொகை	48,500				
சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	வடக்கு, வட ஊ , வடமேல், கிழக்கு, மத்திய, சப்பிரகமுவ, ஊவா				
2018.12.31 திகதிக்கு நிதி முன்னேற்றம் (மி.ரூபா)	இலக்கு	அடைவுகள்	2018.12.31 திகதிக்கு பௌதீகமுன்னேற்ம்	இலக்கு	அடைவுகள்
	130	82.46		100%	60%

2.2.3 மழைநீர் சேகரிப்பு தாங்கிகளை நிறுவும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி குறிக்கோள்	மழைநீரை சேகரித்து துயிமையான குடிநீரை வழங்குதல்				
2018 ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு	முன்- மி.ரூபா 5		திருத்தப்பட்ட- மி.ரூபா 5		
கருத்திட்டக் காலம்	2018.01.01 – 2018.12.31				
பயனாளிகள் தொகை	குடும்பங்கள் 26, பாடசாலைகள் 3, வைத்தியசாலைகள் 3				
சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	வட மத்திய, ஊவா, மேற்க்கு				
2018.12.31 திகதிக்கு நிதி முன்னேற்றம் (மி.ரூபா)	இலக்கு	அடைவுகள்	2018.12.31 திகதிக்கு பௌதீகமுன்னேற்ம்	இலக்கு	அடைவுகள்
	5	0.67		100%	90%

2.2.4. நீரேந்து பகுதிகளைப் பாதுகாக்கும் செயற்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி குறிக்கோள்	நீரேந்து பகுதிகளைப் பாதுகாத்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குதல்				
2018 ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு	முன்- மி.ரூபா 5		திருத்தப்பட்ட- மி.ரூபா 5		
கருத்திட்டக் காலம்	2018.01.01 – 2018.12.31				
பயனாளிகள் தொகை	75,000				
சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	மத்திய, சப்ரகமுவ				
2018.12.31 திகதிக்கு நிதி முன்னேற்றம் (மி.ரூபா)	இலக்கு	அடைவுகள்	2018.12.31 திகதிக்கு பௌதீகமுன்னேற்ம்	இலக்கு	அடைவுகள்
	5	4.1		100%	98%

2.2.5 SACOSAN நிகழ்ச்சித்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி குறிக்கோள்	இலங்கையில் குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் மக்களுக்கு சுகநல வசதிகளை வழங்குதல்				
2018 ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு	முன்- மி.ரூபா 20		திருத்தப்பட்ட- மி.ரூபா 20		
கருத்திட்டக் காலம்	2018.01.01 – 2018.12.31				
பயனாளிகள் தொகை	278				
சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	கண்டி, மாத்தளை, அனுராதபுரம், மொனராகலை, பொலொன்னறுவை, அம்பாறை, கம்பஹா, களுத்துரை, கொழும்பு, மட்டக்களப்பு, காலி, அம்பான்தொடை				
2018.12.31 திகதிக்கு நிதி முன்னேற்றம் (மி.ரூபா)	இலக்கு	அடைவுகள்	2018.12.31 திகதிக்கு பௌதீகமுன்னேற்ம்	இலக்கு	அடைவுகள்
	20	19.68		100%	80%

2.2.6 நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் செயற்திட்டம் (WaSSIP)

கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி குறிக்கோள்	குழாய்நீர் வழங்குவதட்கான வசதிகளை மேம்படுத்தல் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் மேம்படுத்தப்பட்ட சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகள் மற்றும் இணைந்த நிறுவனங்களின் திறனை வலுப்படுத்தல்				
மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவு	அமெரிக்கா டொலர் மில்லியன்165 + .ரூபா. மில்லியன் 925 = (24,715 மில்லியன் ரூபா)				
கருத்திட்டக் காலம்	2016 ஜூன் 24 முதல் 2020 டிசம்பர் வரை				
பயனாளிகள் தொகை	குடிநீர் 426,000 வரை, சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகள்172,000 ஆகும். நகரப்புர பயனாளி வீடுகள் தொகை 23,600 மும், கிராமிய பயனாளி வீடுகள் தொகை 64,900 மும், தோட்டப்பகுத பயனாளி வீடுகள் தொகை 15,800 மும், சுகநல பாதுகாப்பு பயனாளி வீடுகள் தொகை 43,000 ஆகும.				
சேவை வழங்கப்படும் மாவட்டங்கள்	கேகாலை, இரத்தினபுரி, பதுளை, மொனராகலை, கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு மற்றும் நுவரேலியா ஆகிய மாவட்டங்கள்				
	இலக்கு	அடைவுகள்		இலக்கு	அடைவுகள்
2018.12.31 திகதிக்கன நிதி முன்னேற்றம (மி.ரூபா)	4,767	4,691.40	2018.12.31 திகதிக்கு பௌதீகமுன்னேற்ம்	100%	50%

2.2.7 சீனா - இலங்கை ஆராய்ச்சி செயற்திட்டம் (CSLRGP)

கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி குறிக்கோள்	• இலங்கையில் மூலகாரணி இனம் காணப்படாத சிறுநீரக பாதிப்பு நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணம் மற்றும் பரவுவதற்கு சாதகமான காரனங்களை கண்டறிதல். • இலங்கையில் சிறுநீரக நோய் பரவி வரும் பிரதேசங்களில் நிலத்தடி நீர்சிகிச்சை முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தல். • உலர் வலயத்திற்க்கு மழைநீரை சேகரித்து பயன் படுத்துவதற்கான முறைகளையும் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தையும் மேம்படுத்தல். • காணிப் பயன்பாட்டு திட்டம், ஒன்றிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவ திட்டம் மற்றும் நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல, உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தித் திட்டங்களை தயாரிப்பது தொடர்பில் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குதல்.				
மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவு	மி.ரூபா. 2,830				
கருத்திட்டக் காலம்	2016நவம்பர் தொடக்கம் 2020 மே வரை				
பயனாளிகள் தொகை	இலங்கையின் அனைத்து மக்கள் தொகையும்				
சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	இலங்கையின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும்				
	இலக்கு	அடைவுகள்		இலக்கு	அடைவுகள்
2018.12.31 திகதிக்கு நிதி முன்னேற்றம் (மி.ரூபா)	325	247.42	2018.12.31 திகதிக்கு பௌதீக முன்னேற்ம்	100%	30%

2.2.8 நகர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம்

அமைச்சு 3,500 மில்லியன் ரூபா நிதியை நகர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை செயற்படுத்தும் பணிக்காக ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. அதற்கமைய இச் செயற்திட்டத்தின் கீழ் 288 திட்டங்கள் செயற்பட்டன அவற்றின முன்னேற்றம் பின் வறுமாறு.

2018 ஆம் ஆண்டில் நகர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி திட்டத்திற்காக அனுமதி வழங்கப்பட்ட திட்டங்கள்

இல	கருத்திட்ட வகை	அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	நிறைவடைந்த திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	நிதி ஒதுக்கீடு (மி.ரூபா)	2018.12.31 திகதிக்கு செலவுகள் (மி.ரூபா)	2018.12.31 திகதிக்கு உள்ள பில்கள் (மி.ரூபா)
1	சாலைகள்/வடிகால்அமைப்புகள்	319	49	2,026.6	1,135.31	398.13
2	பல்நோக்கு கட்டிடங்கள்	18	11	468.98	143.60	
3	தெரு விளக்குகள்/ பூங்காக்கள்	38	29	464.19	216.18	
4	நீர் வழஙகும் திட்டங்கள்	18	16	306.45	211.68	
5	மாவட்ட செயலகங்களின்-ஒதுக்கீடு	34	34	233.55	57.29	
6	ஏனைய செலவினங்கள்				9.85	
	மொத்தம்	**427**	**139**	**3,500**	**1,773.91**	**398.13**

சம்மாந்துறை மற்றும் கல்முனை பிரதேசங்களுக்கான ஒன்றிணைந்த பிரதான வரைபுத் திட்ட தயாரிப்பு

- மொரட்டுவை பல்கலைக்கழக ஒத்துழைப்புடன் மேற்குப் பிராந்திய நகர, பிரதேச திட்டமிடல் செயற்திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப பட்டதுடன் மேற்குறித்த பிரதான வரைபுத் திட்டத்தின் கீழ் பிரதானதலையீடுகளையும் மற்றும் முதலீடுபகுதிகலையும் இனம் கண்டுள்ளது.

- பிரதான வரைபுத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாவது கல்முனை மற்றும் சம்மாந்துறை பிரதேசங்களுக்கான எதிர்கால இட ஒதுக்கிட்டு அபிவிருத்தி வாய்ப்புக்கலை காட்டும் ஒன்றிணைந்த பிரதான அபிவிருத்தி திட்டத்தை தயாரிப்பதாகும். முன் மொழியப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டத்தின் நோக்கமாவது அப்பிரதேசத்தின் அபிவிருத்திக்கு மிக பொருத்தமான உத்தியை அடிப்படயாக கொண்டு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கொள்கைகள் உள்ளிட்ட ஒரு பிரத்தியோக கட்டமைப்பாகும்.

- 2018 ஆம் ஆண்டு இப் பிரதான திட்டத்தின் கீழ் 35 திட்டங்களை செயற்படுத்துவதற்கு 285 மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் பிரதான திட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி நீரியல் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

2.2.9 காணிப் பிரிவுச் செயற்பாடுகள்

இழப்பீடு மற்றும் வட்டி செலுத்துவதற்கு 2018 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்ட ஒதுக்கீட்டின் மூலம் 200 மில்லியன் ரூபா நிதியை சம்மந்தபட்ட மாவட்ட செயலகங்களுக்கு வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்தல், காணி கையகபடுத்தல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படும் சந்தர்பங்களில் அவற்றை தீர்பதற்கு தேவையான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு கூட்டங்களை நடத்தி அறிக்கைகளை சமர்பித்தல், தேசிய சமுதாய நீர்வழங்கல் திணைக்களத்தினதும் மற்றும் நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநலபாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் செயற்திட்டத்தினதும் (WASSIP) காணி கையகபடுத்தல் தொடர்பான வேண்டு கோகளுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுத்தல், காணி உரிமையாளர்கள் மூலம் முன்வைக்க படுகின்ற பிரச்சினைகளை தீர்பதற்கும் காணி கையகபடுத்தல் தொடர்பான வேறு நிறுவனங்கள் மூலம் முன்வைக்க படுகின்ற பிரச்சினைகளை தீர்த்துவைக்கவும் செயற்படுதல்.

2018.01.01 முதல் 2018.12.31 வரை முன்னேற்றம்

இல	பணிகள்	அளவு
01	புதிய கையகப்படுத்தல் முன்மொழிவுகளை வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு சமர்பித்தல் (தே.நீ.வ.வ.சபையின் (சபைச் சட்டத்தின் 92 பிரிவின் கீழான பணிப்புக்கமைய மும்மொழியிலும் வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு)	அரச அச்சகம் - 109
02	புதிய கையகப்படுத்தல் முன்மொழிவுகள் தொடர்பாக கையகப்படுத்தல்வின்ப்பப்படிவம்அனுப்புதல்(காணி கையகப்படுத்தல் சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவுக்கமைய பணிப்புக்கள்)	காணி அமைச்சு - 85
03	திருத்தங்களை வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு சமர்பித்தல் (சபைச் சட்டத்தின் 92 ஆவது பிரிவின் கீழ் திருத்தம் தொடர்பான அறிவுப்புக்கள்)	அரச அச்சகம் - 03
04	எதிர்புக்களை விசாரித்தல் (காணி கையகப்படுத்தல் சடடத்தின் 4 ஆம் பிரிவுக்கமைய பணிப்புகள்)	காணி அமைச்சு - 23
05	துரிதமாக அனுபவ உரிமையை பொறுப்பேற்க கோருதல் (காணி கையகப்படுத்தல் சட்டத்தின் 38(அ) , 38(ஆ) இடைக்கால கட்டலைச்சட்டம்)	காணி அமைச்சு - 43
06	கையகப்படுத்தல் கைவிடப்படுதல் தொடர்பாக கோருதல் (காணி கையகப்படுத்தல் சட்டத்தின் 50ஆம் பிரிவுக்கமைய பணிப்புகள்)	காணி அமைச்சு - 07
07	உரித்தை கோரல் (காணி கையகப்படுத்தல் சட்டத்தின் 39 (அ)(1) ன் கீழ்)	காணி அமைச்சு - 04
08	எதிர்ப்புக்ளை பரிசீலித்தல் / தீர்மானத்தை அறிவித்தல் (காணி கையகப்படுத்தல் சடடத்தின் 4 ஆம் பிரிவுக்கமைய)	தொடர்.பி.செ.காரியகலயம் / காணி அமைச்சு - 13
09	காணி கையகப்படுத்தல் தொடர்பாக வேறு நிறுவனங்கலால் முன்வைக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு நடவடிகை எடுத்தல்	சபை/ச. நிறுவனம் - 47
10	பொதுமக்கள் முறைப்பாடுகளுக்கு நடவடிகை எடுத்தல்	சபை/ச.நபர்- 16
11	முன்னேற்றத்தை மீளாய்வு செய்தல் (காணிப்பிரிவின் முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டம்) 1.தேசிய நீர் வழங்ககல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சவை 2.காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சகம் 3.நிலஅளவயாலாலர் திணைக்களம் 4.மதீப்பீட்டுத் திணைக்களம் 5.அரச அச்சக திணைக்களம் ஆகிய நிறுவனங்கலின் அதிகாரிகளின் பங்குபற்றலுடன்	03
12	காணிப்பிரச்சினைகள் தொடர்பான ஏனய கூட்டங்கள்	சபை மற்றும் சம்மந்தபட்ட நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் 04
13	மமைச்சரவை அங்கீகாரத்திற்கா சமர்பித்தல்	02
14	இலப்பீடு மற்றும் வட்டி வழங்குவதற்கு நிதி வழங்குதல் (அனுமதியை பெற்றுக் கொண்டு கணக்கு பிரிவுக்கு சமர்பிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளுக்கமைய)	ரூபா.162,653,323.79

2.2.10 நிர்வாக பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்

இல	பணிகள்	அளவு / நிகள்ச்சிகள்	
01	புதிய ஆட்சேர்ப்பு • பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்	12	
02	நலன்புரி நிகள்ச்சி திட்டங்கள்	• 2018.03.13 ஆம் திகதி நடத்திய இரத்த தான நிகழ்ச்சி திட்டம் • 2018.04.06 ஆம் திகதி நடத்திய சகன் ரங்வல அவர்களின் மே அவுருது காலே நிகழ்ச்சி திட்டம் • 2018.07.06/07 ஆம் திகதி நடத்திய பிரித் மற்றும் தானம் வழங்கும் நிகழ்வு • 2018.09.09 வருடாந்த சுற்றுலா பயணம் • 2,000 ரூபா பெறுமதியான அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய பொதி ஒன்றை நலன்புரி சங்க உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குதல்	
03	வழங்கபட்ட சலுகை வரி வாகன அனுமதி பத்திரங்கள்	273	
04	2018 ஆம் ஆண்டில் வாய் வழி பதில்களுக்கு எதிர்பார்த்த கேள்வியள்	15	
05	சமர்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை பத்திரம் மற்றும் தீர்வுகள் • அமைச்சரவை பத்திரங்கள் • தீர்வுகள்	63 33	
06	தபால் • வெளியில் செல்லும் கடிதங்கள் (பதிவு/ சதாரன/ கைமுறையாக) • கிடைத்த கடிதங்கள் (பதிவு / சதாரன/ கைமுறையாக)	15,000 12,000 (கிட்தட்ட)	
07	ஊழியர்கள் பயிற்சி	உள்நாட்டு	வேளிநாட்டு
	• பயிற்சி திட்டங்கள்,பட்டறைகள் , மொழி பயிற்சி, உற்பத்தி திரன் விருத்தி நிகழ்ச்சி திட்டங்கள்	24	28
	• பல்வேறு வெளி படிப்புக்கள்	06	-
08	ஊழியர்கள் இடமாற்றம்	அமைச்சுக்கு வெளியே- 01 (ஒன்றிணைந்த சேவை சாரதி)	

2.2.11 விசாரணை நடவடிக்கைகள்

''ஜனாதிபதிக்கு சொல்லுங்கள்'' நிகழ்ச்சி திட்டம்

முறைப்பாடுகள்	கிடைத்த முறைப்பாடுகள்	தீர்வு வழங்ப்பட்ட முறைப்பாடுகள்
கிடைதத் முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்கை	864	342
தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கு அனுப்பப்பட்டவை	760	342
சமுதாய நீர் வழங்கள் திணைக்களத்திட்கு அனுப்பட்டவை	66	13
மொத்தம்	**1,690**	**697**

2.2.12 அமைச்சின் 2018 ஆம் ஆண்டின் மூலதன மற்றும் மீண்டெழும் செலவுகளின் முன்னேற்றம்

கருத்திட்ட விபரங்கள்	நிகர ஒதுக்கீடு 2018	நிகர செலவுகள் 2018.12.31		மிகை/அதிகபடியான	
	ரூ.	ரூ.	%	ரூ.	%
மீண்டெழும் செலவுகள்	**198,610,000.00**	**177,957,134.12**	**89.60**	**20,652,865.88**	**10.40**
01- அமைச்சு அலுவலகம்	27,109,560.00	24,462,131.96	90.23	2,647,428.04	9.77
02- நிர்வாக மற்றும் தாபனச் சேவைகள்	146,842,300.00	136,999,276.76	93.30	9,843,023.24	6.70
11-இராஜாங்க அமைச்சு அலுவலகம்	21,658,140.00	14,640,525.75	67.60	7,017,614.25	32.40
03 –நீர் வழங்கல் துறையில் சமுதாய நீர் வசதிகள்	3,000,000.00	1,855,199.65	61.84	1,144,800.35	38.16
மூலதனச் செலவுகள்	**34,811,740,000.00**	**32,332,641,800.94**	**92.88**	**2,479,098,199.06**	**7.12**
01-அமைச்சு அலுவலகம்	3,661,000.00	3,570,622.99	97.53	90,377.01	2.47
02-நிர்வாகம் மற்றும் தாபனச் சேவைகள்	23,626,547,100.00	23,521,004,558.76	99.55	105,542,541.24	0.45
11-இராஜாங்க அமைச்சு அலுவலகம்	2,381,900.00	1,553,335.00	65.21	828,565.00	34.79
03 வளர்ந்து வரும் சிறு நகரங்களில் நீர்வழங்கல் உத்தேச முறைகள்	9,657,000,000.00	7,554,676,548.02	78.23	2,102,323,451.98	21.77
04- வளர்ந்து வரும் சிறு நகரங்களில் நீர்வழங்கல் உத்தேச முறைகள்	595,000,000.00	420,504,776.71	70.67	174,495,223.29	29.33
05- பாரிய நீர்வழங்கல் , சுகநலப்பாதுகாப்பு உத்தேச முறைகள்	927,150,000.00	831,331,959.46	89.67	95,818,040.54	10.33
மொத்த செலவு	**35,010,350,000.00**	**32,510,598,935.06**	**92.86**	**2,499,751,064.94**	**7.14**

2.2.13 திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள்

அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்கள் மூலம் நடைமுறைப்படுத் தப்படுகின்ற திட்டங்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க தனிப் பிரிவு நிறுவப்பட்டது 2018 ஆம் ஆண்டில் அந்த திட்டங்களுக்கமைய முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டங்களை நடத்துதல், கண்காணிப்பு குழு கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் எழும் பிரச்சினைகளை தீர்த்தல் மற்றும் அத்திட்டங்களை திறமையாகவும் திறம்படவும் நடைமுறைப்படுத்துதல். மேலும் தேசிய வரவு செலவு சுற்று நிறுபத்தின்படி திட்டங்களின் முன்னேற்ற அறிக்கைகள் தேசிய வரவு செலவுத்திணைக்களம் உற்பட அரச நிறுவனங்களுக்கு இப்பிரிவாள் அனுப்பி வைக்கப்படும். அத்துடன் இப்பிரிவு முன்னேற்ற அறிக்கை, முதலீட்டு திட்டம் மற்றும் செயற்திறன் அறிக்கை, செயற்பாட்டு அறிக்கை ஆகிய வற்றை தயாரிக்கின்றது.

2018 ஆம் ஆண்டில் நடத்திய கூட்டங்கள்

இல	கூட்டங்கள்	அளவு
01	முன்னேற்ற மீளாய்வு கூட்டம் நடத்துதல்	19
02	தேசிய கண்காணிப்பு குழு கூட்டங்களை நடத்துதல்	42
மொத்தம்		**61**

2.2.14 தொழில்நுட்ப்ப நடவடிக்கைகள்

தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றம் வடிகாலமைப்பு சபை மூலம் மேற் கொள்ப்படும் நீர் வழங்கல் மற்றும் மலக்கழிவு அகற்றும் திட்டங்கலை திட்டமிட்டு முகாமைத்துவத்துடன் நடைமுறை படுத்த தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றம் வடிகாலமைப்பு சபை மற்றும் பிர நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைதல்.

மேலும், தற்போது செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் திட்டங்களுக்கு வரி சலுகைகளை பெறுவதற்க்கு பரிந்துரைத்து சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு முன்வைத்தல்.

2.2.15 பெறுகைச் செயற்பாடுகள்

இல	பெறுகை குழு	தற்போது செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்	2018 ஆம் ஆண்டு நிறைவு
01	MPC (அமைச்சின் பெருகை குழு)	12	15
02	CPCM (அமைச்சின் பெருகை ஆலோசனை குழு)	08	02
03	SCAPC (அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்ட நிலையான பெருகை குழு (உள்ளுர் மற்றும் பல பங்குதாரர் நிதி)	05	06
04	SCAPC (அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்ட நிலையான பெருகை குழு) (இரு தரப்பு நிதி)	10	08
05	CANC (அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்ட தீர்வு குழு)	13	01
06	SCANC (அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்ட நிலையான தீர்வு குழு)	02	-
07	CPCC (அமைச்சரவையால் நியமிக்கப்பட்ட ஆலோசனை பெருகை குழு)	03	01
	மொத்தம்	**53**	**33**

2.2.16 உள்ளக கணக்காய்வு நடவடிக்கைகள்

இல		கணக்காய்வு
அமைச்சு		
01		2014 -2015 வாகன கட்டுப்பாடு மற்றும் எரிபொருள் பயன்பாடு தொடர்பாக 216 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட் தணிக்கை மூலம் காட்டிய விடயங்கள் தொடர்பாக மீளாள்வு செய்தல்
02		கிராமிய நீர் விநியோகம் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தும் திட்டம்
03		2017 ஆம் ஆண்டு நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சின் வங்கி கணக்கறிக்கை
04		வறட்சி குறைப்பு மற்றும் அவசர நடவடிக்கைகள்- (யுனிசெப்)
05		சுகநலப் பாதுகாப்பு தொடர்பான தெற்காசிய மாநாட்டின் சுகநல பாதுகாப் செயற்திட்ட மீளாய்வு நடவடிக்கைகள்
06		நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் செயற்திட்டம் - WASSIP (GOSL- WB) நுவரெலியா மாவட்ட காரியாலயத்தால் செயற்படும் தோட்ட பெருத்தேட பகுதிகளின் வழங்கப்பட்ட சுகநல வசதிகள் தொடர்பான கணக்காய்வு (Dunsinane & sheen , Edinburgh, Glassaugh & Radella, Hope, Strahdon)
தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை		
01		யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சி பாரிய நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் கணக்காய்வு (ADB)
02		யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சி பாரிய நீர் வழங்கல் திட்டத்தின களஆய்வு(ADB)
03		தியதலாவை சுற்றுலா விடுதி தொடர்பான கணக்காய்வு
04		பதுளை ஹலிஎல்ல மற்றும் எல்ல ஒன்றிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டம் (ஐகிய நாடுகளின் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி வங்கி)
05		நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையின் உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவினால் நடத்திய கணக்காய்வு விசாரணை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான மீளாய்வு
தேசிய சமூக நீர் வழங்கல் திணைக்களம்		
01		தேசிய சமூக நீர் வழங்கல் திணைக்களத்தின் 2017 ஆம் ஆண்டின் வங்கி கணக்கறிக்கைகளை கணக்காய்வு செய்தல்.
		சமுதாய அமைப்புகள் தொடர்பான கணக்காய்வு
	I.	**கொழும்பு மாவட்டத்தில்**- தற்செயலக தெறிவுசெய்து கொள்ளப்பட்ட சமுதாய அமைப்புக்கள் 09 தொடர்பாக நடத்திய கணக்காய்வு (2018-1) கொழும்பு
	II.	**பதுளை மாவட்டத்தில் -** தற்செயலக தெறிவுசெய்து கொள்ளப்பட்ட சமுதாய அமைப்புக்கள் 09 தொடர்பாக நடத்திய கணக்காய்வு (2018 – 1) பதுளை
	III.	**கொழும்பு மாவட்டத்தில் -** சமுதாய அமைப்புக்கள்13 தொடர்பாக 2016 ஆம் ஆண்டில் நடத்திய கணக்காய்வில் சுற்றிகாட்டிய விடயங்கள் தொடர்பாக மீளாய் தொடர்பான கணக்காய்வு
	IV.	**கம்பஹா மாவட்டத்தில் -** சமுதாய அமைப்புக்கள் 07 தொடர்பாக 2016 ஆம் ஆண்டில் நடத்திய கணக்காய்வில் சுற்றிகாட்டிய விடயங்கள் தொடர்பாக மீளாய் தொடர்பான கணக்காய்வு
	V.	**களுத்துறை மாவட்டத்தில் -** சமுதாய அமைப்புக்கள் 07 தொடர்பாக 2016 ஆம் ஆண்டில் நடத்திய கணக்காய்வில் சுற்றிகாட்டிய விடயங்கள் தொடர்பாக மீளாய் தொடர்பான கணக்காய்வு
	VI.	**குருநாகல் மாவட்டத்தில் -** சமுதாய அமைப்புக்கள் 05 தொடர்பாக
	VII.	**பதுளை மாவட்டத்தில் -** சமுதாய அமைப்புக்கள் 04 தொடர்பாக (2018 – 2)
	VIII.	**கொழும்பு மாவட்டத்தில் -** சமுதாய அமைப்புக்கள் 08 இன் (2018- 2)

2.3 தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் நிறைவேற்றிய பணிகள்

2.3.1 2018 ஆண்டில் முடிவடைந்த கருத்திட்டங்கள்

	கருத்திட்ட பெயர்	பயனாளிகள் தொகை (மி.ரூபா)	நிதியளிப்பு	பயனாளிகள் தொகை
01	பாரிய குருநாகல் நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீ அகற்றும் கருத்திட்டம்	13,248.00	China Exim Bank	25,000
02	கதிர்காமம் கழிவுநீர் அகற்றும் கருத்திட்டம்	2,040.00	Uni-Credit Bank Austria AG	110,000
03	பாரிய கொழும்பு கழிவுநீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம்	1,393.00	ADB	60,000
04	பரந்த தம்புள்ளை நீர் வழங்கல் கருத்திட்டம் - 1 ஆம் கட்டம்	9,593.00	India	174,000
மொத்தம்		**26,274.00**		**369,000**

2.3.2 வெளிநாட்டு நிதியில் இயங்கும் பாரிய அளவிலான குடிநீர் வழங்கும் உத்தேச முறைகள் மற்றும் மல கழிவகற்றும் திட்டங்கள்

இல	கருத்திட்ட பெயர்	கருத்திட்டக் காலம்	பயனாளிகள் தொகை	சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவுத் தொகை (மி.ரூபா)	2018.12.31 திகதிக்கு		2018.12.31 ஒட்டுமொத்த பொதிக முன்னேற்றம் %
						எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி முன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	நிதிமுன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	
மேல் மாகாணம்								
01	பாரிய கொழும்பு நீர் மற்றும் கழிவுநீர்முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தும் முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம்		சேவைவையமேம்படுத்துதல்					
	கருத்திட்டம் 1	2013 ஜுனில் இருந்து 2019 ஜுன்		கொழும்பு நகரம்	14,560	1,414.23	2,322.33	55
	கருத்திட்டம் 2	2014 ஜுனில் இருந்து 2019 ஜுன்		கொழும்பு நகரம்	13,923	1,096.69	2,285.98	25.11
	கருத்திட்டம் 3	2018– 2020			450	-	27.54	-

இல	கருத்திட்ட பெயர்	கருத்திட்டக் காலம்	பயனாளிகள் தொகை	சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவுத் தொகை (மி.ரூபா)	2018.12.31 திகதிக்கு		2018.12.31 ஒட்டுமொத்த பொதிக முன்னேற்றம் %
						எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி முன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	நிதிமுன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	
	அம்பத்தலை நீர் வழங்கல் அமைப்பை மேம்படுத்தல் மற்றும் வலுசக்தி பாதுகாப்பு திட்டம்	2014 செப்டெம்பரில் இருந்து 2019 டிசம்பர்	சேவையை மேம்படுத்துதல்	கொழும்பு மாநகர சபை மற்றும் கோலன்னாவ பிரதேசம்	13,000	1,590.11	812.45	10.84
02	கம்பஹா, அத்தனகள்ளை, மினுவன்கொட	2017 பெப்ரவரியில் இருந்து 2020 பெப்ரவரி வரை	300,000 சேவையை மேம்படுத்துதல் 100,000	கம்பஹா,அத்தனகள்ளை,மினுவன் கொடை பிரதேச செயலக பிரிவிவு மற்றும் மீரிகமயின் ஒரு பகுதி மற்றும் மஹர பிரதேச செயலக பிரிவு	33,060	7,833.14	1,783.55	27.59
03	அழுத்கம, மதுகம, அகலவத்த ஒன்றினைந்த நீர் வழங்கள் உத்தேசமுறை	2017 மேயில் இருந்து 2020 மே வரை	2030 அலவில் 573,000	அழுத்கம 269 கிராம சேவையாளார் பிரிவுகளில், பேருவள, பெந்தொட, மத்துகம, தொடங்கொட, அகலவத்த, மதுராவல களுத்துறை, மக்கோன, பாயாகல	32,278	14,307.49	2,798.38	20
04	களனி தெற்க்கு ஆற்றங்கரை நிர் வழங்கல் உத்தேச முரை	2017 ஜனவரியில் இருந்து 2020 ஜனவரி வரை	1,750,000	களனி,கடவத,வத்தளை, பேலியகொட, மஹர,மகரக, பியகம, வெளிசர, கந்தானை, ,ஜாஏல, பமுனுகம, ஏகல மற்றும் கடுநாயக ஆகிய பகுதிகள்	32,700	6,491.53	8,427.61	55.19
05	கட்டானை நீர் வழங்கல் திட்டம்	2018 ஏப்ரலில் இருந்து 2020 ஏப்ரல் வரை	2020 அலவில் 156,753	கட்டானை செயலக பிரிவில் 46 கிராம சேவையாளார் பிரிவுகளில்	11,794.86	2,319.25	1,240.48	26.2

இல	கருத்திட்ட பெயர்	கருத்திட்டக் காலம்	பயனாளிகள் தொகை	சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவுத் தொகை (மி.ரூபா)	2018.12.31 திகதிக்கு		2018.12.31 ஒட்டுமொத்த பொதிக முன்னேற்றம் %
						எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி முன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	நிதிமுன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	
06	ஒருகொடவத்த மற்றும் கடுவலை வரை விசை செலுத்தல் ஊடிணைப்பு பரிமாற்றங்கள் மற்றும் விநியோக குழாய் மறுசீரமைப்பு செய்யும்	2018 செப்டெம்பரில் இருந்து 2020 செப்டெம்பர் வரை	சேவையை மேம்படுத்து தல் + 1,50,000	ஒருகொடவத்த மற்றும் கடுவலை வரை	10,793	4,519.18	2,149.51	7.4
07	களுகங்கை நீர் வழங்கல் திட்டத்தை விரிவாக்குதல் கருத்திட்டம் 1	2017 ஜூலையில் இருந்து 2025 ஒக்டோம்பர் வரை	400,000	கொழும்பு மற்றும் களுத்துறை	55,338	-	-	-
08	கொழும்பு பிரதேச வீட்டுக் கழிவுநீர் இணைப்புக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்புக்கான வாய்ப்புக்களை மக்களுக்கு அதிகரிக்கும் கருத்திட்டம் (GPOBA)	2012 ஜூனில் இருந்து 2018 டிசம்பர் வரை	44,000	மொரட்டுவை, இரத்மலானை, தெஹிவளை, கொலொன்னாவ,ஜ ாயலை	1,876	343.68	315.1	98.20
09	மொரட்டுவ, ஏக்கல பிரதேசங்களுக்க ான கழிவுநீர் அகற்றும் கட்டமைப்பினை நீடித்தல்	2016 ஜூலையில் இருந்து 2021 டிசம்பர் வரை	56,430	மொரட்டுவை, இரத்மலானை, தெஹிவளை, கொலொன்னாவ,ஜ ாயலை ஏக்கலை பிரதேசம்	16,073	47.43	31.36	1.61
வடமேல் மாகாணம்								
10	பொள்கஹவெல, அலவுவ, பொதுஹர ஒன்றினைந்த நீர் வழங்கல் கருத்திட்டம்	2017 மார்ச்சில் இருந்து 2020 மார்ச் வரை	162,725	பொள்கஹவெல, அலவுவ,மல்லவ பிடிய,குருநாகல் ,வீரம்புகெதர.ஆ கிய 05 பிரதேச செயலக பிரிவுகலில் உள்ள கி.சே.பிரிவுகள் 287 இல் 167 பிரிவுகள் இதில் அடங்கும்	20,207.80	3,041.82	2,851.15	39.4

இல	கருத்திட்ட பெயர்	கருத்திட்டக் காலம்	பயனாளிகள் தொகை	சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவுத் தொகை (மி.ரூபா)	2018.12.31 திகதிக்கு		2018.12.31 ஒட்டுமொத்த பொதிக முன்னேற்றம் %
						எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி முன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	நிதிமுன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	
11	தெதுரு ஓய நீர் வழங்கல் கருத்திட்டம்	2016 டிசம்பரில் இருந்து 2020 மார்ச் வரை	2032 அலவில் 90,700	மஹவ,நாகொள் ளகம மற்றும் பொள்பிதிகம பிரதேச செயலாலர் பிரிவுகள்	10,227	2,583.37	3,159.34	48.29
12	ஆனமடுவ ஒன்றினைந்த நீர் வழங்கல் திட்டம்	2017 பெப்ரவரியில் இருந்து 2020 பெப்ரவரி வரை	81,741	ஆனமடுவ	8,625	456.04	454.06	25
மத்திய மாகாணம்								
13	பாரிய மாத்தலை நீர் வழங்கல் கருத்திட்டம்	2017 ஏப்ரலில் இருந்து 2020 ஏப்ரல் வரை	354,416	மாத்தலை, ரத்தொடை, உக்குவெல, பல்லேபொல, யடவத்த, மற்றும் நாவுல பி.செ. பிரிவுகள் உள்ளடங்கும்	31,453	5,612.68	8,219.90	24
14	கண்டி வடக்கு பாத்ததும்பர ஒன்றினைந்த நீர் வழங்கல் கருத்திட்டம்	2014-2021	470,000	பாத்ததும்பர , அக்குரனை, ஹாரிஸ்பத்துவ, தும்பனை, கண்டி சதரகோரலே மற்றும் பூஜாபிடிய ஆகிய பிரதேசங்கள் உள்ளடங்கும்	54,833	40.76	31.70	4
15	கண்டி நகர கழிவுநீர் முகாமைத்துவ திட்டம்	2010 ஜுலையில் இருந்து 2021 நவம்பர் வரை	205,000 (குடியிருப்பா ளர்கள் 55,000 + நாளாந்தம் வருகைதரு பவர்கள் 150,000)	கண்டி நகரம்	22,588	957.42	2,564.3	60.43
வடக்கு மாகாணம்								
16	யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல பாதுகாப்பு கருத்திட்டம்	2011 பெப்ரவரியில் இருந்து 2020 டிசம்பர் வரை	300,000	யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சி	35,116.49	1,382.14	2,103.33	37.34
வடமத்திய மாகாணம்								
17	அனுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் கருத்திட்டத்தின்- I ஆம் கட்டம்	2013 மார்ச்சில் இருந்து 2020 ஏப்ரல் வரை	115,600	மதவாச்சி, ரம்பேவ பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளிலுள்ள அனைத்து கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளும் உள்ளடங்கும்	10,247	839.67	1,686.83	22.67

இல	கருத்திட்ட பெயர்	கருத்திட்டக் காலம்	பயனாளிகள் தொகை	சேவை வழங்கப்படும் பிரதேசங்கள்	மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த செலவுத் தொகை (மி.ரூபா)	2018.12.31 திகதிக்கு		2018.12.31 ஒட்டுமொத்த பொதிக முன்னேற்றம் %
						எதிர்பார்க்கப்படும் நிதி முன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	நிதிமுன்னேற்றம் (வரவுசெலவு மற்றும் வெளி நிதிகள்) (மி.ரூபா)	
18	அனுராதபுரம் வடக்கு நீர் வழங்கல் கருத்திட்டத்தின் II ஆம் கட்டம்	2018 மேயில் இருந்து 2023 ஒக்டோம்பர் வரை	2040 அலவில் 193,313	மதவாச்சி ரம்பேவ, கஹடகஸ்திகிலிய, ஒரவபொத்தான கெபிதிகொள்லெவ, பதவிய பிரதேச செயலகப் பிரிவுகள	27,196	2.78	2.43	2.40
19	தம்புத்தேகம நீர் வினியேக கருத்திட்டம்	2018 ஜுலையில் இருந்து 2021 ஜுன் வரை	2033 அலவில் 91,810	தலாவ, தம்புத்தேகம, மற்றும் கல்லெவ பிரதேச செயலகப் பிரிவுகள்	22,421.42	4,300.84	4,281.65	4.0
தென் மாகாணம்								
20	மாதரை நீர் வழங்கல் கருத்திட்டத்தின்- IV ஆம் கட்டம்	2017 ஒக்டோம்பர் இருந்து 2020 ஒக்டோம்பர் வரை	285,000	பிரதேச செயலகப் பிரிவுகள்12 கிராம சேவையாளர் பிரிவுகள் 372	18,208.07	1,528.65	529.92	12
சப்ரகமுவ மாகாணம்								
21	ஹெம்மாதகம நீர் வழங்கல் கருத்திட்டம்	2018 டிசம்பர் இருந்து 2021 டிசம்பர் வரை	2042 அலவில் 169,204	மவனல்லை, அரநாயக, மற்றும் ரம்புக்கன பிரதேச செயலகப் பிரிவுகள்	15,352	3,015	3,013.25	-
மாகாணங்களுக்கிடையிலான								
22	உலர் வலய நகரப்புர நீர் வழங்கல் மற்றும் சுகநல கருத்திட்டம் -V	2009 ஜுன் இருந்து 2018 டிசம்பர் வரை	453,000	வவுனியா மன்னார் சிலாபம் புத்தளம்	17,196.49	644.73	1,632.18	96.22
23	நகர சுற்றுப்புற சுகாதார மற்றும் சுகநல மேம்பாட்டு கருத்திட்டம்	2016 ஜுன் இருந்து 2022 ஜுன் வரை	200,000	நீர்கொழும்பு, காலி, உணவடுன மற்றும் களனி	17,664.95	524.51	135.10	1.1

2.3.3 **உள்நாட்டு வங்கிக் கடன் நிதியில் அமுல் படுத்தப்பட்டுள்ள குடிநீர் தொவழங்கும் கருத்திட்டங்கள்**

தொடர் இலக்கம்	கருத்திட்டம்	கருத்திட்ட செலவு (மி.ரூபா)	2018.12.31 திகதிக்கு உண்மைச்செலவு (மி.ரூ)	பௌதீக முன்நேற்றம் %
1	அம்பாறை வினியோக குளாய்க் கட்டமைப்பு	6,848	6,815	92.75%
2	றுகுணுபுர வினியோக குளாய்க் கட்டமைப்பு	1,929.61	970	98.99%
3	பென்தொட்ட நீர் வழங்கல் திட்டம்	1,239	897	100%
4	கொழும்பு நகர வினியோக குளாய்க் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் கருத்திட்டம்	2,792	2,771	100%
5	கொழும்பு கிழக்கு நகர மேம்படுத்தல் கருத்திட்டம் பொதி - I	5,170	3,190	96%
6	கொழும்பு கிழக்கு நகர மேம்படுத்தல் கருத்திட்டம் பொதி - II	4,823	1,944	39.92%
7	கொழும்பு கிழக்கு நகர மேம்படுத்தல் கருத்திட்டம் பொதி - III	10,049	6,406	81.01%
8	22 நீர் வழங்கும் கருத்திட்டங்கள்	3,500	2,262	95%
9	கலகெதர, மாவதகம நீர்வழங்கள் திட்டம்	3,126	1,715	90.44%
10	மெதிரிகிரிய நீர்வழங்கல் கருத்திட்டம்	1,500	976	98.03%
11	வில்கமுவ நீர்வழங்கல் கருத்திட்டம்	3,580	1,036	42%
12	லக்கல புதிய நகர நீர்வழங்கல் கருத்திட்டம்	4,496	1,319	54%
13	கொஸ்கம, அவிஸ்சாவெல ஒன்றினைந்த நீர்வழங்கல் கருத்திட்டம்	1,382.5	626	99%
14	காலி நீர் வழங்கல் தொடர்	1,755	362	23.01%
15	அடம்பிடிய நீர்வழங்கல் கருத்திட்டம்	2,244	810	49%
	மொத்தம்	**54,384.11**	**32,099**	**77.28%**

2.4 தேசிய சமுதாய நீர் வழங்கல் திணைக்களத்தினால் 2018 ஆம் ஆண்டில் அமுல்படுத்திய கருதிட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி திட்டங்கள்

அறிமுகம்

நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையால் நீர் வழங்க முடியாத பிரதேசங்களில் வாழும் கிராமப்புர மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்கு திட்மிட்டதில் இருந்து அன் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்ளும் வரையும் அதன் பின் அவற்ரை பராமரித்து செயற்படுத்துவதற்க்கு சமுதாய அமைப்புகளுடன ஒன்றிணைந்து செயற்படுவது திணைக்களத்தின் முக்கிய கடமையாகும்.

பதிவான இந்த சமுதாய அமைப்புகளில் உள்ள மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குவதற்கு திணைக்களம் அர்ப்பனிப்புடன் பணி புரிகின்ரது அதற்கமைய 2018 ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட 200 மி.ரூபா நிதியில் 56.775 மி.ரூபா நிதியை பயன்படுத்தி சமுதாய நீர் விநியோக திட்டங்கலை புனரமைத்தல் மற்றும் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலயங்கலை அமைத்தல், புதிய நீர் வழங்கும் திட்டங்களை நடைமுரைப்படுத்தல்,சமுதாய நீர் விநியோக முறைகளுக்கு மின்சார வசதிகள் மற்றும் நீா மானி வழங்குதல் சுகநல வசதிகள் இல்லாத மக்களுக்கு சுகநல வசதிகளை வழங்கும் பணிகளுக்கு பயன் படுத்தப்பட்டது. மேலும் அனர்த்த நிவாரனம் வழங்களின் கீழ் இயற்கை அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்பட் சமுதாய அமைப்புகளுக்கு உதவுதல் சமுதாய அமைப்புகளின் அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சிகள் வழங்குதல் மற்றும் நீர் மறுவடிகட்டல் கருவிகளின் பராமரிப்புக்கு தேவையான நிதியை பயன் படுத்தல்அவற்றின் செயற்பாட்டு முன்னேற்றம் பின்வறுமாறு.

இல	நிதிஆதாரம் மற்றும் திட்டநிகழ்வுகள்	மதீப்பிட்டு தொகை	செயற்திட்ட எண்ணிக்கை	நிதிமுன்னேற்றம்		கையில் உள்ள பில்கள் (மி.ரூபா)	பௌதிகமுன்னேற்றம் (அளவு)	
				கையில் உள்ள பில்கள் (மி.ரூபா)	%		முடிவடைந்த திட்டநிங்களின் எண்ணிக்கை	தட்போது இயங்கும் திட்டநிங்களின் எண்ணிக்கை
1	நீர் விநியோகத் திட்டங்களை புனரமைத்தல்	120	123	34.31	28.59	65.814	105	18
2	நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை நிர்மாணித்தல்	20	9	2.275	11.38	12.257	9	-
3	புதிதாக நீர் விநியோக முரைகளை செயற்படுத்துதல்	15	3	0.929	6.19		1	2
4	உலக நீர் தினத்தை முன்னிட்டு குருநாகலில் புதிய திட்டங்களை ஆரம்பித்தல்	7	2	6.458	92.26	5.567	2	-
5	உலக நீர் தினத்தை முன்னிட்டு-குருநாகலில் புதிய திட்டங்களை ஆரம்பித்த	6	31	4.621	77.01	0.457	31	
6	நீர் விநியோக முரைகளுக்கு நீர்மானி வழங்குதல்	3	9	0.784	26.13	2.374	8	1
7	சமூக அமைப்புகளுக்கான பயிற்சி	5	14	2.034	40.68		14	-
8	ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி	2						
9	இடர் நிவாரண செயற்பாடுகள்	7	7	0.274	3.91	5.406	7	
10	மறுவடிகட்டல் கருவிகளுக்கான செலவுகள் பராமரிப்பு	5	30			4.284	30	-
11	13 மாவட்டங்களை உள்ளடக்கி மலசல கூடங்களை நிர்மாணித்தல்	10	14	5.09	50.9	4.28	13	1
	மொத்தம்	**200**	**242**	**56.775**	**28.38**	**100.439**	**220**	**22**
