පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

Ministry of Provincial Councils and Local Government

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2017

வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை - 2017

ANNUAL PERFORMANCE REPORT - 2017

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
අංක: 330, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02.

කාර්ය සාධනය 2017

පටුන

විධායක සාරාංශය		3
1.	**පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ සංවිධාන පසුබිම**	4
1.1.	දැක්ම හා මෙහෙවර	4
1.2.	විෂයන් හා කාර්යයන්	5
1.3.	ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග	6
1.4.	අමාත්‍යාංශයට අයත් අංශ හා ආයතන	7
2.	**කාර්ය සාධන සාරාංශ -2017**	8
2.1.	මූල්‍ය කාර්යසාධනය	8
2.2.	භෞතික කාර්යසාධනය	9
2.3	භෞතික කාර්යසාධන සැකෙවින්	10
3.	**අමාත්‍යාංශයේ අංශ හා ආයතන වල කාර්ය සාධනය**	**15**
3.1.	සංවර්ධන අංශය	15
3.1.1.	දේශිය අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති	16
3.2.	ව්‍යාපෘති හා සැලසුම් අංශය	32
3.2.1.	ප්‍රධාන කාර්යයන්	32
3.2.2.	විදේශිය අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති	33
3.3	ජාතික ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ සහායක මධ්‍යස්ථානය	73
3.4.	පළාත් පාලන අංශය	77
3.5.	පළාත් සභා අංශය	84
3.6.	නීති අංශය	89
3.7.	පාලන අංශය	93
3.8.	වියදම් විමංශන අංශය	97
3.9.	අභ්‍යන්තර විගණන අංශය	99
3.10.	පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය	103
3.11.	දේශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදල	110
4.	**අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ**	**116**

විධායක සාරාංශය

මෙම වාර්තාව මඟින් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අනුව 2017 වසර තුළදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද සියලුම දේශීය හා විදේශීය ආධාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන්වල හා සම්පාදනය කරන ලද ප්‍රතිපත්තිස මාර්ගෝපදේශ හා සංශෝධනය කරන ලද අණපනත් ආදීයෙහි වර්ෂාවසාන කාර්යසාධනය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින එක් එක් අංශ යටතේ විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කර ඇත.

මේ අනුව 2017 වසරේදී ක්‍රියාත්මක වූ සියලුම ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන්වල සමස්ථ මූල්‍ය වටිනාකම රුපියල් මිලියන 44,814ක් වන අතර එම ව්‍යාපෘති මඟින් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්ෂේත්‍රයේ සේවා හා යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරමට කටයුතු කර ඇත. එමෙන්ම සම්පාදනය කරන ලද ප්‍රතිපත්ති, මාර්ගෝපදේශ හා කාලීනව සංශෝධනය කරන ලද අණපනත් අතර ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා හා මහා නගර සභා පනත් විශේෂ වේ. එම අණපනත් පළාත් පාලන ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මූලික වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.

රටේ ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික සංවර්ධනයට කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් සපයන පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ඉහළ ආයෝජනයක් සිදු කිරීමටත් කාලීන ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සැකසීමටත් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍යතුමාගේ නායකත්වය සහ අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාගේ මාර්ගෝපදේශ මෙන්ම අතිරේක ලේකම්වරු සහ සෙසු කාර්යමණ්ඩලයේ සැපයුනු දායකත්වය කැපී පෙනේ.

1

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ සංවිධාන පසුබිම

1.1. දැක්ම හා මෙහෙවර

දැක්ම

කාර්යක්ෂම, සහයෝගීත්ව, නව්‍ය මෙන් ම ජනතාවට වගකියන උසස් හා ගුණාත්මක ප්‍රජා සේවාවන් සපයන පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ක්‍රමයක් ඇති කිරීම.

මෙහෙවර

- පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්‍රමය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති හා නීති සම්පාදනය කිරීම
- පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට ඒවායේ බලතල භාවිතයෙන් සේවාවන් සැලසීම සඳහා ඒවායේ ශක්‍යතාව ඉහළ නැංවීම
- පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්‍රමය තුළ පිළිබිඹු වන ජනතා අභිලාෂය තහවුරු කිරීම
- පළාත් සභා, පළාත් පාලන ආයතන හා වෙනත් ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වමින් සියලු ප්‍රජාවන්ගේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා කටයුතු කිරීම

1.2. විෂයයන් හා කාර්යයන්

2015.09.30 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නව අමාත්‍යාංශවල විෂයයන් හා කාර්යයන් පිළිබඳ නිවේදනයට අනුව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ විෂයයන් හා කාර්යයන්

- පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන විෂයයන්ට සහ පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා දේශීය ණය සංවර්ධන අරමුදල යන ආයතනයෙහි අදාළ ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම
- පළාත් සභාවලට අදාළ කටයුතු නියාමනය කිරීම
- පළාත් සභා වල මන්ත්‍රීවරුන්, නිලධාරීන් හා සේවකයන් පුහුණු කිරීම
- පළාත් පාලන ආයතනවලට අදාළ රජයේ කර්තව්‍යයන් සිදුකිරීම
- පොදු පහසුකම් සංවර්ධන සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවලට ණය පහසුකම් ලබා දීම
- පළාත් පාලන ආයතනවල මන්ත්‍රීවරුන්, නිළධාරීන් හා සේවකයන් පුහුණු කිරීම
- පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන පරිපාලනයෙහි සෑම මානයක් සම්බන්ධයෙන් ම පර්යේෂණ පැවැත්වීම
- පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා දේශීය ණය සංවර්ධන අරමුදල යන ආයතනයන්ට පැවරී ඇති අනෙකුත් සියලු ම විෂය කටයුතු
- පූර්වොක්ත ආයතනයන් අධීක්ෂණය කිරීම

1.3. ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ග

ප්‍රතිපත්තිය:

පළාත්වල ස්වයං තිරසරභාවය තහවුරු කරමින් අන්තර් අසමානතා අඩු කිරීම හා දළ දේශිය නිෂ්පාදිතයන්ට පළාත්වලින් සැපයෙන දායකත්වය වර්ධනය කිරීම.

උපාය මාර්ග:

1. යහපාලන මූලධර්ම පිළිපදිමින් එක් එක් පළාතේ පවත්නා මානව ප්‍රාග්ධන හා පාරිසරික සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් සෑම පළාතක ම ආදායම් උත්පාදන හැකියාව වර්ධනය කිරීම.

2. සංක්‍රමණ අනුපාතයට සාපේක්ෂව ඉහළ මට්ටමක පවතින පළාත් වල එම මට්ටම අවම කිරීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය ප්‍රතිපත්තින් හි දීර්ඝකාලීන වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම සහ හඳුන්වා දීම.

3. රටේ සමස්ත සාමාජ-ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයට දායක වීම සඳහා එක් එක් පළාතේ පවත්නා මානව සම්පත උපයෝගී කර ගැනීම තහවුරු කිරීම.

4. බිම් මට්ටමේ ප්‍රජා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ප්‍රජා සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීම මඟින් පළාත් වල පවතින සම්පත් සජීවීකරණය කිරීම සහ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ අගයන් හා ශක්‍යතාවන් බලාත්මක කිරීම.

5. එක් එක් පළාතේ පවතින ස්වාභාවික සම්පත් වල තිරසර භාවිතය සහතික කරන අතරේ, ආපදා අවධානම් අවම කිරීමේ හා ආපදා අවස්ථාවලට මුහුණ දීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සංවර්ධන ඒකාබද්ධ කිරීම.

6. මානව සම්පත් සංවර්ධන සහ විද්‍යාත්මක පදනමක් මත පළාත් පාලන ආයතන උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම මගින් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන පරිපාලන ක්‍රමයක් සහතික කිරීම.

1.4. අමාත්‍යාංශයට අයත් අංශ හා ආයතන

01. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

02. පාලන අංශය

03. අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාර්යාලය

    I. පළාත් පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ඒකකය

    II. පැමිණිලි හා තොරතුරු ඒකකය

04. පළාත් සභා අංශය

05. පළාත් පාලන අංශය

06. සංවර්ධන අංශය

07. ව්‍යාපෘති හා සැලසුම් අංශය

    I. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය

    II. සැලසුම් ඒකකය

    III. තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

08. නීති අංශය

09. මුදල් අංශය

10. වියදම් විමංසන අංශය

11. අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

12. ජාතික ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ සහායක මධ්‍යස්ථානය

    I. ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය

13. මාධ්‍ය ඒකකය

14. පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය

15. දේශීය ණය සංවර්ධන අරමුදල

2

කාර්යසාධන සාරාංශය

2.1. මූල්‍ය කාර්යසාධනය

වගු අංක 1- මූල්‍ය සාරාංශය

වැඩසටහන	2017 සඳහා ඇස්තමේන්තුව (රු.)	2017.12.31 දිනට වියදම (රු.)
පුනරාවර්තන වියදම්		
පුද්ගල පඩිනඩි	133,550,000	125,649,199
වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම්	1,766,363,000	301,323,583
එකතුව	**1,899,913,000**	**426,972,782**
ප්‍රාග්ධන වියදම්		
මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම	**39,400,000**	**35,803,590**
ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්	33,300,000	30,948,003
යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ	800,000	99,498
වාහන	5,300,000	4,756,089
මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම	**46,500,000**	**46,455,428**
වාහන	42,000,000	42,000,000
ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ	2,860,000	2,836,958
යන්ත්‍ර	1,640,000	1,618,470
වෙනත් ප්‍රාග්ධන වියදම්	7,926,920,000	4,727,895,847
දේශීය ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති	6,408,083,000	1,849,588,458
විදේශීය ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති	21,532,180,000	12,248,231,866
එකතුව	**35,867,183,000**	**18,825,716,171**
මුළු එකතුව	**37,852,996,000**	**19,334,947,971**

මූලාශ්‍රය: මූල්‍ය අංශය

2017.12.31 දිනට අමාත්‍යාංශයේ සමස්ථ මූල්‍ය ප්‍රගතිය 51%

2.2. භෞතික කාර්යසාධනය

2017 වර්ෂයේදී අමාත්‍යාංශය විසින් විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති 13ක් සහ දේශීය ආධාර සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති 8 ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. මෙම සියලු ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් වල 2017.12.31 දිනට භෞතික ප්‍රගතිය පහත වගුවේ සඳහන් කර ඇත.

අංකය	විස්තරය	භෞතික ප්‍රගතිය (%)
01	දේශීය ආධාර මත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන්	63
02	විදේශීය ආධාර මත ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති	90
03	අමාත්‍යාංශයේ සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	77

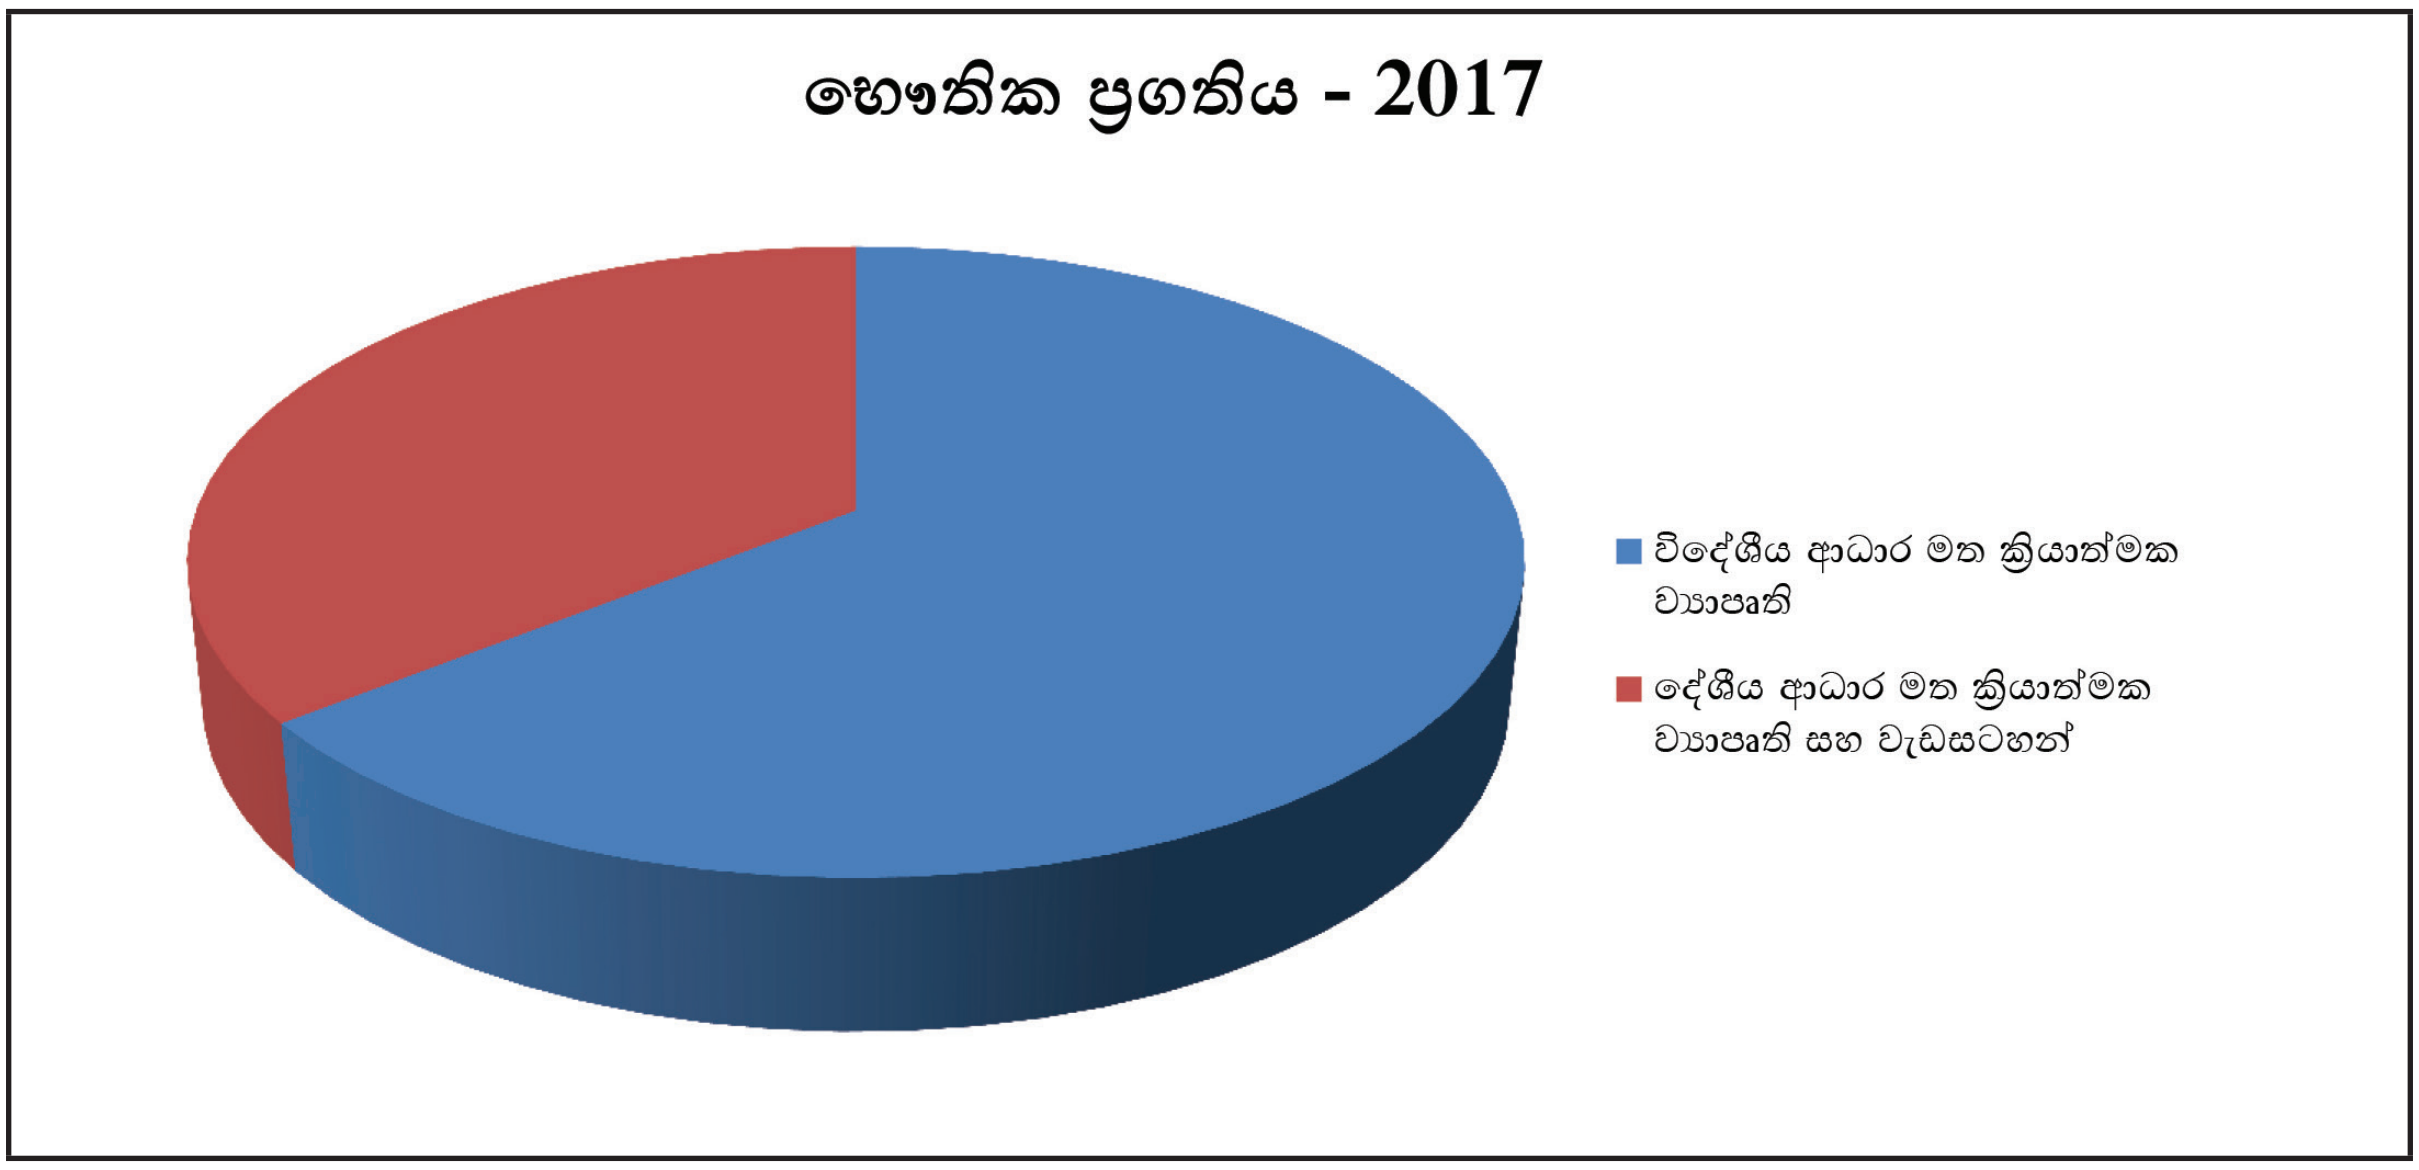

2.3. භෞතික කාර්යසාධනය සැකෙවින්

වගු අංක 2 - භෞතික කාර්ය සාධනය

	සංවර්ධන කාර්යය/ ක්ෂේත්‍රය	කාර්ය නිමැවුම
පළාත් / ග්‍රාමීය මාර්ග සහ පාලම් සංවර්ධනය		
01	සංවර්ධනය කළ පළාත් මාර්ගවල දුර ප්‍රමාණය	කි.මී. 10
02	ඉදිකරන ලද සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ග්‍රාමීය මාර්ග සංඛ්‍යාව (තාර, කොන්ක්‍රීට්,බොරළු)	1608
03	ඉදි කරන ලද ග්‍රාමීය පාලම් සංඛ්‍යාව (මී. 6 සිට මී. 30 දක්වා)	349
වාරිමාර්ග සංවර්ධනය (ඉරණමඩු - කිළිනොච්චි)		
01	වැඩ නිම කරන ලද ප්‍රධාන වාරි ඇළ මාර්ගවල දුර ප්‍රමාණය	කි.මී. 30
02	වැඩ නිම කරන ලද අනෙකුත් වාරි ඇළ මාර්ගවල දුර ප්‍රමාණය	කි.මී. 466
03	වාරි ඇළ මාර්ග හරහා ඉදිකරන ලද පාලම් / බෝක්කු සංඛ්‍යාව	15
04	ඉරණමඩු ජලාශයේ ප්‍රධාන වේල්ල උස් කොට ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කටයුතු	100% වැඩ අවසන්
05	ඉරණමඩු ජලාශයේ වාන් දොරටු සහ පිට වාන පුනරුත්ථාපනය කිරීම	
06	ඉරණමඩු ජලාශයේ දිය රැළි ආරක්ෂිතයන් (Rip Rap Protection) ඉදිකිරීම	
07	ඉරණමඩු උත්සාන වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	
අපජල ප්‍රවාහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය (කොළඹ මහ නගර සහා බලප්‍රදේශය)		
01	මුහුදට අපජලය මුදා හරින ප්‍රධාන නල මාර්ග 04 (U1,U3,T34,T36) ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	100%
02	අපජල නල එලීම අවසන් කරන ලද දුර ප්‍රමාණය (M26)	මී. 1423
03	අපජල නල පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීම සහ අපජල ප්‍රවාහන පද්ධතියේ තත්ත්ව සමීක්ෂණය CCTV මඟින් අවසන් කරන ලද දුර ප්‍රමාණය	කි.මී. 125

පළාත් පාලන ආයතන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය		
01	ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද සතිපොළ සංඛ්‍යාව	96
02	ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව	38
03	ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සංඛ්‍යාව	17
04	ඉදිකරන ලද බස්නැතුම්පොළ / වාහන නැවතුම්පොළ සංඛ්‍යාව	30
05	ඉදිකරන ලද පුස්තකාල සංඛ්‍යාව	53
06	ඉදිකරන ලද ආයුර්වේද හා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව	11
07	ඉදිකරන ලද පහසු මධ්‍යස්ථාන සහ පොදු වැසිකිළි සංඛ්‍යාව	106
08	ඉදිකරන ලද දිවාසුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව	08
09	ඉදිකරන ලද පොදු ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව	07
10	ඉදිකරන ලද ජල ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	88
11	ඉදිකරන ලද අදාහනාගාර සංඛ්‍යාව	17
12	ඉදිකරන ලද උද්‍යාන / ක්‍රීඩාංගන සංඛ්‍යාව	62
13	ඉදිකරන ලද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව	11
14	ඉදිකරන ලද කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව	20
15	ඉදිකරන ලද කාණු පද්ධති සංඛ්‍යාව	53
16	ස්ථාපිත කරන ලද පෙරටු කාර්යාල සංඛ්‍යාව (පළාත් පාලන ආයතන 101ක් තුළ)	101
අධ්‍යාපන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය		
01	ඉදිකරන ලද පාසල් විද්‍යාගාර ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව	135
02	ඉදිකරන ලද / අලුත්වැඩියා කරන ලද කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව	27
03	ඉදිකරන ලද / අලුත්වැඩියා කරන ලද කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව	68
04	විශේෂ අධ්‍යාපන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වූ සිසුන් සංඛ්‍යාව	11484
05	අවිධිමත් අධ්‍යාපන පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වූ සිසුන් සංඛ්‍යාව	12051

06	සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වන ලද පාසල් සංඛ්‍යාව	6837
07	සමාජ ඒකාබද්ධතා වැඩසටහන් පවත්වන ලද පාසල් සංඛ්‍යාව	6382
08	පවත්වන ලද වෙනත් පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව	8785
සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනය		
01	පරිගණකගත දත්ත පද්ධති භාවිතා කරන රෝහල් සංඛ්‍යාව	196
02	රෝහල්වල හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක පිහිටුවීම හා දැනට තිබෙන හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක වැඩිදියුණු කිරීම	191
03	මාතෘ හා ළදරු ප්‍රතිකාර ඒකක වැඩිදියුණු කිරීම	450
04	ජනතාව සඳහා දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම	9996
05	සෞඛ්‍ය ජීවන රටා මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම	127
06	තත්ත්ව කළමනාකරණ ඒකකය පිහිටුවීම	38
07	ඖෂධ ගබඩා අළුත්වැඩියා කිරීම	35
ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම		
01	ඉදිකරන ලද කොම්පෝස්ට් අංගන සංඛ්‍යාව	11
02	වැඩිදියුණු කරන ලද කොම්පෝස්ට් අංගන සංඛ්‍යාව	23
03	පළාත් පාලන ආයතන සඳහා බෙදා දෙන ලද බොබ් කැට් (Bob Cat) යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව	09
04	පළාත් පාලන ආයතන සඳහා බෙදා දෙන ලද ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් බඳුන් සංඛ්‍යාව	4000
05	පළාත් පාලන ආයතන සඳහා බෙදා දෙන ගලිබවුසර් සංඛ්‍යාව	09
06	පළාත් පාලන ආයතන සඳහා බෙදා දෙන ජපන් තාක්ෂණික කොම්පෝස්ට් යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව	09
07	ඉදිකරන ලද මළ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිකර්ම මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව	04

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන නීති පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය		
01	පළාත් පාලනය සඳහා කාන්තා නියෝජනය 25% ක් සහතික කිරීම පිණිස අදාළ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගැනීම	අවසන්
02	පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් (Code of Conduct) සකස් කිරීම	අවසන්
03	නගර සභා, මහ නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා සඳහා අණ පනත් සංශෝධනය සඳහා කමිටුවක් පත්කර එමගින් අදාළ සංශෝධනයන් සඳහා කාලීන යෝජනාවලියක් සහ වාර්තාව සකස් කිරීම	අවසන්
04	පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම	අවසන්
05	පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කිරීම	අවසන්
06	වතු කම්කරුවන්ගේ සුබසාධනය සඳහා ප්‍රාදේශීය සභා පනත සංශෝධනය කිරීමට අදාළ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.	99%ක් අවසන්
07	උසාවි දඩ මුදල් සහ ඉඩම් පැවරීම මත අය වන මුද්දර ගාස්තු පළාත් පාලන ආයතන වෙත ලැබීම විධිමත් කිරීම හා කඩිනම් කිරීම සඳහා පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කිරීම.	80%ක් අවසන්
ජාතික සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු කාර්යයන්		
01	ජාතික සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පදනම් කරගෙන ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රය අනුව, කොට්ඨාශ මායිම්වල නිරවද්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව විසින් යොමු කරන ලද පැමිණිලි / යෝජනා / අභියාචනා විමර්ශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පත්කරන ලද පළාත් පාලන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණ අභියාචනා විමර්ශන කමිටුවේ කාර්යයන් අවසන් කර අවසන් වාර්තාව බාර දී අංක 2006/44 හා 2017.02.17 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරන ලදී.	අවසන්
	ජාතික සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පදනම් කරගෙන ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රයේ (1928/26) සහ පළාත් පාලන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය අභියාචනා විමර්ශන කමිටු වාර්තාව පදනම් කරගෙන ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රයේ (2006/44) පැවති මුද්‍රණ දෝෂ, අක්ෂර වින්‍යාස, විරාම ලකුණු යෙදීම්, කොට්ඨාස මායිම්, නම් හා අංක සම්බන්ධ දෝෂයන් පිළබඳ විවිධ සංවිධාන සහ ප්‍රධාන වශයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගෙන ඒ සඳහා පත් කරනු ලැබූ කමිටුව විසින් ඊට අදාල කමිටු වාර්තාව 2017.11.20 දිනැතිව භාර දෙන ලදී.	අවසන්
	ඊට අදාලව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අත්සනින් යුතුව අංක 2047/51 හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අත්සනින් යුතුව අංක 2047/52 ලෙස අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර 2ක් 2017.12.02 දින නිකුත් කර ඇත.	අවසන්

	පළාත් පාලන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණ අභියාචනා විමර්ශන කමිටුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 2006/44 දරන ගැසට් පත්‍රයේ අංක 02 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අංක 16 මහර ප්‍රාදේශීය සභාවේ අංක 31 දරන කොට්ඨාසයේ කොට්ඨාස නාමය " අක්බාර් ටවුන්" ලෙස පැවති අතර එය " එඬේරමුල්ල" ලෙස සංශෝධනය කර ඊට අදාල කමිටු වාර්තාව 2017.12.23 දිනැතිව භාර දෙන ලදී.(මීට අදාල අංක 2052/34 අංක දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය 2018.01.05 දිනැතිව නිකුත් කර ඇත.)	අවසන්
අමාත්‍යාංශයේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය		
01	විදේශීය ධාරිතා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා යොමු කරන ලද නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව	27
02	දේශීය ධාරිතා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා යොමු කරන ලද නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව	289
පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නියෝජිතයින් / නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම (පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය)		
01	පළාත් පාලනය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ඇතුළුව පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව (තාක්ෂණික නිලධාරීන්, වැඩ පරිපාලකවරුන් ඇතුළු අනෙකුත් තාක්ෂණික නොවන කාර්ය මණ්ඩලය)	222
පළාත් පාලන ආයතන සඳහා සහනදායී කොන්දේසි මත ණය සැපයීම (දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල)		
01	පළාත් පාලන ආයතනවල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 22ක් සඳහා අනුමත කරන ලද සහනදායී ණය මුදල	රු.මිලියන 666
02	පළාත් පාලන ආයතනවල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 13ක් සඳහා නිදහස් කරන ලද සහනදායී ණය මුදල	රු.මිලියන 403

3

අමාත්‍යාංශයේ අංශ හා ආයතනවල කාර්යසාධනය

3.1. සංවර්ධන අංශය

අරමුණ

පළාත් පාලන ආයතනවල මෙන්ම එම බල ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ප්‍රජාවන්ට ප්‍රතිලාභ සැලසෙන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දේශීය අරමුදල් මත අමාත්‍යාංශයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, මාර්ගෝපදේශ සැකසීම හා මෙහෙයවීම ඔස්සේ පළාත් මහජන සේවා සම්පාදනය කාර්යක්ෂම කිරීමත් ඒ මගින් අන්තර් පළාත් විෂමතා අවම කිරීමට දායක වීම.

උපාය මාර්ග

1. රටේ සමස්ථ සමාජ - ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයට දායක වීම සඳහා එක් එක් පළාතේ පවත්නා මානව සම්පත උපයෝගී කර ගැනීම තහවුරු කිරීම.

2. මානව සම්පත් සංවර්ධනය සහ විද්‍යාත්මක පදනමක් මත පළාත් පාලන ආයතන උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම මගින් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන පරිපාලන ක්‍රමයක් සහතික කිරීම.

3. සංක්‍රමණ අනුපාතය සාපේක්ෂව ඉහළ මට්ටමක පවතින පළාත්වල එම මට්ටම අවම කිරීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා දීර්ඝකාලීන වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම සහ හඳුන්වාදීම.

4. එක් එක් පළාතේ පවතින ස්වභාවික සම්පත්වල තිරසර භාවිතය සහතික කරන අතරම, ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ හා ආපදා අවස්ථාවලට මුහුණ දීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වලට ඒකාබද්ධ කිරීම.

5. බිම් මට්ටමේ ප්‍රජා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ප්‍රජා සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීම මගින් පළාත්වල පවතින සම්පත් සජීවීකරණය කිරීම සහ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ අගයන් හා ශක්‍යතාවයන් බලාත්මක කිරීම.

6. යහපාලන මූලධර්ම පිළිපදිමින් එක් එක් පළාතේ පවත්නා මානව ප්‍රාග්ධනය හා පාරිසරික සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් සෑම පළාතකම ආදායම් උත්පාදන හැකියාව වර්ධනය කිරීම.

	මුදල (රු.මි.)	ප්‍රතිශතය
2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කළ මුළු ප්‍රතිපාදන	12,069.00	100%
වියදම(2017.12.31 දිනට)	5,994.13	50%

3.1.1. දේශීය අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

01. ප්‍රාදේශීය සභා ශක්තිමත් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන-2017

අදියර 1

අනු අංකය	පළාත	ආයතන සංඛ්‍යාව	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	අනුමත මුදල (රු)
1	වයඹ පළාත	6	41	12	75,559,799.65
2	උතුරු මැද පළාත	16	46	35	248,889,122.55
3	බස්නාහිර පළාත	4	35	21	53,671,172.51
4	දකුණු පළාත	12	61	40	126,259,878.68
5	මධ්‍යම පළාත	9	37	29	104,001,281.90
6	ඌව පළාත	15	89	57	120,203,395.41
7	නැගෙනහිර පළාත	17	71	51	238,378,227.42
8	සබරගමුව පළාත	12	70	51	116,472,611.89
9	උතුරු පළාත	7	26	15	135,546,026.99
	එකතුව	**98**	**476**	**311**	**1,218,981,517.00**

"මෙම අදියර යටතේ තෝරාගත් එක් ප්‍රාදේශීය සභාවක් සඳහා රු මිලියන 20 ක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයනු ලැබේ"

අදියර 2
"මෙම අදියර යටතේ තෝරාගත් එක් ප්‍රාදේශීය සභාවක් සඳහා රු මිලියන 10 ක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයනු ලැබේ"

අරමුණ
නාගරීකරණය සමග වෙනස් වන මහජන අවශ්‍යතා සපුරාලීමටත්, පළාත් පාලන ආයතනවල ස්වයං උත්පාදන ආදායම් මට්ටම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් මෙන්ම එම ආයතනවලින් සැපයෙන මහජන සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය හා ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමටත් හැකි වන පරිදි අදාළ බල ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් විධිමත් ලෙස නඩත්තු/ අළුත්වැඩියා කිරීම.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්	ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් නඩත්තු කිරීම, අළුත්වැඩියාව , පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම.
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	අදියර 1-රු.මිලියන 10ට අඩු වාර්ෂික ස්වයං උත්පාදන ආදායමක් සහිත ප්‍රාදේශීය සභා 53.

2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන	අදියර 2- රු.මිලියන 10 සිට 20 දක්වා(රු.මිලියන 20ට අඩු) වාර්ෂික ස්වයං උත්පාදන ආදායමක් සහිත ප්‍රාදේශීය සභා 72.
අනුමත ව්‍යාපෘති වටිනාකම(රු.)	රු.මිලියන.1446.00
වියදම(2017.12.31 දිනට)	රු.මිලියන.1218.98
	රු.මිලියන.113.61

මෙම වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන් පහත පරිදි වේ.

- ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති වැඩිදියුණු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම
- වෙළඳපොළ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම
- සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම
- පොදු සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම
- පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශවල හඳුනා ගැනෙන අනෙකුත් නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා කටයුතු

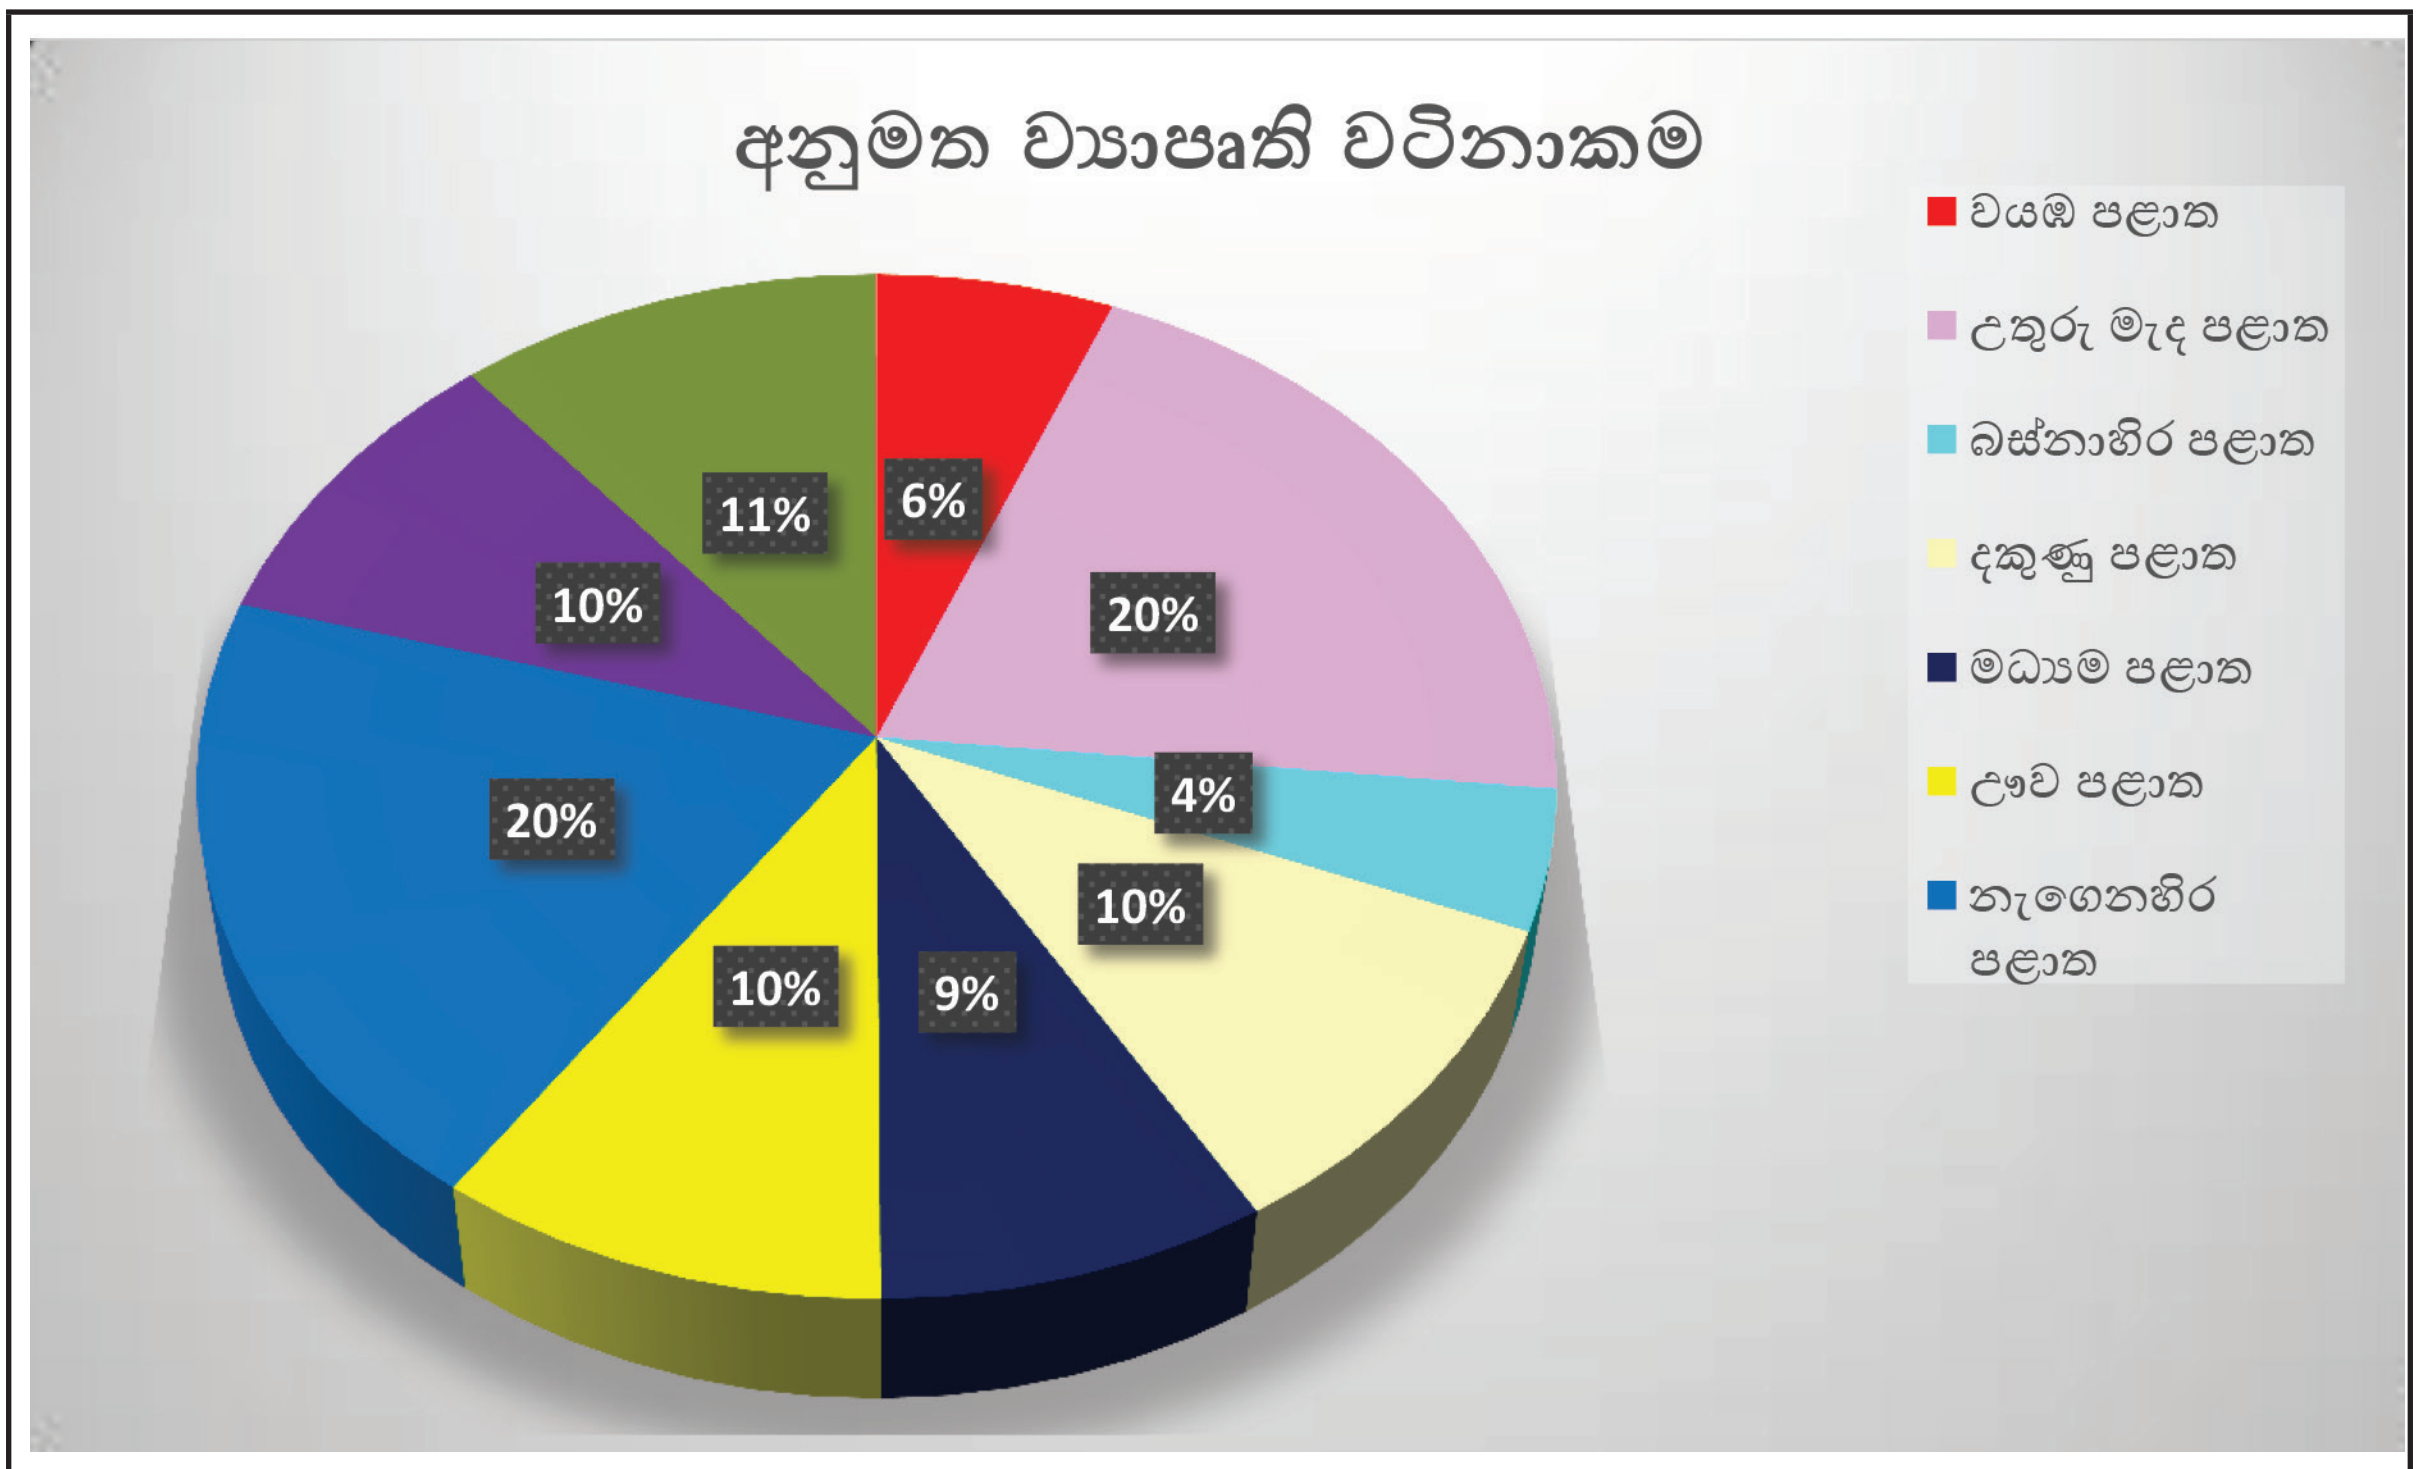

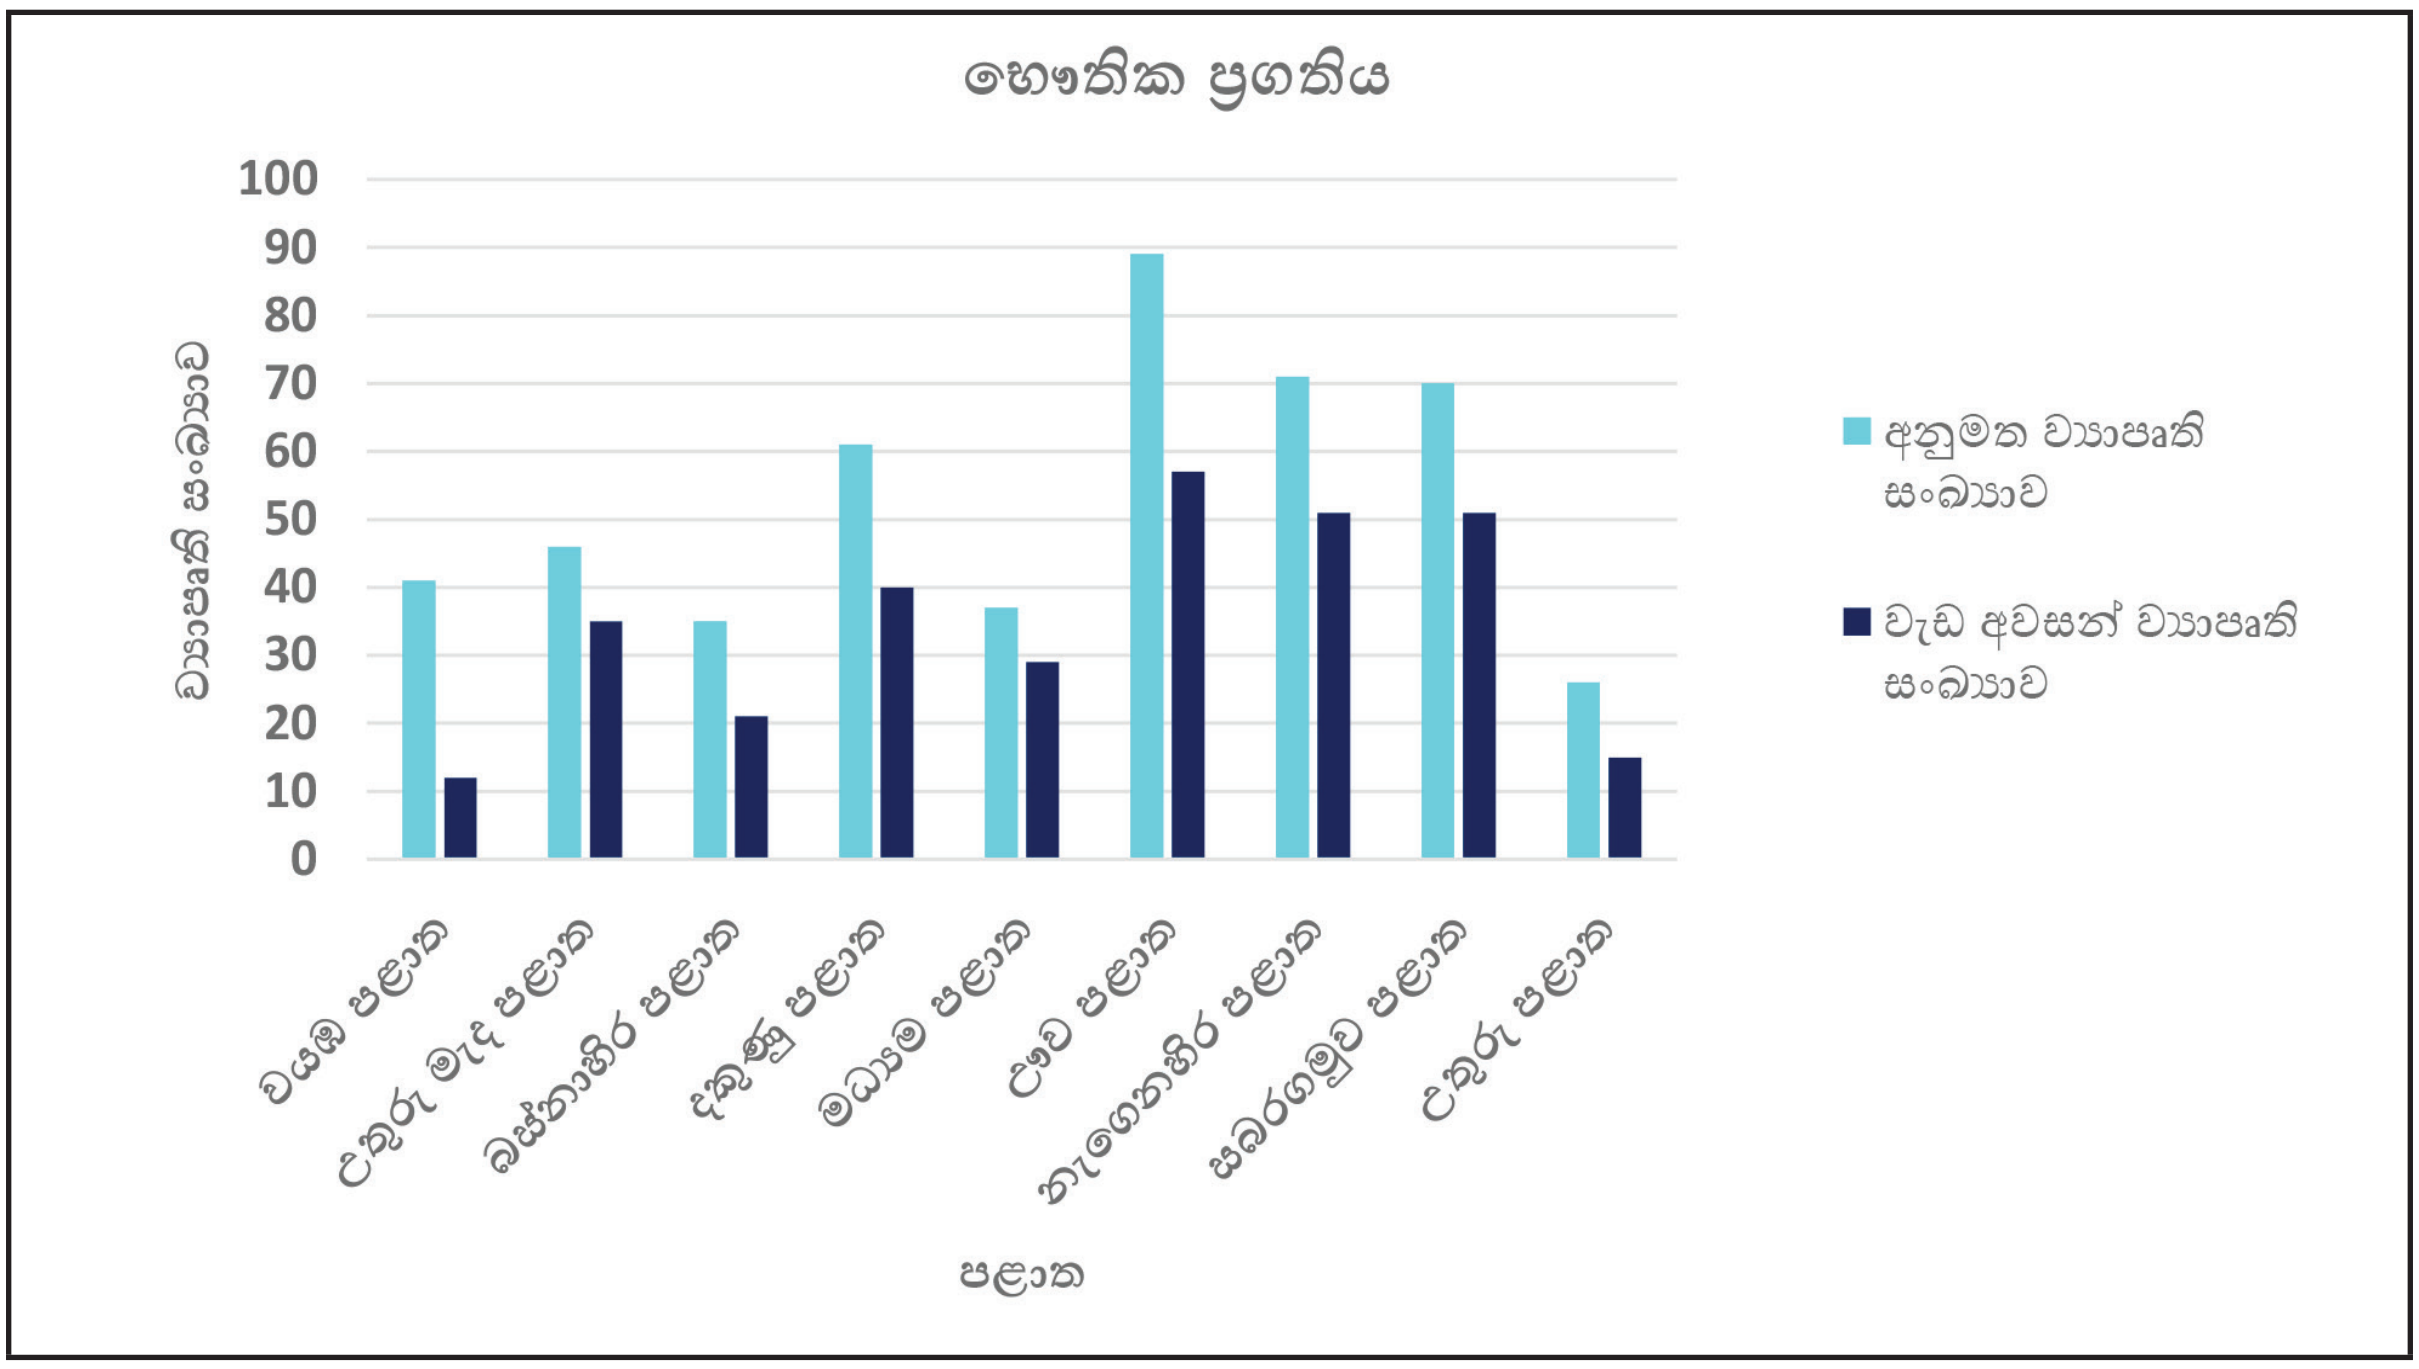

පදවිය ප්‍රාදේශීය සභා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම

2. පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රාග්ධන වැඩසටහන-2017

අරමුණ

නාගරීකරණය සමග වෙනස් වන මහජන අවශ්‍යතා සපුරා ලීමටත්, පළාත් පාලන ආයතනවල ස්වයං උත්පාදන ආදායම් මට්ටම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් මෙන්ම ආයතනවලින් සැපයෙන මහජන සේවාවන්හි ගුණාත්මක භාවය හා ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමටත් හැකි වන පරිදි එම ආයතන බල ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් අළුතින් ඉදිකිරීම හා පවතින පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශය	සියලුම පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ (මහ නගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා
2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන	රු.මිලියන 1350.00
අනුමත ව්‍යාපෘති වටිනාකම	රු.මිලියන 937.12
වියදම	රු.මිලියන 734.86

මෙම වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන් පහත දැක්වේ.

- ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
- වෙළඳපොළ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම
- සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම

පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් නගා සිටුවීමේ ප්‍රාග්ධන වැඩසටහන - 2017

අනුමත ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දිනට)

අනු අංකය	පළාත	පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව	අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	අනුමත ව්‍යාපෘති වටිනාකම (රු.)
1	වයඹ පළාත	7	16	13	57,586,330.31
2	උතුරු මැද පළාත	6	41	5	111,624,018.93
3	බස්නාහිර පළාත	21	280	141	391,706,910.92
4	දකුණු පළාත	10	55	4	69,180,478.85
5	මධ්‍යම පළාත	10	116	85	63,828,850.01
6	ඌව පළාත	5	33	1	25,678,626.73
7	නැගෙනහිර පළාත	9	25	14	104,189,410.87
8	සබරගමුව පළාත	12	106	70	68,671,811.68
9	උතුරු පළාත	10	22	16	44,659,187.50

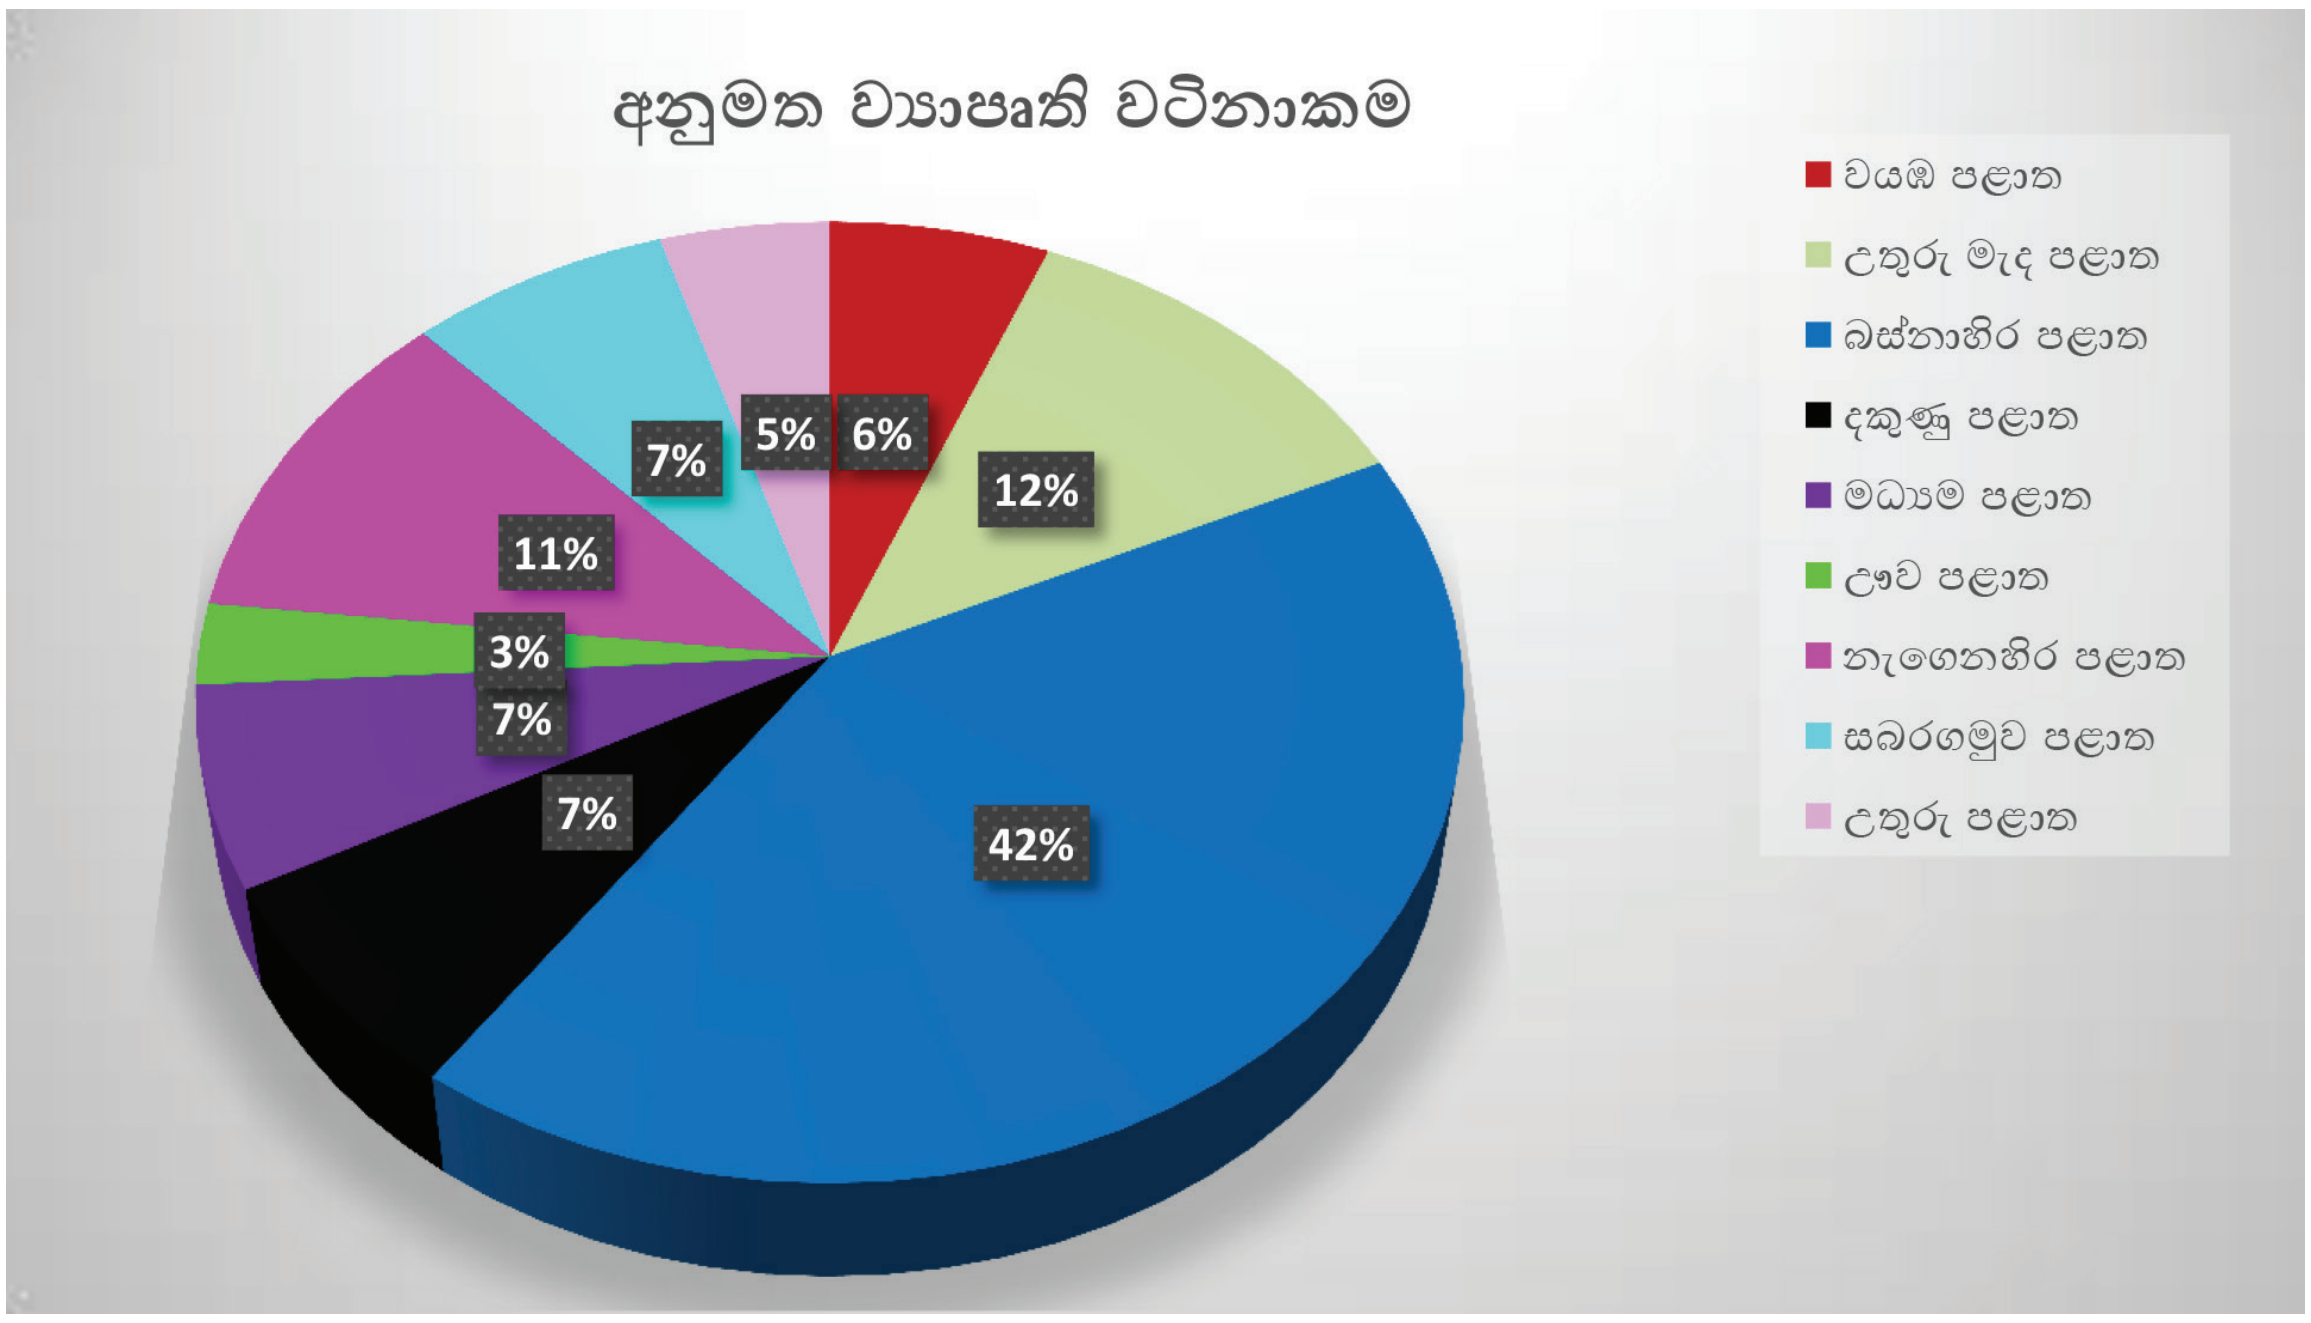
අනුමත ව්‍යාපෘති වට්නාකම
වයඹ පළාත
උතුරු මැද පළාත
බස්නාහිර පළාත
දකුණු පළාත
මධ්‍යම පළාත
ඌව පළාත
නැගෙනහිර පළාත
සබරගමුව පළාත
උතුරු පළාත
6%
12%
42%
7%
7%
3%
11%
7%
5%

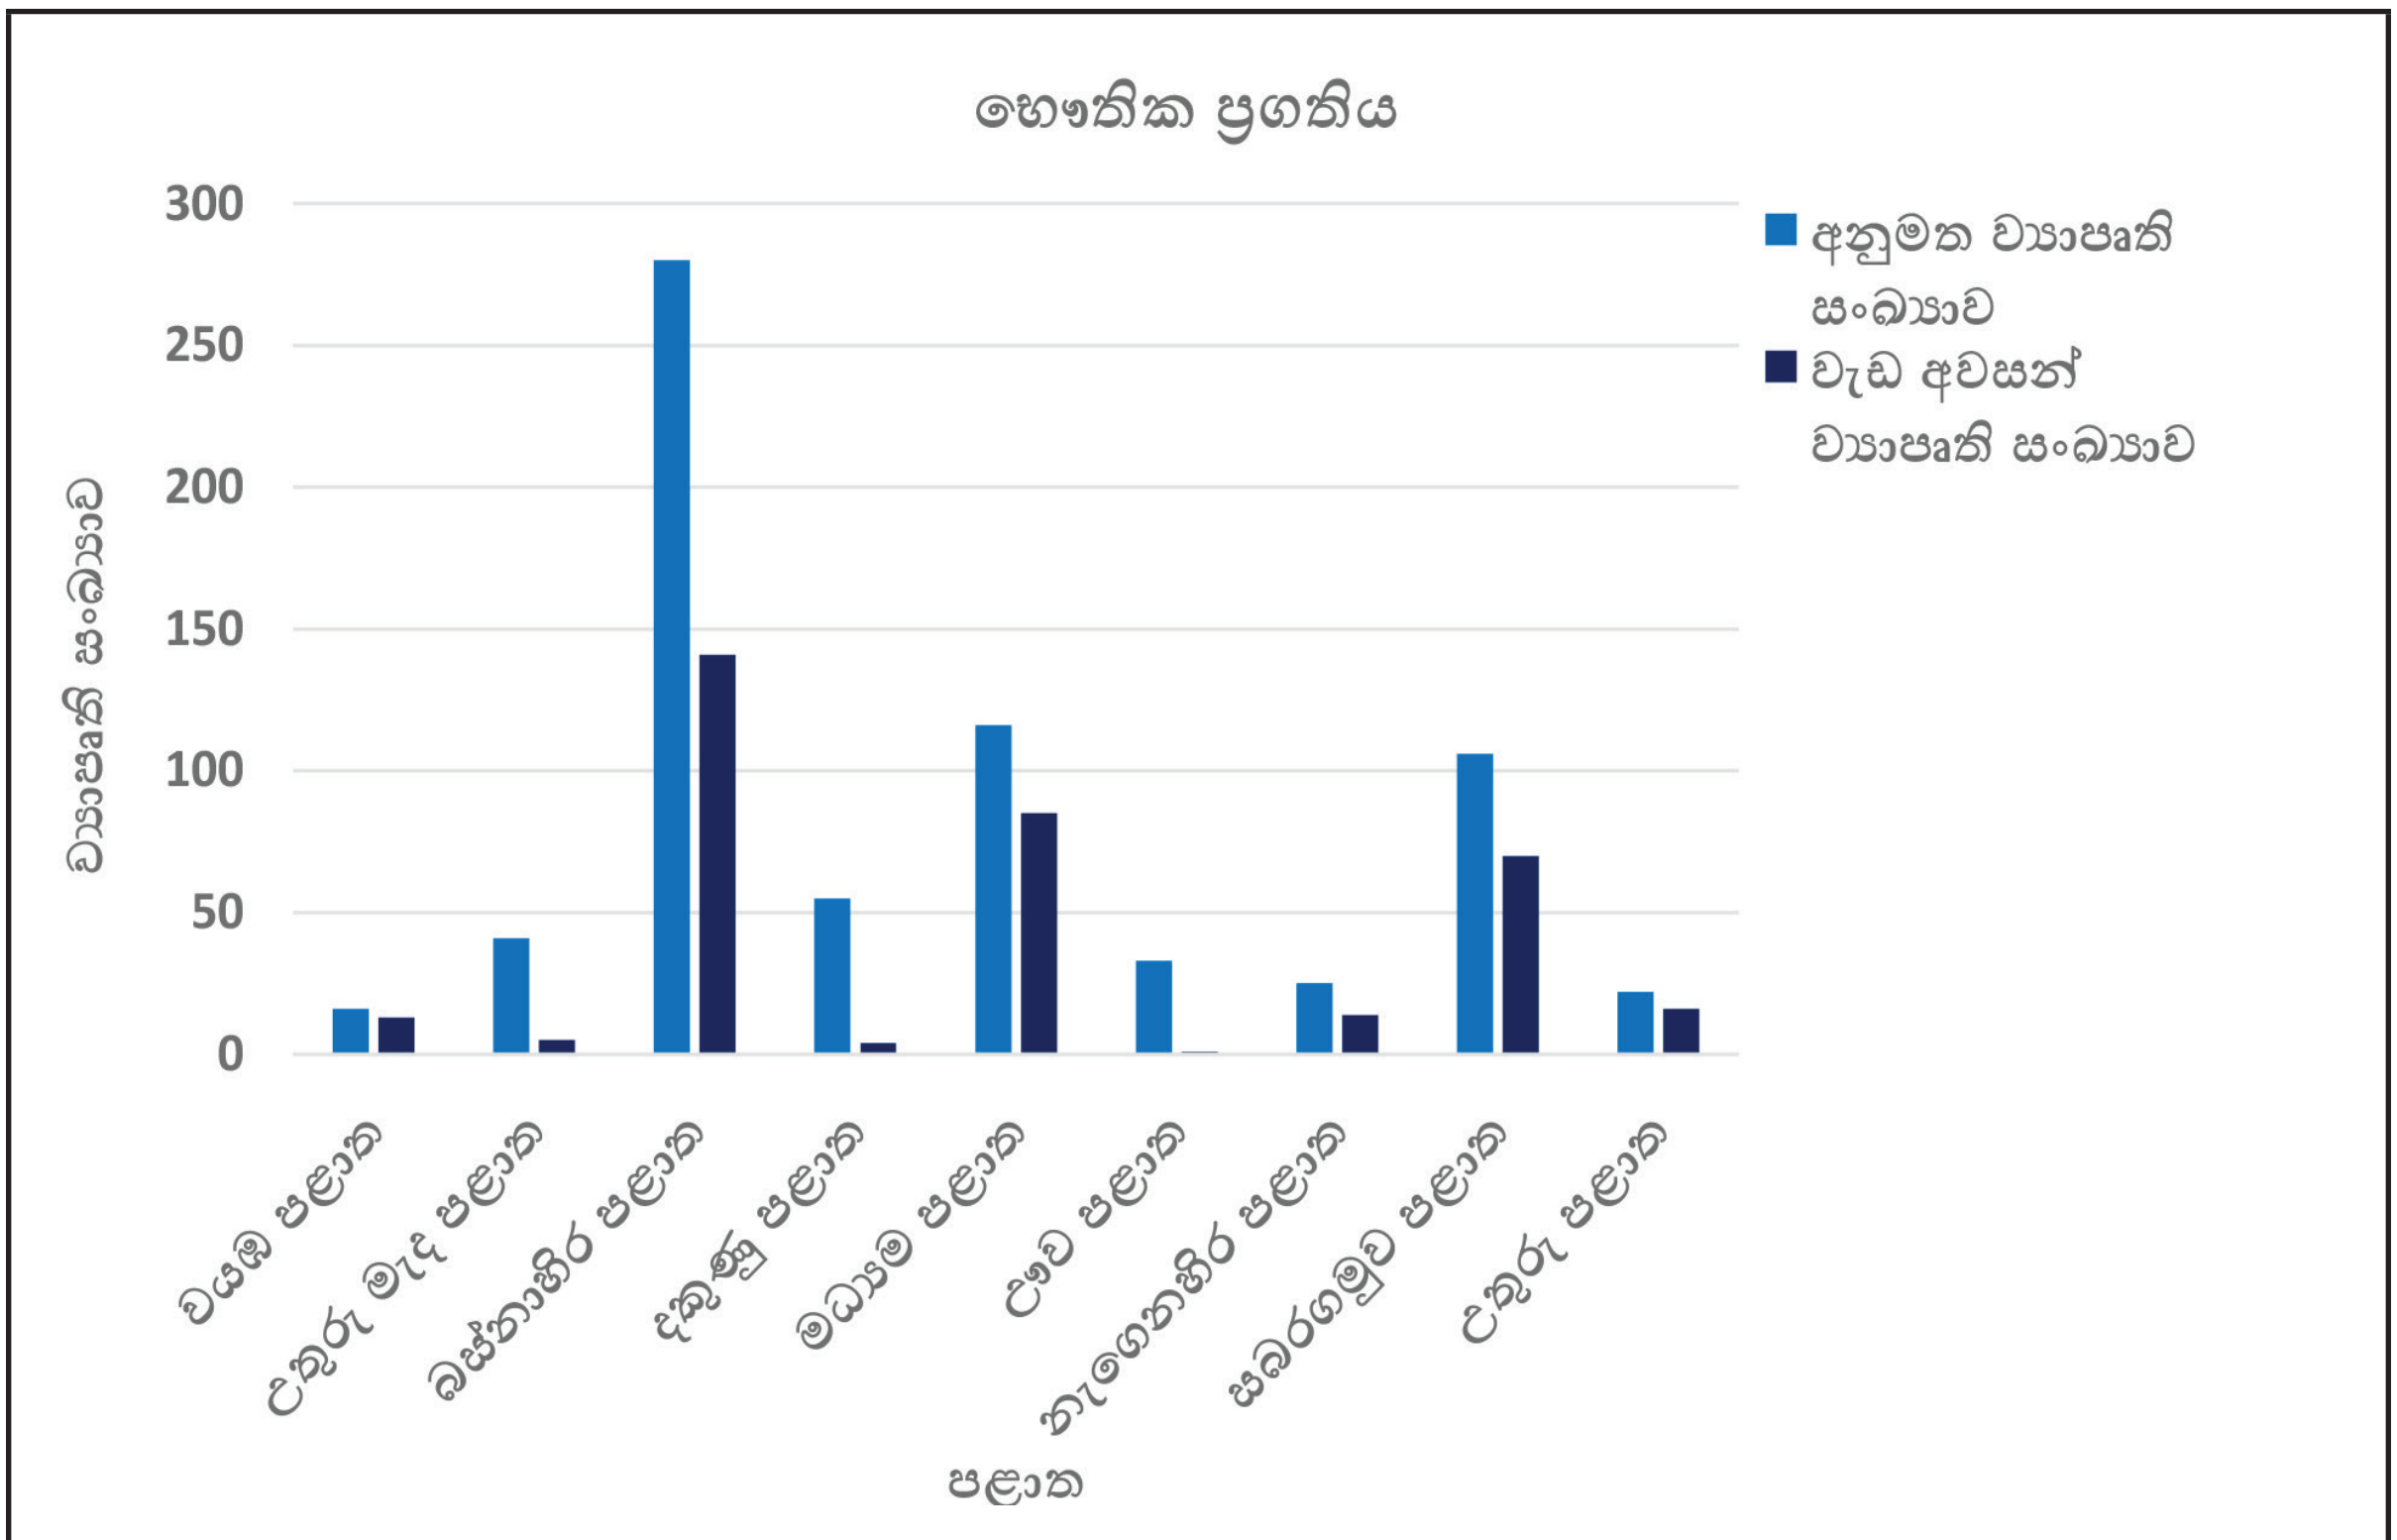
භෞතික ප්‍රගතිය
300
250
200
150
100
50
0
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
වයඹ පළාත
උතුරු මැද පළාත
බස්නාහිර පළාත
දකුණු පළාත
මධ්‍යම පළාත
ඌව පළාත
නැගෙනහිර පළාත
සබරගමුව පළාත
උතුරු පළාත
පළාත

3. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මාර්ග කි.මි 1000 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2017

අරමුණ

මහජනතාවගේ ප්‍රවාහන හා ගමනාගමන අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂම ලෙස සපුරා ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මාර්ග යටිතල පහසුකම් සම්පාදනය මඟින් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නංවාලීම සහ ඒ තුළින් රටේ සමස්ථ ආර්ථික වර්ධනයට සෘජු ලෙස දායක වීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රමුඛ අරමුණ වේ.

රට තුළ ඇතිවන විධිමත් ආර්ථික වර්ධනයත් සමඟ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය තුළද ප්‍රබෝධයක් ඇතිවීම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල කෘෂි කර්මාන්තයේ හා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන්හි වර්ධනය කෙරෙහි ඉවහල් වේ.ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ නිෂ්පාදන වෙළඳ පොළ කරා ගෙන ඒම සඳහා දියුණු ග්‍රාමීය මාර්ග පද්ධතියක් පැවතීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.මේ අනුව ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම මෙම වැඩසටහන මඟින් සිදු කෙරේ.මෙමගින් මහජනතාවගේ ගමනාගමන අවශ්‍යතාද කාර්යක්ෂමව සපුරාලීමට හැකියාව ලැබේ.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්	ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	සියලුම පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ (මහ නගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රදේශීය සභා)
2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන	රු.මිලියන 2025
අනුමත මුදල(රු.)	රු.මිලියන 2088.00
වියදම (2017.12.31 දිනට)	රු.මිලියන 307.88

මේ යටතේ මාර්ග සංවර්ධනය කළ හැකි ආකාරඃ

- කොන්ක්‍රීට් කිරීම
- අන්තර් සම්බන්ධිත කුට්ටිගල් ඇතිරීම
- ගල් අතුරා තාර දැමීම, කාපට් කිරීම

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල මාර්ග කි.මී. 1000 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2017

අනුමත ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දිනට)

අනු අංකය	පළාත	පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව	අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	අනුමත ව්‍යාපෘති වටිනාකම (රු.)
1	වයඹ පළාත	24	110	110	248,897,904.35
2	උතුරු මැද පළාත	25	66	51	146,200,490.66
3	බස්නාහිර පළාත	32	497	415	551,696,881.25
4	දකුණු පළාත	33	188	170	304,956,911.57
5	මධ්‍යම පළාත	24	118	64	139,675,227.18
6	ඌව පළාත	12	121	112	116,551,090.65
7	නැගෙනහිර පළාත	29	110	96	282,449,310.88
8	සබරගමුව පළාත	9	20	19	94,207,446.45
9	උතුරු පළාත	34	34	34	204,243,385.29
	එකතුව	**222**	**1264**	**1071**	**2,088,878,648.28**

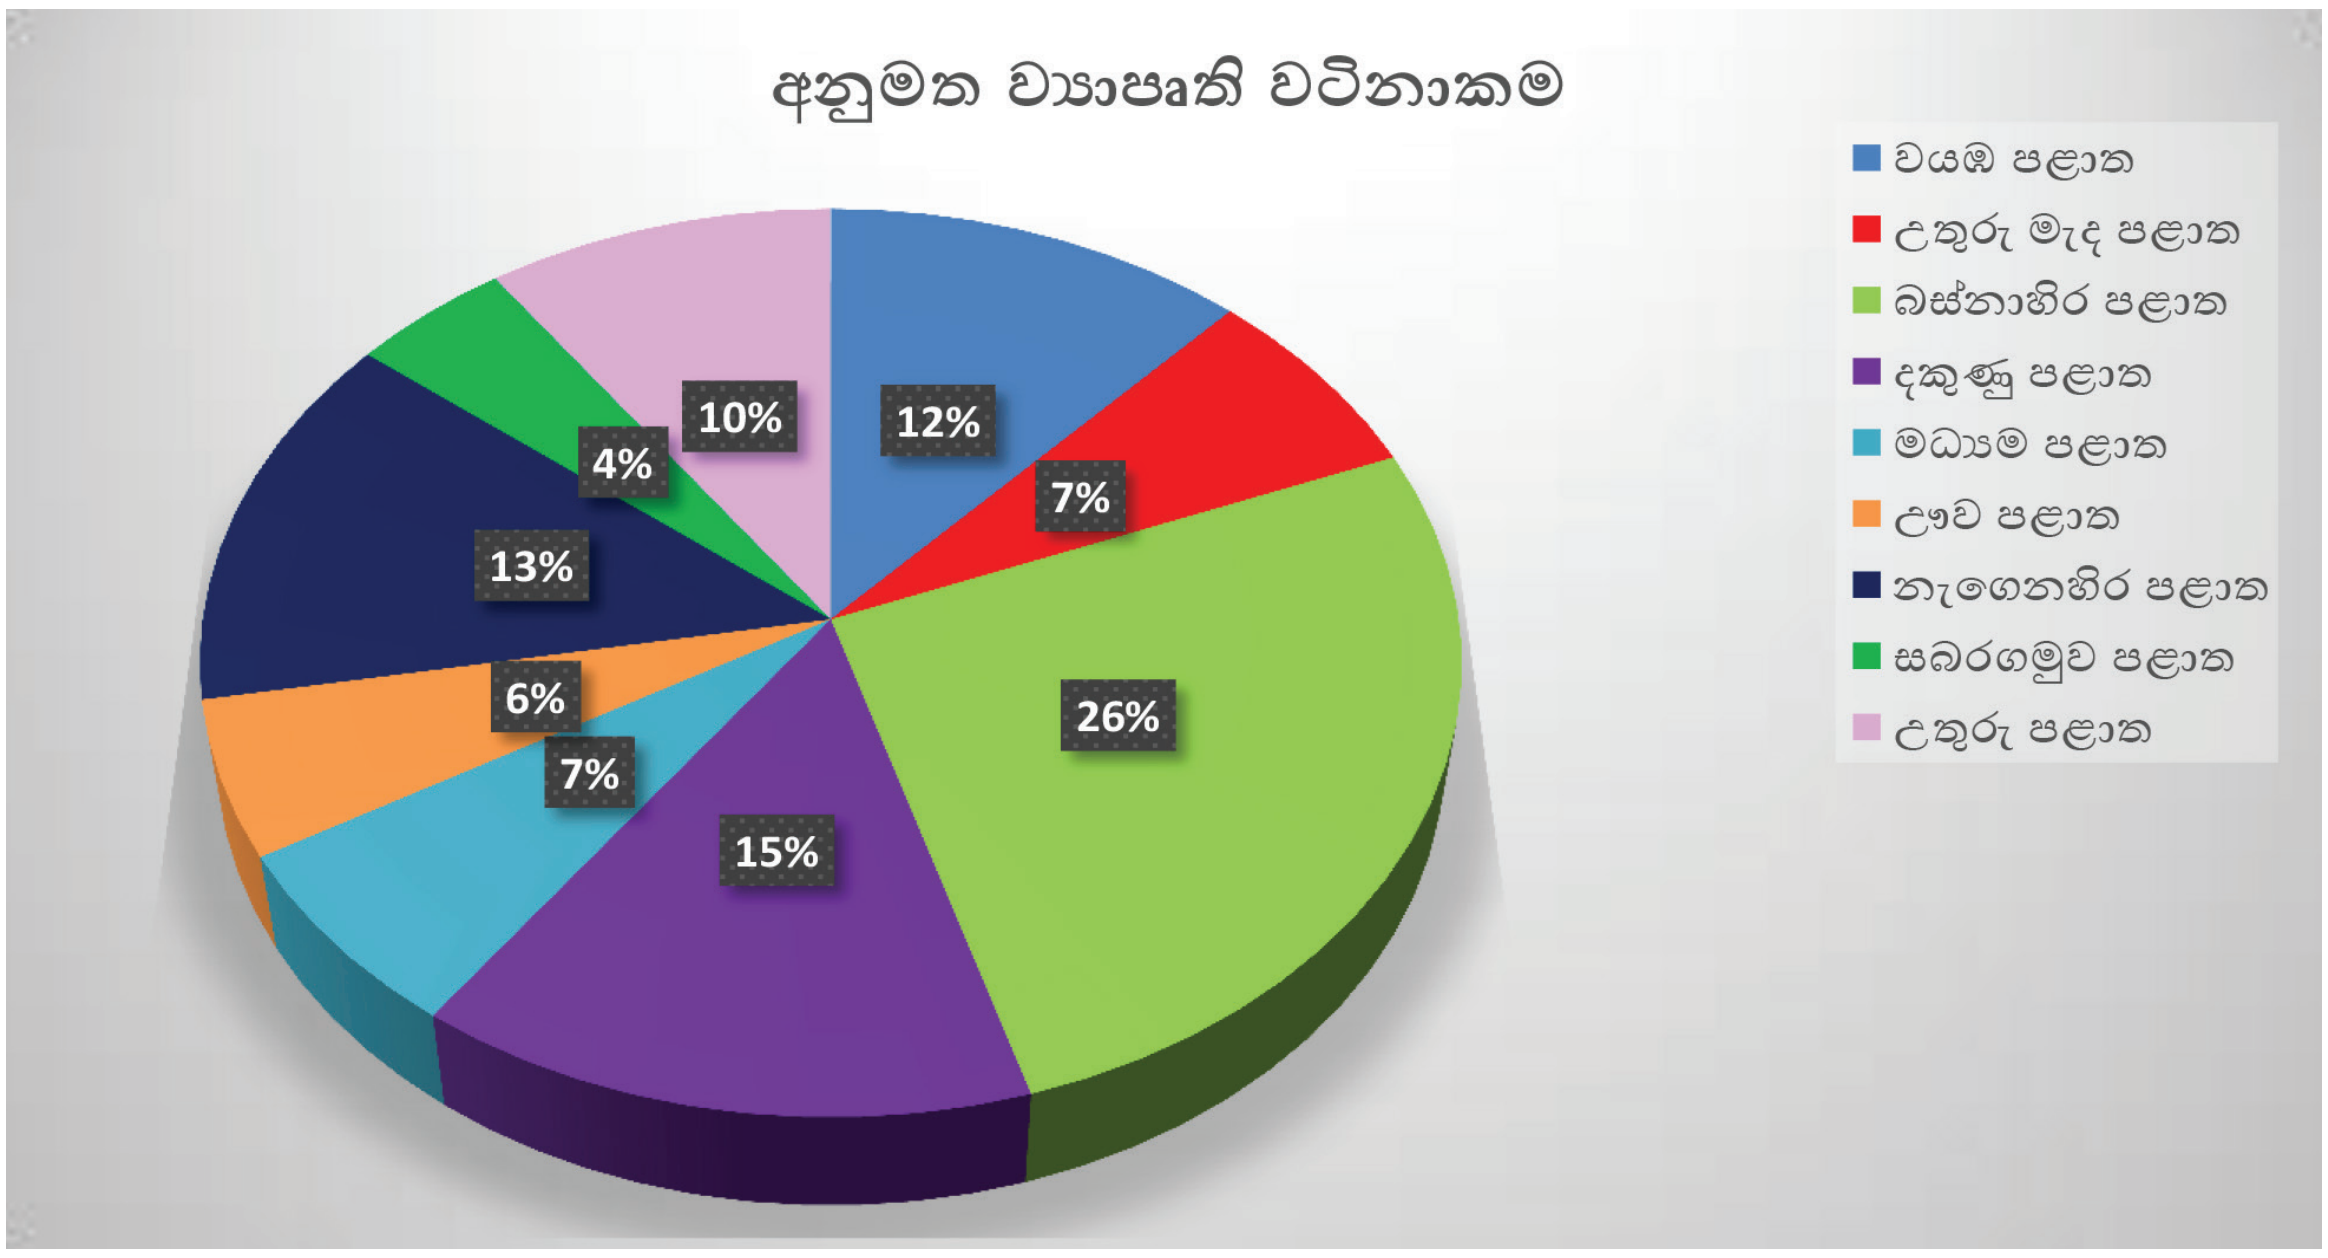
අනුමත ව්‍යාපෘති වටිනාකම
වයඹ පළාත
උතුරු මැද පළාත
බස්නාහිර පළාත
දකුණු පළාත
මධ්‍යම පළාත
ඌව පළාත
නැගෙනහිර පළාත
සබරගමුව පළාත
උතුරු පළාත
12%
7%
26%
15%
7%
6%
13%
4%
10%

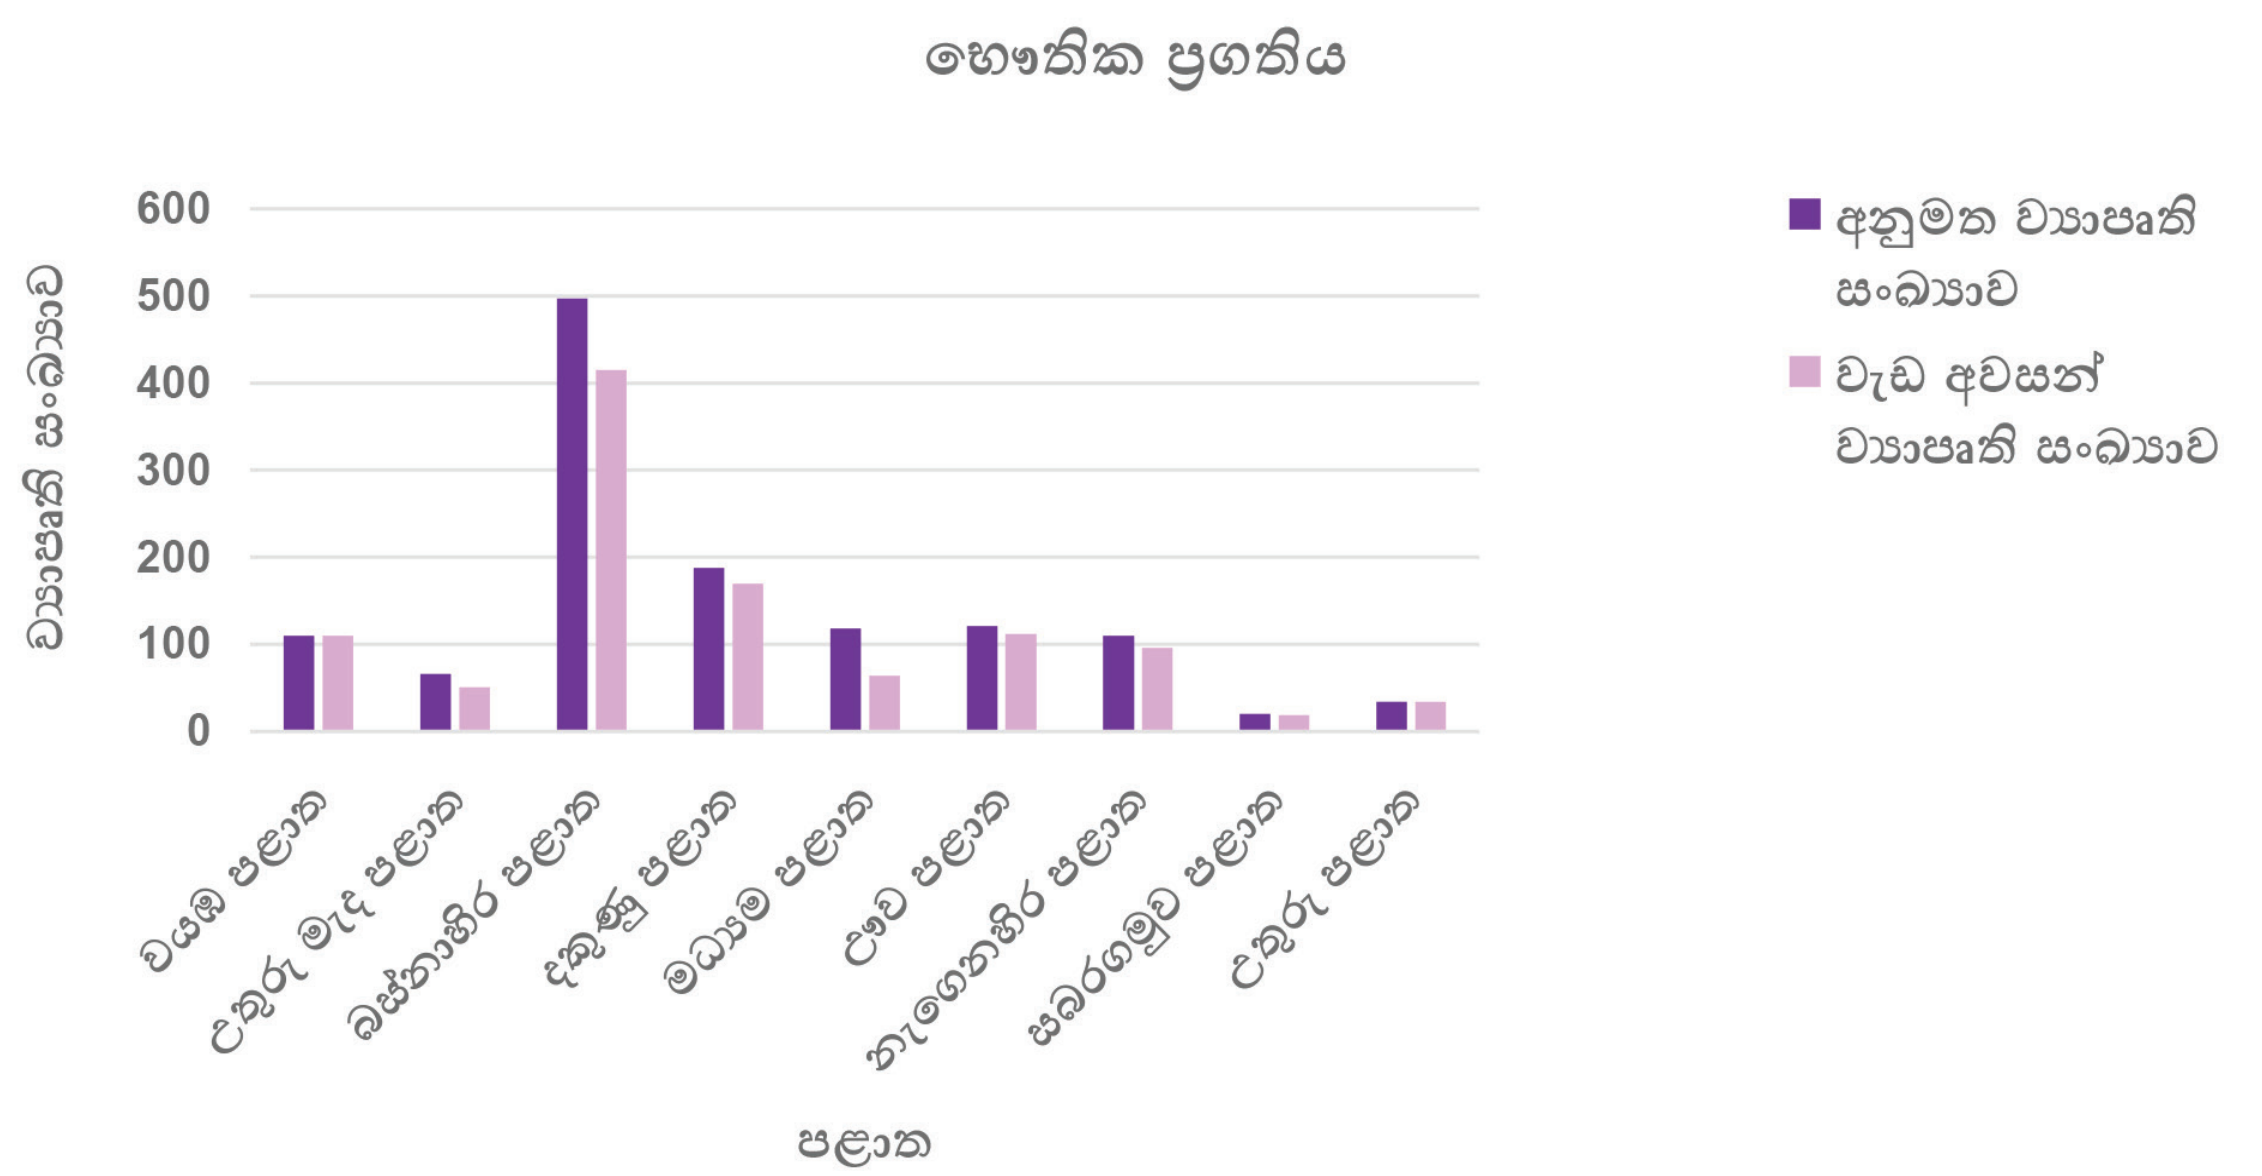
භෞතික ප්‍රගතිය
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
600
500
400
300
200
100
0
වයඹ පළාත
උතුරු මැද පළාත
බස්නාහිර පළාත
දකුණු පළාත
මධ්‍යම පළාත
ඌව පළාත
නැගෙනහිර පළාත
සබරගමුව පළාත
උතුරු පළාත
පළාත
අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව

4. පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන සංවර්ධන සහාය වැඩසටහන - 2017

අරමුණ

අඩු ආදායම්ලාභී පළාත් පාලන ආයතනවල ස්වයං උත්පාදන ආදායම් මට්ටම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා ඊට අදාළ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය සහය ලබා දීම මෙහි මූලික අරමුණ වේ.

ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශය	තෝරාගත් අඩු ආදායම්ලාභී පළාත් පාලන ආයතන 13
2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන	රු.මිලියන 90.00
අනුමත මුදල	රු.මිලියන 101.29
වියදම (2017.12.31) දිනට	රු.මිලියන 7.26

මෙම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ව්‍යාපෘති ක්ෂේත්‍ර පහත දැක්වේ.

- ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
- වෙළඳපොළ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
- සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම

පළාත් පාලන ආයතනවල ස්වයං උත්පාදන ආදායම් මට්ටම වර්ධනය කරගත හැකි වන පරිදි එම ආයතන බල ප්‍රදේශවල පානීය ජල සම්පාදනය,වෙළඳපොළ පහසුකම් සහ දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් සහ වන්දනාකරුවන් සඳහා අවශ්‍ය පොදු යටිතල පහසුකම් අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි සංවර්ධනය කිරීම මේ යටතේ සිදුවේ.

පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන සංවර්ධන සහාය වැඩසටහන-2017

අනුමත ව්‍යාපෘති (2017.12.31 දිනට)

අනු අංකය	පළාත	ආයතන සංඛ්‍යාව	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	අනුමත මුදල (රු)
1	උතුරු පළාත	2	2	2	17,825,560.00
2	වයඹ පළාත	3	3	3	25,331,132.89
3	උතුරු මැද පළාත	1	1	1	10,800,000.00
4	බස්නාහිර පළාත	‑	‑	‑	‑
5	දකුණු පළාත	1	1	1	1,685,000.00
6	මධ්‍යම පළාත	2	2	2	11,650,917.00

7	ඌව පළාත	2	2	2	21,921,322.25
8	නැගෙනහිර පළාත	1	1	1	7,083,043.91
9	සබරගමුව පළාත	1	1	1	5,000,000.00
	එකතුව	13	13	13	**101,296,976.05**

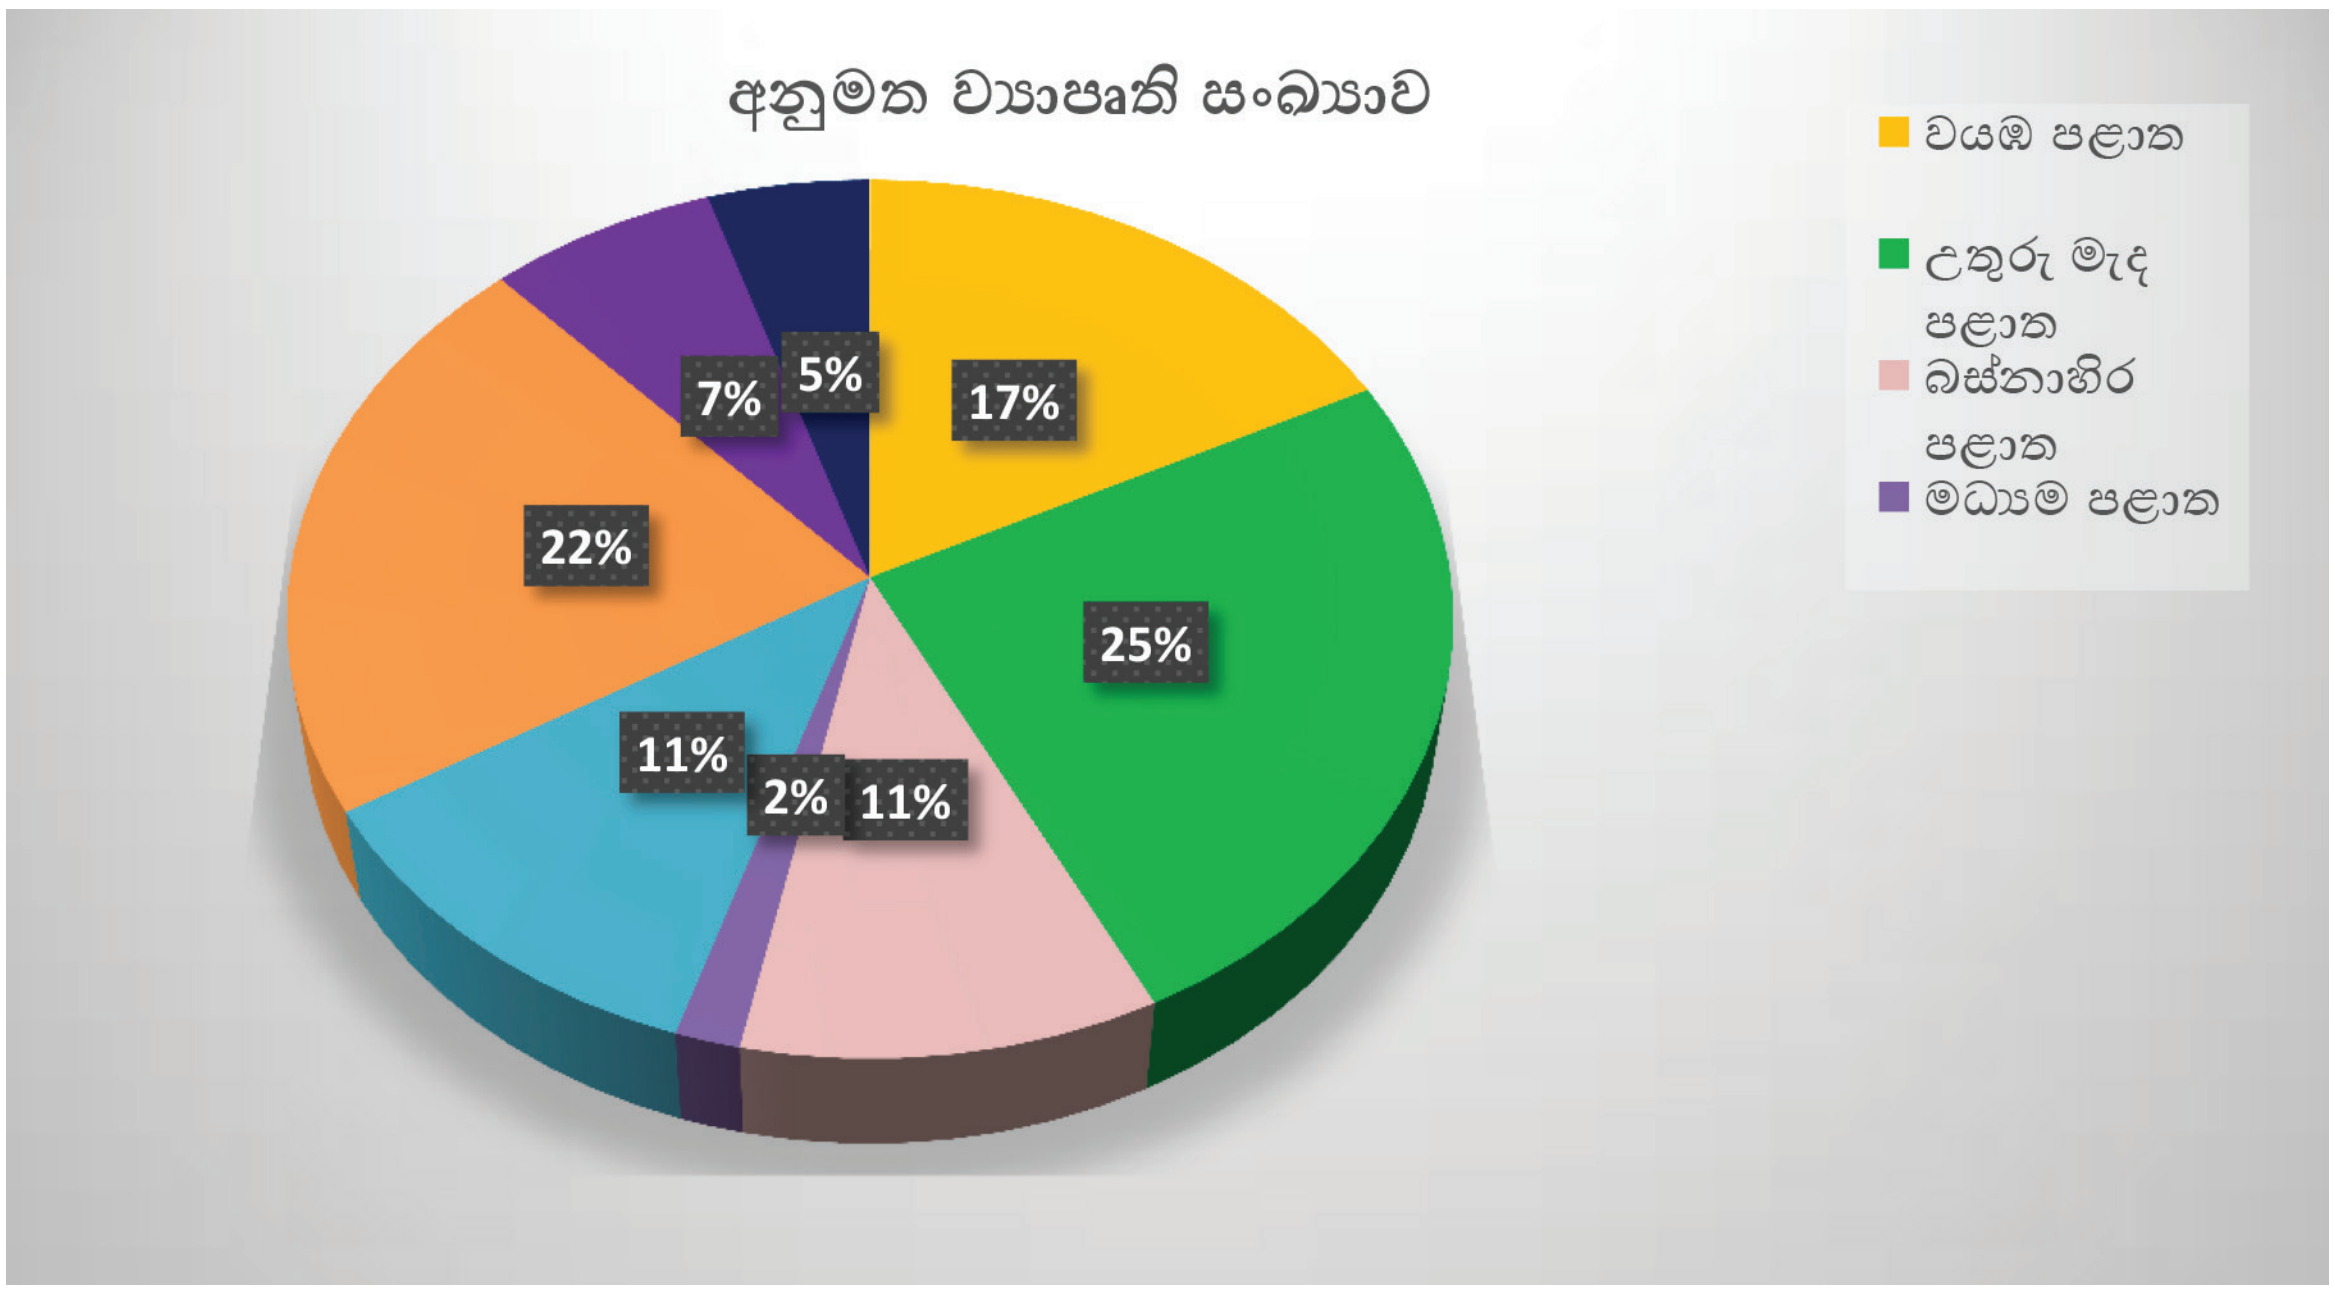

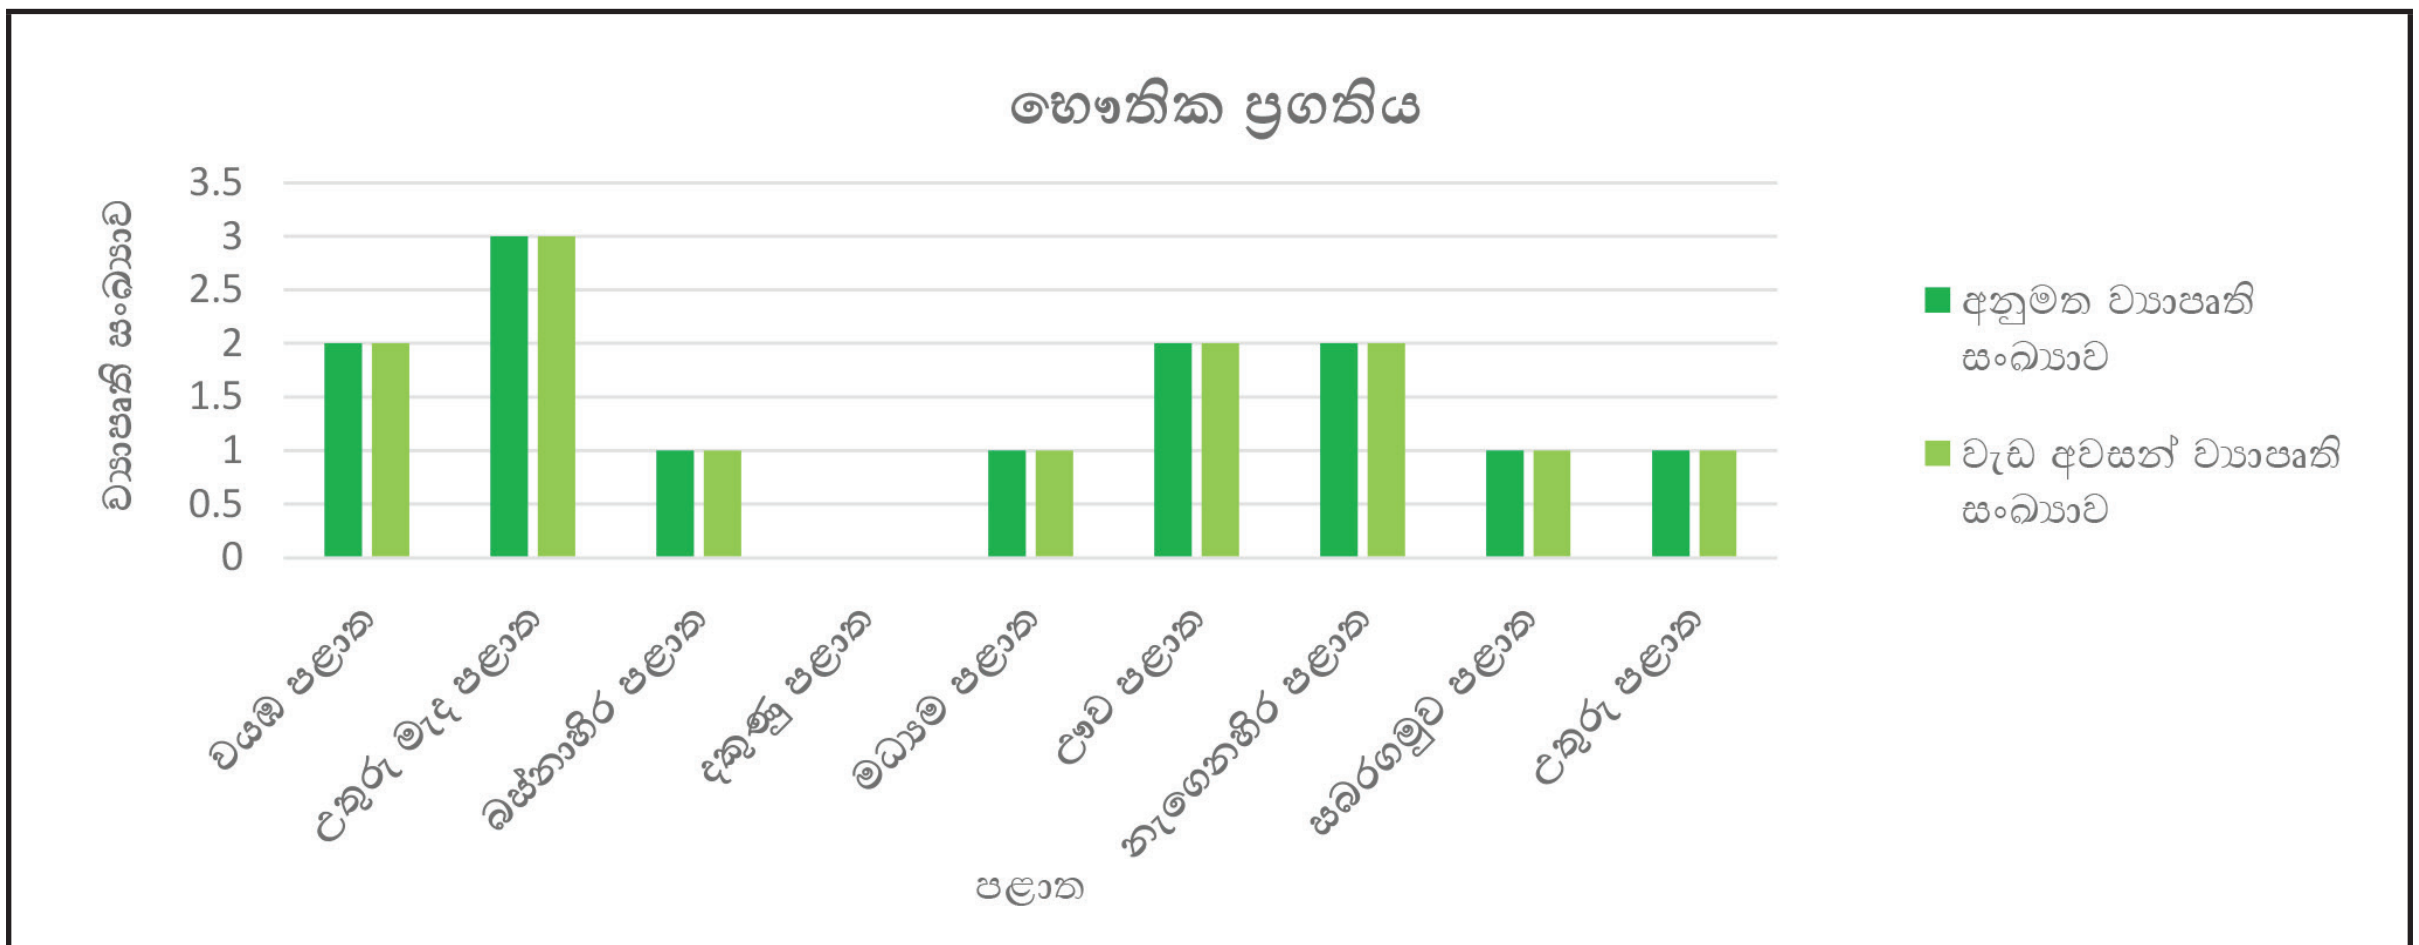

5. පුස්තකාල සංවර්ධන වැඩසටහන 2017

හැඳින්වීම:
තොරතුරු තාක්ෂණයේ ප්‍රයෝජන පුස්තකාලයේ කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා යොදාගැනීම අරමුණ කරගෙන ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික විශේෂඥ සහාය ඇතිව 2016 වසෙර් ආරම්භ කළ පුස්තකාල ස්වයංක්‍රියකරණ ව්‍යාපෘතිය යටෙත් සමෝධානිත සහ අන්තර්ජාතික සම්මතයන්ට අනුගතවූ පුස්තකාල පරිගණක යෙදුම් යොදාගනිමින් පුස්තකාල පාඨකයා කේන්ද්‍රකරගත් උසස් සේවයක් සැපයීම සඳහා පුස්තකාල දිරිගැන්වීම පිණිස අවශ්‍ය කරන සම්පත් දෘඩාංග, මෘදුකාංග සහ පුහුණුව ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබිණි.

එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලද අත්දැකීම් පාදක කරගෙන දැනට ස්වයංක්‍රියකරණ කර තිබෙන පළාත් පාලන ආයතන පුස්තකාල 30 සහ ඉදිරි වර්ෂවලදී ස්වයංක්‍රිය කරනු ලැබෙන පුස්තකාල විද්‍යුත් පුස්තකාල ජාලයක් ලෙස එකට සම්බන්ධ කෙරෙන මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීම 2017 වර්ෂයේ පුස්තකාල සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික සහාය ඇතිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ මූලික සැලසුම් සකස් කෙරිණි.

අරමුණු:
1. දැනට ස්වයංක්‍රීයකරණය කර ඇති සහ ඉදිරියේදී ස්වයංක්‍රියකරණය කරනු ලැබෙන පළාත් පාලන ආයතන සතු මහජන පුස්තකාල ජාලය එකට සම්බන්ධ කරන ඒකකයක් ලෙස මධ්‍යගත විද්‍යුත් පුස්තකාලයක් ස්ථාපනය කිරීම.
2. නූතන දියුණු පුස්තකාල අංගයනගෙන් සමන්විත හා 21වන සියවසට ගැලපෙන කාර්යක්ෂම සේවා සැපයීමේ හැකියාව සහිත ආදර්ශ පුස්තකාලයක් වශෙයන් පවත්වාගෙන යාම
3. දිවයිනේ ආර්ථික, විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික සංවර්ධනය සඳහා සහාය ලබාගැනීමට හැකි මහජන විද්‍යුත් සම්පත් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම
4. පුස්තකාල වෘත්තිකයන් සඳහා පුස්තකාල තාක්ෂණය සම්බන්ධ පුහුණු අවස්ථා සැලසීම.
5. පුස්තකාල හා තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පර්යේෂකයන්ට නවීන තාක්ෂණික ප්‍රවණතා හා භාවිත කිරීමේ ක්‍රම ගවේෂණය කිරීමටත් තොරතුරු තාක්ෂණික ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවස්ථා සැලසීම
6. මධ්‍යස්ථානය කලමනාකරණය සඳහා තාක්ෂණයන් හා ක්‍රමවේද ස්ථාපනය කිරීම.

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල:
1. නවීන පුස්තකාලයක හා විද්‍යුත් පුස්තකාලයක යථා ස්වරූපය දැකගැනීමට හැකිවීම (මහජනතාව, මහජන පුස්තකාලයාධිපතිවරු හා පුස්තකාල පරිපාලන නිලධාරීන් වැනි පාර්ශ්වකරුවන්ට)
2. නවීන පුස්තකාල පරිසරයක් තුළ ප්‍රායෝගික පුහුණුව හා අත්දැකීම මගින් නව තාක්ෂණයන් සමග පුස්තකාලවල සේවය කිරීමට විශ්වාසයක් ගොඩනැගීම
3. පුස්තකාලයාධිපතිවරුන්ගේ සහ මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා අනුව දේශීය විද්‍යුත් ග්‍රන්ථ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පරිශීලනයට අවස්ථාව ලැබීම
4. නවීන තොරතුරු තාක්ෂණික පරිසරය තුළ තොරතුරුවල හැසිරීම ගවේෂණය කිරීමට පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධති වෘත්තිකයන්ට හා විද්වතුන්ට පර්යේෂණ අවස්ථා උදාවීම.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්	1. පුස්තකාල ස්වයංක්‍රියකරණ වැඩසටහනෙහි ඉතිරි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු නිමකිරීම 2. මහජන විද්‍යුත් පුස්තකාල මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම: ■ නවීන විද්‍යුත් පුස්තකාලයක් සඳහා යටිතල ව්‍යුහය ස්ථාපනය කිරීම (ගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියා කිරීම හා නවීකරණය ■ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණික විශේෂඥ සේවය ලබා ගැනීම
ක්‍රියාත්මක කරන ස්ථානය	කොළඹ මහජන පුස්තකාලය
2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන	රු. මිලියන 20.0
වියදම(2017.12.31 දිනට)	රු.මිලියන 4.7 (2016 වර්ෂයේ ඉතිරි ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් සඳහා වියදම)

යෝජිත විද්‍යුත් පුස්තකාල මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.මිලියන 15.3ක් වූ අතර 2017 වර්ෂයේ ව්‍යාපෘති කටයුතු නිම කිරීමට සැලසුම් කළ ද ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ප්‍රමාද වීම නිසා 2018 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරනු ලැබිණි.

අනු අංකය	පළාත	දිස්ත්‍රික්කය	පළාත් පාලන ආයතනය	පුස්තකාල ලැයිස්තුව

1	බස්නාහිර	කොළඹ	කොළඹ මහ නගර සභාව	කොටහේන මහජන පුස්තකාලය
2			කොළඹ මහ නගර සභාව	මහරගම නගර සභා මහජන පුස්තකාලය
3			සීතාවක ප්‍රා.සභාව	සීතාවක මහජන පුස්තකාලය
4			කොට්කාවත්ත ප්‍රාදේශිය සභාව	කොට්කාවත්ත ප්‍රා.සභාවේසිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මහජන පුස්තකාලය
5			කොළඹ මහ නගර සභාව	කිරුළපන මහජන පුස්තකාලය
6			කොළඹ මහ නගර සභාව	මරදාන නාගරික මහජන පුස්තකාලය
7			බොරලැස්ගමුව නගර සභාව	බොරලැස්ගමුව නගර සභාවේ වී.එච් පෙරේරා ම.පුස්තකාලය
8		කළුතර	පානදුර නගර සභාව	මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද මහජන පුස්තකාලය
9		ගම්පහ	මීනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශිය සභාව	මීනුවන්ගොඩ මහජන පුස්තකාලය
10	සබරගමුව	රත්නපුරය	ඇහැළියගොඩ ප්‍රාදේශිය සභාව	ඇහැළියගොඩ මහජන පුස්තකාලය
11		කෑගල්ල	කෑගල්ල නගර සභාව	කෑගල්ල මහජන පුස්තකාලය
12	වයඹ	කුරුණෑගල	මාවතගම ප්‍රා. සභාව	මාවතගම මහජන පුස්තකාලය
13		පුත්තලම	ආණමඩුව ප්‍රාදේශිය සභාව	ආණමඩුව ප්‍රා.සභාවේ මහජන පුස්තකාලය
14			පුත්තලම නගර සභාව	පුත්තලම නගර සභා මහජන පුස්තකාලය
15	දකුණ	ගාල්ල	ගාල්ල මහ නගර සභාව	රිච්ඩ්පතිරණ මහජන පුස්තකාලය
16		හම්බන්තොට	බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශිය සභාව	බෙලිඅත්ත මහජන පුස්තකාලය
17			තංගල්ල නගර සභාව	තංගල්ල මහජන පුස්තකාලය
18		මාතර	වැලිගම නගර සභාව	වැලිගම නගර සභාවේ මහජන පුස්තකාලය

19	උතුරු මැද	අනුරාධපුරය	කැකිරාව ප්‍රාදේශිය සභාව	කැකිරාව ප්‍රා.සභා මහජන පුස්තකාලය
20			අනුරාධපුර මහ නගර සභාව	අනුරාධපුර මහජන පුස්තකාලය
21		පොළොන්නරුව	තමන්කඩුව ප්‍රා.සභාව	තමන්කඩුම ප්‍රා.සභාවේ බුද්ධිමණ්ඩපය මහජන පුස්තකාලය
22			හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශිය සභාව	බණ්ඩාරනායක මහජන පුස්තකාලය
23	මධ්‍යම	මාතලේ	විල්ගමුව ප්‍රාදේශිය සභාව	විල්ගමුව මහජන පුස්තකාලය
24			නාවලපිටිය නගර සභාව	නාවලපිටිය මහජන පුස්තකාලය
25			අකුරණ ප්‍රාදේශිය සභාව	අකුරණ මහජන පුස්තකාලය
26		නුවර	ගම්පොල නගර සභාව	ගම්පොළ මහජන පුස්තකාලය
27		නුවර එළිය	නුවරඑළිය මහ නගර සභාව	නුවර එළිය මහ නගර සභා මහජන පුස්තකාලය
28	ඌව	බදුල්ල	බදුල්ල මහ නගර සභාව	බදුල්ල මහ නගර සභා මහජන පුස්තකාලය
29		මොණරාගල	මොණරාගල ප්‍රාදේශිය සභාව	මොණරාගල ප්‍රා.සභා මහජන පුස්තකාලය
30			වැල්ලවාය ප්‍රාදේශිය සභාව	වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලය
31	උතුර	වව්නියාව	වව්නියාව දකුණ ප්‍රාදේශිය සභාව	වව්නියාව දකුණ ප්‍රාදේශිය සභා මහජන පුස්තකාලය
32		මන්නාරම	මන්නාරම ප්‍රාදේශිය සභාව	තලෙයිමන්නාරම් මහජන පුස්තකාලය
33		කිළිනොච්චිය	කරච්චි ප්‍රාදේශිය සභාව	කරච්චි ප්‍රාදේශිය සභා මහජන පුස්තකාලය
34		මුලතිව්	මන්තායි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශිය සභාව	මන්තායි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශිය සභා මහජන පුස්තකාලය
35		යාපනය	චාවකච්චෙරී නගර සභාව	චාවකච්චේරි නගර සභාවේ චාවකච්චේරි මහජන පුස්තකාලය
36			නල්ලූර් ප්‍රාදේශිය සභාව	නල්ලූර් ප්‍රාදේශිය සභා මහජන පුස්තකාලය

37	නැගෙනහිර	ත්‍රිකුණාමලය	මුතූර් ප්‍රාදේශිය සභාව	මුතූර් මහජන පුස්තකාලය
38		මඩකළපුව	මන්මුනෙයි දකුණ-බටහිර ප්‍රාදේශිය සභාව	කළුවන්චිකුඩි මහජන පුස්තකාලය
39		අම්පාර	අම්පාර නගර සභාව	අම්පාර නගර සභාවේ මහජන පුස්තකාලය
40			කල්මුනේ මහ නගර සභාව	කල්මුනෙයි මහජන පුස්තකාලය

6. මීරිගම සෙත් සෙවණ රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය නවීකරණය කිරීම.

පසුබිම

ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, පකිස්ථානය, නේපාලය හා ශ්‍රී ලංකාව යන දකුණු ආසියාතික රටවල දක්නට ලැබෙන ප්‍රවනතාවක් වන්නේ ජනගහනයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් සීග්‍රයෙන් වියපත් භාවයට පත්වීමේ ලක්ෂණය සහිත වීමය වර්තමානයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ජනගහනයෙන් 12.47% ක් වියපත් ජන සංඛ්‍යාව නියෝජනය කරන අතර, එය වර්ෂ 2041 වන විට 24.8% ඉක්මවනු ඇති බවට අනුමාන කෙරේ. වැඩිහිටි ජනගහනයට සමාජයෙන් ලැබෙන අනවධානය හා අසමානතා ද දිනෙන් දින වැඩිවන ප්‍රවනතාවයක් පවතින හෙයින් අභියෝග රැසකට මුහුණ දීමට ඔවුනට සිදුව ඇත. මේ අතුරින් වැඩිහිටි නිවාස ගත කිරීමට සිදුවන වැඩිහිටියන්ගේ සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යන අතර, ඔවුන්ගේ ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍යය පමණක් නොව ඔවුන්ගේ ගෞරවය හා අභිමානය ද සුරක්ෂිත වන ආකාරයට එම නිවාසගත කිරීම් සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පැන නැගේ. මෙම තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක රජයේ වැඩිහිටි නිවාස 5න් බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටි විශාලතම වැඩිහිටි නිවාසය, මීරිගම සෙත් සෙවන රජයේ වැඩිහිටි නිවාසය වන අතර මෙය මහාමාත්‍ය ඩී.එස්.සේනානායක මැතිතුමා අනුස්මරණය කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කරන ලද්දකි. බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන මෙම වැඩිහිටි නිවාසය තුළ දැනට වැඩිහිටියන් 265කට නේවාසික පහසුකම් සැපයේ.

එසේ වුවත්, මෙම වැඩිහිටි නිවාසයේ ඇතැම් ගොඩනැගිලි අබලන් වීම හා ජල හා වැසිකිළි පහසුකම් ප්‍රමාණවත් මට්ටමක නොතිබීම වැනි ගැටලු හේතුවෙන් නේවාසික වැඩිහිටියන්ට ඉහළ ගුණාත්මක සේවාවන් සැපයීමේ දුෂ්කරතා පැනනැගී තිබිණි. මෙය සැලකිල්ලට ගෙන 2016.06.22 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි මෙම පුනරුත්තාපන කටයුතු සඳහා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට ප්‍රතිපාදන ලබා දීමට මහා භාණ්ඩාගාරය කටයුතු කරන ලදී. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම බස්නාහිර පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරිණි.

අරමුණ

මීරිගම වැඩිහිටි නිවාසයේ සේවාවන් ප්‍රශස්ත මට්ටමින් පවත්වා ගෙනයාම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.

eLibrary Project

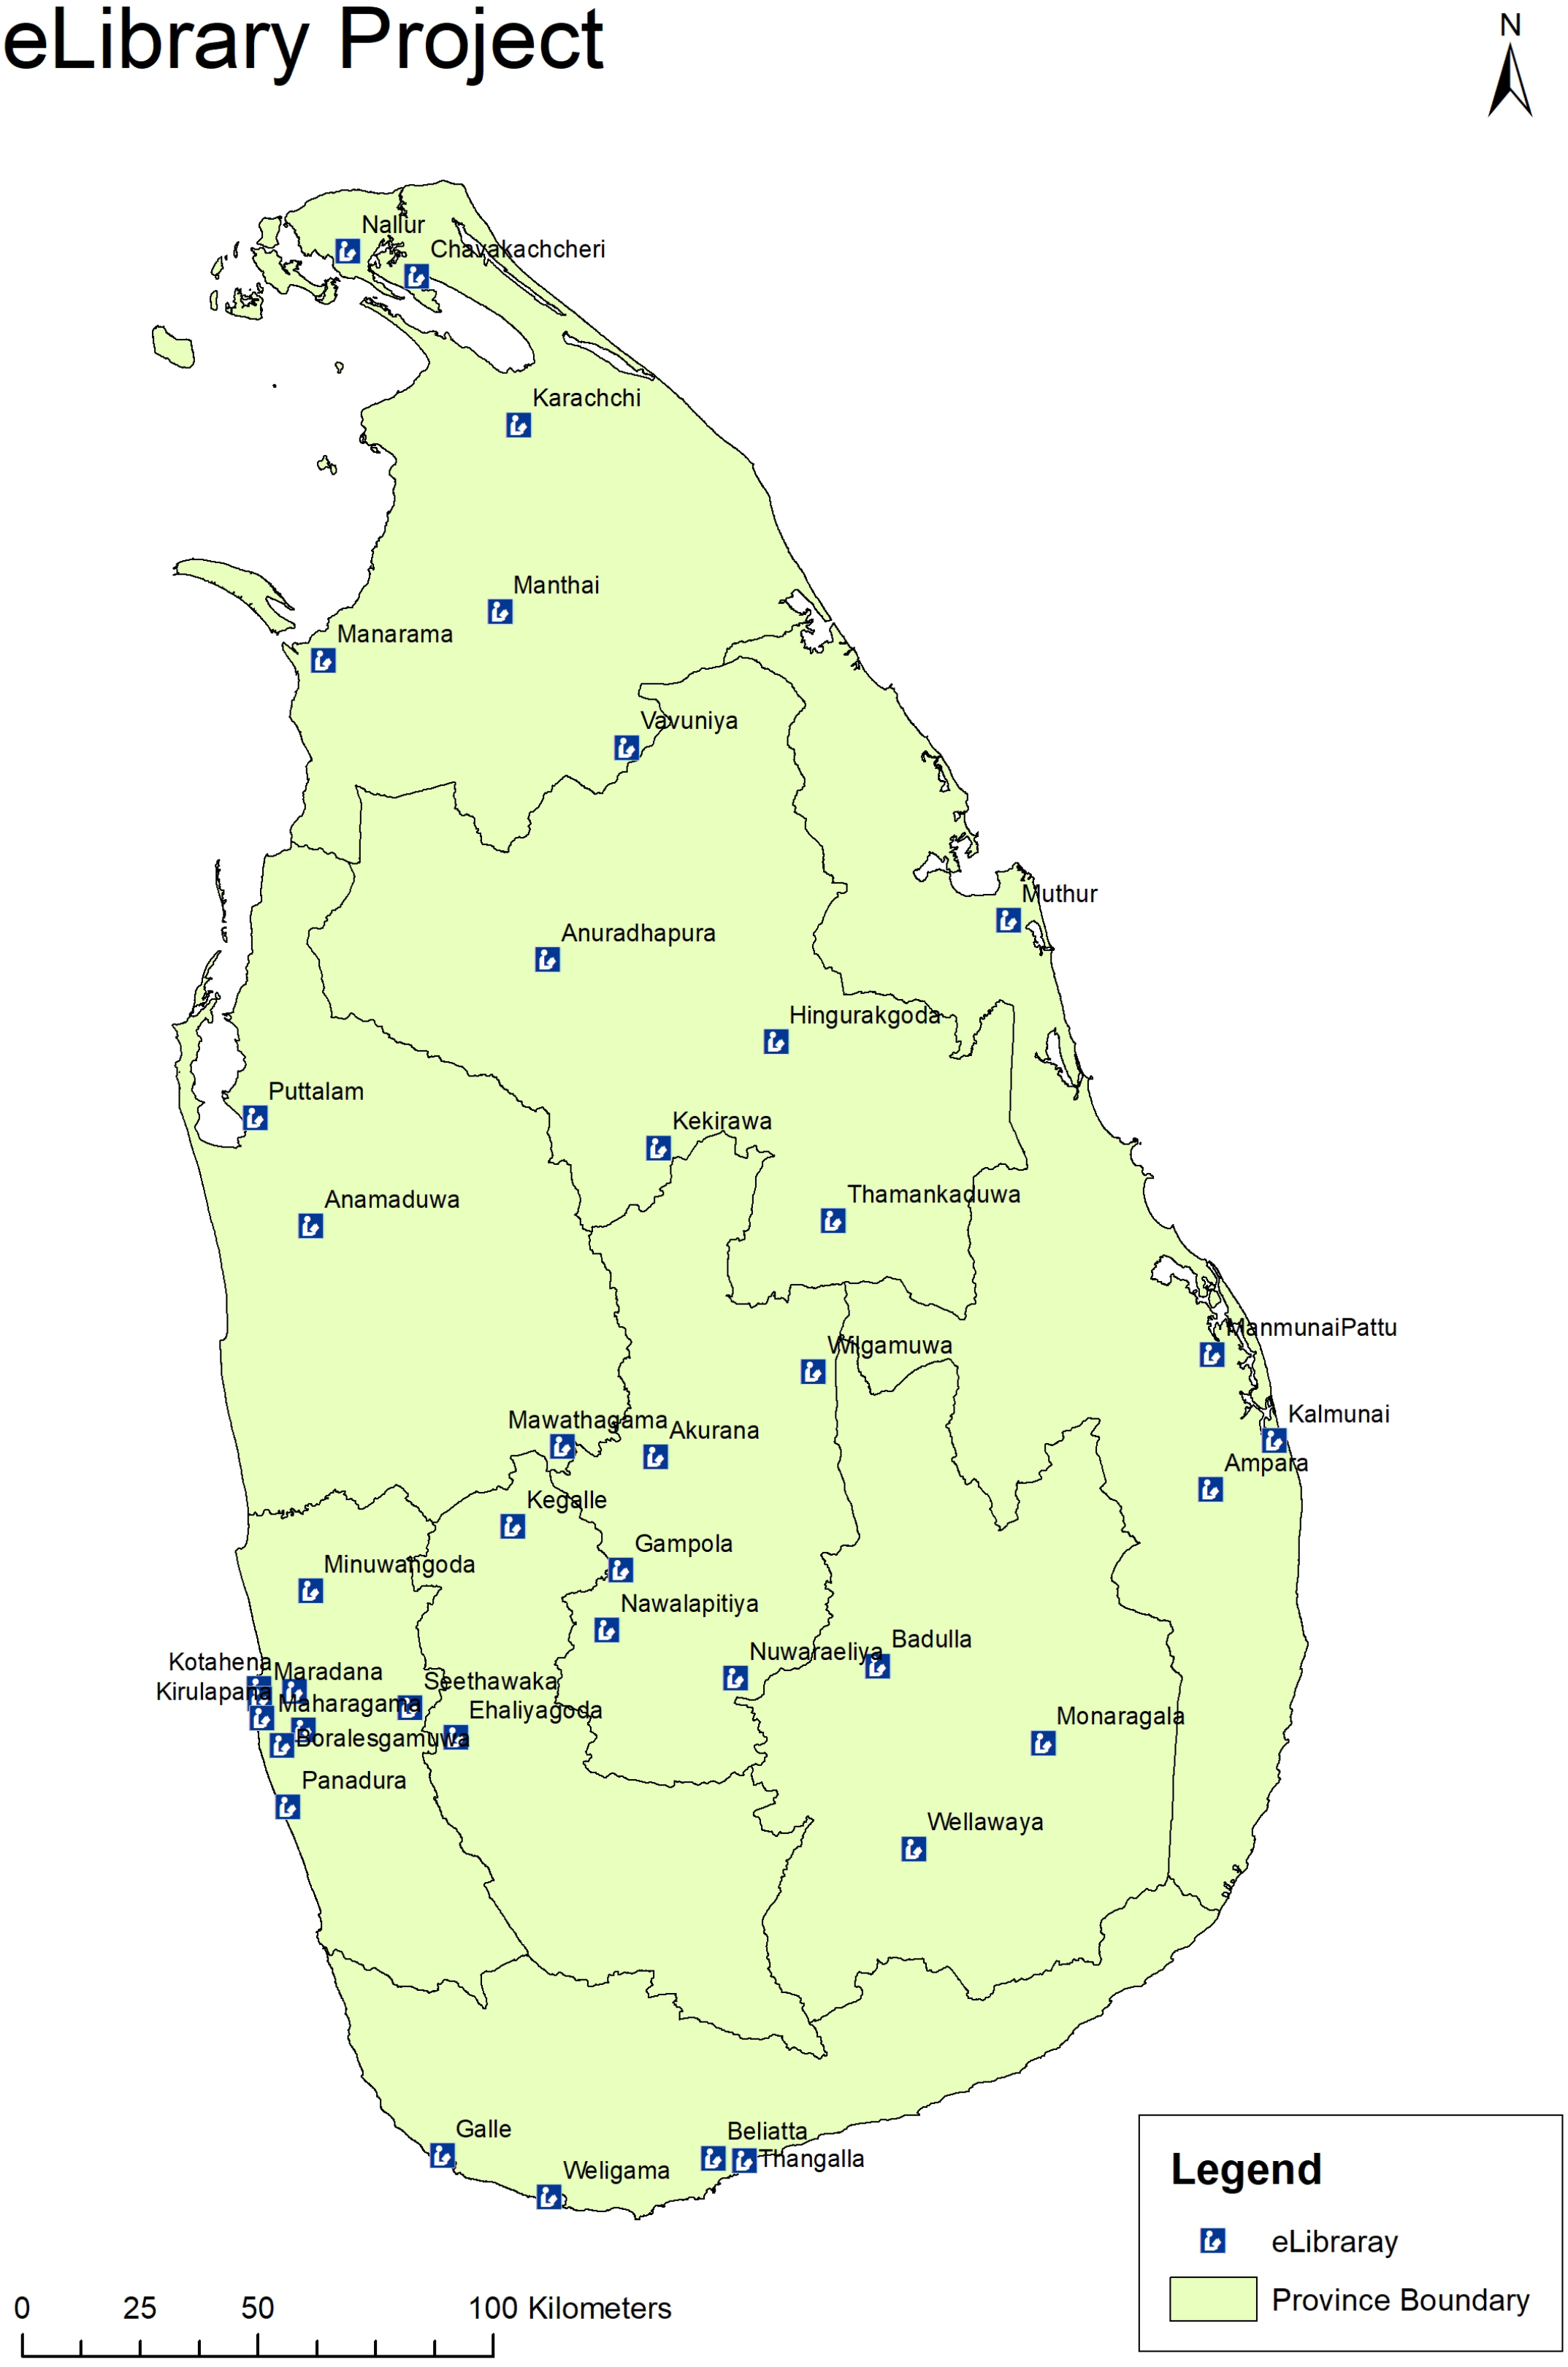

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්	i. වැඩිහිටි නිවාසය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම. ii. ජල ටැංකිය ඉදිකිරීම. iii. ගෝතමී බී අංශයේ වැසිකිළි පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම.
2017 වසර සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය	රු.මිලියන.21.8
2017 වසරේ වියදම(2017.12.31 දිනට	රු..මිලියන.8.63
භෞතික ප්‍රගතිය	100%

7. නැගෙනහිර පළාතේ ජල ප්‍රවාහන පද්ධති වැඩි දියුණු කිරීම.

නැගෙනහිර පළාතේ නාගරීකරණය ඉහළ යාමත්, නගරික ප්‍රදේශවල ජන ඝනත්වය ඉහළ යාමත් හේතුවෙන් පවතින අබලන් වූ කාණු පද්ධති අවහිර වීම නිසා වැසි පවතින කාලවලදී ගංවතුර තත්වයන් ඇති වීමේ හා ඩෙංගු උණ වැනි රෝග පැතිරීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දැකගත හැකිය.

මෙම තත්වය අවම කිරීමට හැකිවන පරිදි අත්‍යාවශ්‍ය වැසි ජල කාණු පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 2017 වසරේ රුපියල් මිලියන 100 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලදී.

දිස්ත්‍රික්කය	**පළාත් පාලන ආයතනය**
මඩකලපුව	මඩකලපුව මහ නගර සභාව
	එරාවුර් නගර සභාව
	කාත්තන්කුඩි නගර සභාව
අම්පාර	කල්මුණේ මහ නගර සභාව
	අක්කරපත්තු මහ නගර සභාව
	පොතුවිල් ප්‍රාදේශීය සභාව
ත්‍රිකුණාමලය	ත්‍රිකුණාමලය නගර සභාව
	කින්නියා නගර සභාව

අරමුණ:

1. නැගෙනහිර පළාතේ නාගරික ප්‍රදේශවල ප්‍රමුඛතාවය අනුව හඳුනාගත් වැසිජල ප්‍රවාහන පද්ධති ඉදිකිරීම මඟින් සුරක්ෂිත ජීවිතයක් තහවුරු කිරීම හා එහි ප්‍රතිඵලයන් වශයෙන් එම ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ප්‍රජාවගේ ජීවන මට්ටම් ඉහළ නැංවීම.

2. නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රදේශවල විවිධ ලෙඩ රෝග පැතිරීම වැළැක්වීම මඟින් ලෙඩ රෝගවලින් තොර සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමාජයක් බිහි කිරීම.

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්	නැගෙනහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන 11 ක නාගරික බල ප්‍රදේශවල වැසිජල ප්‍රවාහන පද්ධති ඉදි කිරීම.
2017 වසරට නියමිත ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය	රු.මිලියන 90.00
2017 වසරේ අනුමත මුදල(රු.)	රු.මිලියන 98.17
2017 වසරේ වියදම(2017.12.31 දිනට)	රු.මිලියන 10.12

3.2. ව්‍යාපෘති හා සැලසුම් අංශය

2017 වසරේ සිට අමාත්‍යාංශයට එකතු වු නව අංශයකි. මෙම අංශය ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යාපෘති කළමණාකරණ ඒකකය, සැලසුම් ඒකකය, හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය මඟින් සමන්විත වී තිබේ.

දැක්ම :

අමාත්‍යාංශයේ සියළු කටයුතු වල උපායමාර්ග සැලසුම් සම්පාදක වීම සහ විදේශ ව්‍යාපෘති සඳහා තනාපතිවරයෙකු වීම.

ප්‍රධාන අරමුණු :

1. ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතන මඟින් සේවා හා යටිතල පහසුකම් වගවීමකින් හා වගකීමකින් යුතුව ලබාදීමට සහාය වීම.
2. ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජනජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිකිරීමට අවශ්‍ය සම්පත් ලබාදීම.

3.2.1. ප්‍රධාන කාර්යයන්

3.2.1.1. ව්‍යාපෘති හා කළමනාකරණ ඒකකය

1. විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිවලට අදාල කාර්යයන් රේඛීය අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යාපෘති කළමණාකරණ ඒකක හා වෙනත් ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණ කිරිම තුලින් ව්‍යාපෘතිවල අරමුණු ළඟා කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
2. ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය පසු විපරම් කිරිම.
3. ජාතික ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම.
4. ව්‍යාපෘති වලට අදාල කැබිනට් පත්‍රිකා සකස් කිරීම.
5. ව්‍යාපෘති කාර්යය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම ඇතුළු පරිපාලන කටයුතු සිදු කිරීම.
6. අමාත්‍යාංශයේ අනෙකුත් අංශ අතර නිසි සම්බන්ධීකරණය පවත්වාගෙන යාම.

3.2.1.2. සැලසුම් ඒකකය

1. අමාත්‍යාංශ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම හා උපාය මාර්ගික සැලැස්ම සකස්කර අදාල ආයතනවලට ඉදිරිපත් කිරීම.
2. අමාත්‍යාංශ ප්‍රගති වාර්තා මාසිකව, කාර්තුමය හා වාර්ෂික ලෙස සකස් කිරීම හා අදාල ආයතන වලට ඉදිරිපත් කිරීම.
3. අමාත්‍යාංශ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම.
4. අනාගතයට අදාල ව්‍යාපෘති යෝජනා හඳුනා ගැනීම.
5. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධිකරණය මඟින් නව ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.
6. වාර්ෂික කාර්යය සාධන වාර්තාව සැකසීම හා පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාරක සභා අවස්ථාව අවශ්‍ය කාර්යසාධනය හා ඉදිරි සැලසුම් ඇතුලත් වාර්තාව සැකසීම.
7. වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම සහ පැවැත්වීම.

Development Projects 2015 -2018

Ministry of Provincial Councils & Local Government

	Projects	Funding Source	Project Value (LKR Mn)
	Puraneguma	ADB	10,184.00
	Rural Bridges	UK, Netherland	44,100.00
	Rural Infrastructure Development in Emerging Region (RIDEP)	JICA	21,186.00
	Second Health Sector Development Project (SHSDP)	World Bank	26,000.00
	Northern Road Connectivity Project (NRCP)	ADB	4,600.00
	Transforming the School Education System (TSEP)	World Bank	13,000.00
	General Education Modernization Project (GEM)	World Bank	15,500.00
	Grater Colombo Waste Water Management Project (GCWWMP)	ADB,EIB	43,006.00
	North East Local Services Improvement Project	World Bank	13,600.00
	Iranamadu Irrigation Development Project	IFAD	3,250.00
	Jaffna Kilinochchi Water Supply & Sanitation Project (JKWS&SP)	ADB	1,881.00
	Total Project Value		**196,307.00**
	Local Funded Development Project	GOSL	6567.00

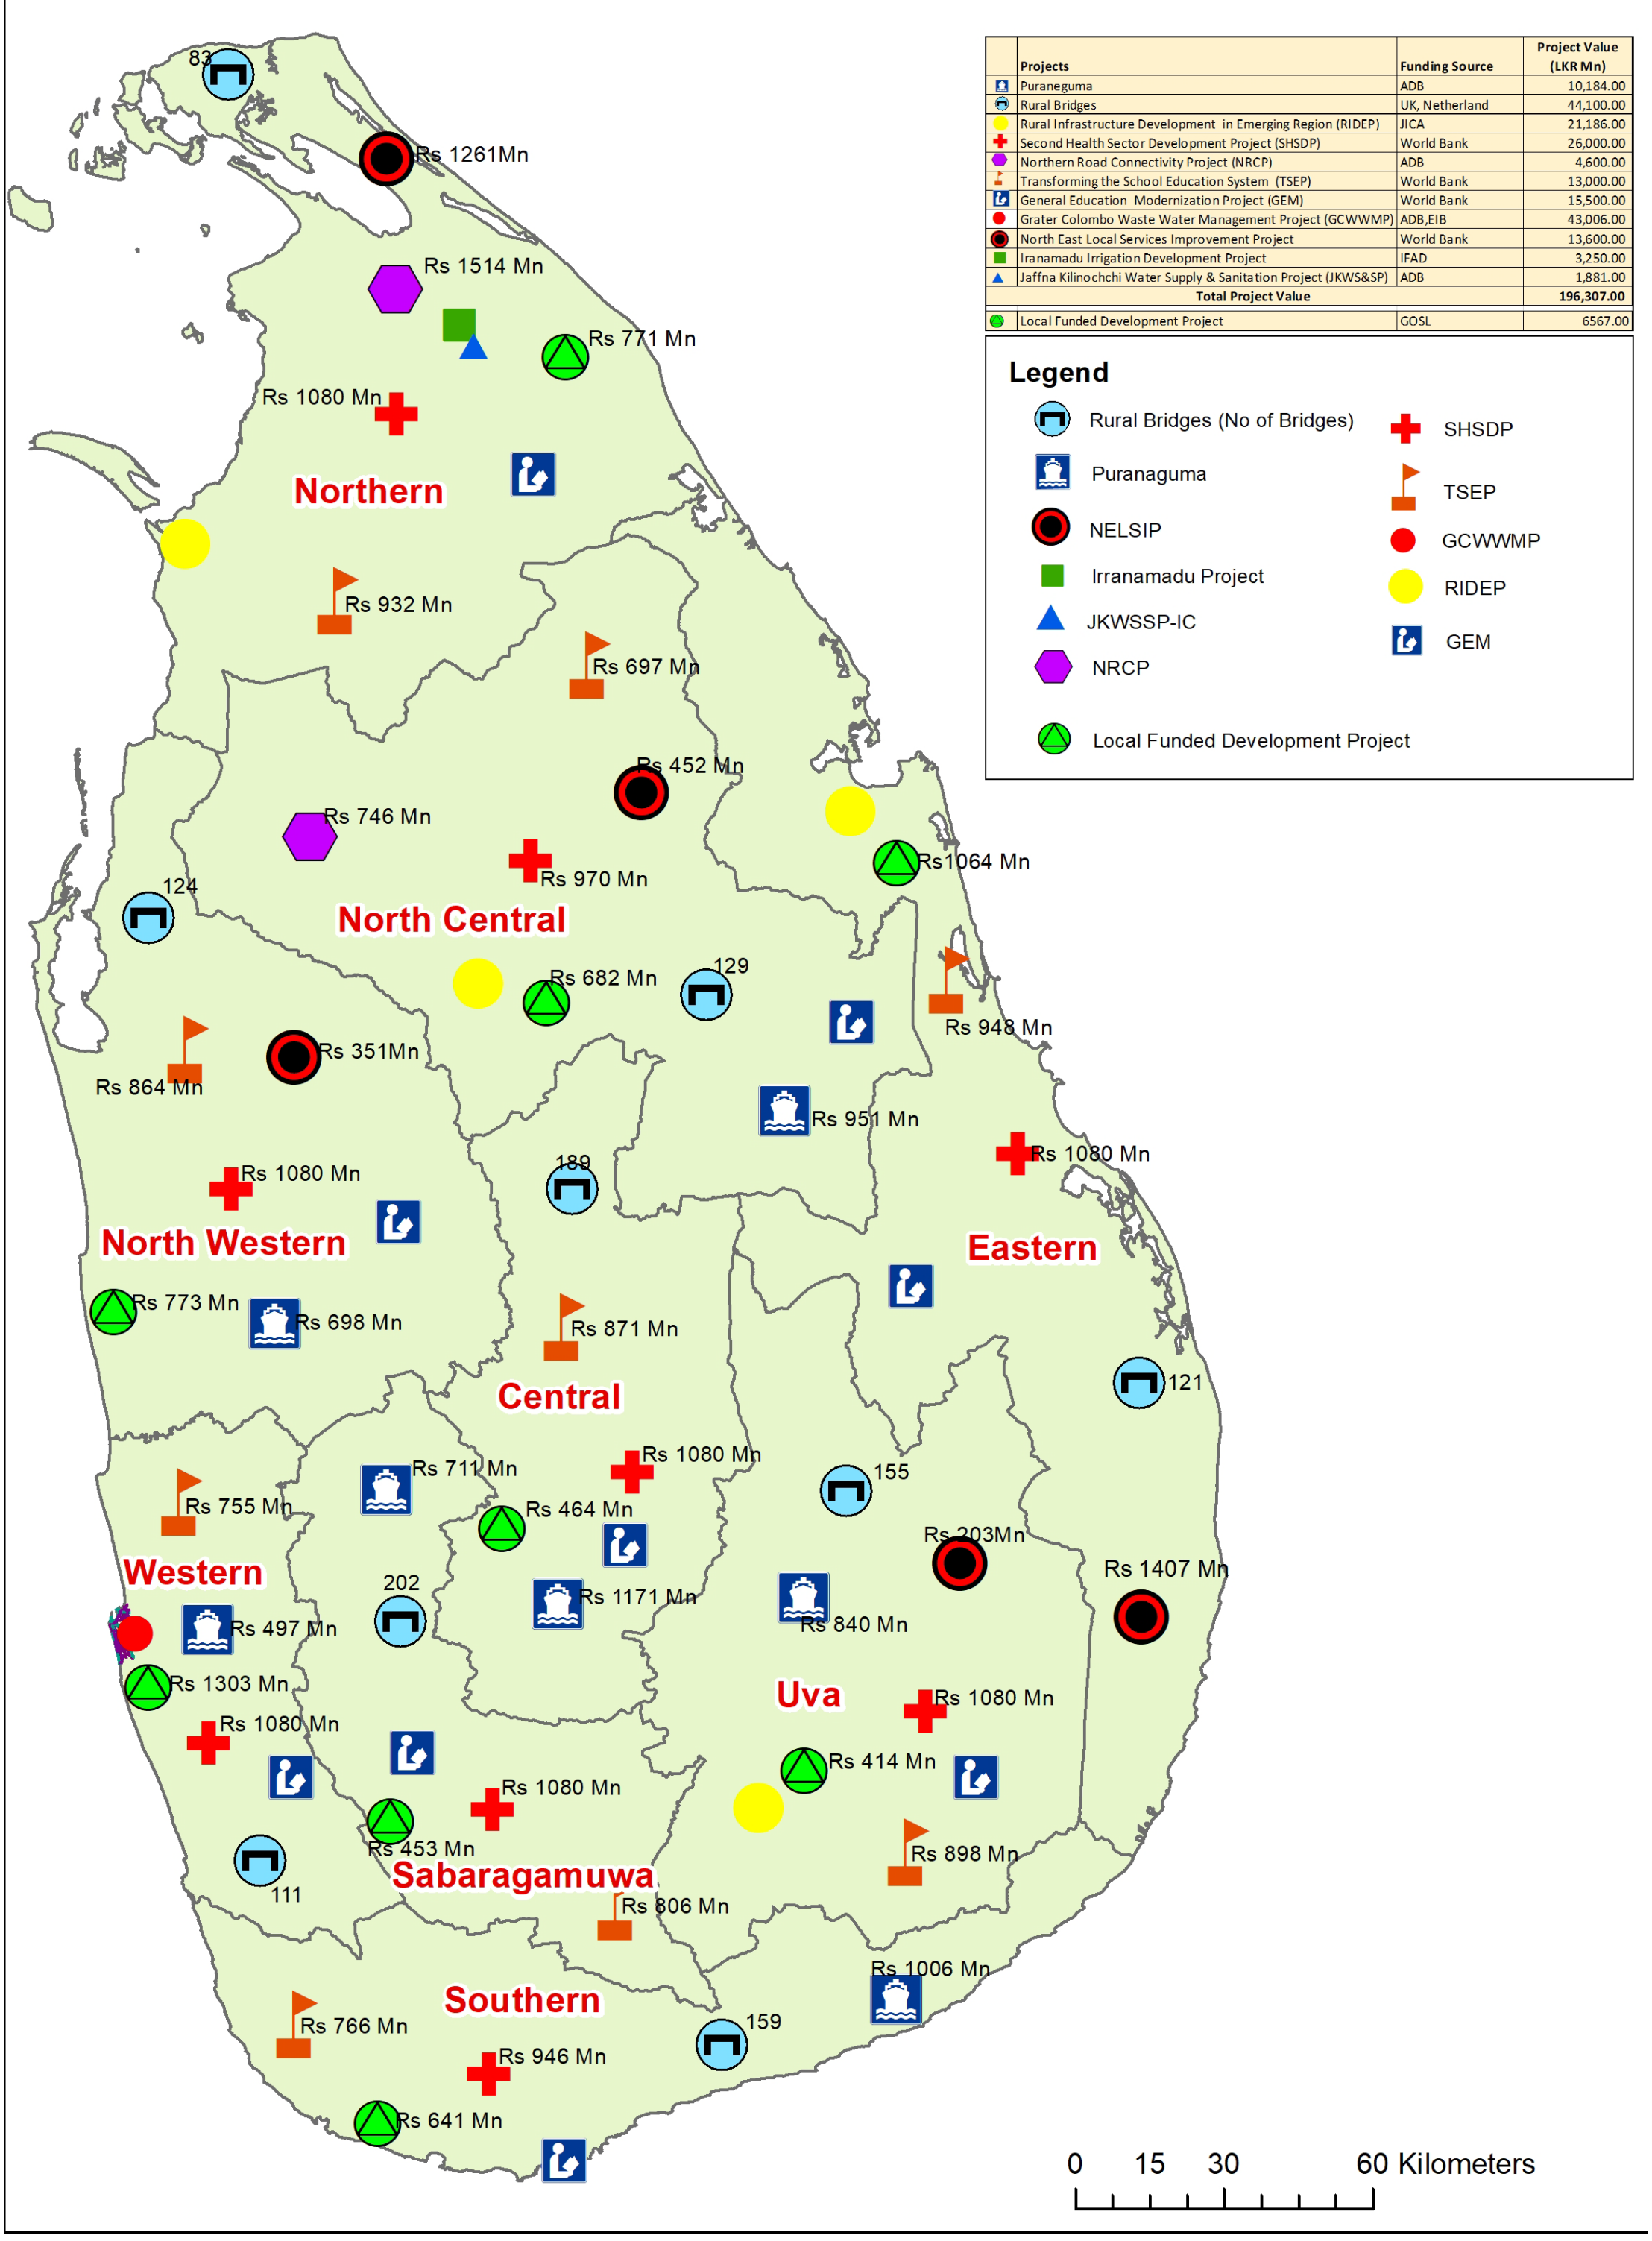

3.2.1.3. තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

1. අමාත්‍යාංශ නිල වෙබ් අඩවිය සතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම.
2. තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා ගෙන යාම හා තොරතුරු එක්රැස් කිරීම.
3. අන්තර්ජාල පහසුකම් පවත්වා ගෙන යාමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහය ලබාදිම.
4. අමාත්‍යාංශයේ සියලු අංශ වලට හා නළධාරින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ සහය ලබාදීම.

මෙම අංශය යටතේ, 2017 වසර තුළ විදේශාධාර ව්‍යාපෘති 15 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. එම ව්‍යාපෘතිවල කාර්යය මණ්ඩලය 500 පමණ සේවය කරන අතර සියලුම පළාත් ආවරණය කරමින් අදාල පළාත් සභා හරහා ඒවා ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිවල සම්පූර්ණ ආයෝජනය රු.මිලියන 30,164.03 කි. විවිධ මූල්‍ය ආයතන මඟින් ණය හා ප්‍රදාන ලෙස එම ආයෝජන සිදු කර ඇත.

3.2.2. විදේශීය අරමුදල් මත ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

3.2.2.1. පුරනැගුම

අරමුණ

පළාත් පාලන ආයතන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම සහ පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ 137ක උප ව්‍යාපෘති 383ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම

	ණය ආධාර ලබාදෙන ආයතනය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	
	ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මිලියන)	16,800.00	
	ව්‍යාපෘති කාලය	2011 - 2020	
	ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	බස්නාහිර, වයඹ, දකුණ, සබරගමුව, ඌව, මධ්‍යම, උතුරුමැද යන පළාත්	
	ආරම්භක ප්‍රතිපාදන වල භෞතික ප්‍රගතිය	100%	
	අතිරේක ප්‍රතිපාදන වල භෞතික ප්‍රගතිය	9%	
	සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)	8780.00	
	2017 ප්‍රතිපාදන රු.මි.	1892.00	
	2017 හතරවන කාර්තුවට මූල්‍ය ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	1892.00	1532.00
	2017.12.31 දිනට භෞතික ඉලක්ක / ප්‍රගතිය අතිරේක ප්‍රතිපාදන	10%	9%

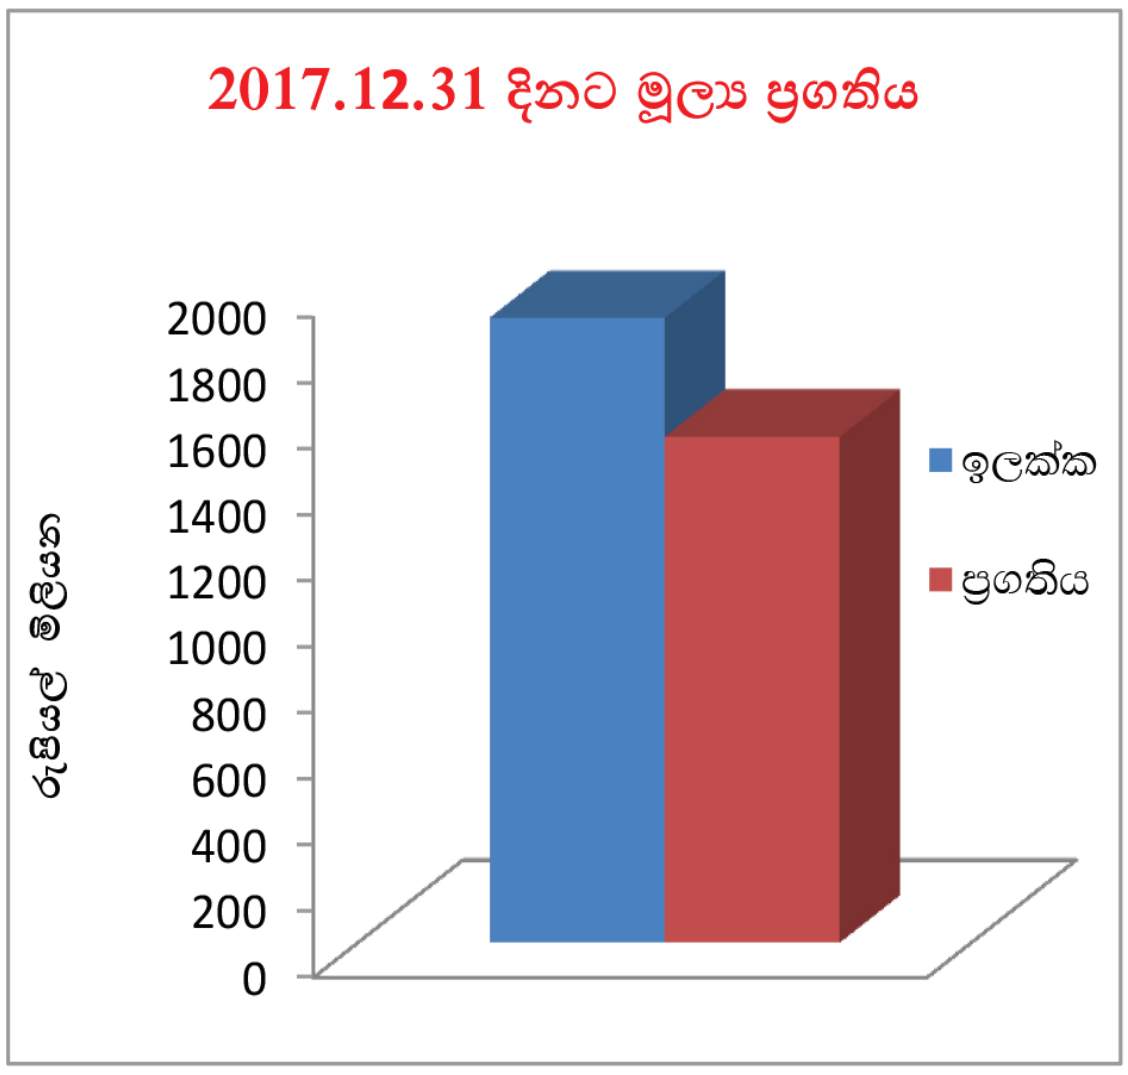

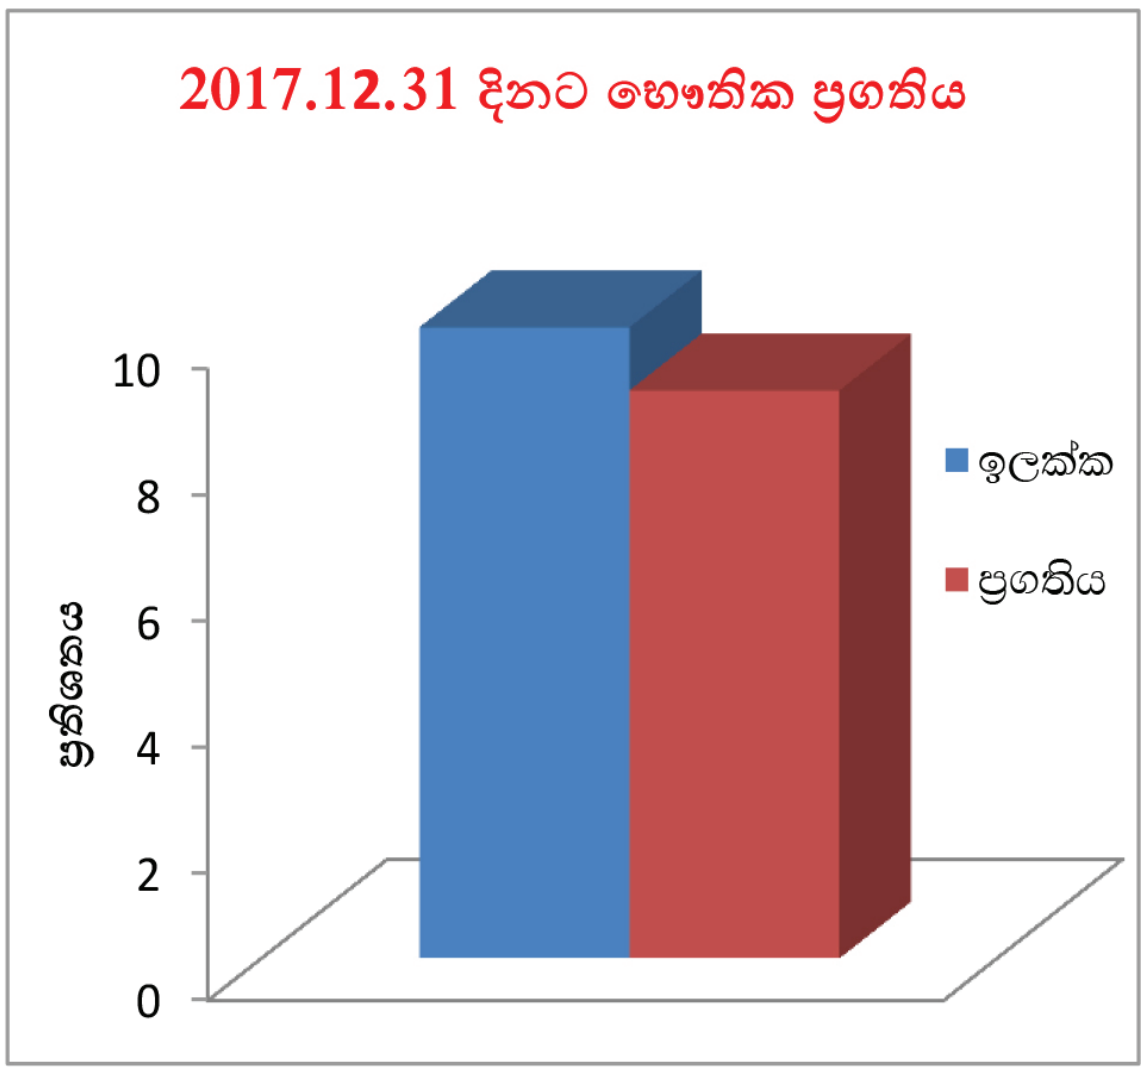

වගු අංක 14 - පුරනැගුම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

ආරම්භක ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්	ඉදිකිරීම් නිමකළ ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණය	අතිරේක ප්‍රතිපාදන යටතේ ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්	ඉදිකිරීමට යෝජිත ප්‍රමාණය
සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන	31	ප්‍රධානය කරන ලද ව්‍යාපෘති (පානීය ජල යෝජනාක්‍රම)	08
දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන	19		
පහසු මධ්‍යස්ථාන	28	සැලසුම් අවස්ථාවේ පවතින ව්‍යාපෘති (පානීය ජල යෝජනාක්‍රම)	17
ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන	03		
ආදාහනාගාර	02	ප්‍රදානය කරන ලද ව්‍යාපෘති (යටිතල පහසුකම්)	05
ජල යෝජනා ක්‍රම	23		
සති පොළ	45		
පුස්තකාල	40	ලංසු කැඳවන ලද ව්‍යාපෘති (යටිතල පහසුකම්)	05
බස් නැවතුම්පොළ	14		
පොදු ගොඩනැගිලි	74	සැලසුම් අවධියේ පවතින ව්‍යාපෘති (යටිතල පහසුකම්)	19
මාර්ග / පාලම්	23		
එකතුව	302	එකතුව	49

Puraneguma Project   2015-2017

Ministry of Provincial Councils & Local Government

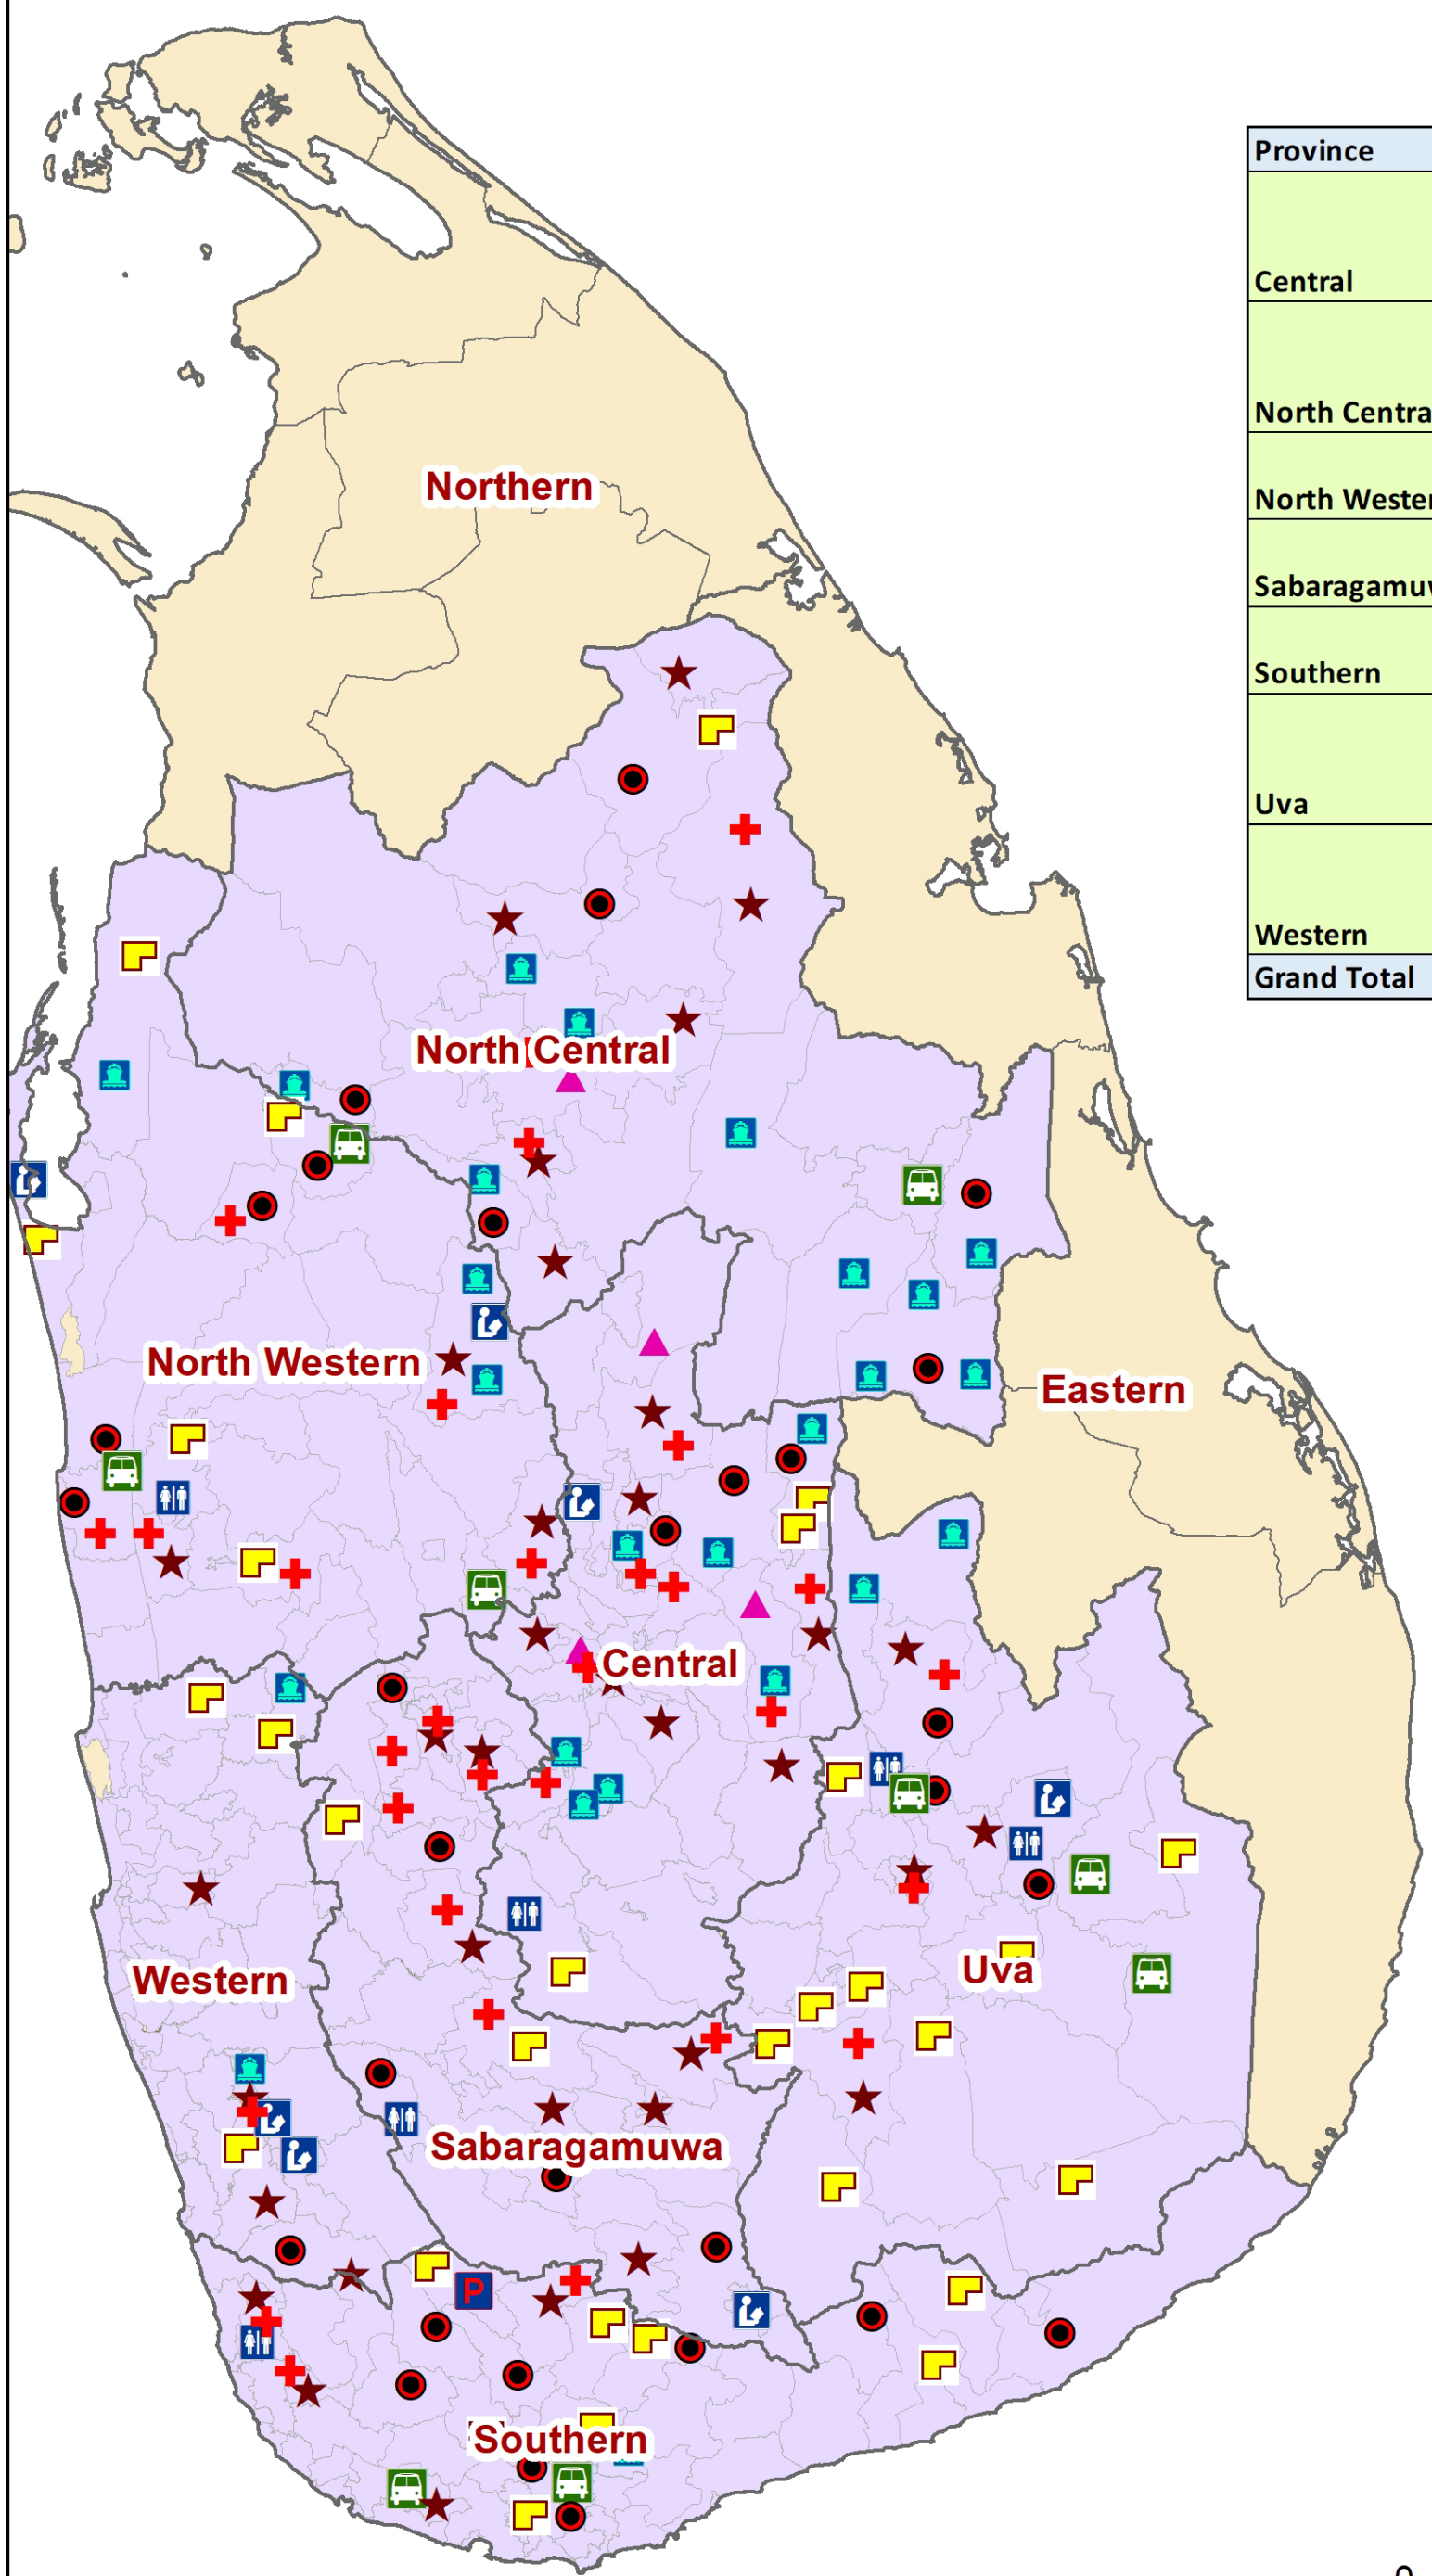

Province	Year	No of Sub Projects
	2015	18
	2016	6
Central	2017	5
	2015	14
	2016	12
North Central	2017	4
	2015	19
North Western	2017	2
	2015	9
Sabaragamuwa	2016	15
	2015	20
Southern	2016	7
	2015	23
	2016	4
Uva	2017	2
	2015	10
	2016	4
Western	2017	3
Grand Total		177

Legend

Puraneguma Projects

- Office Building
- Water Supply Project
- Weeky Fair
- Multipurpose Building
- Public Toilet
- Community Hall
- Library Building
- Bus Stand
- Health Center
- Vehicle Park
- Local Authority Boundary
- Province Boundary

0 15 30 60 Kilometers

Note: This Map shows selected main projects only

මීට අමතරව ප්‍රාදේශීය සභා මගින් සපයන සේවාවන් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී අයුරින් ඉටුකිරීමට හැකිවන පරිදි එම ආයතන යටතේ පාලනය වන යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍ර වැඩිදියුණු කිරීම, වරිපනම් ඇතුළු අනෙකුත් බදු අය කිරීමේ හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි සරල කිරීම හා ඒවා අනුමත කිරීමේ ක්‍රමවේදය වඩාත් විනිවිදභාවයකින් ඉටුකිරීමට හැකිවන පරිදි ප්‍රාදේශීය සභාවන්හි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම මෙන්ම පළාත් පාලන ආයතන සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ බෙදාදීමත් සිදුකෙරේ.

සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය සභාව

බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල
මිණිපේ ප්‍රාදේශීය සභාව

සිදුකරන ලද අනෙකුත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්:

- ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙබ් අඩවියක් සකස් කිරීම - අඅඅ.චමර්බැටමප්.කන
- දුක් ගැනවිලි සමනය කිරීමේ යාන්ත්‍රණය සංවර්ධනය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම
- ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම
- ආරක්ෂණ ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම.

3.2.2.2. මහකොළඹ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

කොළඹ සහ අවට නගරවල ජීවත්වන 838,000 ක පමණ ජනතාව සඳහා උචිත සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් ලබාදීමේ අරමුණින් මහ කොළඹ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කෙරිණි. එමෙන්ම මෙමගින් මහ කොළඹ ප්‍රදේශයේ මිලියන 2.5 ජනතාව සඳහා ජීවත් වීමට වඩාත් උචිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය කොළඹ, දෙහිවල-ගල්කිස්ස, කොලොන්නාව යන පළාත් පාලන ආයතන 3 ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වේ. කොළඹ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම කොළඹ මහා නගර සභාව මගින් සිදු කරන අතර පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය පරිපාලන කටයුතු සිදු කරයි.

තාක්ෂණික, ආයතනික, කළමනාකරණ සහ මෙහෙයුම් දුෂ්කරතා යන ගැටලු වලට ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල අනුව ආයෝජනය කිරීමේ පදනමින් ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර ඇත. කොළඹ මහා නගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි අපජල ප්‍රවාහන පද්ධතිය නවීකරණය සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු ගත මුදල (අවිනිශ්චිත මුදල ඇතුළුව) රුපියල් මිලියන12,171 වන අතර මෙම මුදලින් රුපියල් මිලියන 10,455 ක් ශ්‍රී ලංකා රජය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලබාගත් ණයක් මගින් සපයන අතර ඉතිරි මුදල ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් ආයෝජනය කර ඇත.

අරමුණ

කොළඹ නගරයේ අපජල ප්‍රවාහන පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම මඟින් නගරයේ සහ අවට නගරවල ජීවත් වන වැසියන් සඳහා ක්‍රමවත් අපජල ප්‍රවාහන පද්ධතියක් ලබා දීම තුළින් ඔවුනට උචිත සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.

අරමුදල් මූලාශ්‍ර	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව /ශ්‍රී ලංකා රජය	
සමස්ථ ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මි.)	12,171.00	
ව්‍යාපෘති කාලය	2010-2019	
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශය	කොළඹ මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය	
සමස්ථ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)	8156.44	
සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	77%	
2017 ප්‍රතිපාදන රු.මි.	3380ග00	
2017 12.31 දිනට මූල්‍ය ඉලක්ක/ ප්‍රගතිය (රු.මි.)	3380ග00	1775.74
2017.12.31 දිනට භෞතික ඉලක්ක/ ප්‍රගතිය	85	77%

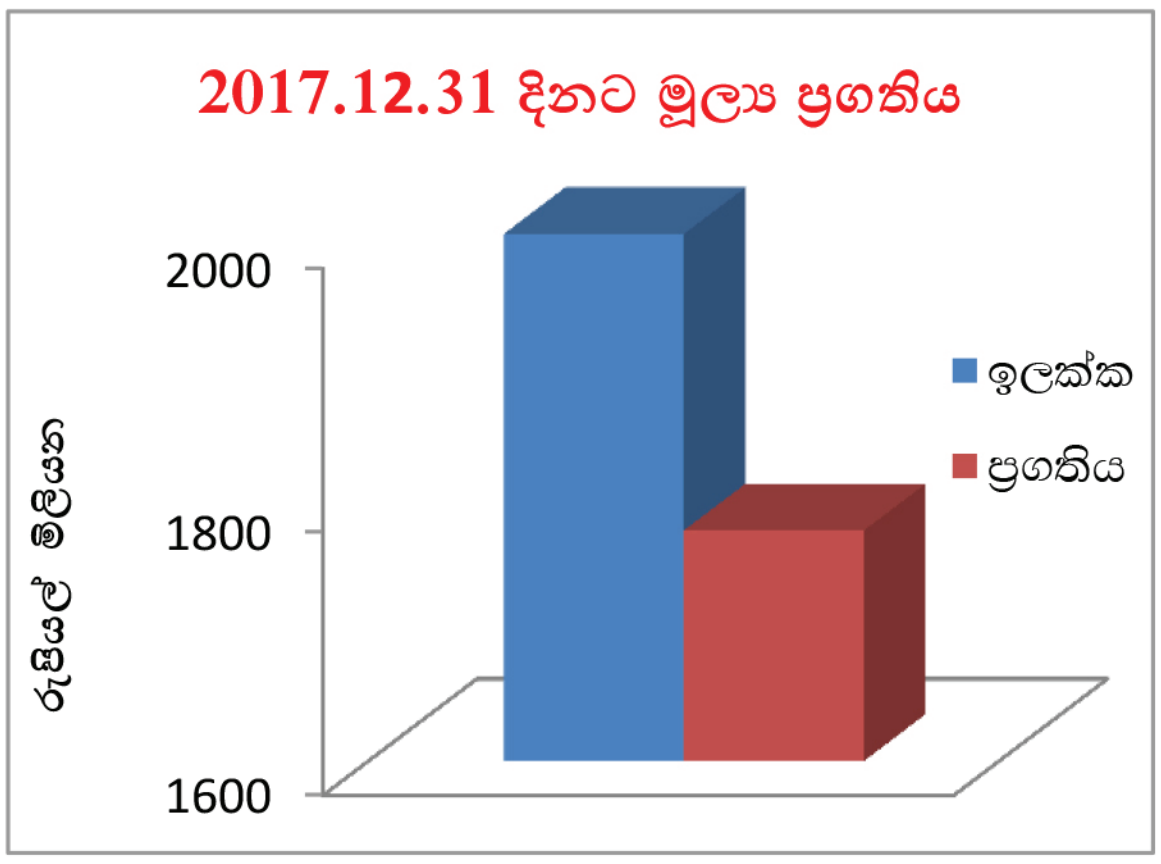

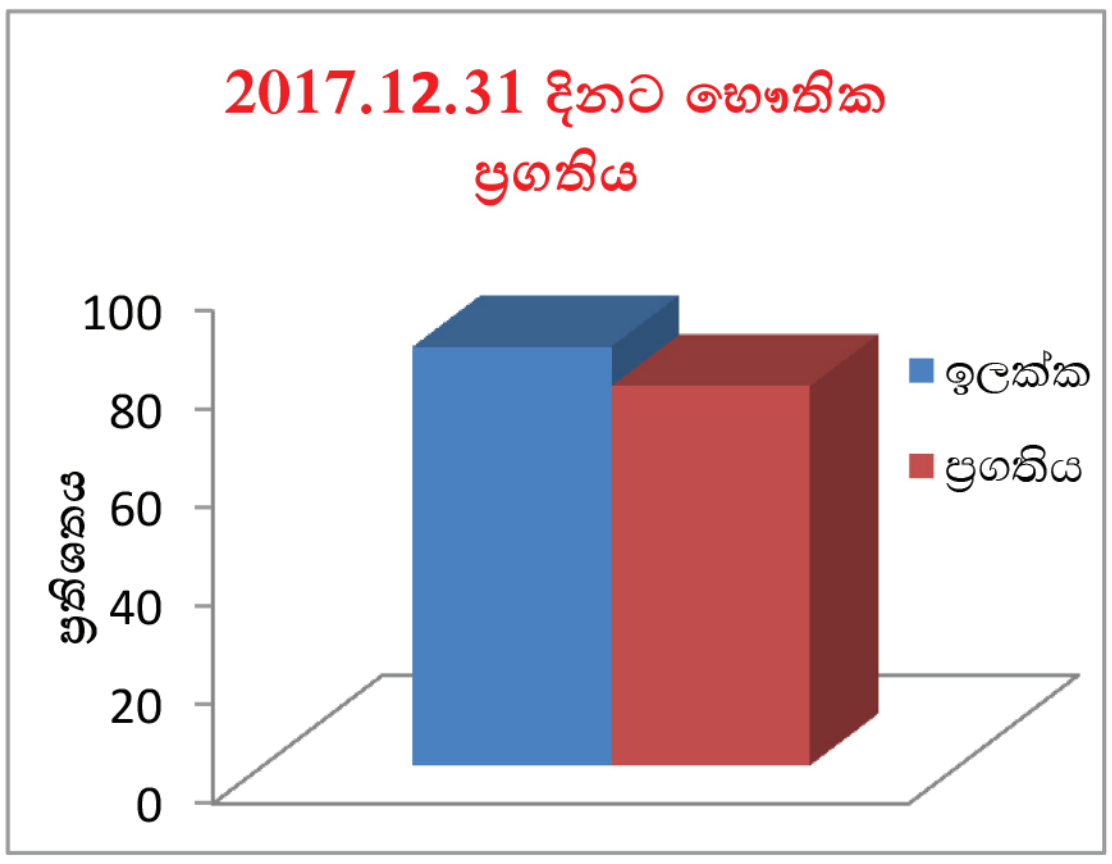

අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2017

අංකය	විස්තරය	2017 දෙසැම්බර් 30 ප්‍රගතිය	2018 ක්‍රියාකාරී සැලස්ම
01	වැල්ලවත්ත හා මුතුවැල්ල පිහිටි අපජලය මුහුදට මුදාහරින නල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	වැඩ නිම කර ඇත.	වැඩ නිමකර ඇත.
02	අපජල පවාහන නල මාර්ගයේ ධාරිතාවය අඩු කි මී 10 ක ප්‍රමාණයේ ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම සහ කි මී 125 ක තත්ත්ව සමීක්ෂණය කිරීම	අපජල පවාහන පද්ධතියේ තත්ත්ව සමීක්ෂණ කිරීමේ දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම සඳහා සිදු කරන CCTV සමීක්ෂණය හා පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීම වැඩ අවසන් කර ඇත. U1, U3, T36 සහ T34 ස්ථාන වල නවීකරණ කටයුතු අවසන් කර ඇත. M26 ස්ථානයේ නල සම්බන්ධ කිරීම 63.18% ක් අවසන් කර ඇත. සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය 93.4% කි. සමුද්‍ර මාවතෙහි සහ රුජින මාවතෙහි කි. මී. 3.3 ක ප්‍රමාණයක් Micro tunneling තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් අපජල නල නැවත එලීම අවසන් කර ඇත.	මාලිගාවත්ත අපජල පොම්පාගාරය දක්වා M26 අපජල පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම.
03		සීවලී මාවතෙහි සහ සරණපාල හිමි මාවතෙහි මීටර් 662 අපජල නල එලා ඇති අතර මනුබිල් 27 ක ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇත. මුළු භෞතික ප්‍රගතිය 65%. කොන්ත්‍රාත්තුව නවතා ඇත.	කොන්ත්‍රාත්තුව නවතා ඇත.

04		පොම්පාගාර නව ඉදිකිරීමේ හා නවීකරණය කිරීමේ භෞතික ප්‍රගතිය පහත පරිදි වේ.	පොම්පාගාර ඉදිකිරිම සහ වනාතමුල්ල විස්ට්වික් නල එලීම.
		මධ්‍යම මෙහෙයුම් ඒකකය හා නව පොම්පාගාර 4ක් වැඩ ආරම්භ කර ඇත. ප්‍රධාන වැඩපලේ කටයුතු 84.4%ක් අවසන්ය. වනාතමුල්ල පොම්පාග ාරය 50% මාලිගාවත්ත - 34.4% බොරැල්ල - 2.7% බම්බලපිටිය - 53.3% විස්ට්වික් - 40.7% තිඹිරිගස්යාය - 32.4% CS3 - 19.5% SlaveIsland - 17.3% සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය 28.9%	ප්‍රධාන වැඩ පල ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීම.
05	CS19 අපජල පද්ධතිය නවීකරණය සහ වනාතමුල්ල අවශේෂ අපජල පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම	ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකිරීම.	මල්ලිකාරාම පාර සහ දුම්රිය නිලනිවාස පාර සහ ස්ථානවල අනවසර පදිංචි පවුල් 11 ක් ගෝනමුල්ල " රන්දිය උයන" නිවාස වල පදිංචි කරවීම.
06	නැවත පදිංචි කිරීම	මල්ලිකාරාම පාර සහ දුම්රිය නිලනිවාස පාර සහ ස්ථානවල අනවසර පදිංචි පවුල් 11 ක් ගෝනමුල්ල " රන්දිය උයන" නිවාස වල පදිංචි කරවීම. පදිංචි කරවීම් කටයුතු සිදුකිරීම.	පදිංචි කරවීම් කටයුතු සිදුකිරීම.

3.2.2.3. මහකොළඹ අපජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන - (GCWWMIIP)

අදියර 2 සහ අදියර 3

කොළඹ මහා නගර සහා සීමාව තුළ කාර්යක්ෂම හා අඛන්ඩ ජල සැපයුමක් සහ විධිමත් අපජල සේවාවක් ලබාදීම මහ කොළඹ ජල සහ අපජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණුකිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහනේ අපේක්ෂාවයි.

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ බහු කාර්යය සංවර්ධන ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින කොළඹ අපජල පවාහන පද්ධති යේ අලුත්වැඩියා කටයුතු ඉදිරියට සිදු කිරීමට හා කොළඹ ප්‍රදේශයේ ජල හා අපජල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන සපයයි. මෙම ප්‍රතිපාදන මගින් කොළඹ දකුණ ප්‍රදේශයේ ඉදිරි නව සංවර්ධන කටයුතු වලට සරිලන පරිදි අපජල පවාහන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම, දැනට අපජල පහසුකම් නොලබන ප්‍රදේශ සඳහා අපජල පවාහන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම සහ අපජලය මුහුදට මුදා හැරීමට පෙර පිරිපහදු කිරීම සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා රජය මේ සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අරමුදල් වලට අමතරව පරිපූරක අරමුදලක් යුරෝපානු ආයෝජන බැංකුවෙන් (ඈෂර්) ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි.

අරමුණ

කොළඹ මහා නගර සහා සීමාව තුළ කාර්යක්ෂම හා අඛන්ඩ ජල සැපයුමක් සහ විධිමත් අපජල සේවාවක් ලබා දීම.

අරමුදල් මූලාශ්‍රය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ශ්‍රී ලංකා රජය	
සමස්ත ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මි.)		
අදියර 2	1396.0	
අදියර 3	26,061.00	
ව්‍යාපෘති කාලය		
අදියර 2	2014-2019	
අදියර 3	2015-2020	
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශය	කොළඹ මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය	
සමස්ථ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)	902.53	
සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	6.8%	
අදියර 2		
2017 ප්‍රතිපාදන රු.මි.	280	
2017.12.31 දිනට මූල්‍ය ඉලක්ක/ප්‍රගතිය (රු.මි.)	280	74.3%
2017.12.31 දිනට භෞතික ඉලක්ක/ප්‍රගතිය	26.9%	22.5%
අදියර 3		
2017 ප්‍රතිපාදන රු.මි.	2456	
2017.12.31 දිනට මූල්‍ය ඉලක්ක/ප්‍රගතිය (රු.මි.)	2456	776.1
2017.12.31 දිනට භෞතික ඉලක්ක/ප්‍රගතිය	7.6%	5.9%

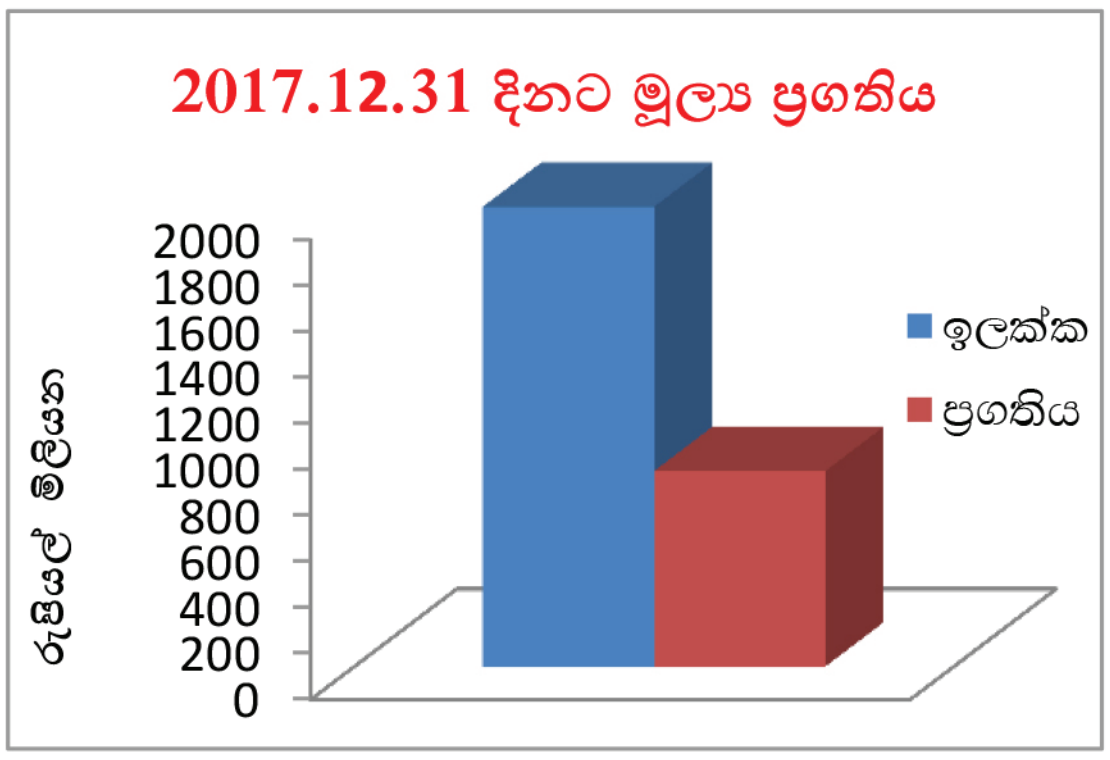

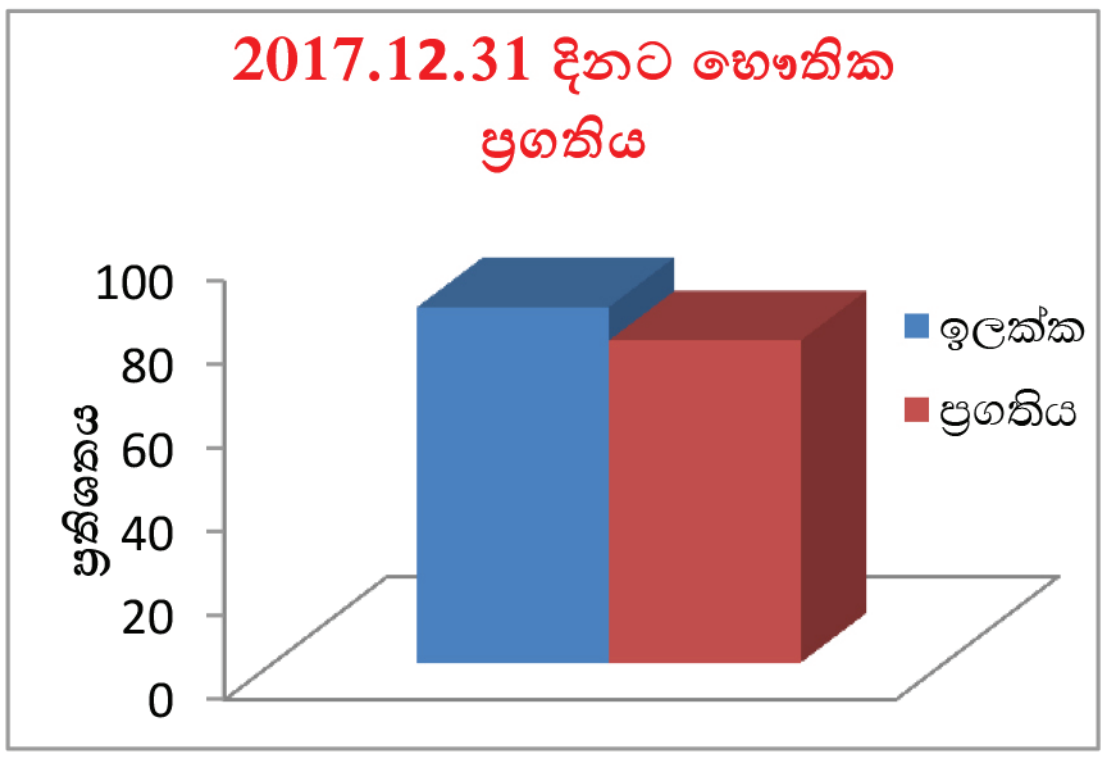

අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2018

අංකය	විස්තරය	2017 දෙසැම්බර් 31 ප්‍රගතිය	2018 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
01	සැලසුම් කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම සහ ආයතනික සංවර්ධනය සඳහා සහාය වීමේ උපදේශකවරු	උතුරු පෝෂක ප්‍රදේශය සැලසුම් කිරීම දකුණු පෝෂක ප්‍රදේශය සැලසුම් කිරීම භෞතික ප්‍රගතිය 16.5%.	උතුරු සහ දකුණු පෝෂක ප්‍රදේශ අපජල පද්ධතිය සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කිරීම කිරුළපන සහ වැල්ලවත්ත ඉදිකිරීම් අධික්ෂණ කිරීම.වරාය නගර සංවර්ධනය සම්බන්ධ වීමෙන් ව්‍යාපෘතිය තවත් පුලුල් වී ඇත.
01	අපජල පවාහන පද්ධතියේ කි මී 125 ක් කැමරා සමීක්ෂණ හා පිරිසිදු කිරීම මඟින් තත්ත්ව සමීක්ෂණ කිරීම.	අපජල පවාහන පද්ධතියේ තත්ත්ව සමීක්ෂණය කළයුතු කොටස් හඳුනා ගෙන ඒ සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකිරීම.	CCTV තාක්ෂණය භාවිතයෙන් අපජල පවාහන පද්ධතියේ තත්ත්ව සමීක්ෂණය
02	දැනට කොළඹ කිරුළපන ප්‍රදේශයේ අපජල පහසුකම් නොලබන ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි කි. මී. 29.40 ක් දුර අපජල නල පද්ධතියක් හා පොම්පාගාර 3 ක් ඉදි කිරීම.	වැඩ ආරම්භ කර ඇත. භෞතික ප්‍රගතිය 7.4%.	පොම්පාගාර සහ අපජල පවාහන පද්ධතියේ ඉදිකිරීම

03	කි මි 15.61 අපජල නල අලුත්වැඩියා කිරීම, නැවත එලීම හා පිරිසිදු කිරීම තුළින් කොළඹ දකුණ අපජල පෝෂිත ප්‍රදේශයේ දැනට පවතින අපජල පද්ධතියේ අපජල නල බිඳ වැටීම් අවහිරතා සහ රොන්මඩ හා වැලි ඒකරාශීවීම් හඳුනා ගැනීම හා පිළියම් යෙදීම	සැලසුම් කටයුතු සිදු කරයි.භෞතික ප්‍රගතිය 10.4%.	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සහ අපජල පවාහන පද්ධතියේ අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීම
04	කොළඹ දකුණ අපජල පෝෂිත ප්‍රදේශයේ කි. මි. 6.22 ක් දිග අපජල පවාහන පද්ධතිය සහ පොම්පාගාර 3 ක් ඉදිකිරීම.	පස් නියැදි සාම්පල් විමර්ශණය, ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ කටයුතු, අපජල පවාහන පද්ධතිය සහ පොම්පාගාර සැලසුම් කිරීම. භෞතික ප්‍රගතිය 22%.	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සහ අපජල පවාහන පද්ධතිය ඉදිකිරීම
05	සැලසුම් ඉදිකිරීම් සහ ක්‍රියාකිරීම් ක්‍රමවේදය යටතේ දිනකට ඝණ මීටර් 50,000 ක ධරිතාවයෙන් යුතු ද්වීතිය අපජල පිරිපහදු කර්මාන්ත ශාලාවක් වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම.	ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකිරීම. භෞතික ප්‍රගතිය 5%.	කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සමීක්ෂණ කටයුතු සහ සැලසුම් සකස් කිරීම
06	නැවත පදිංචි කිරීම	කිරුළපන අපජල ව්‍යාපෘතිය යටතේ පවුල් 10 ක් කොළොන්නාව "ලක්සිරි සෙවන" නිවාස වල පදිංචි කරවීම සැලසුම් කිරීම.	අදාල පවුල් පදිංචි කරවීම.

19.6.2017 08:52

12.5.2017 08:22

D.P. JAYASINGHE
PC
120
7.6.2017 11:14

3.2.2.4. උතුරු පාළාත් මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය (ආරම්භක)

අරමුණු:
උතුරු පළාත තුළ වව්නියාව සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි මාර්ග ජාලය වැඩිදියුණු කිරීම මගින් පළාත තුළ සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සහ උතුරු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ශක්තිමත් කිරීම.

	ණය ආධාර ලබාදෙන ආයතනය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	
	ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මිලියන)	3600.00	
	ව්‍යාපෘති කාලය	2010 - 2016	
	ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	උතුරු පළාත	
	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය	100%	
	සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)	3281.11	
	2017 ප්‍රතිපාදන රු.මි.	200.31	
	2017.12.31 දිනට මූල්‍ය ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	200.31	149.78
	2017.12.31දිනට භෞතික ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	100%	100%

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉල්ලීම මත ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ඇ.ඩො. මිලියන 173 ක ණය ආධාරයක් දිවයිනේ උතුරු කොටසේ තෝරාගත් ජාතික හා පළාත් මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ලබාදී ඇත. එයින් ඇ.ඩො.මිලියන 24.4ක් පළාත් සංරචකය යටතේ උතුරු පළාතේ තෝරාගත් මාර්ග කි.මී.154 ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා සහ උතුරු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යොදාගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන
උතුරු පළාතේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

භෞතික ප්‍රගතිය
මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළාත් සංරචකය යටතේ උතුරු පළාතේ මාර්ග කොන්ත්‍රාත් 08ක් සහ ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත් 01 පිරිනමා ඇති අතර, මේ වන විටත් එම මාර්ග කොන්ත්‍රාත් 08 සහ ගොඩනැගිලි

කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ නිම කර ඇත.

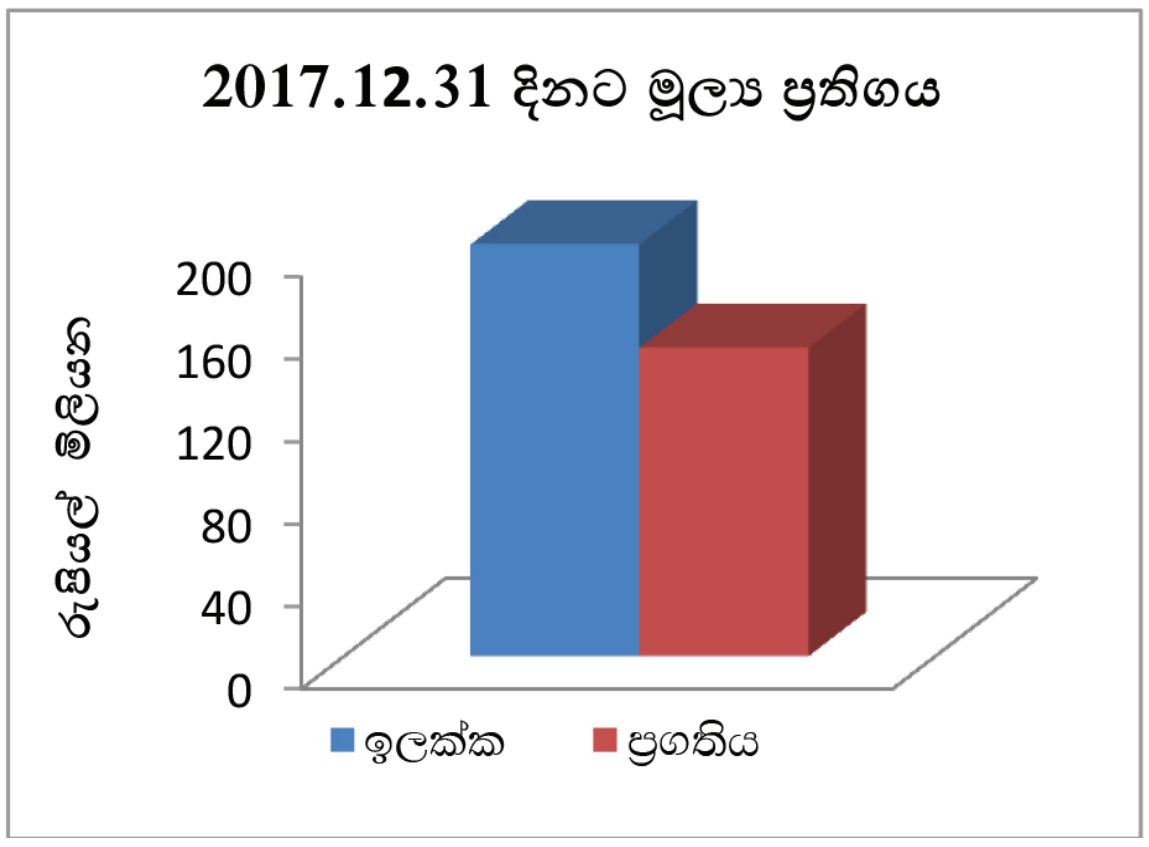

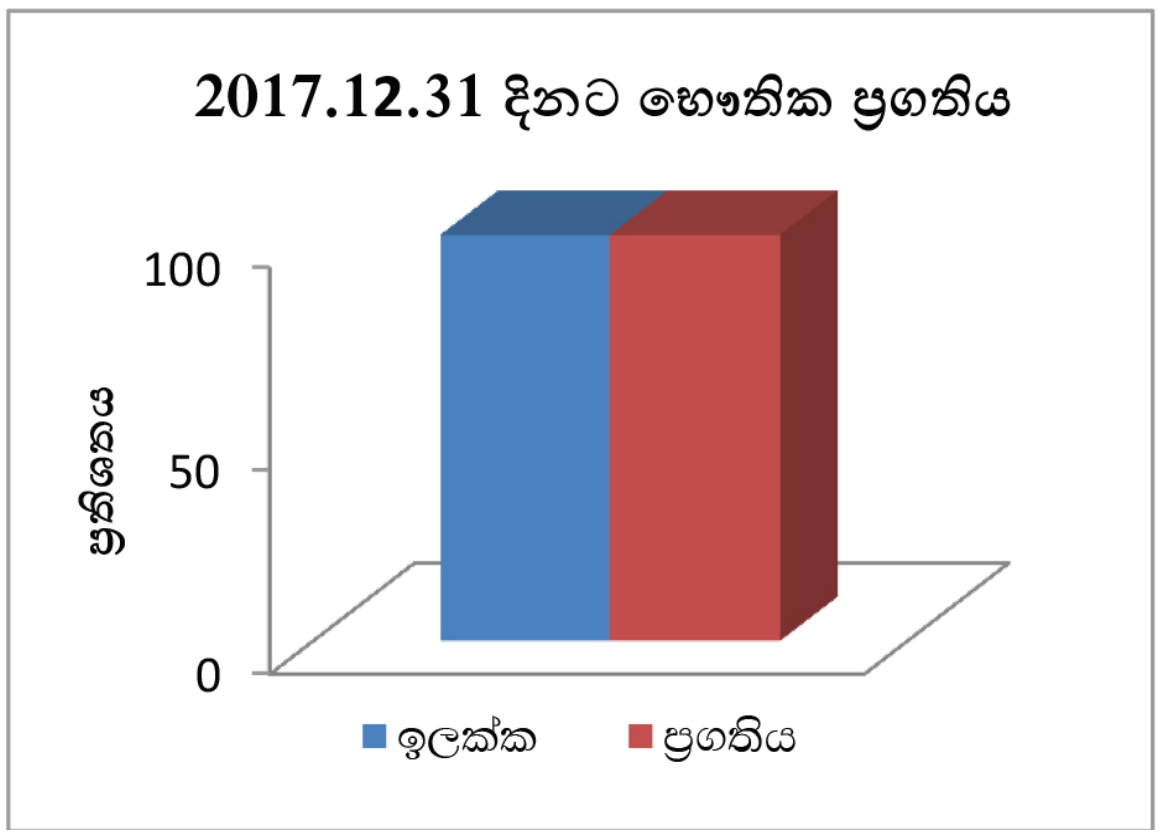

වගු අංක 17 - ප්‍රගතිය - උතුරු පළාත් මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය (ආරම්භක) - (2017.12.31 දිනට)

කොන්ත්‍රාත් අංකය	දිස්ත්‍රික්කය	ආරම්භක කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම	සංශෝධිත රු වටිනාකම රු.මි.	සත්‍ය වියදම	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	ව්‍යාපෘති කාලය		භෞතික ප්‍රගතිය	
						ආරම්භක දිනය	අවසන් කළ දිනය	ඉලක්කගත %	සත්‍ය %
NP - 01	මන්නාරම	414.06	457.93	437.12	95.46%	2011-10-02	21/06/2013	100%	100%
NP - 02		413.23	454.72	448.03	98.53%	2011-11-02	31/05/2014	Mutually Terminated	
NP - 03		371.68	378.32	364.34	96.31%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 02R		345.54	345.54	313.67	90.78%	24/02/2015	31/07/2016	100%	100%
NP - 09		507.69	507.69	455.84	89.79%	16/03/2015	30/09/2016	100%	100%
NP - 04	වව්නියාව	351.92	351.92	312.40	88.77%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 05		390.64	448.44	426.08	95.02%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 06		355.42	279.11	263.38	94.36%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 07	යාපනය PRDD කොඩිකාමම්	76.69	88.24	83.32	94.42%	2014-10-06	2015-09-06	100%	100%
එකතුව		3,227	3,312	3,104.18					

මූලාශ්‍රය-උතුරු පළාත් මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය(ආරම්භක)

NP- 03 - Uinkulama-Mankulama Nanattan Culvert Construction

NP- 03 – Uinkulama-Mankulama Nanattan Culvert Construction

NP- 02R - Veppankulam Periyamurippu Road (MAC029)

NP- 02R - Veppankulam Periyamurippu Road (MAC029)

NP- 09 - Mahilankulam Pallamadu Road (MAC028)

NP- 09 - Mahilankulam Pallamadu Road (MAC028)

NP- 04 - Iretperiyakulam Puthoor Road (VAC027)

NP- 04 - Pandichurichan Andiyappuliyankulam Road (VAC034)

NP- 05 - Madukanthai Iretperiyakulam Road (VAC007)

NP- 05 - Mahilankulam Pallamadu Road (VAC010)

NP- 5 – Mahilanulam Pallmadu Road

NP- 05 – Madukanda Irattaperiyakulam Road

NP- 06 - Mankulam Maruthamadu Mingettigama Road (VAC032)

NP- 06 - Puthoor Palamoddai Road (VAC014)

3.2.2.5. උතුරු පළාත් මාර්ග සම්බන්ධිත ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක ප්‍රතිපාදන)

අරමුණු

උතුරු පළාත තුළ කිළිනොච්චිය සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි සහ උතුරුමැද පළාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ මාර්ග ජාලය වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් පළාත තුළ අභ්‍යන්තර සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සහ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ආයතනයන් ශක්තිමත් කිරීම.

ණය ආධාර ලබාදෙන ආයතනය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	
ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මිලියන)	4,600.00	
ව්‍යාපෘති කාලය	2013 - 2018	
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත	
සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය	98%	
සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)	4104.26	
2017 ප්‍රතිපාදන : රු.මිලියන	600.72	
2017 .12.31 දිනට මූල්‍ය ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	600.00	360.76
2017 .12.31දිනට භෞතික ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	100%	98%

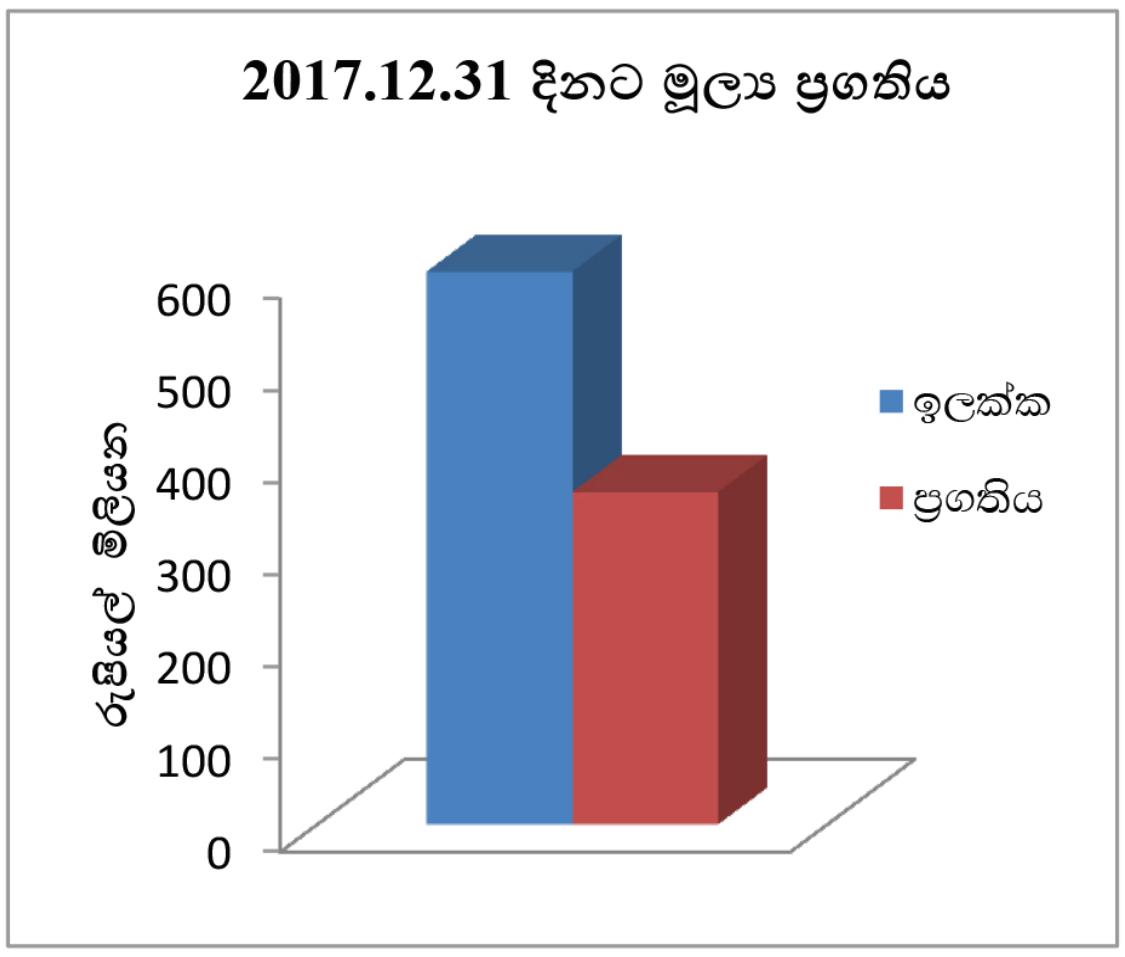

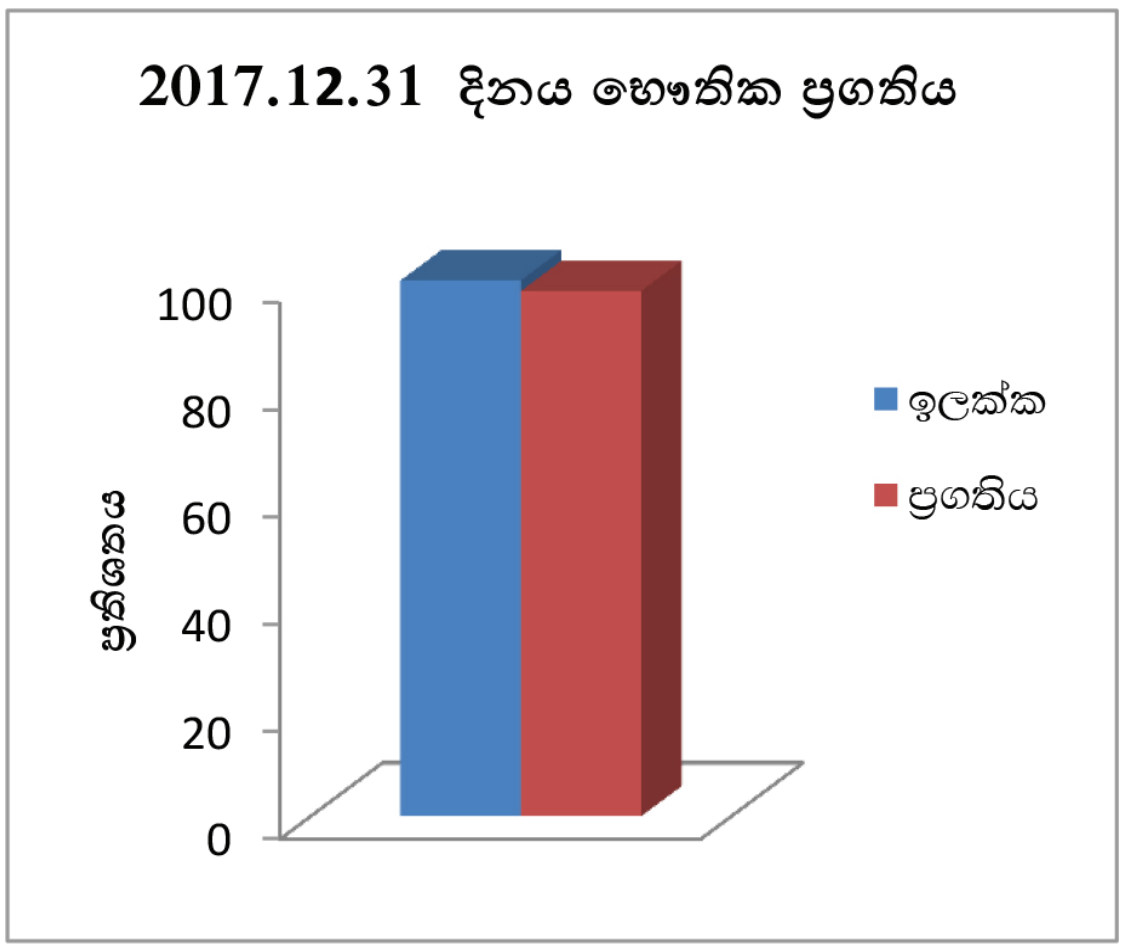

මුල් ව්‍යාපෘතියේ සාර්ථකත්වය පදනම්ව ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉල්ලීම මත ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් උතුරු පළාත් මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතියට අතිරේක මූල්‍යයක් ලෙස ඇ.ඩො. මිලියන 68ක ණය ආධාරයක් දිවයිනේ උතුරු කොටසේ තෝරා ගත් ජාතික හා පළාත් මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ලබා දී ඇත. එයින් ඇ.ඩො. මිලියන 30 ක් පළාත් සංරචකය යටතේ උතුරු සහ උතුරුමැද පළාත්වල තෝරාගත් පළාත් මාර්ග කි.මී125 ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා සහ උතුරු සහ උතුරුමැද පළාත් මාර්ග ආයතනයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යොදාගැනීමට කටයුතු කෙරේ.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය

උතුරු පළාතේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ උතුරුමැද පළාතේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

භෞතික ප්‍රගතිය

අතිරේක මූල්‍යනය යටතේ උතුරුමැද පළාතේ මාර්ග කොන්ත්‍රාත් 05ක් ද උතුරු පළාතේ මාර්ග කොන්ත්‍රාත් 04 ක් ද පිරිනමා ඇත. එයින් උතුරු මැද පළාතේ කොන්ත්‍රාත් 05 ම නිමකර ඇති අතර උතුරු පළාතේ කොන්ත්‍රාත් 04ද නිම කර ඇත. මෙම නිම කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවල අවුරුදු 05 කාලයක් සඳහා එම මාර්ග නඩත්තු කටයුතු අදාල කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින්ම ඉදිරියට කරගෙන යාමට නියමිතව ඇති අතර, එමඟින් නිම කරන ලද මාර්ගවල තිරසාරභාවය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළ හැක.

NRCP/NP/NCB/MU-03
Vattapalai Keppaipilavu Puthukudiyiruppu Road (MUC011)

NRCP/NP/NCB/MU-03
Vattapalai Keppaipilavu Puthukudiyiruppu Road (MUC011)

NRCP/NP/NCB/KL-06
L.B Main Chl.Road Akkarayankulam Road
(KLC004)

NRCP/NP/NCB/KL-06
R.B Main Chl.Road Akkarayankulam Road
(KLC014)

කෙන්නඩි පාර

ඔඩ්ඩුසුඩාන්-පුදුකුඩිරිප්පු මාතලන් පාර

වගු අංක 18 - දැනට ක්‍රියාත්මක මාර්ගවල ප්‍රගතිය, උතුරු පළාත් මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය (අතිරේක ප්‍රතිපාදන)

පළාත	දිස්ත්‍රික්කය	මාර්ගයේ නම	දිග ප්‍රමාණය (කි.මී.)	ඇස්තමේන්තුව රු.මි.	වියදම රු.මි.	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය	
							ඉලක්කය	ප්‍රගතිය %
උතුරු	කිලිනොච්චි	එල්.බී. ප්‍රධාන මාර්ගය, අක්කරයාන්කුලම මාර්ගය (කි.මී.7.06), ආර්.බී. ප්‍රධාන මාර්ගය, අක්කරයාන්කුලම (කි.මී. 6.6)	13.66	473.19	307.45	64.97%	100%	78%
		කෙන්නඩි මාර්ගය (කි.මී. 7.01) ගොවිපල ප්‍රවේශ මාර්ගය (කි.මී. 3.35)	10.45	456.55	451.33	98.86%	100%	100%
උතුරු මැද	මුලතිව්	වට්ටපලායි - කෙප්පායිපිලව් පුදුකුඩියිරුප්පු මාර්ගය	12.85	647.63	566.21	87.43%	100%	97%
		ඔට්ටුසුඩාන් පුදුකුඩියිරුප්පු පුදුමාතලන් මාර්ගය	11.64	463.38	421.75	91.39%	100%	100%

	අනුරාධපුරය	කැබිතිගොල්ලෑව හඳගල මාර්ගය	12.09	295.34	282.11	95.52%	100%	100%
		දව්විදමන පරණ හල්මිල්ලෑව මාර්ගය(කි.මී. 4.70) තේක්කවත්ත පුල්ලේලිය මාර්ගය(කි.මී. 5.68)	10.35	343.31	266.94	77.76%	100%	100%
		කිරිකැටිවැව බණ්ඩාර උල්පත කපුගොල්ලෑව මාර්ගය	20.30	559.91	484.51	86.53%	100%	100%
		යකාවැව මහා කොන්ගස්කඩ මාර්ගය	13.80	458.55	388.63	84.75%	100%	100%
		ඇත්කඳ ඇටඹගස්කඩ මාර්ගය(කි.මී. 6.80) කිරිගල්ලෑව හීරුළුගම මාර්ගය (කි.මී. 11.50)	18.30	408.80	356.25	87.15%	100%	100%
එකතුව			**124.25**	**4104.81**	853.98	85.88		

3.2.2.6. යාපනය - කිළිනොච්චි ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය

අරමුණු

යාපනය හා කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කවල ජල සැපයුම් සේවා වැඩිදියුණු කිරීම යාපනය මහා නගර සභා සීමාව තුළ ජනතාව සඳහා සනීපාරක්ෂක යටිතල පහසුකම් හා යාපනය අර්ධද්වීපයේ ජල සැපයුම් කළමනාකරණ වැඩසටහන් ශක්තිමත් කිරීම විවිධ ප්‍රවිශයන් යටතේ උතුරු පළාතේ වාරිමාර්ග පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ පළමු වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිය මෙය වේ. එම ප්‍රවේශයන් අතර ජල කළමණාකරණය, කෘෂිකර්මාන්තය හා අලෙවිකරණය වඩාත් කැපී පෙනේ. වාරිමාර්ග ඒකාබද්ධ කළමණාකරණය, නඩත්තු කටයුතු සඳහා මුදල් වෙන් කිරීම, කෘෂිකාර්මික කටයුතු සැලසුම්කරණය සඳහා ව්‍යාපෘති කමිටු පිහිටුවීම, තොග ජල සැපයුම් වෙන්කිරීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ ජලය බෙදාහැරීම, වෙළඳ ගිවිසුම් ඇති කරීම සඳහා අලෙවිකරණ ප්‍රවර්ධන කටයුතු හා කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාර සඳහා ණය පහසුකම් ලබාදීම ඉහත ප්‍රවේශයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ප්‍රධන ක්‍රියාකාරකම් වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන නිමැවුම් හා බලපෑම් උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම හා කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් සපයා තිබේ.

ව්‍යාපෘතියේ නිමැවුම් හා කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාවය ඉහළ යාම.

- ❖ වාරිමාර්ග පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය .
- ❖ ඉඩම් ඵලදායීතාව ඉහළ යාම.(හෙක්ටයාර 243)
- ❖ බෝග වගාකිරීමේ ඉඩම් ප්‍රමාණ භාවිතය වැඩි වීම.
- ❖ බෝග වගා කිරීමේ තීව්‍ර තාවය ඉහළ යාම.

ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන නිමැවුම් හා බලපෑම්.

ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යාපෘතිය ආවරණ ප්‍රදේශයේ සමස්ථ කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාවය ඉහළ යාම සිදුවිය. ඒ යටතේ පහත සඳහන් බලපෑම් උතුරු පළාතේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් ඇති වී තිබේ.

1. වාරිමාර්ග පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය කිරීම.
2. සමස්ථ වාරිමාර්ග පද්ධතිය පුළුල් වීම.

මේ යටතේ

- වගාබිම් ඵලදායීතාවය 50% කින් ඉහළ යාම.
- වගාබිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 688 කින් ඉහළ යාම.
- බෝග වගාකිරීමේ තීව්‍රතාවය 23% න් වැඩිවීම.

ඉරණමඩු ජලාශයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් තාක්ෂණයන් භාවිතා කර ඇත.

1. **ජල කාන්දුව පාලනය කිරීම සඳහා බැම්ම ශක්තිමත් කිරීම.**
   මෙම ජල කාන්දුව නිසා 30m ක් උස ජල ධාරිතාවන් පවත්වා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. එම නිසා මෙම බැම්ම හරහා සිරස් අතට අගලක් කපා එය මැටි ආස්තරයකින් සවිමත් කර ඇත. ඉන්පසු එම අගල බෙන්ටොයිට් මිශ්‍රණය මඟින් පුරවා පසුව ඉවත් කර එහි බිත්ති ශක්තිමත් කර ඇත. අනතුරුව එම අගල පස්, සිමෙන්ති, බෙන්ටොයිට් හා ජලය මඟින් පුරවා අගල වසා ඇත. මෙම තාක්ෂණය මඟින් ජල කාන්දුව පාලනය වී ඇත. මෙලෙස සකසන ලද බිත්තිය SCB ලෙස නම් කර ඇත.

2. **යාන්ත්‍රික රේඩියල් වාන් දොරටු ක්‍රියාත්මක කිරීම.**
යාන්ත්‍රික නොවන වාන් දොරටු පද්ධතිය වෙනුවට යාන්ත්‍රික වාන් දොරටු පද්ධතියක් සවි කරන ලදී. එමඟින් වාන් දොරටු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වේගය විනාඩියකට විවර 0.025 සිට මීටර් 2, මීටර් 3කින් ඉහළ දැමීමට හැකිවී තිබේ.

ණයආධාර ලබාදෙන ආයතනය	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	
ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මිලියන)	2,178.57	
ව්‍යාපෘති කාලය	2012 - 2020	
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්ක	
සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය	87%	
සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)	1,742.53	
2017 ප්‍රතිපාදන :රු.මිලියන	909.00	
2017 .12.31 දිනට මූල්‍ය ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	909.00	940.52
2017 .12.31දිනට භෞතික ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	100%	80%

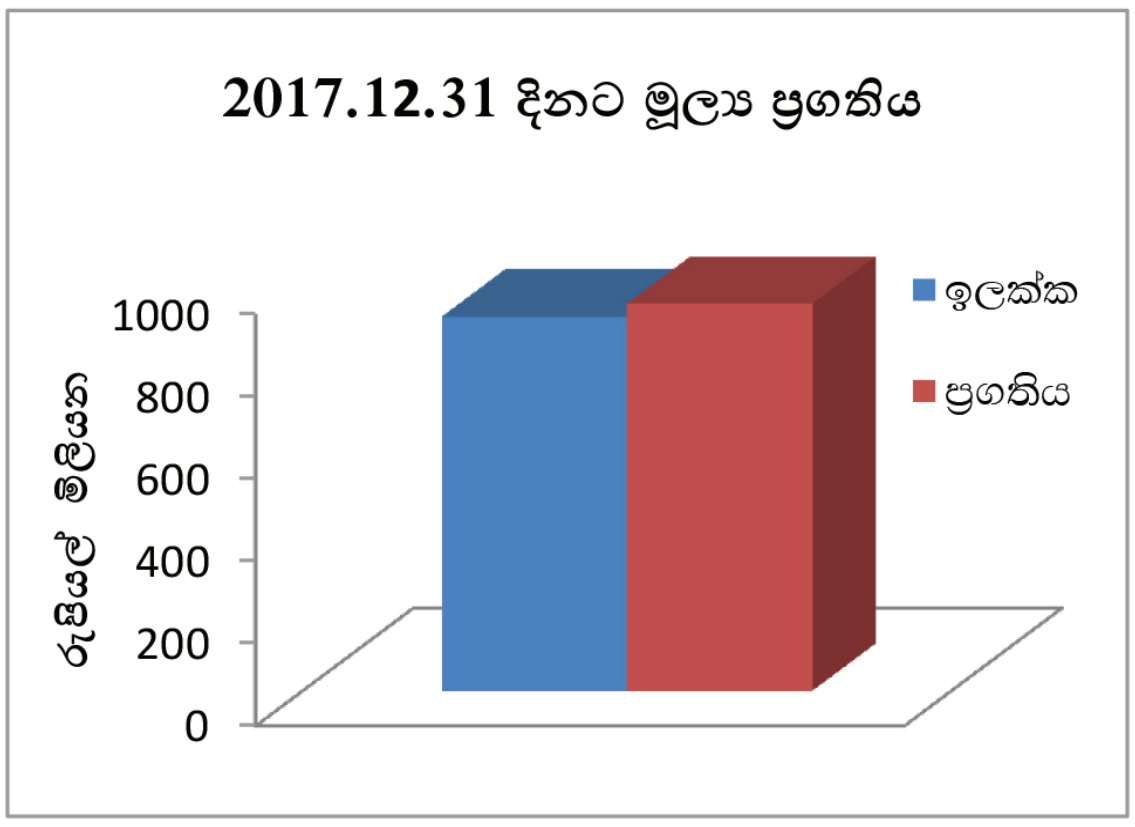

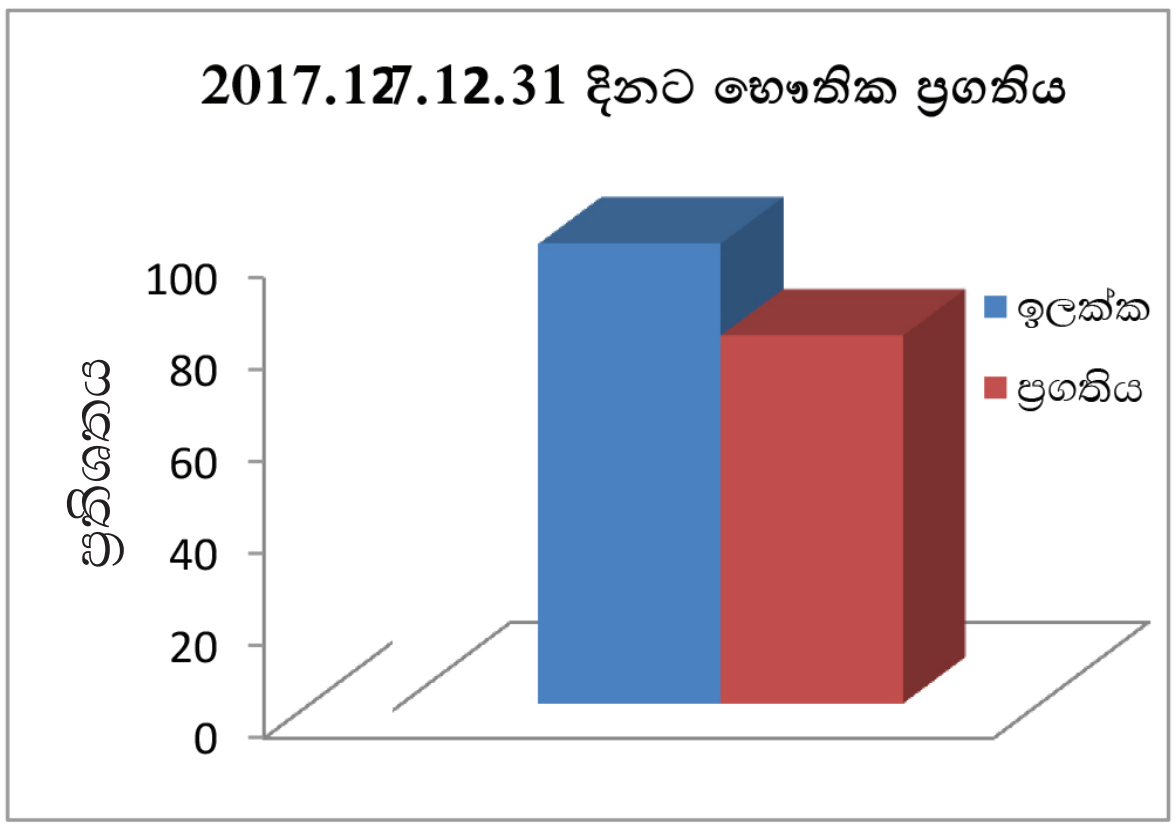

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය වන්නේ පළල් කරමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ඉරණමඩු ජලාශය හා ඉරණමඩු ජලාශය යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද අවසාන වාරිමාර්ග ක්‍රමය වේ.

මේ යටතේ ගොවිපවුල් 10,000කට පමණ ප්‍රතිලාභ සැලසෙන අතර වගා කළ හැකි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 8455කි. තිරුවයිආරු උත්සාන වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමය යටතේ හෙක්ටයාර් 447ක් වගා කළ හැකි නමුත් යුදගැටුම් සමයේ සිට එය ක්‍රියාත්මක නොවේ. මේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් යල කන්නයේ වගා කෙරෙන කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර 4000කින් පමණ වේ.

3.2.2.7. ද්විතීයික සෞඛ්‍ය අංශික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතියේ සංවර්ධන අරමුණු

මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතියෙහි කාර්ය සාධන මට්ටම් ඉහළ නැංවීම සහ එමඟින් මන්දපෝෂණය සහ බෝ නොවන රෝග ආදී අභියෝග සඳහා වඩාත් හොඳින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකියාව සැලැස්වීම මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණයි.

අරමුදල් සපයන නියෝජිත ආයතන	: ලෝක බැංකුව
සමස්ථ ව්‍යාපෘති වියදම	: රු.මි. 26,000 (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200)
පළාත් සෞඛ්‍ය සඳහා අපේක්ෂිත වියදම	: රුමි 15163.20 (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 105.5)
ව්‍යාපෘති කාල සීමාව	: 2013 - 2018
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රදේශ	: සමස්ත දිවයින
ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභීන්	: දිවයිනෙහි සමස්ත ජනතාව ඉලක්ක කෙරේ

- මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් මත යැපෙන වඩාත් දිළිඳු මෙන්ම පහසුවෙන් උපද්‍රවවලට ලක් විය හැකි ජනතාව
- ඌණ පෝෂණයෙන් යුතු පහසුවෙන් උපද්‍රවයට බඳුන් විය හැකි කණ්ඩායම්
- වයස අවු. 5ට අඩු දරුවන්, ගර්භණී මව්වරුන් සහ කිරි දෙන මව්වරුන් සහ නව යොවුන් වියේ ගැහැණු ළමුන්
- මාතෘ සහ ළමා සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ගැටලු
- බෝවන රෝග (ක්ෂය රෝගය, ඩෙංගු, ලෙප්ටොස්පයිරොයිස් ආසාදනය, එච්.අයි.වී / ඒඩ්ස්, ජලභීතිකාව සහ සතුන්ගෙන් බෝවන වෙනත් රෝග)
- තරුණ, වැඩකරන වයසේ සහ වැඩිහිටි ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවය මුහුණ දෙන බෝනොවන රෝග

ප්‍රධාන තේමාවන් සහ ක්‍රියාකාරකම්

- සෞඛ්‍ය පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම
- මාතෘ සහ ළමා සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණය
- බෝවන රෝග පාලනය සහ වැළැක්වීම
- බෝනොවන රෝග වැළැක්වීම සහ පාලනය
- වැඩමුළු, සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ සහ සමීක්ෂණ

සමුච්චිත භෞතික ප්‍රගතිය : 94%

සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය : රු. මි. 11,086

2017 වර්ෂය සඳහා වෙන් කිරීම් : රු.මි. 3,260

2017 වර්ෂය තුළ මූල්‍ය ප්‍රගතිය : ප්‍රගතිය: රු.මි. 3,130.50

2017 වර්ෂය තුළ භෞතික ප්‍රගතිය : ඉලක්කය: 100% ප්‍රගතිය: 96%

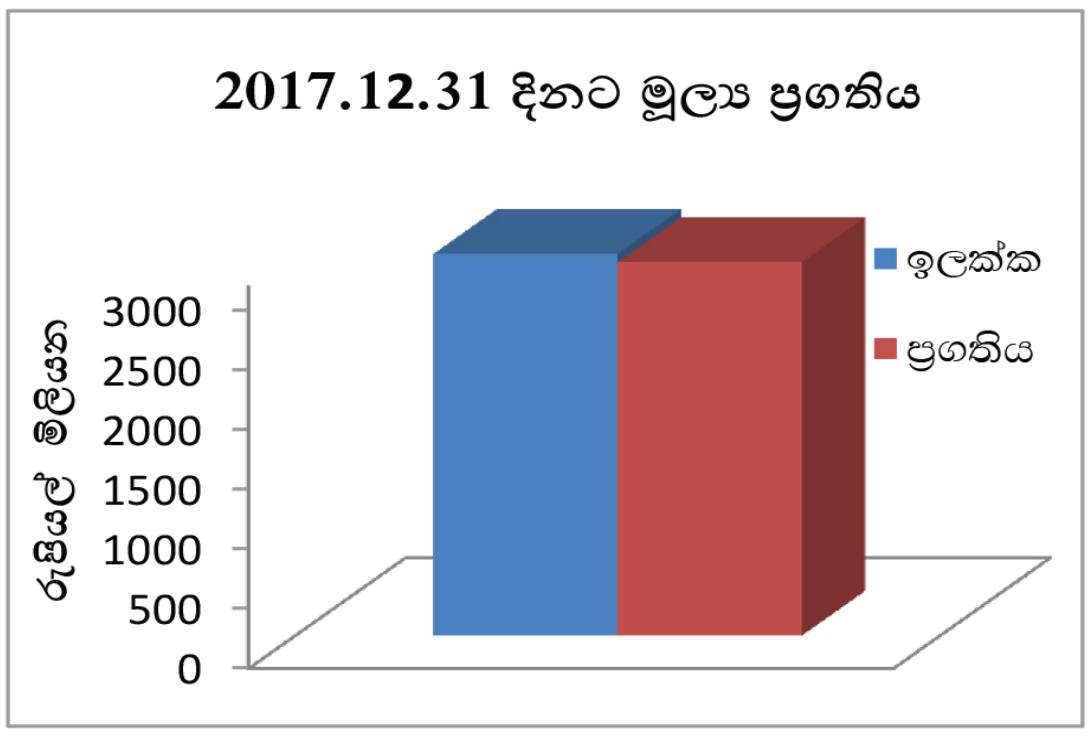

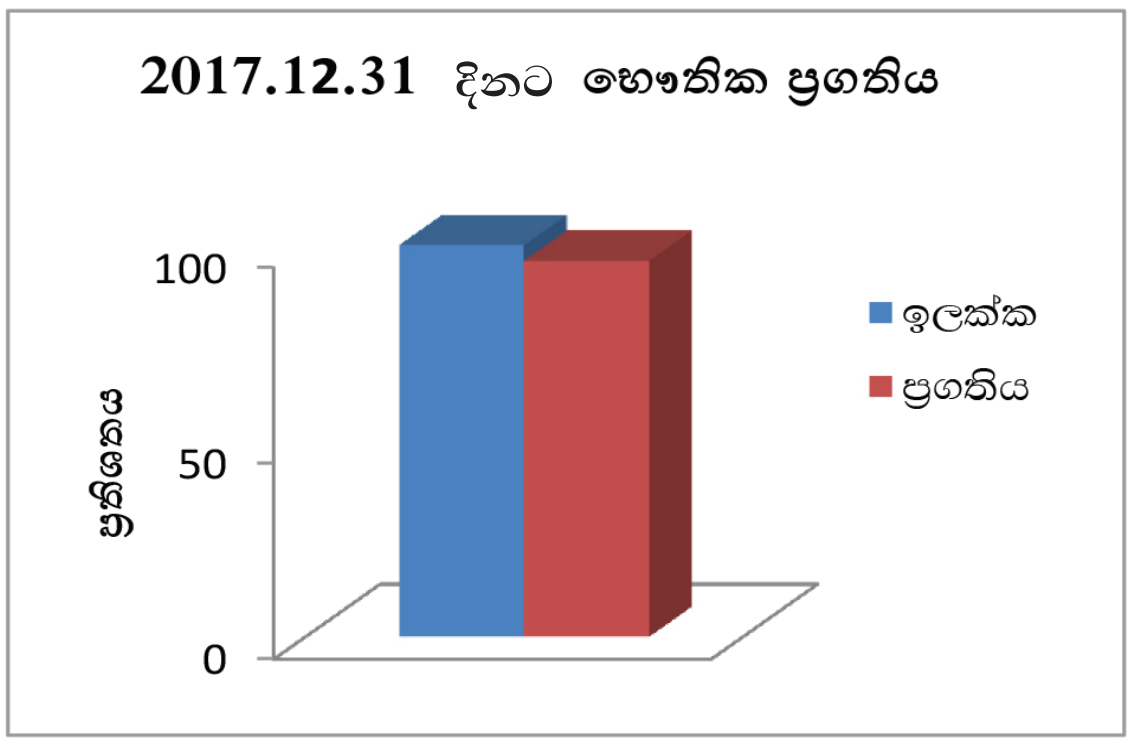

පළාත් අනුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති

අනු අංකය	නිම කරන ලද ව්‍යාපෘති	භෞතික ප්‍රගතිය									මුළු එකතුව
		බස්නාහිර පළාත	උතුරු පළාත	නැගෙනහිර පළාත	උතුරුමැද පළාත	මධ්‍යම පළාත	ඌව පළාත	වයඹ පළාත	සබරගමුව පළාත	දකුණු පළාත	
01	හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක පිහිටුවීම / වැඩිදියුණු කිරීම	36	51	44	27	89	41	53	50	45	**436**
02	රෝග තත්ත්ව හා මරණ තොරතුරු පරිගණක ගතකරන පළාත් සභා රෝහල්	40	49	46	51	85	40	49	35	48	**443**
03	මාතෘ හා ළමා හදිසි ප්‍රතිකාර සායන වැඩිදියුණු කිරීම	434	274	370	220	598	381	494	372	492	**3635**
04	සුව දිවි මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපනය කිරීම	36	30	44	28	46	24	39	29	46	**322**
05	තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය(QM)	10	11	13	05	06	07	06	04	08	**70**
06	ඖෂධ ගබඩා අළුත්වැඩියා කිරීම	-	04	76	08	35	20	16	28	-	**187**

Second Health Sector Development Project (SHSDP)

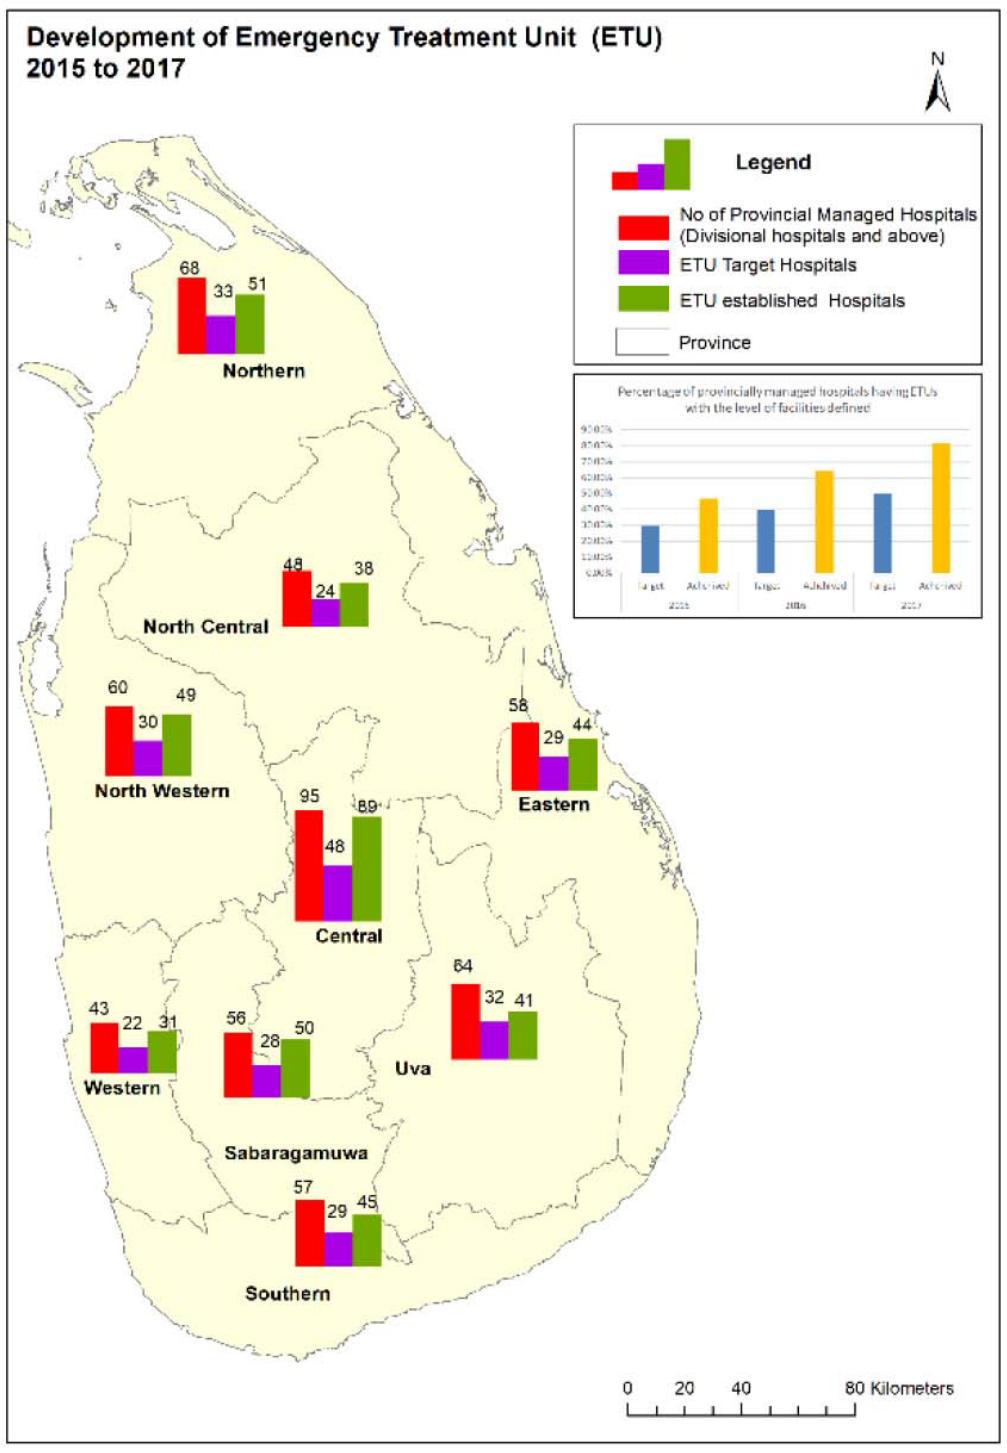

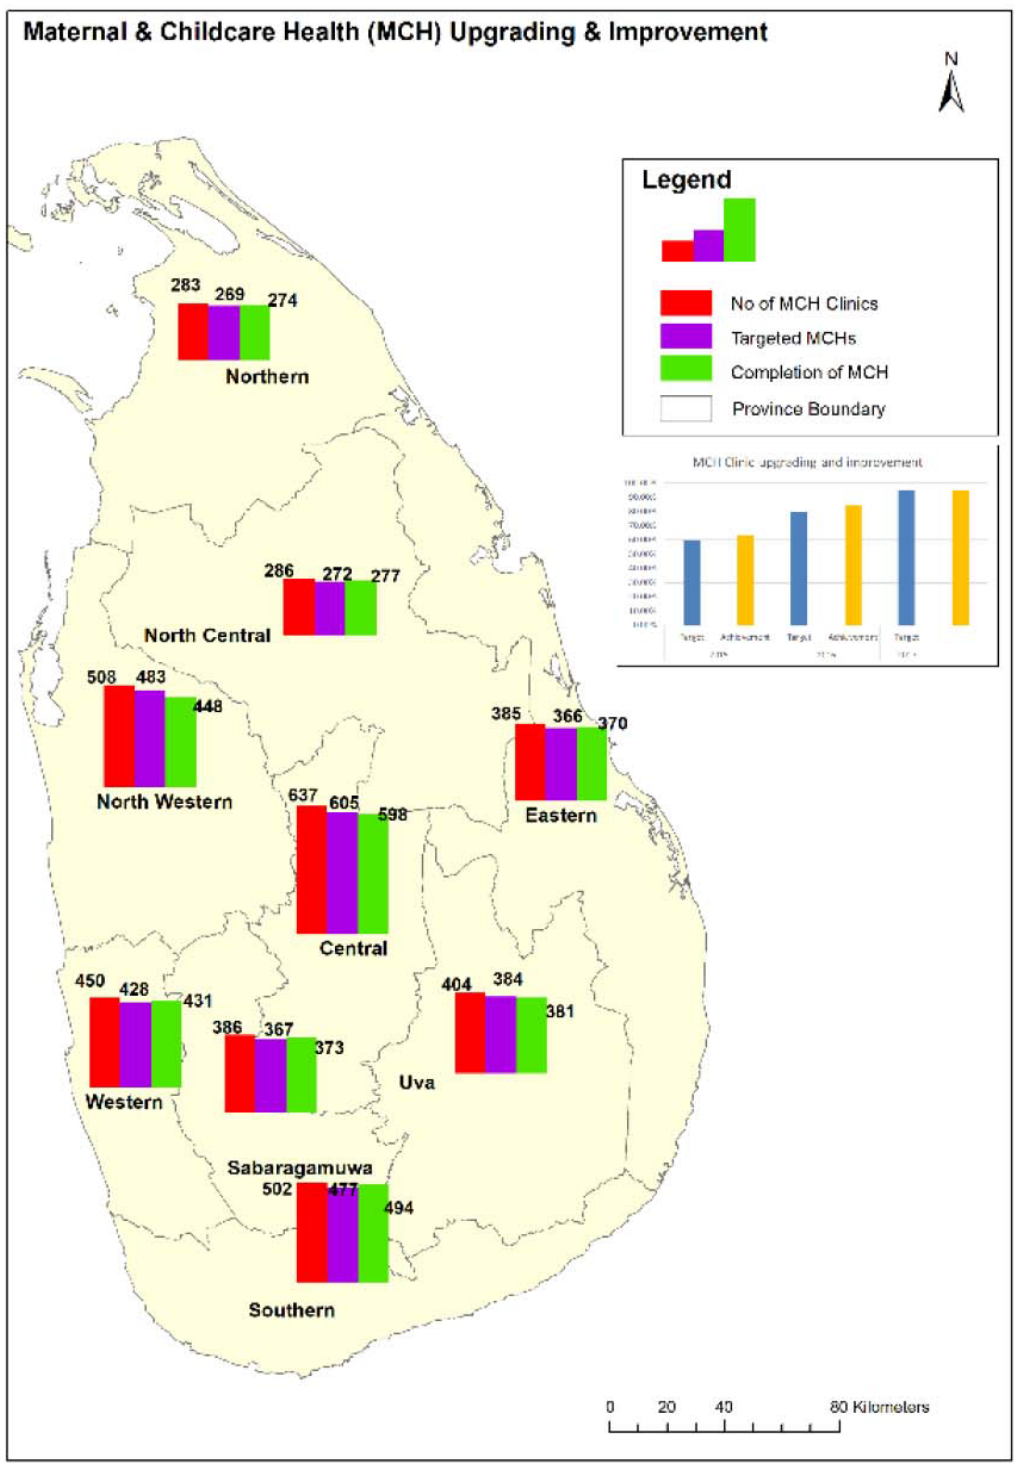

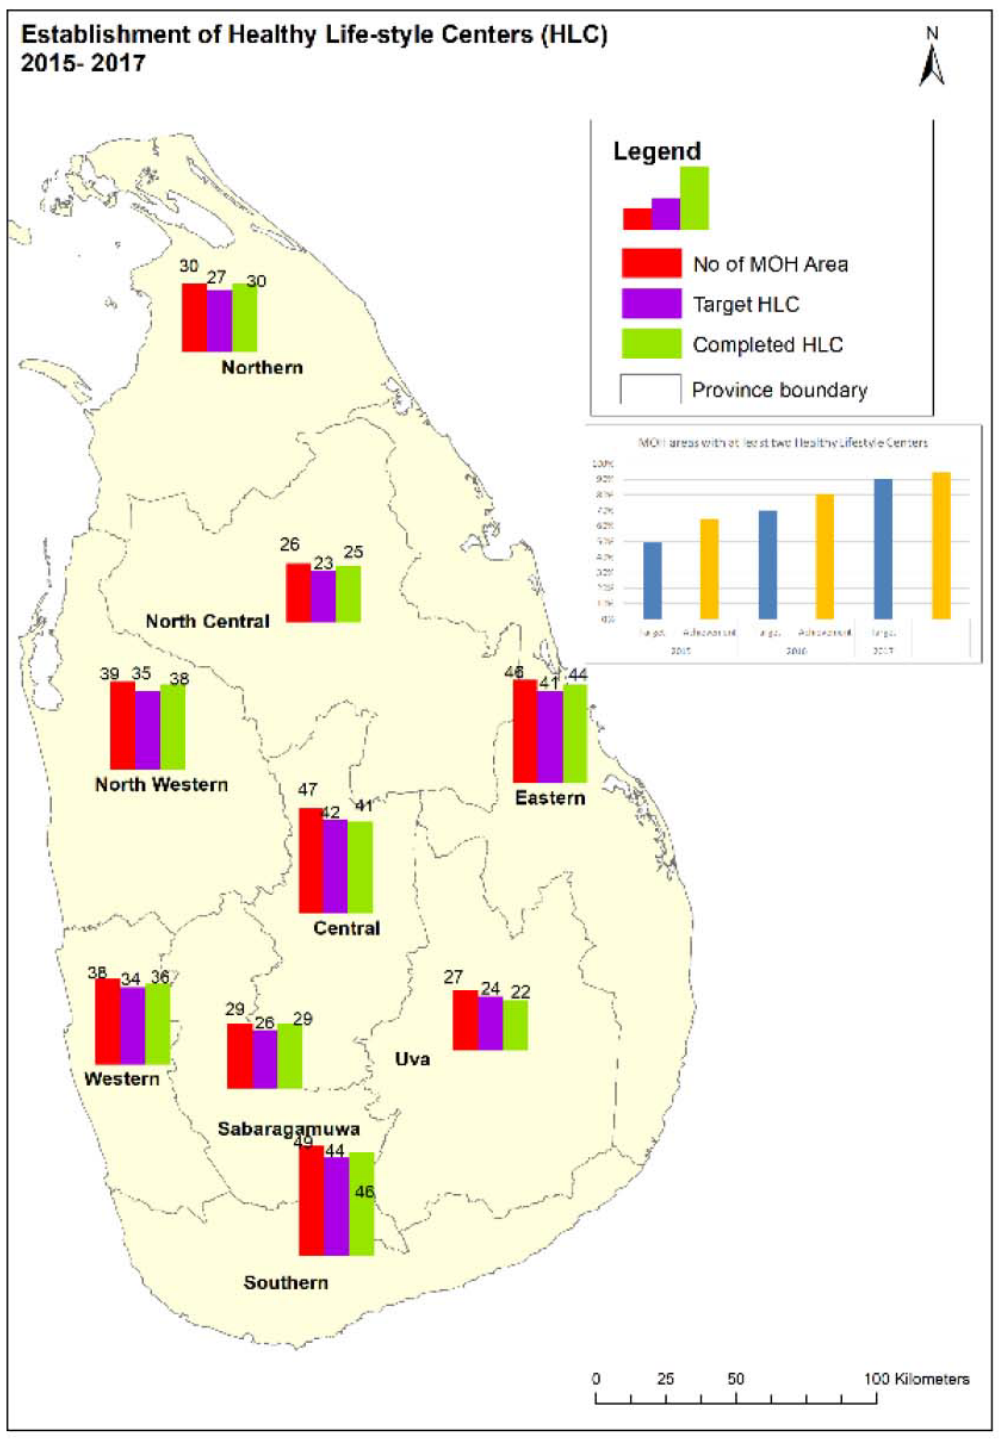

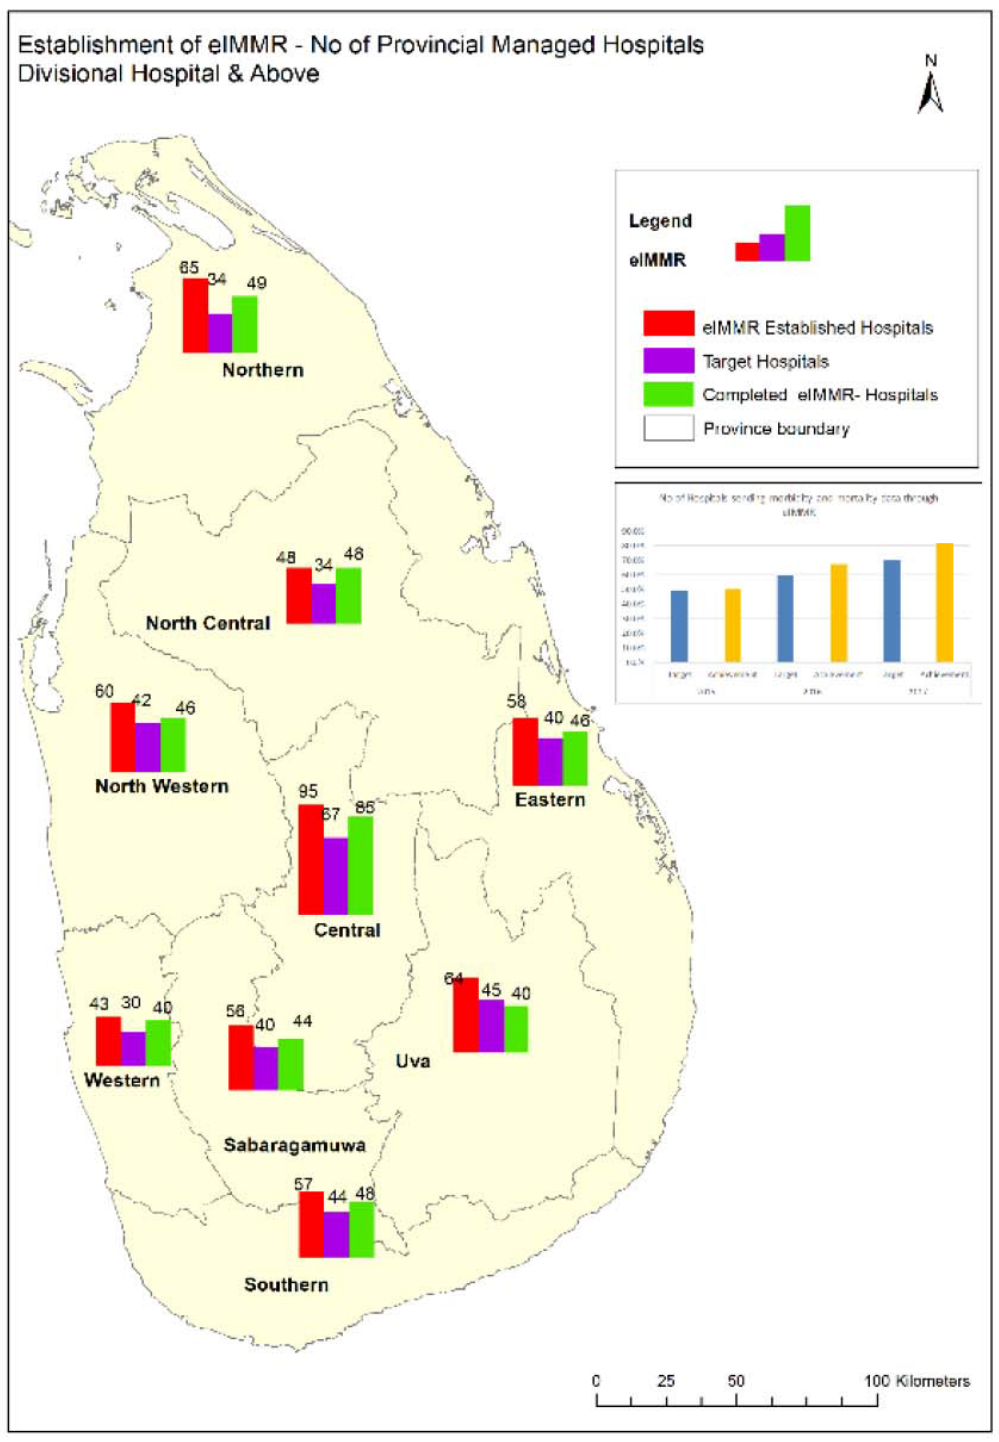

නැගෙනහිර පළාත

පළාත් පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම-තිරයිමඩු,මඩකලපුව
Completion of Main Building of Provincial Training Centre at Thiraimadu" Batticaloa

මධ්‍යම පළාත

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක සංවර්ධනයය -දිස්ත්‍රික් රෝහල රත්තොට

වයඹ පළාත

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක සංවර්ධනය - දිස්ත්‍රික් රෝහල කොට්ටුකච්චිය
Construction of Emergency Room - DH Kottukachchiya

උතුරු පළාත

හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක සංවර්ධනය-දිස්ත්‍රික් රෝහල කරෙයිනගර්,පුදුකුඩිරුප්පු, පූනකරී

පළාත් සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම- මිල්ලෙනිය
Construction of MOH Office - MIlleniya

Rural Bridges in Sri Lanka 2015-2017

Ministry of Provincial Councils & Local Government

Year	Completed Bridges
2015	141
2016	334
2017	509
Grand Total	**1116**

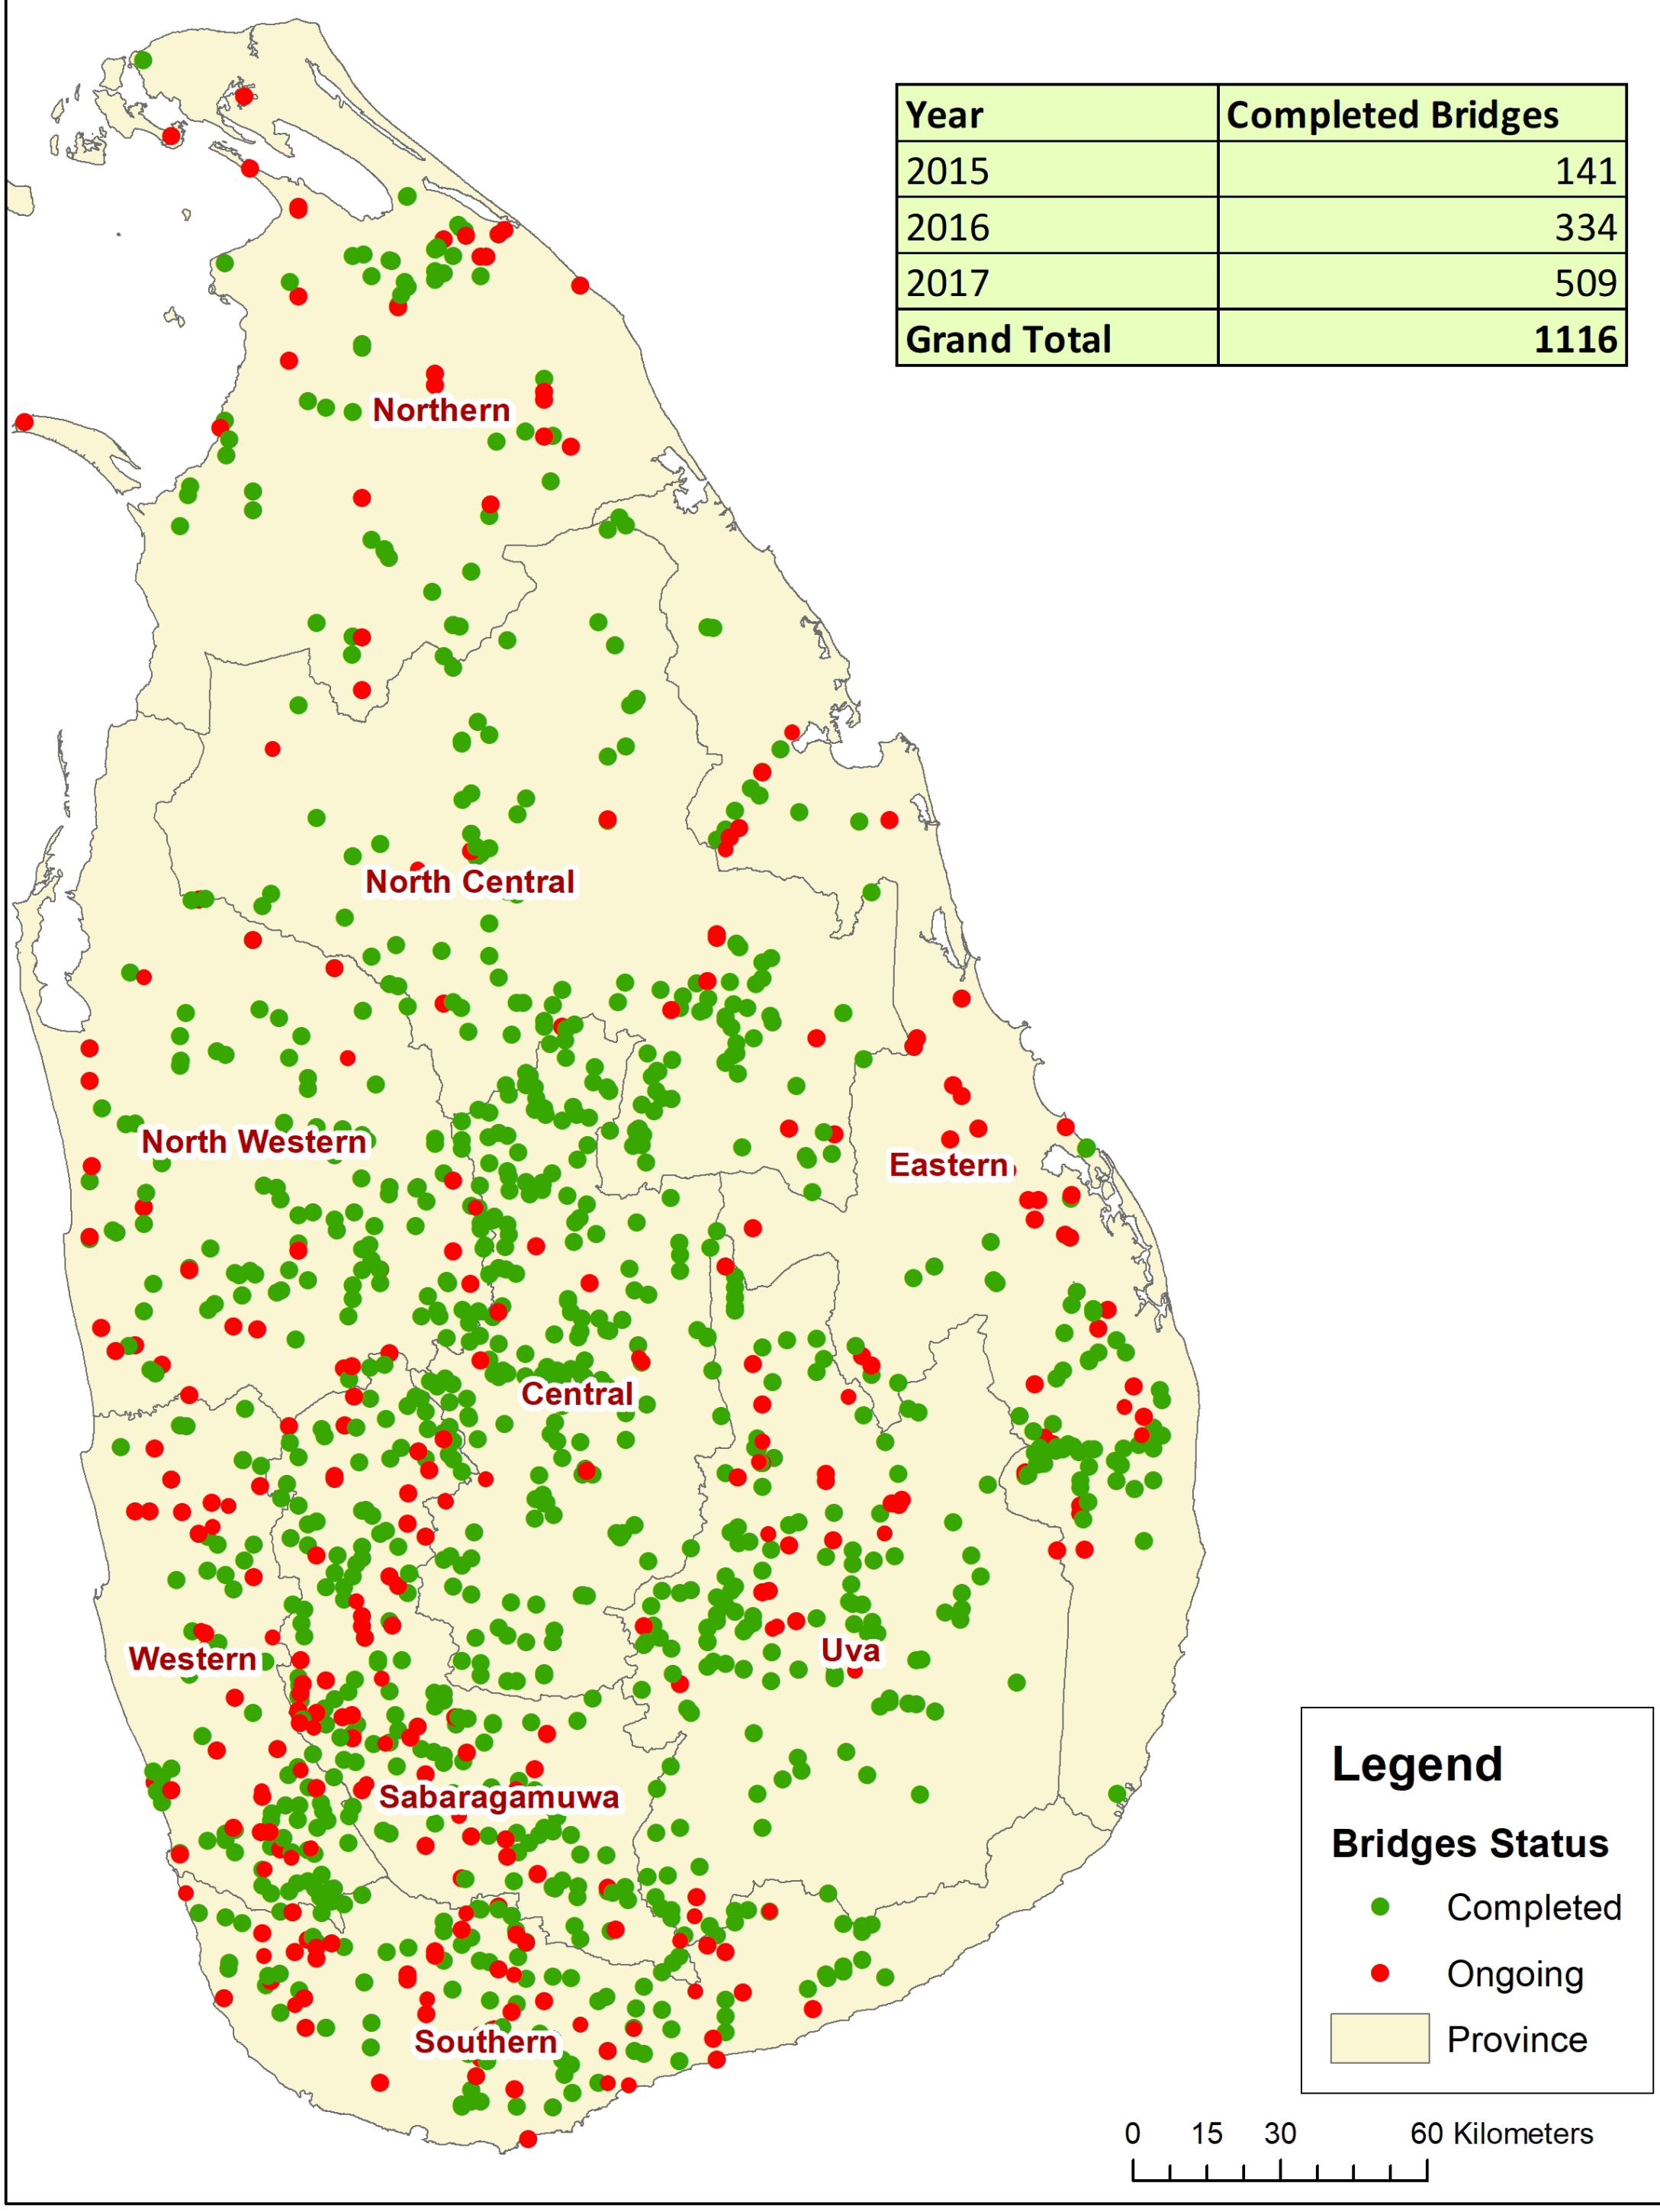

3.2.2.8. ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

අරමුණු

1. රටේ ජාතික ආර්ථික වර්ධනය අරමුණු කර ගනිමින් ජනතාවගේ සංචලනය සහ ජීවන තත්වයේ ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම
2. ග්‍රාමීය ජනතාවගේ පොදු සුරක්ෂිත බව වර්ධනය කිරීම
3. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල මෙතෙක් භාවිතයට නොගත් සම්පත් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්වය වර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් නව නිෂ්පාදන අවස්ථා සඳහා ඔවුන්ගේ දේශීය දැනුම භාවිතයට ගැනීම

වගු අංක 19

	අදියර I	අදියර II	අදියර III
ණය ආධාර ලබාදෙන ආයතනය	එක්සත් රාජධානිය	එක්සත් රාජධානිය	නෙදර්ලන්තය
ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මිලියන)	7,400.00	20,200.00	16,500.00
ව්‍යාපෘති කාලය	2013 - 2016	2014 - 2017	2014 - 2017
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	සමස්ත දිවයින පුරා		
සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය	100%	85%	85%
සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)	7,366.41	19,892.71	14,694.43
2017 සිව්වන කාර්තුවට මූල්‍ය ඉලක්ක/ ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)	40.00 / 15.22	4205.00 / 5300.00	3100.00 / 2530.05
2017 සිව්වන කාර්තුවට භෞතික ඉලක්ක/ ප්‍රගතිය	වැඩ අවසන් වී ඇත	100% / 21%	100% / 34%

වගු අංක 20

මූල්‍ය සහාය	මුළු පිරිවැය	2017 සඳහා වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන රු.මි.	ඉදිකෙරෙන පාලම් සංඛ්‍යාව	වැඩ නිමි සංඛ්‍යාව	මූල්‍ය ප්‍රගතිය (2017) රු.මි.	සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු.මි.	සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය %
එක්සත් රාජධානිය (අදියර I)	7,400.00	20	210	210	15.22	7,372.87	100%
එක්සත් රාජධානිය (අදියර II)	20,200.00	3500	537	348	2,693.82	17,286.12	85%
නෙදර්ලන්තය (අදියර III)	16,500.00	2800	463	241	1,751.76	13,550.44	78%
එකතුව	**44,100.00**	**6320**	**1,210**	**799**	**4,460.80**	**38,209.43**	

මේ ව්‍යාපෘතියෙහි පළමු අදියරෙහි වැඩ අවසන් වී ඇත. දෙවන අදියර යටතේ වැඩ අවසන් නොවූ පාලම් 189 සහ තෙවන අදියර යටතේ වැඩ අවසන් නොවූ පාලම් 222 ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී.

පෙර පැවති ආකාරය

වර්තමාන තත්ත්වය

පෙර පැවති ආකාරය

වර්තමාන තත්ත්වය

3.2.2.9. උතුරු නැගෙනහිර පළාත් පාලන සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (NELSIP)

■ **ව්‍යාපෘති අරමුණු**

උතුරු නැගෙනහිර පළාත් පාලන සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ (නෙල්සිප්) ප්‍රධාන අරමුණ පළාත් පාලන ආයතන විසින් සපයනු ලබන සේවා පහසුකම් විනිවිදභාවයකින් හා වගකීමකින් යුතුව සැපයීමට හැකිවන පරිදි අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමත්, සේවා පහසුකම් ලබා දීමේදී සමාජ සාධාරණත්වය උපරිම වන අකාරයෙන් ලබාදීමට හැකිවන සේවා පහසුකම් සැපයීමේ ක්‍රම සහ විධි හඳුන්වාදීමත් සහ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ යන පරිදි අදාල නිළධාරීන්ට අවශ්‍ය දැනුම හා අත්දැකීම් ලබාදීමත්ය.

■ **ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිඵල**

පළාත් පාලන ආයතන වල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1190 කි. මේ අතර ග්‍රාමීය මාර්ග කි.මී.791.2ක්, කානු පද්ධති කි.මී.49.8ක්, වෙළඳපල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 146ක්, ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති 14ක්, ක්‍රීඩා පිටි සහ ළමා උද්‍යාන 74ක් සහ බහු කාර්යය මධ්‍යස්ථාන 36ක් වේ.

මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලටම බද්ධ වූ බෝක්කු, පාලම් හා කාණු පද්ධති අලුතින් ඉදිකිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට හේතුවී ඇත. ව්‍යාපාර සඳහා ආයෝජන වැඩිකිරීමට, දේශීය විදේශීය සංචාරක කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමට, විවිධ සේවාසම්පාදන කටයුතු ඉහළ නැංවීමට සහ පොදුවේ ජන ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු වීමට මෙය හේතු කාරක වනු ඇත.

නෙල්සිප් ව්‍යාපෘතිය මඟින් කරන ලද සමාජීය ආයතනික, පාරිසරික සහ ආර්ථික බලපෑම් පිළිබඳ තක්සේරු කිරීමේ වාර්තාව මඟින් පෙන්වා දී ඇත්තේ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම නිසා, ගමන් කිරීමේ කාලය අඩුවීම, මාර්ග අනතුරු අඩුවීම සහ ගමන් කිරීමේ සුවපහසුව ඇතිවීම පිළිබඳ ප්‍රතිලාභීන් ඉතා තෘප්තියට පත්වී සිටින බවයි. එමෙන්ම මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමෙන් ඇතිවූ අතුරු ප්‍රතිඵල ලෙස පහත සඳහන් කරුණු දක්වා ඇත. මාර්ග නඩත්තු සහ පවත්වාගෙන යාමේ වියදම් අඩුවීම, වෙළඳ ව්‍යාපාර ඉහළ යාම, කෘෂිකාර්මික කටයුතු වැඩිවීම, ඉඩම්වල වටිනාකම ඉහළයාම, අධ්‍යාපනයට, රැකියාවලට පුහුණුවීම්වලට පහසුවෙන් ගමන්කළ හැකිවීම සහ යෙදවුම් මිලදීගැනීම හා නිෂ්පාදන අලෙවිකිරීම සඳහා පහසුවක් ඇතිවී තිබීම.

කාණු පද්ධති අලුතින් ඉදිකිරීම තුලින් මාර්ග පද්ධතියේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවී තිබේ. තවද, ගංවතුර අවධානම අඩුවීමටත්, මදුරුවන් බෝවීම වලක්වා ගැනීමටත්, මාර්ග අනතුරු අඩුකර ගැනීමටත් මෙය හේතු වී ඇති බව වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

ළමා උද්‍යාන හා ක්‍රිඩාංගන ඉදිකිරීම තුළින් පිරිස් ඒකරාශිවීම, මුණ ගැසීම මගින් සමාජයීය වශයෙන් යහපතක් සැලසීම, සමාජ මුසුවීම මගින් සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු වීම, පෞද්ගලික හා සමාජයීය පීඩනය අඩු කරගැනීමට හැකිවීම, සමාජ සහයෝගීත්වය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ හැඟීම තහවුරුවීම මෙන්ම මානසික හා ශාරීරික යෝග්‍යතාව වැඩිදියුණු කරගැනීමට හැකිවී ඇති බව පෙන්වා දී ඇත.

පානීය ජලය ලබාදීම, වෙළඳපල සංවර්ධන, පුස්තකාල වැඩිදියුණු කිරීම ආදිය තුළින් සැලකිය යුතු සමාජයීය හා ආර්ථික දියුණුවක් සිදුවී ඇති බවද හඳුනාගෙන ඇත. (ඔයැ\`දජස්ක, ෂබ්එසඑමඑසදබ්ක, ැබඩසරදබපැබඑ ) ැජදබදපසජි ෂපච්ජඑ\`ිපැබඑ 'එ හැඛිෂජ - ජ. 37,38)

පළාත් පාලන ආයතන මඟින් මහජනතාවට සපයනු ලබන සේවා පහසුකම් වඩා ක්‍රමවත්ව හා නිවැරදි ආකාරයට ලබාදීම සඳහා නෙල්සිප් ව්‍යාපෘතිය මඟින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ විශේෂ වැඩ සටහන් හා ක්‍රමවේද කිහිපයකි. ඒවා අතර, පළාත් පාලන ආයතන සහභාගීත්ව සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම, ව්‍යාපෘති සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒ ඒ ව්‍යාපෘතිවලට අදාලව ප්‍රතිලාභීන්ගෙන් සමන්විත සමාජ විගණන කමිටු පිහිටුවීම ප්‍රමුඛතාවය අනුව හඳුනාගන්නා ව්‍යාපෘති ඇගයීමට, ව්‍යාපෘති ඇගයීම් කමිටු දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පිහිටුවීම, පළාත් පාලන ආයතනවල සේවා පහසුකම් ලබා දීම පහසු කරවනුවස් පෙරටු කාර්යාල පිහිටුවීම, මහජන දුක් ගැනවිලි වලට විසඳුම් ලබා දීමේ ක්‍රමවේද යාවත්කාලීන කිරීම, දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් යහපාලන මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම ප්‍රධානවේ. පළාත් පාලන ආයතන ගිණුම්කරණය යාවත්කාලීන කිරීම, පුස්තකාල ස්වයංක්‍රීයකරණ වැඩසටහන හඳුන්වාදීමද ප්‍රධාන වැඩසටහන් අතර වේ.

■ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ

නෙල්සිප් ව්‍යාපෘතිය 2010 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ අතර, 2017 වර්ෂය අවසානය තෙක් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය උතුරු පළාතේ සමස්ත දිස්ත්‍රික්ක පහ තුළම එනම් යාපනය, කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, වව්නියාව සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම පළාත් පාලන ආයතන (පළාත් පාලන ආයතන 34ක්) ආවරණය කරමින් ක්‍රියාත්මක වේ. එමෙන්ම නැගෙනහිර පළාතේ සමස්ත දිස්ත්‍රික්ක තුන තුළම එනම් ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම පළාත් පාලන ආයතන (පළාත් පාලන ආයතන 45ක්) ආවරණය කරමින් ක්‍රියාත්මක වේ. 2014 වර්ෂයේ සිට උතුරු පළාත හා නැගෙනහිර පළාතට යාබදව ඇති පළාත්වල තෝරාගත් පළාත් පාලන ආයතන මෙම ව්‍යාපෘති සඳහා තෝරාගන්නා ලදී. ඒ අනුව, උතුරු මැද පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන 12ක්ද, වයඹ පළාතේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 07ක් ද සහ ඌව පළාතේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 03ක්ද සමග සමස්ත වශයෙන් පළාත් පාලන ආයතන 101ක් ආවරණය කරමින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

බිබිල පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය

අම්පාර බස් නැවතුම්පොළ

ඩෙල්ෆ් දූපතට ලබාදුන් නැඳුන්තාරකී මගී නෞකාව

මාරවිල පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය

North East Local Services Improvement Project (NELSIP) 2015-2017

Ministry of Provincial Councils & Local Government

Year	No of Sub Projects	Total Expenditure (Rs Mn)
2,015	44	479.21
2,016	295	1,921.79
2,017	131	1,068.82
Total	**470**	**3,470**

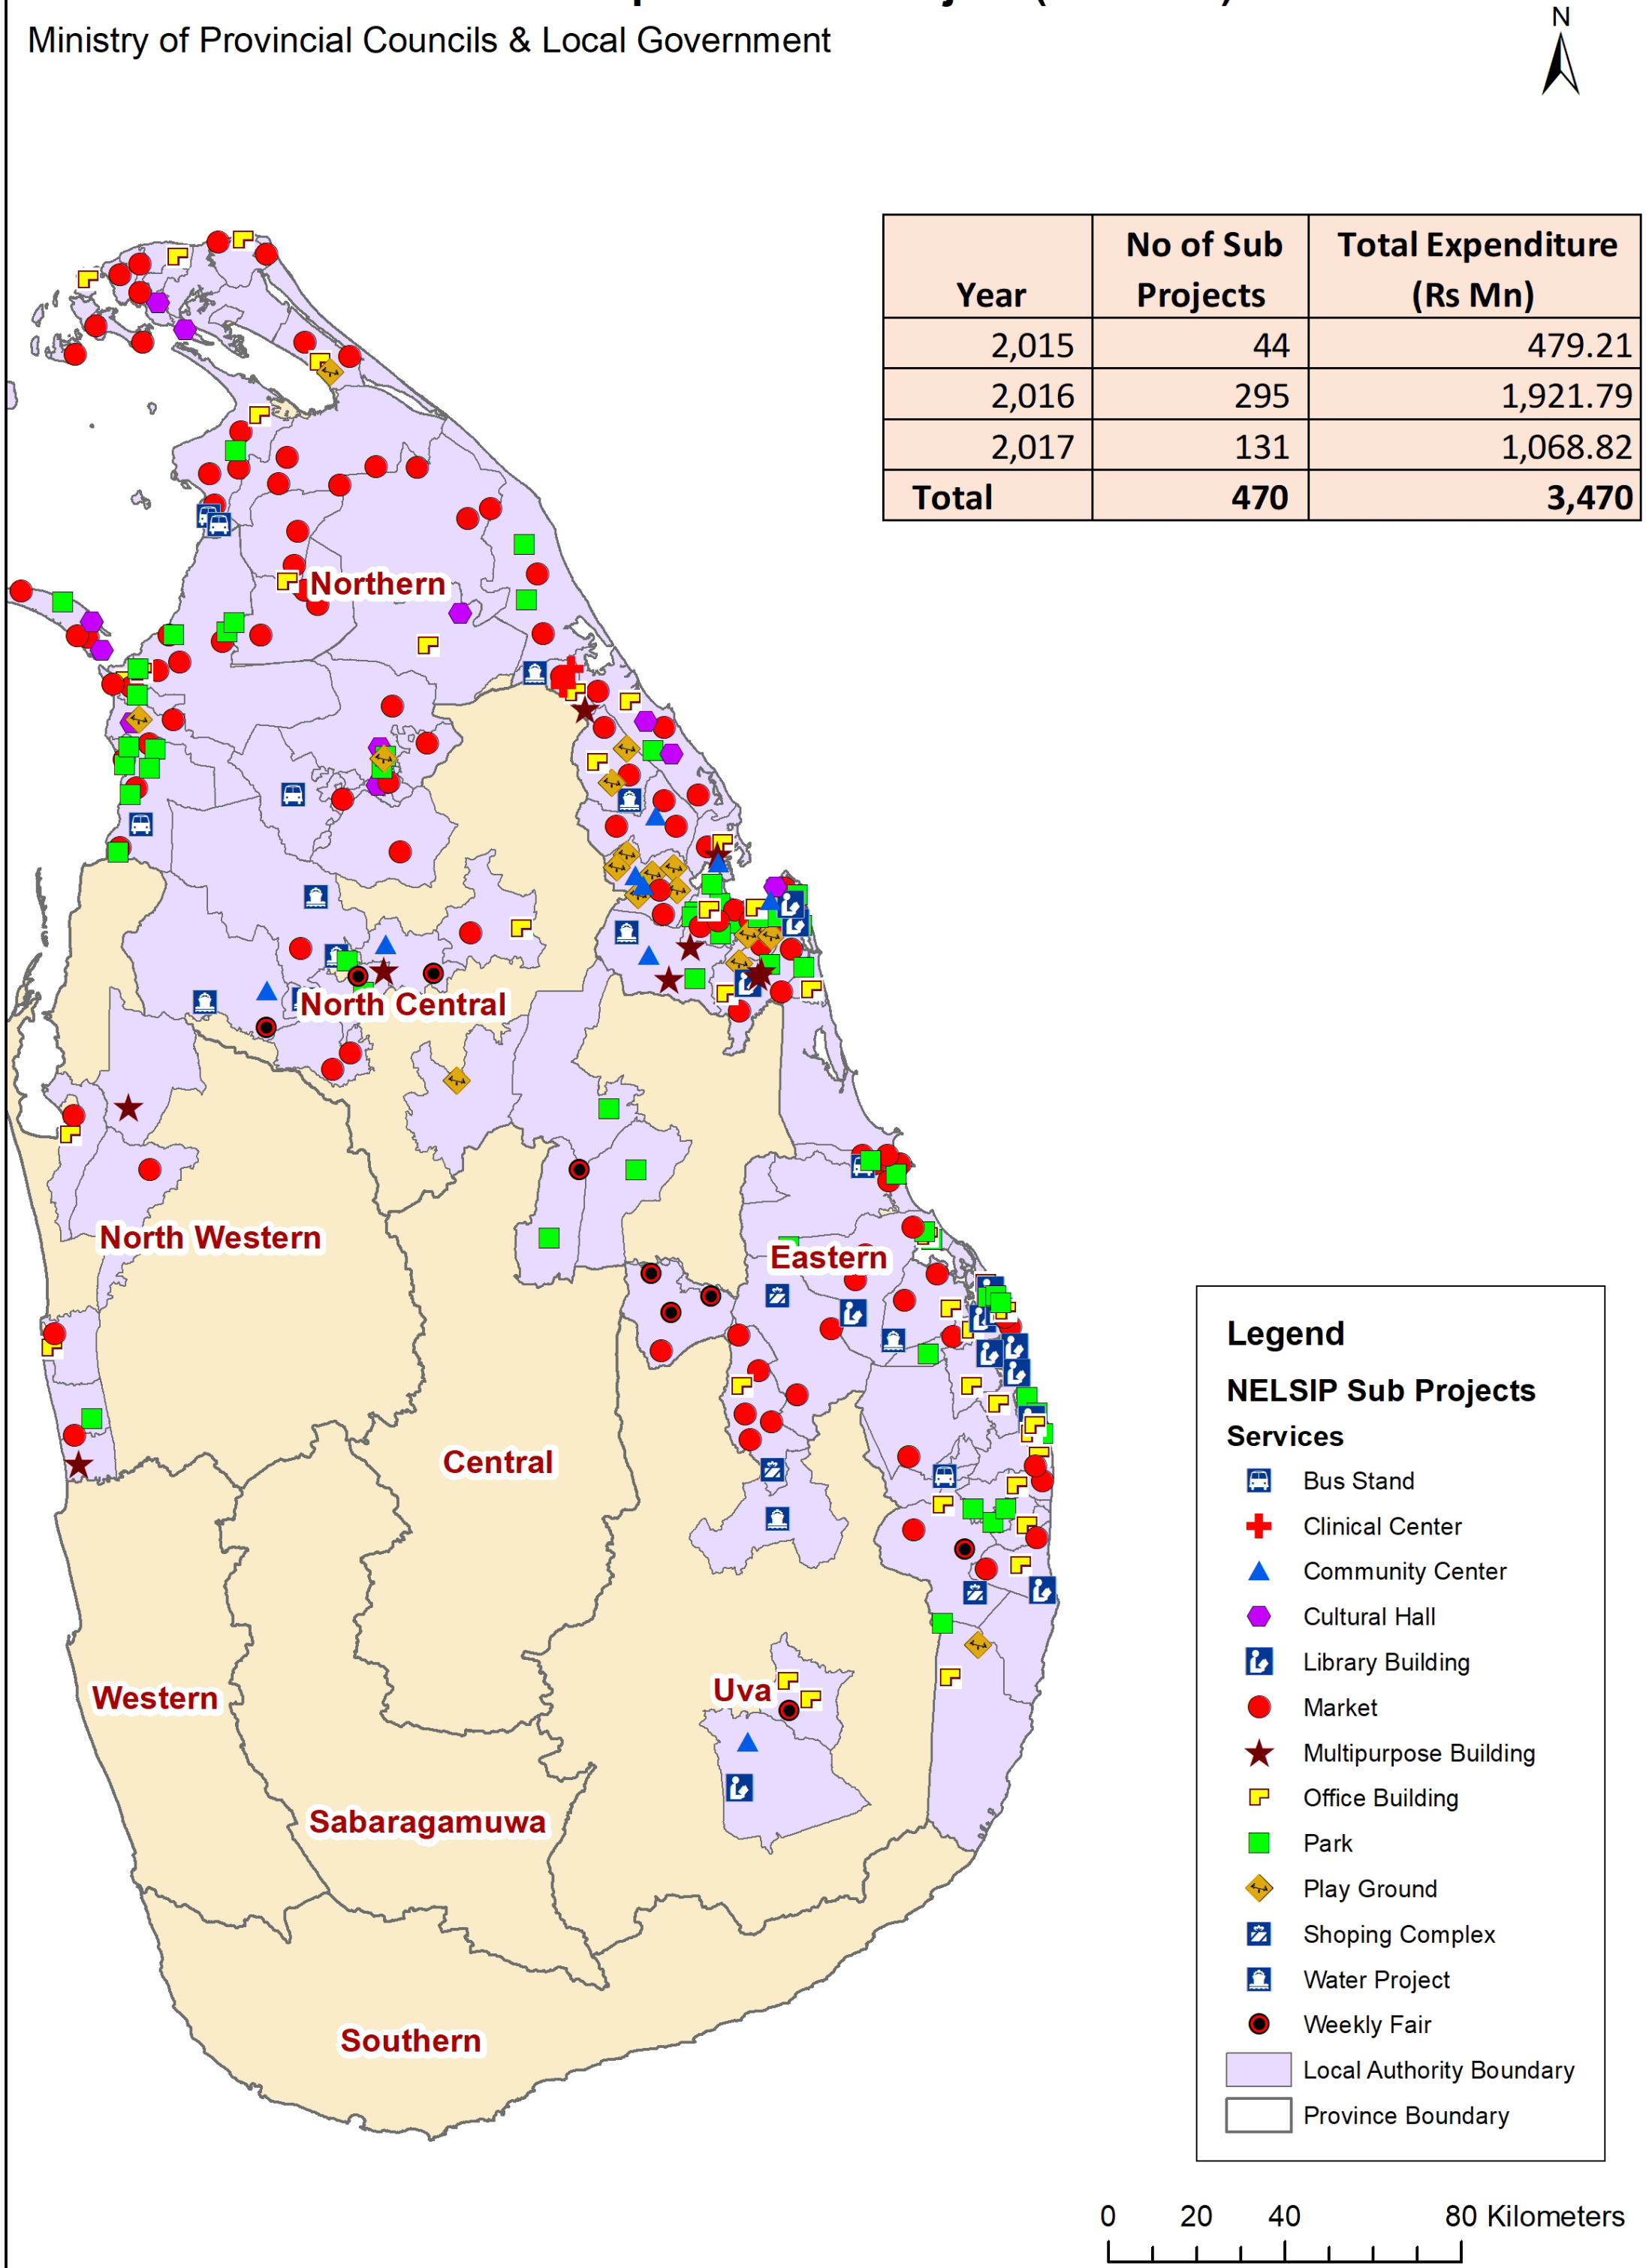

Note: "NELSIP has completed1190 sub projects during the period from 2012 to 2017.

				මුළු සංඛ්‍යාව	මහා නගර සභා	නගර සභා	ප්‍රාදේශීය සභා
1.	උතුර	යාපනය	17	17	01	03	13
		කිලිනොච්චිය	03	03	-	-	03
		මුලතිව්	04	04	-	-	04
		වව්නියාව	05	05	-	01	04
		මන්නාරම	05	05	-	01	04
2.	නැගෙනහිර	ත්‍රිකුණාමලය	13	13	-	02	11
		මඩකලපුව	12	12	01	02	09
		අම්පාර	20	20	02	01	17
3.	උතුරුමැද	අනුරාධපුරය	19	09	01	-	08
		පොළොන්නරුව	07	03	-	-	03
4.	වයඹ	පුත්තලම	12	07	-	02	05
5.	ඌව	මොණරාගල	10	03	-	-	03
එකතුව			**127**	**101**	**05**	**12**	**84**

මුදල් මූලාශ්‍ර

උතුරු නැගෙනහිර පළාත් පාලන සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කරන ලද මුළු ආයෝජන මුදල රු.මි. 13522.90කි. එයින් 66%ක් ලෝක බැංකු ජාත්‍යාන්තර සහයෝගිතා අරමුදල මඟින්ද, 20% ඕස්ට්‍රේලියානු විදේශ කටයුතු හා වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තු ආධාර ලෙසද, 12%ක් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රතිපාදන මඟින් හා 2% ක් ප්‍රතිලාභී දායකත්වයෙන්ද සමන්විත වේ. දේශීය හා විදේශිය වශයෙන් වෙන් වී ඇති මෙම මුදල් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය හරහා ව්‍යාපෘති කටයුතුවලට වෙන් කරනු ලබයි.

වගු අංක 22

මුදල් මූලාශ්‍ර	ව්‍යාපෘති මුදල		සංශෝධිත ව්‍යාපෘති මුදල	
	ඇ. ඩො	රු. මි.	ඇ. ඩො	රු. මි.
ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා අරමුදල(WB)	50.00	6,175.00	70.00	9,464.44
විදේශ කටයුතු හා වෙළෙඳ දෙපාර්තමේන්තුව (Aus Aid)	20.30	2,537.50	20.30	2,539.50
ශ්‍රී ලංකා රජය	34.00	3,740.00	14.35	1,661.55
ප්‍රජා දායකත්වය	2.00	220.00	2.00	220.00

	106.30	12,672.50	107.35	13,665.49

වගු අංක 23 - සමස්ථ මූල්‍ය ප්‍රගතිය උතුරු නැගෙනහිර පළාත් පාලන සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (2017.12.31 දිනට)

සංරචකය	මුළු ඇස්තමේන්තුව රු. මි.	වියදම රු. මි.
යටිතල සේවා සැපයුම	11,371.49	11,373.96
වගවීම් ආයතන ගත කිරීම	57.00	56.93
ධාරිතා වර්ධනය	1,805.50	1,791.50
ඇගයීම හා තක්සේරුකරණය	31.50	30.56
ව්‍යාපෘති කළමණාකරණය	400.00	377.58
එකතුව	**13,630.53**	**13,630.53**

ඒ අනුව 2017.12.31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ සමස්ථ මූල්‍ය ප්‍රගතිය 99.81% කි

වගු අංක 24 - පළාත් අනුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති

අනු අංකය	අංශය	භෞතික ප්‍රගතිය					
		නැගෙනහිර පළාත	උතුරු පළාත	උතුරු මැද පළාත	වයඹ පළාත	ඌව පළාත	මුළු එකතුව
01	ප්‍රවේශ මාර්ග	03	326	06	-	03	738
02	ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථාන/සායන මධ්‍යස්ථාන	02	01	-	-	-	03
03	පාලම් /පැති බැම්	10	04	-	-	-	14
04	බස් නැවතුම්පොළවල්	02	03	-	-	-	05
05	සුසාන භූමි/ආදාහනාගාර	04	04	-	-	-	08
06	ප්‍රජා ශාලා/සංස්කෘතික ශාලා/බහු කාර්යය ගොඩනැගිලි	19	10	03	02	01	35
07	ළමා උද්‍යාන	32	18	04	01	-	55
08	ක්‍රීඩා භූමි/ක්‍රීඩාගාර	17	03	01	-	-	21
09	කාණු පද්ධති	63	11	04	01	-	79
10	විදුලි බලය ලබා දීම	12	-	-	-	-	12
11	පුස්තකාල ඉදිකිරීම	11	03	-	-	01	14
12	වෙළෙඳ ස්ථාන ඉදිකිරීම	64	57	09	04	01	135
13	ජලය බෙදා දීම	06	03	04	-	01	14
14	නගර අලංකරණය/ කුණුකසල රථ	04	01	-	-	-	05
15	සත්ව ඝාතකාගාර	-	09	-	-	-	09
16	කාර්යාල ගොඩනැගිලි	25	13	01	02	02	43
	එකතුව	**674**	**466**	**32**	**10**	**09**	**1190**

3.2.2.10. දැනුම් කේන්ද්‍රයේ පදනම ලෙස පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය පරිණාමණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

අරමුණු

දැනුම පාදක කරගත් ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනයේ පදනම ලෙස ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපනය කෙරෙහි වූ ප්‍රවේශය හා එහි ගුණාත්මකභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ණය ආධාර ලබාදෙන ආයතනය	ලෝක බැංකුව	
ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මිලියන)	13,000.00	
ව්‍යාපෘති කාලය	2012 - 2017	
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	සමස්ත දිවයින පුරා	
සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය	91%	
සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)	13,123.00	
2017 ප්‍රතිපාදන : රු.මිලියන	2730.00	
2017 .12.31 දිනට මූල්‍ය ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	2730.00	2035.00
2017 .12.31 දිනට භෞතික ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	100%	96%

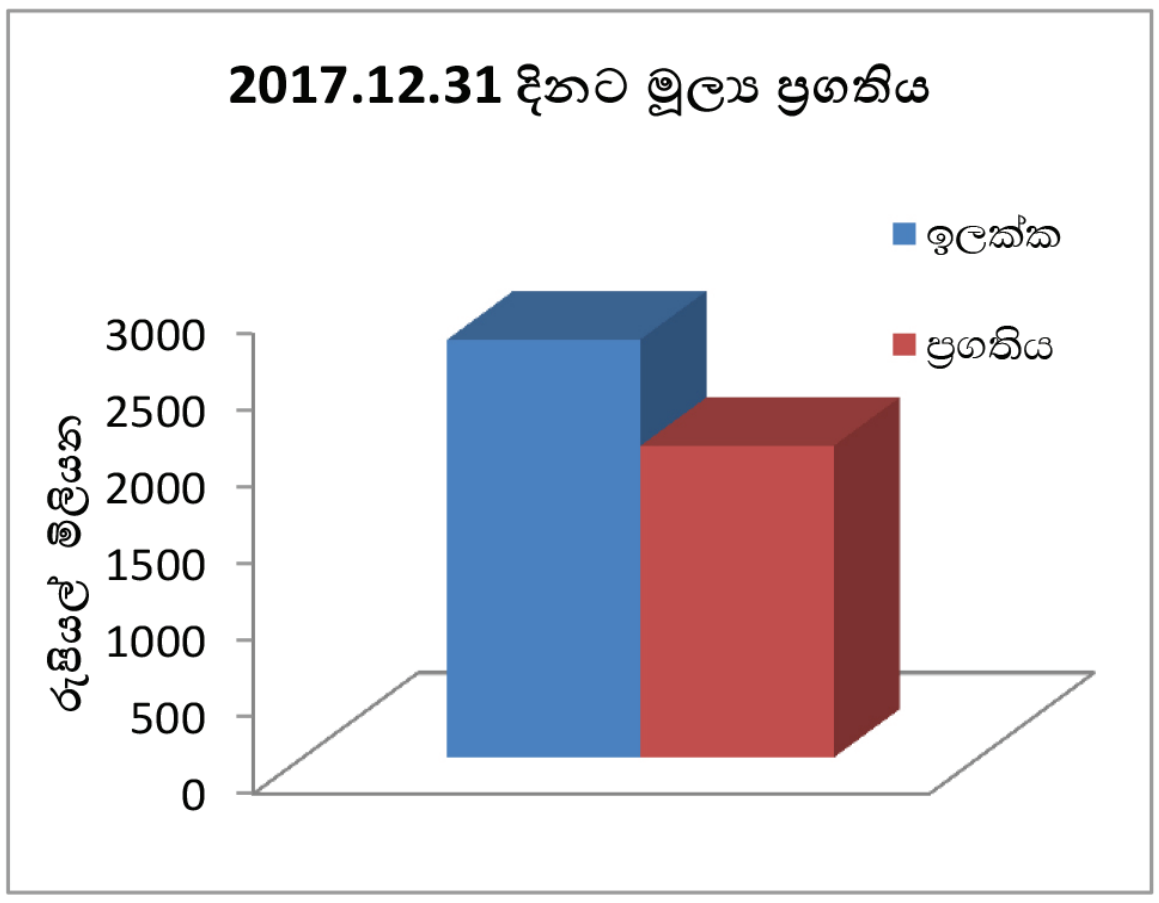

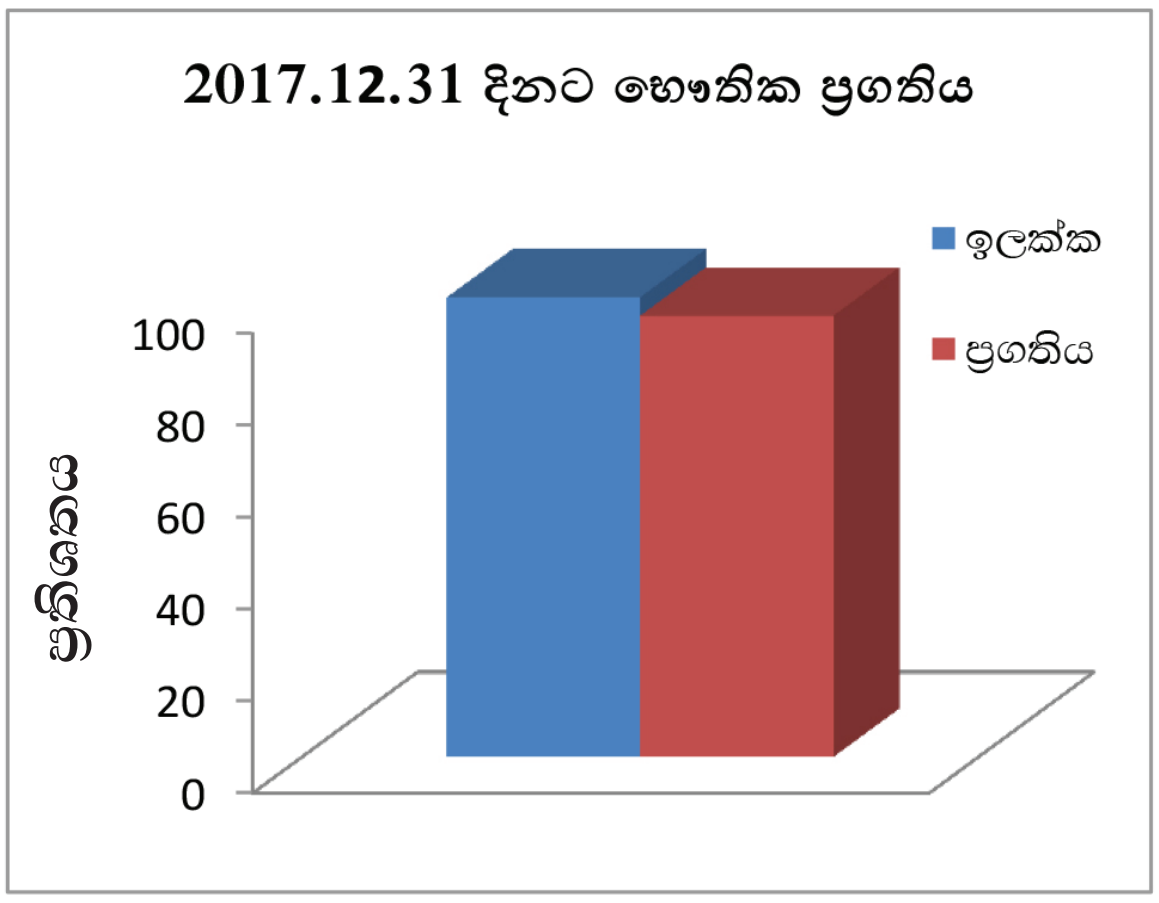

ලෝක බැංකුවේ මූල්‍යාධාර යටතේ රුපියල් මිලියන 13,000ක පිරිවැයක් දරමින් ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් සියලු පළාත් අවරණය වේ. මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, දැනුම පාදක කරගත් ආර්ථික හා සමාජයීය සංවර්ධනයේ පදනම ලෙස ප්‍රථමික සහ ද්විතීක අධ්‍යාපනය කෙරෙහි වූ ප්‍රවේශය හා එහි ගුණාත්මකභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි. භෞතික ප්‍රගතිය 96%ක් වන අතර මූල්‍ය ප්‍රගතිය 74% කි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ජාතික මට්ටමින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ පළාත් සභාව, පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සහ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව හරහාය. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය විසින් ව්‍යාපෘතියේ පළාත් සභාවලට අදාල වැඩ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබයි.

- මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ වනවිට තාක්ෂණික විද්‍යාගාර 135, පන්ති කාමර ගොඩනැගිලි 721ක්, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල 25ක් සහ කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කර්යාල 65ක් ඉදිකිරීම් අවසන් කර තිබේ.

- පරිඝණක යන්ත්‍ර 15936ක්, ස්කෑනර්, ප්‍රින්ටර් යනදී පරිඝණක උපාංග 13083ක්, පන්ති කාමර ඩෙස්ක් සහ පුටු 117795ක්, කාර්යාල මේස සහ පුටු 18973ක්, කාර්යාල උපකරණ (ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර, ෆැකස් යන්ත්‍ර මල්ටිමීඩියා උපකරණ යනාදිය) 3205 ක් මිලදී ගෙන බෙදාදී ඇත.

- මූල්‍ය කළමනාකරණය, ප්‍රසම්පාදන, පරිසරය කළමනාකරණය, පාසැල් පාදක කළමණාරණය, පාසැල් පාදක ගුරු සංවර්ධනය යන තේමා යටතේ පළාත් සභා නිලධාරීන්, විදුහල්පතිවරුවන් සහ ගුරුවරුන් 4726ක් පුහුණු කොට ඇත.

2017 ජුනි මස අවසන් වීමට නියමිතව තිබු මෙම ව්‍යාපෘතිය 2018 ජුනි දක්වා වසරකින් දීර්ඝ කරන ලදි.

උතුරුමැද පළාත

මහින්දෝදය විද්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ල - අ/ දීපානි මහා විද්‍යාලය

මධ්‍යම පළාත

මහින්දෝදය තාක්ෂණික විද්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ල කුරුඳුවත්ත රාජකීය විද්‍යාලය

උතුරු පළාත

කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල - පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

දකුණු පළාත

පාසැල් ගොඩනැගිල්ල ග/ මුස්ලිම් කාන්තා විද්‍යාලය

ඌව පළාත

පාසැල් ගොඩනැගිල්ල
මො/ කෝන්ගස්පිටිය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

නැගෙනහිර පළාත

Construction of Zonal Education Office - Trincomalee North Zone

බස්නාහිර පළාත

පාසැල් ගොඩනැගිල්ල -
මහමායා බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ

විශේෂ අධ්‍යාපන සම්පත් මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල
උඩුපිල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය, කැළණිය.

වයඹ පළාත

Construction of Kalpitiya Divisional Educational Office

සබරගමුව පළාත

Construction of Balangoda Zonal Educational Office Building

3.2.2.11. ඉරණමඩු වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

අරමුණ

වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් ඵලදායි හා තිරසාර කළමනාකරණයක් සඳහා දියුණු කිරීම සහ ජල හා භූමි ඵලදායිතාවය තිරසාර ලෙස දියුණු කිරීම

ණය ආධාර ලබාදෙන ආයතනය	කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර අරමුදල (ඉෆෑඩ්)	
ව්‍යාපෘති පිරිවැය (රු.මිලියන)	3,277.44	
ව්‍යාපෘති කාලය	2012 - 2017	
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	උතුරු පළාතේ කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය (වාරිමාර්ග කිලෝමීටර් 390)	
ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් 1 යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ◆ වාර්මාර්ග පුනරුත්ථාපනය ◆ අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 2 නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිකරණ කටයුතු ප්‍රවර්ධනය 3 ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය		
සමස්ත භෞතික ප්‍රගතිය	99'19]	
සමස්ත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)	3250.46	
2017 ප්‍රතිපාදන (රු.මිලියන)	675.00	
2017 .12.31 දිනට මූල්‍ය ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	675.00	663'60
2017 .12.31 දිනට භෞතික ඉලක්ක / ප්‍රගතිය	100%	99'19]

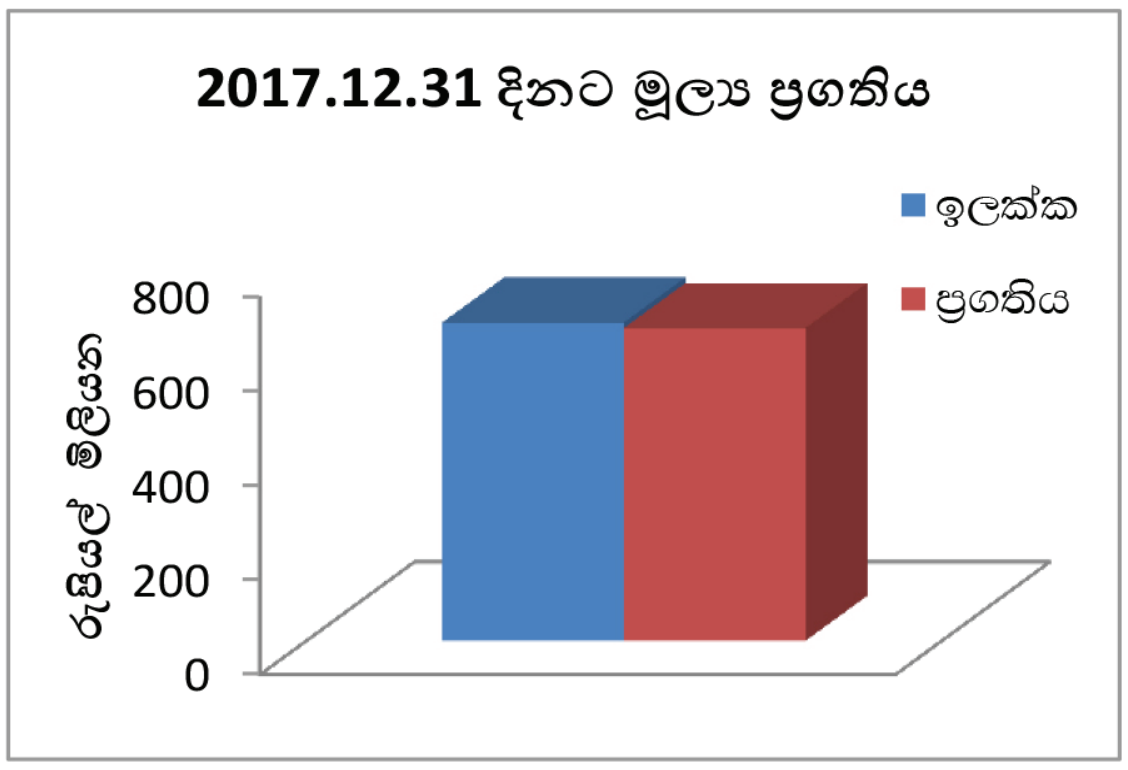

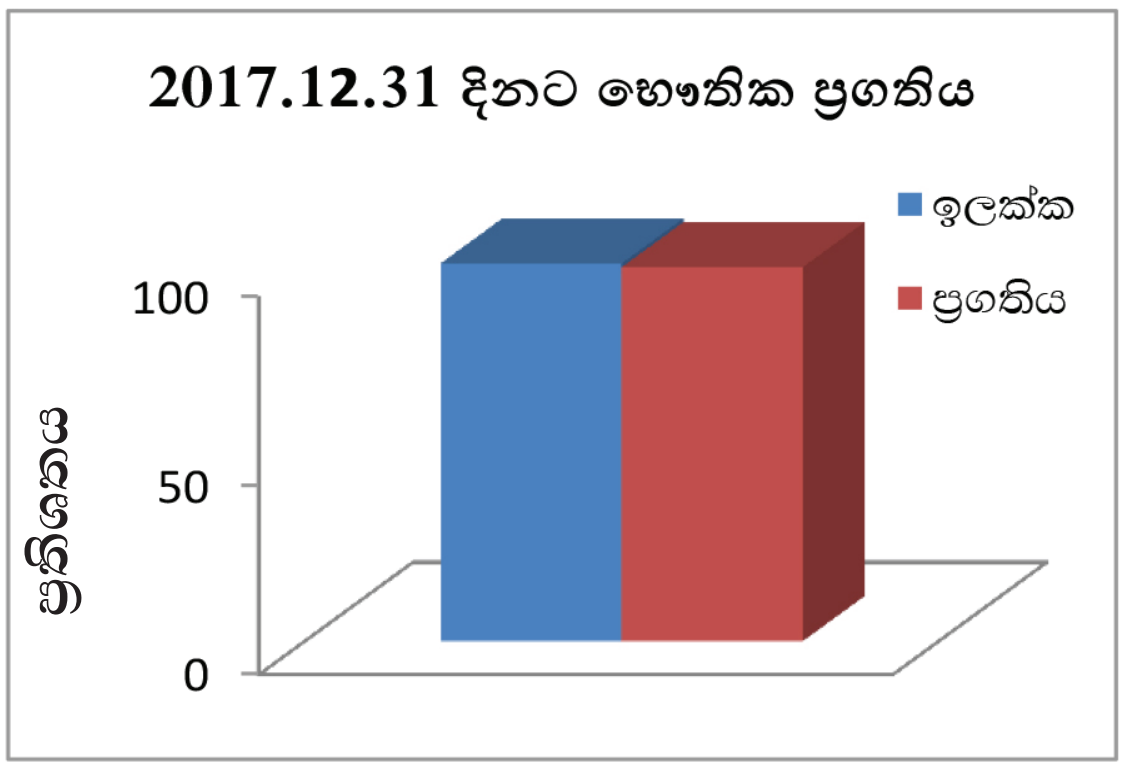

වගු අංක 25 - මූල්‍ය ප්‍රගතිය - ඉරණමඩු වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

අරමුදල් මූලාශ්‍රය	සමුච්ඡිත වියදම රු.මි.			2017 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන හා වියදම රු.මි.			
	මුළු ඇස්තමේන්තුව	සමුච්ඡිත වියදම 2017 සැප්තැම්බර් මාසයට රු.මි.	%	2017 ප්‍රතිපාදන රු.මි.	සංශෝධිත රු.මි.	වියදම 2017 දෙසැම්බර් මාසයට රු.මි.	%
IFAD	2883.44	2883.44	100	567.79	900.00	567.79	99.9
GOSL	394.00	367.82	93.66	119.57	100.00	118.49	99.09
එකතුව	3277.44	3250.46	92.26	687.36	1000.00	985.90	99.78

මූලාශ්‍රය- ඉරණමඩු වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

වගු අංක 26 - භෞතික ප්‍රගතිය-ඉරණමඩු වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම්	ඒකක	ඉලක්කය	සත්‍ය	සමුච්ඡිත ප්‍රගතිය	%
ඇල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය	කි.මී.	401	359	359	100
කාණු ප්‍රතිසංස්කරණය	කි.මී.	70	70	70	100
ව්‍යුහ (Structures) ඉදිකිරීම (බෝක්කු, ආරක්ෂිත බැම්, පාලම්, ඇළ මාර්ග ආදිය ඇතුළත්ව)	සංඛ්‍යාව	426	1950	3000	100
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම	සංඛ්‍යාව	05	05	05	100
කුඩා පරිමාණ කෘෂි ළිං 20/ නළ ළිං 60/ කි.මී. 44ක වැට ඉදිකිරීම	සංඛ්‍යාව	930	66	68	100
ධාන්‍ය වියළීමේ භූමි ඉදිකිරීම	සංඛ්‍යාව	21	21	21	100
වී ගබඩා ඉදිකිරීම	සංඛ්‍යාව	06	03	03	100
කෘෂි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය (කොන්ක්‍රීට්/ බොරළු)	කි.මී.	150	45	45	100

මූලාශ්‍රය- ඉරණමඩු වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

වගු අංක 27 - නිෂ්පාදනය සහ වෙළෙඳපොළ

ක්‍රියාකාරකම්	ඒකක	ඉලක්කය	ප්‍රගතිය	%
■ **සමාජ සජීවීකරණය හා පුහුණු වැඩසටහන්**				
ගොවි සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම	සංඛ්‍යාව	83	83	100
ගොවීන් පුහුණු කිරීම (සියලු ක්ෂේත්‍රයන්හි)	සංඛ්‍යාව	14,000	14,929	100
වැඩි ජලය මුදාහැරීමේ ක්‍රමය පිළිබඳ ගොවීන්ට පුහුණුව ලබා දීම	සංඛ්‍යාව	1675	1678	100
■ **නිෂ්පාදනය හා වෙළෙඳපොළ**				
වී නොවන බෝග විවිධාංගීකරණ වැඩසටහන්				
සැලසුම් කළ පුහුණු වැඩටහන්	සැසි සංඛ්‍යාව	460	425	92
කණ්ඩායම් පිහිටුවීම	කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව	423	423	100
වී නොවන බෝග වැඩසටහන යටතේ ගොවීන් පුහුණු කිරීම	පුහුණු සංඛ්‍යාව	2220	3688	100
වී නොවන බෝග වැඩසටහන යටතේ වගා කිරීම	අක්කර ප්‍රමාණය		1518	
කිරිගව පාලනය පිළිබඳ ගොවීන් පුහුණු කිරීම	පුහුණු සංඛ්‍යාව	200	200	100
ඵලදායී කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් සඳහා වගා බිම් පිහිටුවීම	ආදර්ශ සංඛ්‍යාව	500	631	100
වී නොවන බෝග වැඩසටහන පිළිබඳ ආදර්ශනය	ආදර්ශන සංඛ්‍යාව	1672	2784	100
කෘෂි අලෙවි කොන්ත්‍රාත් සඳහා ගොවීන් පුහුණු කිරීම	පුහුණු සංඛ්‍යාව	350	115	33
කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා ගොවීන් පුහුණු කිරීම	ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාව	350	98	28
එළවළු හා පලතුරු වගා සඳහා කාන්තා කණ්ඩායම් සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම	කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව	423	423	100
■ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය				
සැලසුම් කළ වැඩසටහන්	කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව	80	60	75
ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය කණ්ඩායම් පිහිටුවීම (කණ්ඩායම් ඉතුරුම් හා අභ්‍යන්තර ණය දීම)	කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව	150	150	100
ප්‍රතිලාභීන් පුහුණු කිරීම	පුහුණු සංඛ්‍යාව	750	1889	100
ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය යටතේ ජීවනෝපාය සඳහා ණය ලබා දීම	ණය සංඛ්‍යාව	200	180	90

■ ගොවිපළ නොවන ක්‍රියාකාරකම්				
කිරිගව පාලනය පිළිබඳ ගොවීන් පුහුණු කිරීම	පුහුණු වූ සංඛ්‍යාව	200	200	100
කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කාන්තාවන්ට ආධාර ලබා දීම (කිරි ගවයින් ලබා දීම)	ආධාර ලද කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව	200	150	75
වෙනත් ගොවිපළ නොවන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සුදුසු ආධාර ලබා දීම	ආධාර ලද සංඛ්‍යාව	300	ක්‍රියාත්මක වූයේ නැත	

මූලාශ්‍රය- ඉරණමඩු වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

පෙර පැවති තත්ත්වය

වර්තමාන තත්ත්වය

පෙර පැවති තත්ත්වය

වර්තමාන තත්ත්වය

3.2.2.12. නැගී එන ප්‍රදේශවල ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

අරමුණ උතුරු, නැගෙනහිර, උතුරු මැද සහ ඌව පළාත්වල, ග්‍රාමීය මාර්ග, මධ්‍යම හා කුඩා ප්‍රමාණ වාරිමාර්ග සහ පානීය ජල සම්පාදන පහසුකම් වැනි මූලික යටිතල පහසුකම් මගින් එම පළාත්වල ජීවත්වන ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සහ එමගින් ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා දායකවීම සහ ප්‍රාදේශීය විෂමතා අවම කිරීම.	
ණය ආධාර ලබාදෙන ආයතනය	ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය (ජයිකා)
ව්‍යාපෘති පිරිවැය	රු.බිලියන 12.8 (එක් පළාතකට රු.බිලියන 3.2 ක් බැගින්)
ව්‍යාපෘති කාලය	2017 අප්‍රේල් - 2021 ජූලි
ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ	උතුරු, නැගෙනහිර, උතුරු මැද සහ ඌව පළාත්
ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් උප ව්‍යාපෘති - 524 ➢ ග්‍රාමීය මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය - 275 ➢ වාරිමාර්ග පහසුකම් ඉදිකිරීම් හා ප්‍රතිසංස්කරණය - 151 ➢ පානීය ජල සම්පාදනය - 98	

2017 ක්‍රියාකාරකම්

- 2017.07.07 ණය ගිවිසුම අත්සන් කිරීම.
- ව්‍යාපෘති කළමණාකරණ ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කර ගැනීම.
- ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් සඳහා උපදේශක සේවාවන් තෝරා ගැනීම් සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
- පළාත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒකක පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය අනුමත කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

3.3. ජාතික ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ සහායක මධ්‍යස්ථානය

දැක්ම : සැමට වඩාත් සුවපහසු පරිසරයක්

අරමුණ : පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශවල ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම

කාර්යභාරය :

- ❖ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා විධිමත් හා යෝග්‍ය ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රියාකාරකම් හඳුන්වාදීම පිණිස නීති සම්පාදනය හා උපදේශන සැපයීම
- ❖ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ නවීන තාක්ෂණික සහාය පළාත් පාලන ආයතන වෙත ලබාදීම හා පුහුණු වැඩමුළු සංවිධානය
- ❖ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ දේශීය හා විදේශීය අත්දැකීම් හුවමාරුකර ගැනීමෙහි ලා පළාත් පාලන ආයතන දිරිගැන්වීම
- ❖ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා මූල්‍ය ආයතනයන්ගෙන් තාක්ෂණික හා මූල්‍යමය සහාය ලබාග ැනීමට සහායවීම
- ❖ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා කසල කළමනාකරණයට අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි , වාහන , යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා යටිතල පහසුකම් ලබා දීම
- ❖ 3ඍ ක්‍රමවේදය වැඩිදියුණු කිරීම (Reduse" Reuse" Recycle)

3.3.3. විශේෂ ව්‍යාපෘති - ජපන් තාක්ෂණික කොම්පෝස්ට් යන්ත්‍ර ස්ථාපනය කිරීම.

- ❖ දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුළ කම්කරු ශ්‍රමය යොදාගෙන කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය සිදුකරන අතර එම ක්‍රමය වෙනුවට යාන්ත්‍රික ක්‍රමවේදයන් යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කාර්යක්ෂම කිරීම .

- ❖ 2017 වර්ෂයේ දිවයිනේ පළාත් 09 ම ආවරණය වන පරිදි යන්ත්‍ර ස්ථාපනය කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර එම යන්ත්‍රයක් මඟින් දිනකට කසල ටොන් 50 ක් කොම්පොස්ට් කිරීම සිදු වේ. පළාත් පාලන ආයතන (50) ක පමණ දිරන කසල සඳහා විසඳුමක් මෙමගින් ලැබෙන අතර මෙහි නිෂ්පාදිත ගුණාත්මක තත්වයෙන් ඉහළ කොම්පෝස්ට් සඳහා වෙළඳ පොළක් හඳුන්වා දීමට ද කටයුතු කරමින් පවතී.

යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත පළාත හා ස්ථානය	දිරන කසල ලබාගන්නා පළාත් පාලන ආයතන
බස්නාහිර පළාත බේරුවල	බේරුවල නගර සභාව, බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව. පානදුර මහා නගර සභාව, ,පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව
උතුරු මැද පළාත මැදිරිගිරිය	මැදිරිගිරිය ප්‍රා.ස. දිඹුලාගල , වැලිකන්ද ප්‍රා.ස. හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රා.ස. ලංකාපුර ප්‍රා.ස.
මධ්‍යම පළාත දඹුල්ල, දිගම්පතහ	දඹුල්ල මහා නගර සභාව, ගලේවෙල ප්‍රා.ස., දඹුල්ල ප්‍රා.ස., ලග්ගල පල්ලෙගම ප්‍රා.ස., නාඋල ප්‍රා.ස., කැකිරාව ප්‍රා.ස, කළුගස්වැව ප්‍රා.ස
සබරගමුව පළාත කෑගල්ල	කෑගල්ල නගර සභාව, කෑගල්ල ප්‍රා.ස, මාවනැල්ල ප්‍රා.ස.අරණායක ප්‍රා.ස, බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රා.ස, දෙහිඕවිට ප්‍රා.ස., ගලිගමුව ප්‍රා.ස., රුවන්වැල්ල ප්‍රා.ස.,යටියන්තොට ප්‍රා.ස., දැරණියගල ප්‍රා.ස. , රඹුක්කන ප්‍රා.ස.,වරකාපොල ප්‍රා.ස
දකුණු පළාත හම්බන්තොට	හම්බන්තොට නගර සභාව, හම්බන්තොට ප්‍රා.ස., අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව
වයඹ පළාත ඉබ්බාගමුව	ඉබ්බාගමුව ප්‍රා.ස, කුරුණෑගල ප්‍රා.ස, මාවතගම ප්‍රා.ස. , රිදීගම ප්‍රා.ස, වාරියපොල ප්‍රා.ස.
නැගෙනහිර පළාත අඩ්ඩාලච්චේන	අඩ්ඩාලච්චේන ප්‍රා.ස., සමන්තුරෙයි ප්‍රා.ස., අක්කරෙයිපත්තු මහා නගර සභාව, කල්මුණේ මහා නගර සභාව, කරෙතිව් ප්‍රා.ස., නින්දවූර් ප්‍රා.ස.
ඌව පළාත බදුල්ල	බදුල්ල මහා නගර සභාව, මීගහකිවුල ප්‍රා.ස.,බදුල්ල ප්‍රා.ස., සොරණාතොට ප්‍රා.ස., කන්දකැටිය ප්‍රා.ස., හාලිඇල ප්‍රා.ස.,
උතුරු පළාත වඩමාරච්චි නිරිත	වඩමාරච්චි නිරිත ප්‍රා.ස., චාවකච්චේරි නගර සභාව, පේදුරු තුඩුව නගර සභාව, වැල්වැටිතුරෙයි නගර සභාව, චාවකච්චේරි ප්‍රා.ස., වලිකාමම් (බටහිර) ප්‍රා.ස.

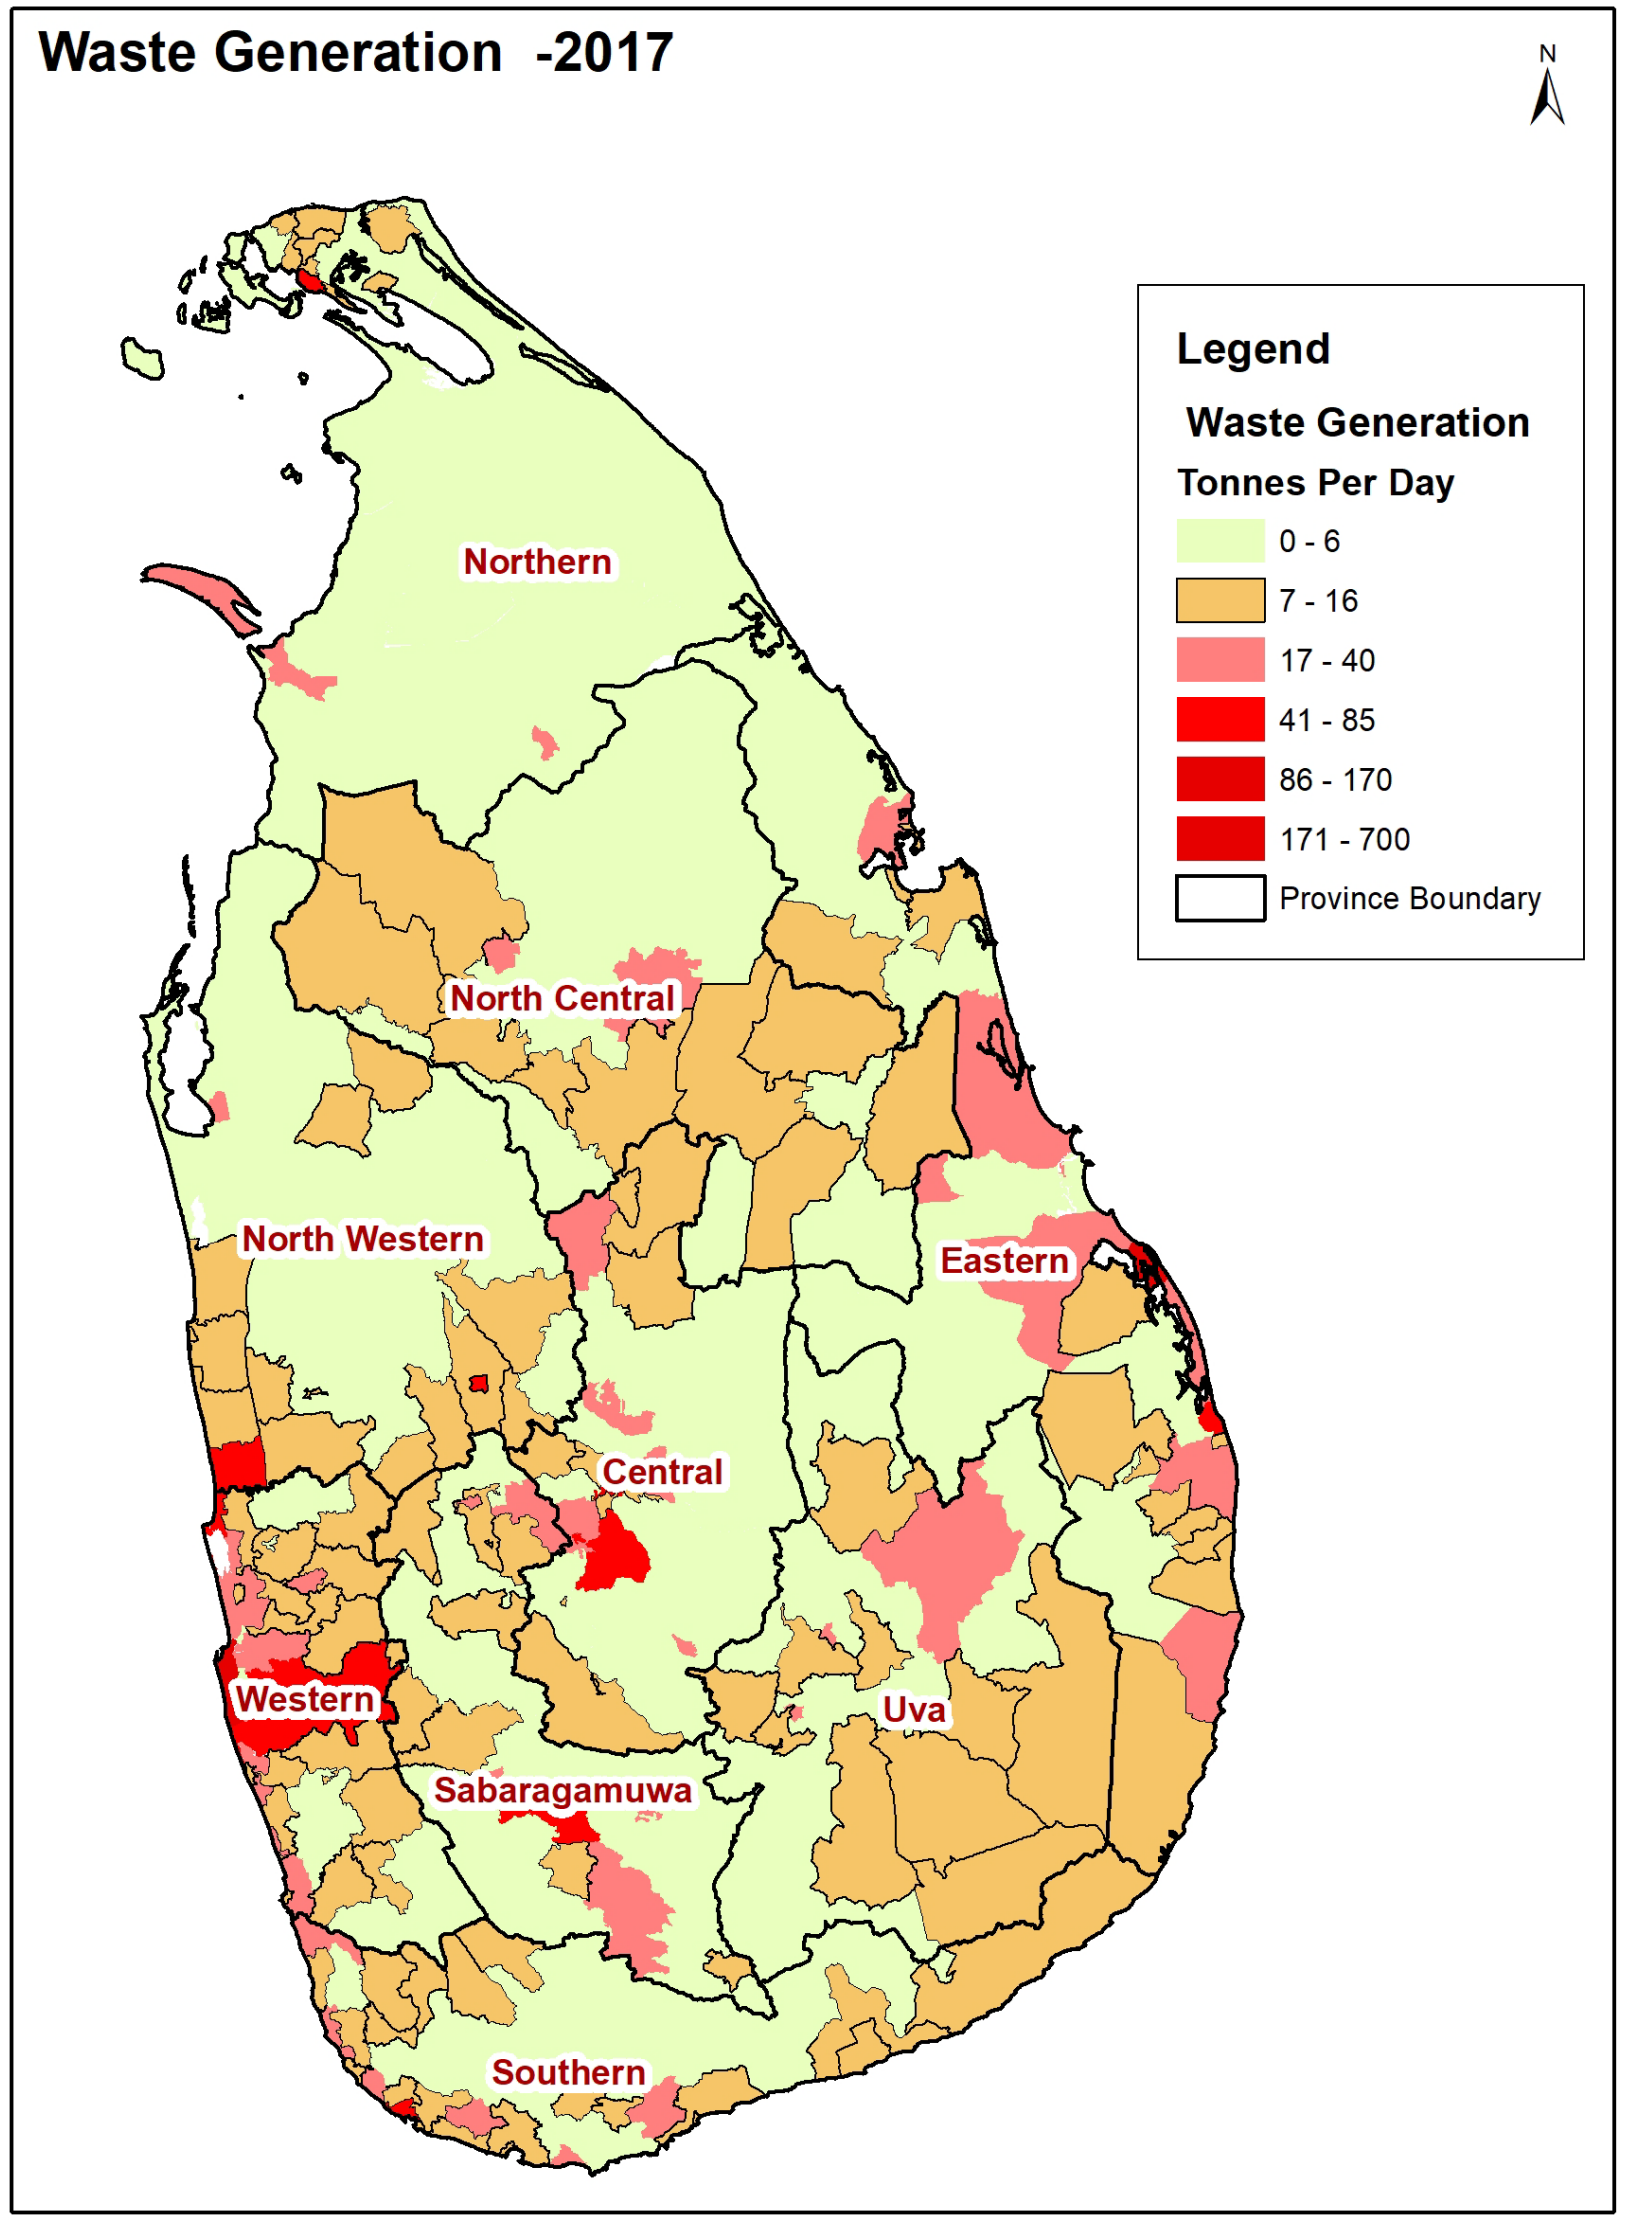

Waste Generation -2017
N
Legend
Waste Generation
Tonnes Per Day
0 - 6
7 - 16
17 - 40
41 - 85
86 - 170
171 - 700
Province Boundary
Northern
North Central
North Western
Eastern
Central
Western
Uva
Sabaragamuwa
Southern

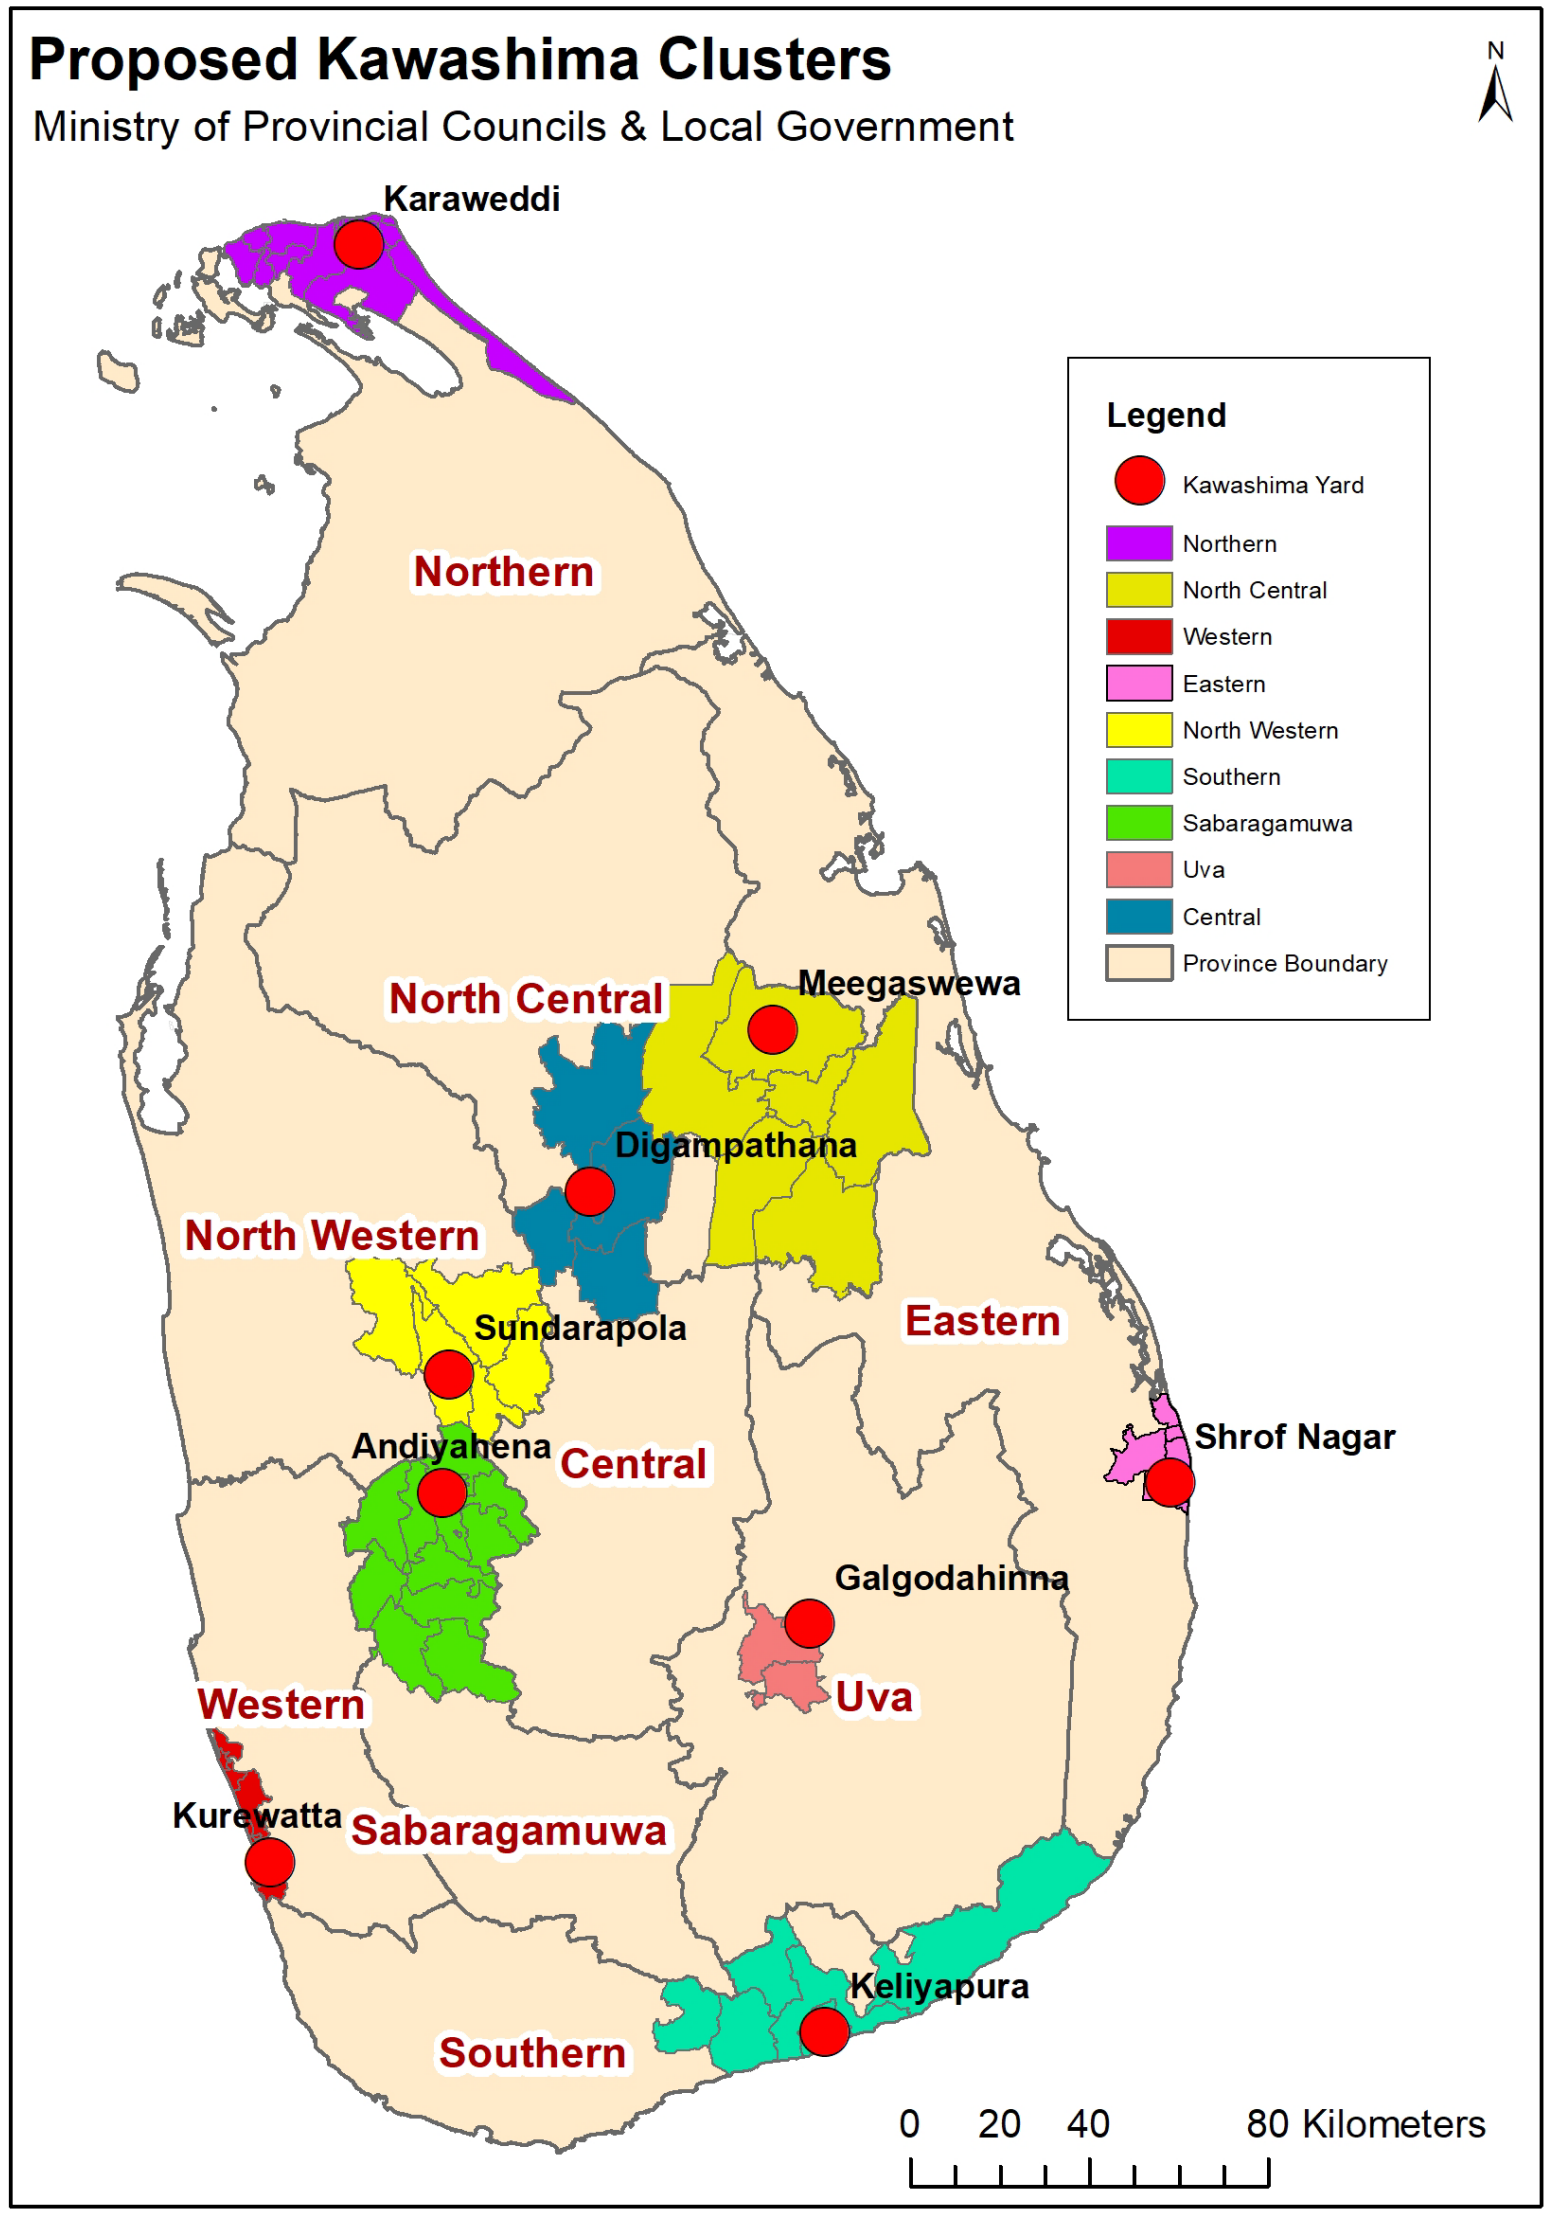

Proposed Kawashima Clusters
Ministry of Provincial Councils & Local Government
N
Legend
Kawashima Yard
Northern
North Central
Western
Eastern
North Western
Southern
Sabaragamuwa
Uva
Central
Province Boundary
Karaweddi
Northern
North Central
Meegaswewa
Digampathana
North Western
Sundarapola
Eastern
Shrof Nagar
Andiyahena
Central
Galgodahinna
Uva
Western
Kurewatta
Sabaragamuwa
Keliyapura
Southern
0 20 40 80 Kilometers

සියළුම පළාත් පාලන ආයතනවල කසල වෙන්කිරීම ආරම්භ කිරීම

❖ කසල වෙන්කිරීම වෙනුවෙන් 2017 වර්ෂයේ සියළුම පළාත් පාලන ආයතන අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් ලෙස හඳුන්වාදෙන ලදි. තව ද එසේ වෙන් කරන කසල කොම්පෝස්ට් කිරීම වෙනුවෙන් පළාත් පාලන ආයතන පොකුරු ක්‍රමයට පෙලගැස්වීම ආරම්භ කර ඇත. නොදිරන කසල ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කිරීම වෙනුවෙන් පෞද්ගලික ආයතන දිරිගන්වමින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති මේ වෙනුවෙන් ආරම්භ කිරීමටත් කටයුතු යොදා ඇත. නොදිරන එහෙත් ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කළ නොහැකි කසල සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් වෙත යොමු කිරීම වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

❖ කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල කසළ කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා කාර්ය සාධක බලකායක් හා මෙහෙයුම් කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීම

❖ මහජනතාවගේ පැමිණිලි ලබාගැනීම සඳහා 1917 යන දුරකථන අංකය ස්ථාපිත කර ඇත.
❖ ලැබෙන පැමිණිලි කඩිනමින් විසඳීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පරිසර පොලිස් නිලධාරීන් විසින් අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීම .
❖ අවිධිමත් කසල බැහැර කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ලැබීමේ දී ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතු පරිසර පොලීසිය මඟින් සිදුකිරීම.
❖ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන් විසින් කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල මාර්ගවල හා අතුරු මාර්ගවල අනවසනර කසල බැහැර කිරීම, මාර්ගයේ පවතින අනතුරු දායක තත්වයන් පිළිබඳ වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කිරීම හා නිවැරදි කිරීමට අදාළ ආයතන වෙත යොමු කිරීම .

ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන

❖ දිවයිනේ ඩෙංගු අවදානම් සහිත පරිසරයන් අවම කිරීමට ආයතන දැනුවත් කරමින් අවශ්‍ය වැඩසටහන් සම්පාදනය කර, ඒවා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය දීම මඟින් ඩෙංගු වලින් තොර පරිසරයක් ගොඩනැගීමට පළාත් පාලන ආයතන වලට සහාය වීම.

වගු අංක 33 - ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රගතිය (2017.12.31 දිනට) ජාතික ඝන අපද්‍රව්‍යය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම (රු.)	සත්‍ය වියදම (රු.)	සත්‍ය භෞතික ප්‍රගතිය (%)
01	ජපන් තාක්ෂණික කොම්පෝස්ට් යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීම	748,000,000	662,016526	100%
02	කොම්පෝස්ට් අංගන , මල අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථාන හා නොදිරන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම	235,000,000	118,042,670	100%
03	යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදීගැනීම හා බෙදාහැරීම (ගලිබවුසර් හා බොබ්කැට් යන්ත්‍ර)	116,000,000	--	50%
04	ජනනය වන ස්ථානයේදීම කසල වෙන් කිරීම හා ගෘහස්ත කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු කිරීම හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම	32,0 00,000	35,751,616	100%

05	ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍ය මගින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම	25,000,000	16,753,997	100%
06	කසළ කළමනාකරණ මෙහෙයුම් මැදිරිය ක්‍රියාත්මක කිරීම	44,000,0000	4,7335,74	100%
	එකතුව	**1200,000,000**	**837,298,383**	

හම්බන්තොට මහා නගර සභාවේ ගලි පිරිපහදු පද්ධතිය නවීකරණය

නොදිරන කසළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානය කතරගම ප්‍රාදේශීය සභාව

3.4.පළාත් පාලන අංශය

අරමුණ:

ප්‍රාදේශීය සම්පත් හා ශක්තීන් ගොනු කර ප්‍රාදේශීය අනන්‍යතාව ආරක්ෂා කර ගනිමින් ස්වයං උත්පාදන ආයතනයන් බවට පත්වීමේ අභිලාශයෙන් සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර තමන් වෙත පැවරී ඇති කාර්යය හා බලතල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන පළාත් පාලන ආයතන බිහි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ජාතික මට්ටමේ නියාමනය.

උපාය මාර්ග :

01. යහපාලන මූලධර්ම මත පිහිටා එක් එක් පළාත තුළ පවත්නා මානව ප්‍රාග්ධනය හා පාරිසරික සම්පත් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරමින් ආදායම් ප්‍රභවයන් වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම.

02. බාහිර සංක්‍රමණ අනුපාතය සාපේක්ෂව වඩා ඉහළ මට්ටමක පවත්නා පළාත් පාලන ආයතනයන්හි එකී අනුපාතයන් අවම කිරීමට සුදුසු ප්‍රතිපත්ති හා දිගු කාලීන වැඩ සටහන් හඳුන්වා දීම.

03. ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියෙහි සුරක්ෂිත බව උදෙසා එක් එක් පළාතෙහි පවත්නා මානව සම්පතෙහි උපයෝගිතාවය වඩාත් තහවුරු කිරීම.

2017 වර්ෂය සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවල පෙරටු කාර්යාල ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

පළාත් පාලන ආයතනයකින් සේවාවක් ලබා ගැනීම උදෙසා පැමිණෙන මහජනතාවට අවශ්‍ය වන වරිපනම් බදු ගෙවීම්, අවශ්‍ය ආකෘති පත්‍ර ලබා ගැනීම් යනාදී ප්‍රමුඛ සේවා සපයා ගැනීමේදී එම කටයුතු කාර්යක්ෂමව ලබා දීමේ අරමුණින් පළාත් පාලන ආයතන 106 ක පෙරටු කාර්යාල ස්ථාපනය කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදී.

මේ අනුව තෝරා ගන්නා ලද පළාත් පාලන ආයතන වල පෙරටු කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීම සඳහා සහ එහි භාවිතය සඳහා පරිගණක යන්ත්‍ර හා උපකරණ මෙන්ම එයට අවශ්‍ය කාර්යාලීය ලී බඩු උපකරණ සපයා ගැනීම සඳහා මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත. මෙම පෙරටු කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීම මඟින් පළාත් පාලන ආයතනයෙන් අය කරගනු ලබන විවිධ බදු ගෙවීම් , විවිධ කුලී ගෙවීම්, විවිධ බල පත්‍ර නිකුත් කිරීම් හා විථි රේඛා සහතික,නිශ්කාශණ සහතික ආදී සහතික පත් නිකුත් කිරීම වැනි පළාත් පාලන ආයතනවලින් සිදුවන කාර්යයන් ඉතා කඩිනමින් ඉටු කර ගත හැක.

පෙරටු කාර්යාල ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මුදල් ලබා දීම පහත පරිදි වේ.

	පළාත	ගණන තෝරාගත් පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව	බාදුන් මුදල (රු.මිලියන)
1	බස්නාහිර	21	13.48
2	මධ්‍යම	10	6.87
3	දකුණ	05	3,69
4	වයඹ	13	8.41
5	සබරගමුව	13	8.56
6	ඌව	06	4.44
7	උතුර	03	2.25
8	නැගෙනහිර	35	23'72
	එකතුව	**106**	**71.42**

මේ වන විට ස්ථාපනය කරන ලද පෙරටු කාර්යාල කිහිපයක ඡයාරූප පහත දැක් වේ.

නව පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය සහ පවත්නා පළාත් පාලන ආයතන උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා නිර්ණායක තීරණය කිරීම.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නව පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීම හා තිබෙන පළාත් පාලන ආයතන උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම සම්බන්ධව පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් හෝ ප්‍රතිපත්තියක් නොමැති වීම හේතුවෙන් එම කාර්යයන් විධිමත්ව සිදු නොවන බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව නව පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය සහ පවත්නා පළාත් පාලන ආයතන උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමේ හා ඊට අදාලව නිර්ණායක හඳුනාගැනීමේ අරමුණින් යුතුව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන විෂයභාර ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් 2016.05.25 දින 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විද්වත් කමිටුවක් පත් කරන ලදී.

අදාල සියලුම ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි වූ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත පළාත්/දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කමිටු පිහිටුවීමටත් හඳුනා ගනු ලැබූ නිර්ණායක පදනම් කරගෙන විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරමින් පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපන හා උත්ශ්‍රේණිගත කිරීමේ කාර්යයන්ට අදාලව එම පළාත් කමිටු මඟින් නිර්දේශ ලබා ගැනීම යන කරුණු ඇතුළත් විද්වත් කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2017.07.25 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

ඒ අනුව අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබුණු ඉල්ලීම් / යෝජනා පහත සඳහන් පරිදි ඒඒ පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් වෙත යොමු කරන ලදී.

උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම හා සංස්ථාපනය සඳහා ලැබී තිබූ යෝජනා

අනු අංකය	පළාත	උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම හා සංස්ථාපනය සඳහා ලැබී ඇති යෝජනා
01	බස්නාහිර පළාත	13
02	මධ්‍යම පළාත	06
03	දකුණු පළාත	09
04	වයඹ පළාත	15
05	ඌව පළාත	06
06	සබරගමුව පළාත	03
07	උතුරු මැද පළාත	05
08	නැගෙනහිර පළාත	17
09	උතුරු පළාත	08
	එකතුව	82

ඒ අනුව පළාත් කමිටු මගින් ලැබෙන නිර්දේශ පදනම් කරගෙන සංස්ථාපන /උත්ශ්‍රේණිගත කිරීමට කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ. මේ වන විට පළාත් 05 කින් නිර්දේශ ලැබී ඇත.

මේ අනුව මධ්‍යම පළාත් කමිටු නිර්දේශය මත පැවති අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සීමා සංශෝධනය කරමින් නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාව හා මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාව ලෙස ප්‍රාදේශීය සභා 02 ක්ද පැවති නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සීමා සංශෝධනය කරමින් කොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව හා ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාව වශයෙන් නව ප්‍රාදේශීය සභාව 02 ක්ද වශයෙන් නව ප්‍රාදේශීය සභා 04 ක් සංස්ථාපනය කරන ලදී.

මීට අමතරව තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය සභාව බෙදා පොළොන්නරුව මහා නගර සභාව සංස්ථාපනය කර ඉතිරි තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය සභා සීමාව පොළොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සභාව ලෙස නාමය වෙනස් කරන ලදී.

අයහපත් කාළගුණයෙන් පීඩාවට පත් පළාත් පාලන ආයතන වලට සහන සැලසීම.

2017 වර්ෂයේ මැයි, ජුනි මාස වල දිවයිනේ පැවති අයහපත් කාළගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් දකුණ , බස්නාහිර හා සබරගමුව පළාත් වල පීඩාවට හා හානියට පත් පළාත් පාලන ආයතන බල ප්‍රදේශ වල යටිතල පහසුකම් නගා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය හා සම්බන්ධීකරණ සහාය ලබා දීමට කටයුතු කරන ලදී.

තවද ආපදාවෙන් හානියට පත් නොවූ ප්‍රදේශ අයත් පළාත් පාලන ආයතන වල යන්ත්‍රෝපකරණ, ආපදාවට ලක් වූ ආසන්නතම පළාත් පාලන ආයතන වල යටිතල පහසුකම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා එම බල ප්‍රදේශ වෙත යොමු කිරීමට අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ඉටු කරන ලදී .

විද්‍යාත්මක පසුබිමක් මත පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන හඳුනා ගැනීම

සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා මෙම අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමේ දී පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන නගා සිටුවීමට මූලිකත්වය ලබා දෙන අතර එහිදී නිවැරදිව එම ආයතනවල පසුගාමී තත්ත්වය හඳුනා ගැනීම වැදගත් වේ. මේ සඳහා මෙතෙක් අනුගමනය කරන ලද ක්‍රියා මාර්ගය වූයේ එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනයේ වාර්ෂික ආදායම (ප්‍රදානයන් හැර) අනුපිළිවෙලට පෙළ ගස්වා වාර්ෂික ආදායම රුපියල් මිලියන 10 ට අඩු ආයතන පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන ලෙස සලකා සංවර්ධන සහාය ලබාදීම වේ. ඒ අනුව විද්වත් මඩුල්ලක් විසින් සකස් කරන ලද නිර්ණායක පදනම් කරගෙන ලකුණු ලබා දී පළාත් පාලන ආයතන ලකුණු අනුපිළිවෙල අනුව ප්‍රමුඛතා ගත කිරීම තුළින් පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන 100 ක් හඳුනා ගෙන සංවර්ධන සහාය ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ.

මෙහිදී පහත නිර්ණායක කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදි.

i'	ප්‍රවේශය	xi.	ආපදා අවදානම
ii'	නාගරීකරණය	xii.	පළාතේ තත්ත්වය
iii'	දරිද්‍රතාවය	xiii.	රැකියා වියුක්තිය
iv'	අධ්‍යාපනය	xiv.	සෞඛ්‍යය
v'	මාර්ග	xv.	ජල සැපයුම
vi'	විදුලිය	xvi.	පුස්තකාල
vii'	රජයේ ප්‍රදාන	xvii.	බාහිර අරමුදල්
viii'	උපයාගත් ආදායම්	xviii.	ප්‍රධාන කාර්යය මණ්ඩල
ix'	පුරප්පාඩු	xix.	මූල්‍ය කළමනාකරණය
x'	කාර්යාල උපකරණ	xx.	කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

ඉහත නිර්ණායක අනුව පළාත් මට්ටමින් පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන ලෙස හඳුනා ගත් පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ.

අනු අංකය	පළාත	මුළු පළාත් පාලන ආයතන ගණන	පසුගාමී පළාත් පාලන ආයතන සංඛ්‍යාව
01	බස්නාහිර පළාත	48	08
02	වයඹ පළාත	33	10
03	මධ්‍යම පළාත	43	04
04	ඌව පළාත	28	04
05	සබරගමුව පළාත	29	05
06	දකුණු පළාත	49	13
07	උතුරු මැද පළාත	26	15
08	උතුරු පළාත	34	09
09	නැගෙනහිර පළාත	45	32
	එකතුව	335	100

මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් 9 තුළ පිහිටි පළාත් පාලන ආයතන වලින් මහජනතාව වෙත සපයන සේවා සම්බන්ධයෙන් අතෘප්තියට පත් වුවහොත් එවැනි අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධව පැමිණිලි යොමු කිරීම සඳහා මෙම අමාත්‍යාංශයේ පළාත් පාලන අංශයට අනුයුක්තව පැමිණිලි විමර්ශන අංශයක් ස්ථාපිත කර ඇත. එලෙස යොමු කරනු ලබන මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පරිදි ක්‍රියාකර විසඳුම් ලබා දීම සඳහා අවස්ථාවෝචිත පරිදි අදාල පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් / පළාත් පාලන කොමසාරිස් /පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

2017 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දක්වා එලෙස යොමු කරන ලද මහජන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව -1805

අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ හා තීරණ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම

I. පළාත් පාලන විෂයට අදාල ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ වලට එළඹීම සඳහා පළාත් පාලන අංශය මඟින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ . එලෙස 2017 වර්ෂය තුළ ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ ගණන 04 කි. එම පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද කොට්ඨාස සීමා නිර්ණයට අදාලව කමිටු පත් කරන ලද අවස්ථාවලදී හා පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීම හා පවතින පළාත් පාලන ආයතන උත්ශේණිගත කිරීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට අදාලවය.

II. මීට අමතරව වෙනත් අමාත්‍යාංශ වලින් පළාත් පාලන විෂයට අදාලව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සඳහා අවස්ථාවෝචිත පරිදි ඒ ඒ පළාත් වලින් අවශ්‍ය තොරතුරු හා නිර්දේශ ලබා ගනිමින් නිරීක්ෂණ සපයනු ලැබේ. එලෙස 2017 වසර තුළ යොමු වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිරීක්ෂණ ගණන 10 කි.

III. මීට අමතරව ලැබෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් වෙත යොමු කිරීමට ද කටයුතු කරනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා මහජනතාව විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත යොමු කරන ගැටලු

- **පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න**

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන විෂය භාර ගරු අමාත්‍යතුමන් වෙතින් පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමු කරනු ලබන ගැටළු අදාල පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් වෙත යොමු කර එම පළාත් වලින් ලබා ගන්නා නිරීක්ෂණ මත පිළිතුරු සකස් කර පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. එලෙස 2017 වසර තුළ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න ගණන 23 කි.

මීට අමතරව පාර්ලිමේන්තුව කල් තබනු ලබන අවස්ථාවලදී පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගැටලු සඳහා කඩිනමින් පිළිතුරු සකස් කළ යුතුව ඇත. මේ සඳහා අදාල පළාතට ගැටළුව යොමු කර දිනක් හෝ දින දෙකක් තුළ නිර්දේශ ලබා ගෙන ඊට අනුකූලව පිළිතුරු කෙටුම්පත් කර යොමු කරනු ලැබේ. මෙලෙස ලද ගැටලු සංඛ්‍යාව 03 කි.

- **මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව**

I. පළාත් පාලන ආයතන වෙතින් තම අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට නොහැකිවන ඇතැම් පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් විසින් මහජන පෙත්සම්කාරක සභාව මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන පෙත්සම් සඳහා පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරුන්ගෙන් තොරතුරු ලබාගෙන එම පුද්ගලයින්ට සහන සැලසිය හැකි පරිදි මැදිහත්කරුවකු ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි.

II. පළාත් පාලන ආයතන වල සේවය කරනු ලබන ඇතැම් නිලධාරීන් විසින් ආයතන මට්ටමින් නොවිසඳුනු පරිපාලන ගැටලු පෙත්සම් ලෙස මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාද දැකිය හැකි වේ. එවැනි යොමු කිරිම සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට ද අදාල පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරුන් වෙතින් තොරතුරු හා නිර්දේශ ලබා ගෙන මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරනු ලැබේ.

එලෙස 2017 වසර තුළ මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පෙත්සම් ගණන 46 කි.

■ **රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව**

පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව හරහා ඉදිරිපත් වන මහජන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබා දීමට ද අදාල පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් සම්බන්ධීකරණයෙන් යුතුව ලැබෙන නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ පදනම් කර ගෙන කටයුතු කරනු ලැබේ.

එලෙස 2017 වසර තුළ රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව වෙතින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ගැටළු සංඛ්‍යාව 29 කි.

පළාත් පාලන ආයතන විසින් අය කරනු ලබන බදු

පළාත් පාලන ආයතන වලින් අය කරනු ලබන බදු හා බලපත්‍ර ගාස්තු පැනවීමේදී විෂමතාවයන් පැවතීම හේතුවෙන් මහජනතාවට මුහුණ දීමට සිදු වන අවහිරතා හා අපහසුකම් ඉවත් කිරීම සඳහා බදු හා බලපත්‍ර ගාස්තු පැනවීම ව්‍යවස්ථාපිත විධිවිධාන සමඟ අනුකූල කරවිම සහ එම විධි විධාන වල සංශෝධන සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන විටදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

පළාත් පාලන ආයතන වලින් අය කරනු ලබන බදු හා බලපත්‍ර ගාස්තු නියාමනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් මත කමිටුවක් පත් කර ඇති අතර එම කමිටුව මඟින් බදු හා බලපත්‍ර ගාස්තු සම්බන්ධව විධිමත් ක්‍රමවේදයන් යටතේ කිරීමට නියමිතය.

අයාලේ යන සුනඛයින්ගෙන් මහ ජනතාවට සිදු වන අවහිරතා වැළැක්වීම සඳහා මෙතෙක් ගෙන ඇති පියවර

අයාලේ යන සුනඛයින්ගෙන් මහජනතාවට සිදු වන අවහිරතා වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු ක්‍රම වේදයක් සැකසීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කර ඇත. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ග්‍රාමීය කටයුතු අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශ වල ලේකම්වරුන්ගෙන් මෙම කමිටුව සමන්විත වේ. එම කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශ අනුව අයාලේ යන සුනඛ ගහනය පාලනය, ජලභීතිකා රෝග මර්ධනය කිරීම, පොදු ස්ථාන වල සිදු වන සුනඛයින් සපාකෑම් පාලනය කිරීම සඳහා ක්‍රම වේදයක් සකස් කිරීම සහ සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය දැනට ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සුනඛ වන්ධ්‍යකරණය සහ එන්නත්කරණ වැඩසටහන ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම යන කරුණු නිර්දේශ කර ඇත. ඒ අනුව මේ වන විට පහත ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

01. ඒ අනුව සුනඛ එන්නත්කරණය හා වන්ධ්‍යකරණය සඳහා වැඩසටහන් පළාත් මට්ටමින් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර දිස්ත්‍රික්කයකට එක බැගින් සුනඛ රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ මූල්‍ය සහයෝගය සහිතව ස්ථාපනය කර වීථි වල වාසය කරන සුනඛයින් එම රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට අවධානය යොමු වී ඇත.

02. 2018.04.01 දින සිට යථෝක්ත වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන්ම සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත් කර ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව හා සියළු පළාත් සභා යටතේ විශේෂ වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

03. ඉදිරි වර්ෂයේ සිට මෙම වැඩසටහන සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ඍජුවම ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයට හා පළාත් සභා සඳහා වෙන් කර දීමට කටයුතු කර ඇත.

04. I. ඊට අමතරව ජලභීතිකා රෝගය පිළිබඳ ආඥා පනත සහ සුනඛයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර, ඒ අනුව සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පත නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

II. සුනඛයින් පොදු ස්ථාන වල දමා යන අවස්ථාවලදී එම පුද්ගලයින්ට දඬුවම් ලබා දීමේ ක්‍රම වේදයක්ද දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති පනත් කෙටුම්පතට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කිරීම. (රු.25000ක දඩයක් හෝ මාස 06ක සිර දඬුවමක් ලබා දීම).

05. I. සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නව පශු වෛද්‍යවරුන් 60 දෙනෙකු බඳවාගැනීමට කටයුතු කිරීම හා එසේ බඳවා ගන්නා නව පශුවෛද්‍යවරුන් වෙත ඒ ඒ පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශවල සිටින සුනඛ ගහණය පාලනය හා ජලභිතිකා රෝග මර්ධනය සඳහා පූර්ණ බලතල පැවරීමට තීරණය කිරීම.

II. දැනට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ සේවය කරන එන්නත්කරුවන් සහ අදාල අනෙකුත් නිළධාරීන් රැකියා නාමය සහ වැටුපෙහි වෙනසක් නොකර සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදවීමට තීරණය කිරීම.

III. සුනඛ එන්නත්කරණ හා වන්ධ්‍යකරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තව දුරටත් අවශ්‍ය වන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම් කළමණාකරන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම

3.5. පළාත් සභා අංශය

අරමුණ

පළාත් සභාවල ක්‍රියාකාරිත්වයට පහසුකම් සැලසීම, මධ්‍යම රජය හා පළාත් සභා අතර සම්බන්ධීකරණය හා පළාත් සභාවල මානව සම්පත් සංවර්ධනය මඟින් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම පළාත් සභා ක්‍රමයක් ඇති කිරීම.

උපාය මාර්ග

1. යහ පාලන මූලධර්ම මත පිහිටා එක් එක් පළාත තුළ පවත්නා මානව ප්‍රාග්ධනය සහ පාරිසරික සම්පත් ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරමින් පළාත් ආදායම් ප්‍රභවයන් වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම.

2. බාහිර සංක්‍රමණ අනුපාතය සාපේක්ෂව වඩා ඉහළ මට්ටමක පවත්නා පළාත් සභාවන්හි එකී අනුපාතය අවම කිරීමට සුදුසු ප්‍රතිපත්ති හා දිගු කාලීන වැඩසටහන් හඳුන්වාදීම.

3. ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියෙහි සුරක්ෂිත බව උදෙසා එක් එක් පළාතෙහි පවත්නා මානව සම්පතෙහි උපයෝගීතාවය වඩාත් තහවුරු කිරීම.

වගු අංක 3 - පළාත් සභා අංශයේ ප්‍රගතිය - 2017 වසර අගට

අනු අංකය	ක්‍රියාකාරකම	ප්‍රගතිය
01	ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම (පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා)	ඉඩම් අත්කර ගැනිමට අදාලව සියළුම පළාත් වෙතින් ඉල්ලීම් 353ක් මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්ගේ නිර්දේශය සහිතව යොමු කර ඇත.
		එම ඉල්ලීම් වලින් 202ක් අඩුපාඩු සහිතව එවා ඇති බැවින් අදාළ පළාත් වෙත නැවත යොමු කර ඇත. එයින් ඉල්ලීම් 27ක් සම්බන්ධව මේවන තෙක් අඩුපාඩු සකස්කර එවා නොමැති බැවින් ඒ පිළිබඳව විමසා අදාළ පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් වෙත සිහිකැඳවීම් ලිපි යවා ඇත.
		ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව ඉදිරිපත්කර තිබූ ඉහත ඉල්ලීම්වලින් ලිපි ලේඛන 126ක් 2 වගන්තියේ නියමය නිකුත් කිරීමේ සිට ඉදිරි කටයුතු සඳහා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කර ඇත.

		1964 අංක 28 දරණ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් පනතේ 04 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විරෝධතා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව නිලධාරීන් 12 දෙනෙකු පත් කර ඇත.
		38(අ) අතුරු විධානය යටතේ අත්කර ගැනීමට අදාලව ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට නිර්දේශ 08ක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
		එම ඉල්ලීම්වලින් 5ක් ඉඩම් අත්කරගැනිමේ කටයුතු අත්හැරිම / අවසතු කිරිම සඳහා මෙම අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍යතුමාගේ නිර්දේශය සහිතව ඉඩම් හා පාර්ල්මේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත යොමුකර ඇත.
02	රා.පරි.ච.ලේ.06/2006 අනුව පළාත්රාජ්‍ය සේවයට අදාළ තනතුරු සඳහා සේවා ව්‍යස්ථා සම්පාදනය කිරීම	06/2006 චක්‍රලේඛ අනුව සකසා අවසන් කොට ඇති පහත සඳහන් පළාත් සේවා ව්‍යවස්ථා සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටළු පිළිබඳ ක්‍රියා කරමින් පවතී. තාක්ෂණ සේවය ආදායම් පරීක්ෂක සේවය පේෂ කර්ම උපදේශක ආදායම් සේවය කෘෂිකර්ම උපදේශක
		ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව විසින් එවන ලද ක්‍රීඩා නිළධාරී, ක්‍රීඩා පුහුණුකරු සහ මූලස්ථාන ක්‍රීඩා නිළධාරී තනතුරුවලට අදාල බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සියළුම පළාත් සභා වෙත යොමු කර ඇති අතර ,සබරගමුව, වයඹ සහ දකුණ යන පළාත් වෙතින් සංශෝධන ඉදිරිපත් කර ඇත. සියළු පළාත් වෙතින් විස්තර ලද පසු ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කිරීමට නියමිතයි.
	පළාත් පාලන කළමනාකරණ සේවය ස්ථාපිත කිරීම	රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතුව පත් කරන ලද කමිටුව මඟින් මේ වන විට කමිටු වාර්තාව සකසා ඇත. කමිටු වාර්තාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් සකසා ඉදිරිපත් කර ඇත.
03	පළාත් සභා ධූරධාරීන් හා නිළධාරීන් සම්බන්ධ කරගත හැකි තොරතුරු කාර්තුමය වශයෙන් යාවත්කාලීන කිරීම	තොරතුරු ඇතුළත් පොත් පිංච සකස් කර අමාත්‍යාංශයේ සියළුම අංශ වෙත ලබා දී ඇත.

04	පළාත් සභාවන්ට හා පළාත් පාලන ආයතනයන්ට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ	I. පළාත් සභාවන්ට අදාල ගැටලු පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ 09ක් සකස් කර ඇත. II. වෙනත් අමාත්‍යාංශ මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සඳහා නිරීක්ෂණ 14ක් අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත. III. අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 34ක් පිළිබඳ ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් දැනුවත් කර ඇත.
05	පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න	පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න 20ක් සඳහා පිළිතුරු පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කර ඇත.
06	මහජන පෙත්සම් I. පාර්ලිමේන්තු මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව වෙතින් ලැබෙන පෙත්සම්	පෙත්සම් 20ක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා අදාල පළාත් සභා වෙත යොමු කර ඇත. මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව විසින් එවා ඇති මහජන පෙත්සම්වලට අදාල වාර්තා 16ක් සම්බන්ධව මෙම අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවට යොමු කර ඇත.
07	පළාත් සභා සඳහා වාහන මිලදීගැනීම සහ දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් වෙත තීරු බදු සහන සහිත වාහන ආනයන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම I. රා.පරි.ච.ලේ.22/99ට අදාළ නිර්දේශ ලබාදීම II. ජාතික අයවැය චක්‍රලේඛ අංක 1/2016 අනුව පළාත් සභා සඳහා වාහන මිලදී ගැනීම. III. 01 වන උතුරු පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් හට තීරු බදු සහන සහිත වාහන ආනයන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම	ලද අයදුම්පත් 40ක් නිර්දේශ කර වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවා ඇත. වියදම් පාලන කමිටුවේ අනුමැතිය සඳහා අයදුම්පත් 23ක් යොමු කර ඇත. තීරු බදු සහන සහිත වාහන ආනයන බලපත්‍ර 38ක් නිකුත් කර ඇත.

08	නව තනතුරු ඇතිකිරීම	පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නව තනතුරු ඇති කිරීමට කළමනාකරණ සේවා චක්‍ර ලේඛ 03/2014 පරිදි ලැබී ඇති ඉල්ලීම් 752ක් නිර්දේශ කර කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරි කටයුතු සඳහා යොමු කර ඇත. තනතුරු 601ක් අනුමත කර ඇති බව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් අදාළ පළාත් සභා වෙත දැනුම් දී ඇත.
09	විදේශීය ස්වේච්ඡා සේවකයින් සඳහා වීසා ලබාදීම/ කාලය දීර්ඝ කිරීම	විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ස්වෙච්ඡා සේවකයින්ට වීසා ලබාදීම සඳහා එවා ඇති ඉල්ලීම් 21ක් එකඟතාවය ලබාගැනීම සඳහා පළාත් වෙත යොමු කර ඇත. පළාත් වෙතින් එකඟතාවය ලැබී ඇති වීසා ඉල්ලීම් 14ක් විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර ඇත
10	අන්තර් පළාත් විෂය සම්බන්ධීකරණ සමුළුව	පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් සහ අදාළ ආයතනවල නියෝජිතයන්ගේ නියෝජන සහිතව රැස්වීම් වාර 04ක් පවත්වා ඇත.
11	පළාත් සභා ධූරධාරීන්ගේ වරප්‍රසාද දීමනා හා පහසුකම්	පළාත් සභා අනුමත ධූරධාරීන්ගේ දීමනා හා වරප්‍රසාද සමරූපී කිරීම සඳහා මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කරන ලද චක්‍රලේඛ කෙටුම්පතට ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් හා මුදල් කොමිෂන් සභාවෙන් නිරීක්ෂණ ලබා ගන්නා ලදී.
12	දේශපාලන හේතූන් මත විවිධ ගැටලුවලට මුහුණදුන් අයට සහන සැලසීම	රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයෙන් යොමු කරන ලද අභියාචනා 245න් අභියාචනා 200ක් සඳහා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාල ප්‍රගතිය රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්තා කර ඇත.
13	මහජන පැමිණිලි හා පෙත්සම්	අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය, ජනාධිපති කාර්යාලය, අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ, ආයතන සහ මහජනතාව විසින් යොමු කරනු ලැබූ පැමිණිලි 52ක් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා අදාල ආයතන වෙත යොමු කර ඇත.

14	ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රතිපාදන මත මෙහෙයවනු ලබන ව්‍යාපෘති පළාත් සභා සමග සම්බන්ධීකරණය		ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් අදාළ ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලද බවට ලිපිය ලැබීමෙන් අනතුරුව මුදල් රෙගුලාසි අනුව අදාළ වියදම් කර ගෙවීම් කිරීමට බිල්පත් එවන ලෙස අදාල පළාත් වෙත ලිපි යොමු කර ඇති අතර පළාත් වෙතින් ලැබෙන බිල්පත් පරීක්ෂා කර බලා ගෙවීම් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
	I.	වර්ෂාපතනයේ හා දේශගුණයේ පවත්නා වෙනස්කම් තුළ ආහාර නිෂ්පාදනය සැලසුම් කිරීම	වයඹ පළාත් සභාව වෙත රු.16,037,005.62ක්, සබරගමුව පළාත් සභාව වෙත රු. 1,235,520.03ක් සහ දකුණු පළාත් සභාව වෙත රු. 463,725.00ක් ලෙස ගෙවීම් කර ඇත.
	II.	තිරසාර පාසල් සංවර්ධන ජාතික වැඩසටහන	රු.684,410ක මුදලක් මධ්‍යම පළාත් සභාව වෙත ගෙවීම් කර ඇත.
	III.	දරුවන් සුරකිමු ජාතික වැඩසටහන	මධ්‍යම පළාත් සභාව වෙත රු.4,097,365.65ක් සහ නැගෙනහිර පළාත් සභාව වෙත රු.2,999,187.62ක් ගෙවීම් කර ඇත.
	IV.	ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය	උතුරු පළාත් සභාව වෙත රු.2,500,000ක්, වයඹ පළාත් සභාව වෙත රු. 2,470,000ක් සහ උතුරු මැද පළාත් සභාව වෙත රු. 1,178,750ක් ලෙස ගෙවීම් කර ඇත.
	V.	පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන	මධ්‍යම පළාත් සභාව වෙත රු.57,500ක්, වයඹ පළාත් සභාව වෙත රු. 1,900,000ක් සහ බස්නාහිර පළාත් සභාව වෙත රු. 296,465ක් ලෙස ගෙවීම් කර ඇත.
	VI.	ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන	රු.176,767.50ක මුදලක් වයඹ පළාත් සභාව වෙත ගෙවීම් කර ඇත
	VII.	වාරිමාර්ග 08ක් සංවර්ධනය කිරීම	රු.5,000,000ක මුදලක් වයඹ පළාත් සභාව වෙත ගෙවීම් කර ඇත

3.6. නීති අංශය

හැඳින්වීම

රටේ සමස්ථ ජනතාවගේ පොදු අපේක්ෂාවන් මුදුන් පත්වන ආකාරයට, ඵලදායීවූද , කාර්යක්ෂමවූද ජනතාවාදී ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුකරණයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවත්වා ගෙනයාම සහතික කරලීම සඳහාත් සමානාත්මතාවයෙන් යුතු තිරසර මානව සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහාත් පහසුකම් සළසාලීම සහ උපදෙස් ලබා දීම පිණිස අමාත්‍යාංශයේ නීති අංශය ස්ථාපිත කර ඇත.

කාර්යය භාරය

01. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා වලට අදාළ නීතීන් කාලීන අවශ්‍යතාවයන් පරිදි එකී ආයතන සමඟ සම්බන්ධිකරණයෙන් යුතුව යාවත්කාලීන කිරීම.
02. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා ක්ෂේත්‍රයට අදාල නවනීතීන් හඳුන්වා දීම.
03. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා වලට අදාළ නීතිමය ගැටලු සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහාය ඇතිව අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම.
04. පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා ක්ෂේත්‍රයට අදාළ අධිකරණමය කාර්යයන්හිදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය වෙමින් අවශ්‍ය නෛතිකමය කාර්යයන් ඉටු කිරීම.
05. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ප්‍රඥප්ති, අනු නීතීන් සැකසීමට අදාළව නෛතිකමය සහාය සැළසීම.

කාර්ය සාධනය

1. දැනට දශක 7කට පමණ පෙර නගර සභා ආඥා පනත සම්මත කර ගැනීමත් සමඟ පැනවුන පළාත් පාලන ප්‍රධාන අණපනත් අතරින් අවසන් වරට සම්මත වූ ප්‍රාදේශීය සභා පනතද පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වී මේ වන විට දශක තුනකට අධික කාලයක් ගත වී ඇත. එබැවින් මෙකී පනත්වල පවත්නා යල් පැනගිය ප්‍රතිපාදන එම අණ පනත් තුලින් මහජනතාවට සැලසෙන සේවයෙහි ඵලදායිතාව හා කාර්යක්ෂමතාවය ආරක්ෂා වීම කෙරෙහි දැඩි ලෙස බලපෑම් ඇති කර ඇත.

මෙකී අණ පනත් සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය 1999 පළාත් පාලනය පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තාව මඟින්ද හදුනාගෙන ඇතත් මෙතෙක් ඒ සම්බන්ධව අවශ්‍ය සංශෝධන ගෙන ඒමට අපොහොසත් වී ඇත. එබැවින් මෙම පනත් සංශෝධනයේ අත්‍යාවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් වත්මන් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් ඒ සඳහා පත් කරන ලද කමිටුවක් මගින්, අදාළ පනත් සංශෝධන සම්බන්ධව මේ දක්වා අමාත්‍යාංශය ගෙන තිබූ සියලු කාරණා අධ්‍යනය කරමින් ඊට අදාළව කාලීන යෝජනාවලියක් සකස් කර ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉදිරි වර්ෂය තුළදී එකී පනත් සංශෝධන කටයුතු අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

පළාත් පාලන අනපනත් සංශෝධන යෝජනාවලිය සකස් කිරීමේ කමිටුව



පළාත් පාලන ප්‍රධාන අණපනත් සංශෝධන කමිටු වාර්තාව

2. පළාත් පාලන ආයතන තුල 25% ක අවමයක්වූ අනිවාර්යය කාන්තා නියෝජනය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කිරීම සහ දේශපාලනය තුල කාන්තාව බල ගැන්වීම පිණිස අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකර පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත සංශෝධනය කිරීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇත. එය 2017 අංක 16 දරණ පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත ලෙස 2017 අගෝස්තු මස 31 දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇති අතර අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේද ඇතුළත් කර ඇත.

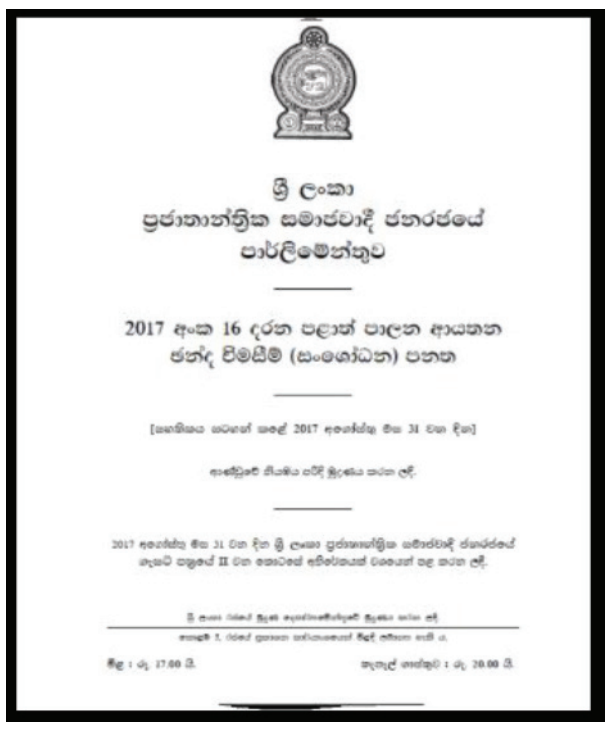
ශ්‍රී ලංකා
ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලිමේන්තුව

2017 අංක 16 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත

2017 අංක 16

නව මැතිවරණ ක්‍රමය සහ ඒ තුළ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් වූ කෝටාව පිළිබඳව කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින්

3. පළාත් සභා තුළ 25%ක කාන්තා නියෝජනය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සිදුකර අවසන් කර ඇත. තවද පළාත් සභා ඡන්ද ක්‍රමයෙහි වෙනස්කම් සිදු කොට පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත සංශෝධනය සිදු කර ඇත. එය 2017 අංක 17 දරණ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත ලෙස 2017 සැප්තැම්බර් මස 22 දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය මඟින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇති අතර අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේද ඇතුළත් කර ඇත.

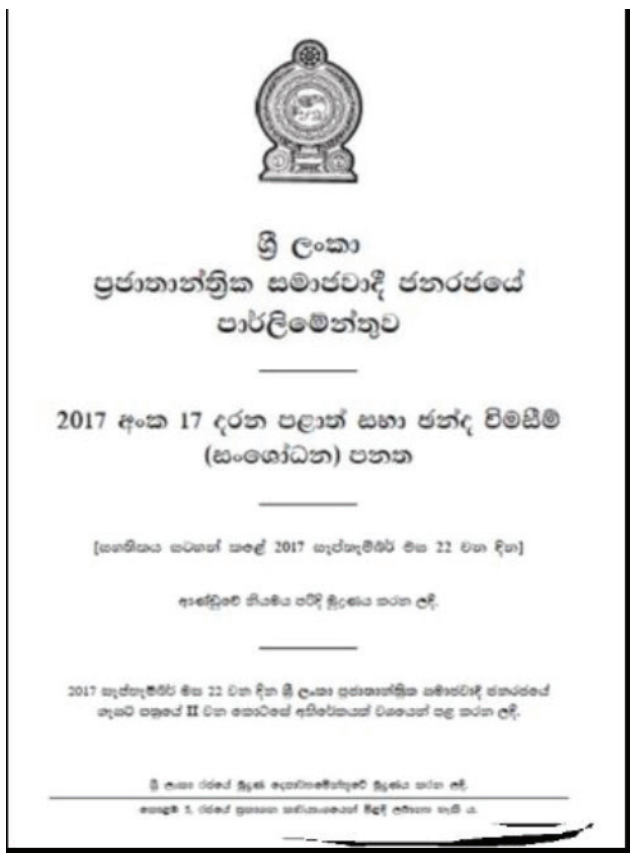
ශ්‍රී ලංකා
ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලිමේන්තුව

2017 අංක 17 දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත

2017 අංක 17

පළාත් සභා තුල කාන්තාව වෙනුවෙන් වෙන්වූ කෝටාව පිළිබඳව කාන්තා සංවිධාන ගරු අමාත්‍යතුමා සමඟ සාකච්ඡාවක

4. පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා කෙටුම්පත් කළ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝගය අනුව පළාත් සභාවන්හි අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා යොමුකර ඇත.

5. අයාලේ යන සුනඛයින්ගෙන් මහජනතාවට සිදුවන අවහිරතා වලක්වාලීම සඳහා පවත්නා බාධා හඳුනාගෙන ඒ සඳහා ක්‍රමවේදයක් සැකසීමේ කටයුතු සිදුකර අවසන් කර පසු විපරම සඳහා පළාත් සභා ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කර ඇත.

අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වූ කමිටු රැස්වීම

6. උසාවි දඩ මුදල් සහ ඉඩම් පැවරීම මත අයවන මුද්දර ගාස්තු පළාත් පාලන ආයතන වෙත ලැබීම විධිමත් කිරීම හා කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධව සකස් කරන ලද පනත් කෙටුම්පත නීතිපතිගේ සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. කාලාන්තරයක් තිස්සේ පළාත් පාලන ආයතන විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් සැලකිල්ලට ගනිමින් ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම සංශෝධන තුළින් ඉදිරියේදී පළාත් පාලන ආයතන තුළ මුද්දර ගාස්තු සහ උසාවි දඩ මුදල් පිළිබඳ ගැටලුව නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා පැහැදිලි විසඳුමක් ලබා දෙනු ඇත.

7. වතු කම්කරුවන්ගේ සුභසාධනය සැලසීමේ අරමුණින් වතු ජනාවාස සඳහා අවශ්‍ය පොදු උපයෝගීතා සේවාවන් සැපයීමට ප්‍රාදේශීය සභා අරමුදල යොදා ගැනීමේ හැකියාව සැලසෙන පරිදි 1987 අංක 15 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනත සංශෝධනය කිරීමට පනත් කෙටුම්පත සකස් කර පළාත් සභාවල අදහස් සඳහා යොමු කර ඇත.



ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන)

8. පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය සඳහා සුදුසු නිර්ණායක හඳුනාගැනීම තුළින් ඉදිරියේදී පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය සහ උසස් කිරීම් සම්බන්ධව වඩාත් පාරදෘශ්‍ය හා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සියල්ල අවසන් කර ඇත.

නව පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය සඳහා නිර්නායක හඳුනා ගැනීම සඳහා පත්කළ කමිටුව

නව පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනතෙහි සංශෝධනයන්ට අනුව පළාත් පාලන ආයතන සහික සංඛ්‍යාව පිළිබඳව ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. 2017 නොවැම්බර් මස 22 දින අංක 2043/56 සහ 2043/57 දරණ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජා තාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිවිශේෂ ගැසට්

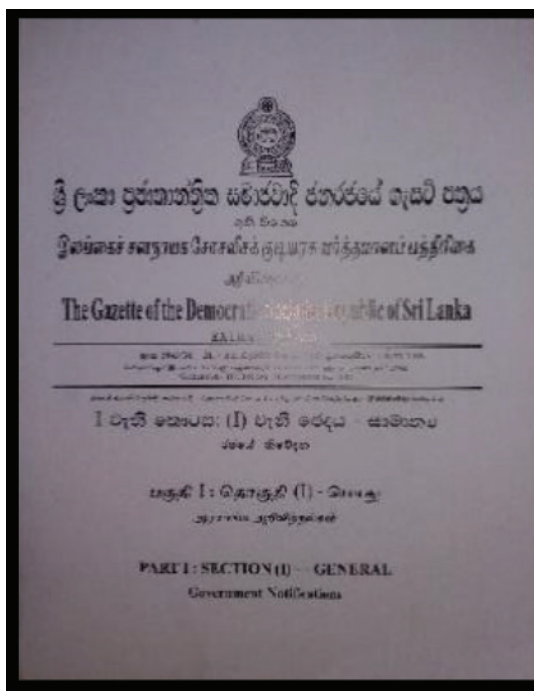
The Gazette of the Democrati... ...ublic of Sri Lanka
PART I : SECTION (I) — GENERAL
Government Notifications

2043/56

2043/57

3.7 පාලන අංශය

අමාත්‍යාංශයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය, මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා භෞතික සම්පත් කළමනාකරණය පාලන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වේ. පහත ක්‍රියාකාරකම් මඟින් එකී කාර්යභාරය 2017 වර්ෂය පුරා සාධනීය මට්ටමින් ඉටු කර ඇත.

	කාර්යය	ඉටු කළ මූලික ක්‍රියාකාරකම්
1	මානව සම්පත් කළමනාකරණය	පෞද්ගලික ලිපිගොණු පවත්වාගෙන යාම
		නිවාඩු ලේඛණ පවත්වාගෙන යාම
		අභ්‍යන්තර හා බාහිර ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක කිරීම
		නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ කටයුතු
		අනවශ්‍ය තනතුරු යටපත් කිරීම හා නව තනතුරු ඇති කිරීම
		අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු පිරවීම
2	මානව සම්පත් සංවර්ධනය	කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවා සැපයුමක් සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම
		දේශීය පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
		විදේශීය පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය
3	පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය	අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ 60ක් 2017 වර්ෂය තුල දී අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
		මෙම අමාත්‍යාංශයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න 68 ක් සඳහා පිළිතුරු ලබා දීම
		අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ 41 ක් සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ නිරීක්ෂණ ලබා දීම.
4	පද්ධති සංවර්ධනය	එක් එක් අංශ සඳහා නිශ්චිත කාර්යයන් හඳුනා ගැනීම
		වැඩ අධ්‍යයනය මඟින් කාර්ය මණ්ඩල සමාලෝචනය
5	තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම	තොරතුරු නිළධාරීන් පත් කිරීම
		පනත පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම
		එක් එක් අංශ මඟින් පල කළ යුතු තොරතුරු රැස් කිරීම
		තොරතුරු ලබා ගත හැකි ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ නිල වෙබ් අඩවියේ පල කිරීම

6	ඵලදායිතා සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම	5 S සංකල්පය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම
		ඵලදායිතා මෙහෙයුම් කමිටුව පත් කිරීම
		එක් එක් අංශ සඳහා තත්ව කව පිහිටුවීම
		තත්ව කව මගින් නව ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම
		ඩෙංගු මර්ධනය වෙනුවෙන් සියළුම අංශ එක්වී ශ්‍රමදාන පැවැත්වීම මඟින් අමාත්‍යාංශ බාහිර පරිශ්‍රය පිරිසිදු කිරීම
		ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය යටතේ අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුළ වගා කටයුතු සිදු කිරීම හා හරිත පැහැ ගැන්වීම.
7	භෞතික සම්පත් කළමනාකරණය	ගොඩනැඟිලි/ කණ්ඩලම සංචාරක බංගලාව/ යන්ත්‍රෝපකරණ/ වාහන නඩත්තුව ■ අමාත්‍යාංශ බිම් සැළැස්ම සකස් කිරීම ■ අතිරේක ලේකම් (පළාත් පාලන හා පළාත් සභා) ගොඩනැගිල්ලේ තුන් වන මහල අලුතින් ඉදි කරීම ■ ව්‍යාපෘති අංශය සඳහා ගොඩනැඟිල්ලක් අලුතින් ඉදි කිරීම ■ සංවර්ධන අංශය අළුත්වැඩියා කිරීම ■ වාහන ගාල් කිරීම සඳහා අංගනයක් ඉදි කිරීම ■ පොත් බැඳුම් කාමරය අළුත්වැඩියා කිරීම ■ අමාත්‍යතුමාගේ නිල නිවස සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ■ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාලය අළුත්වැඩියා කර වර්ණ ආලේපිත කිරීම ■ කණ්ඩලම සංචාරක බංගලාවේ නාන කාමර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම මූල්‍ය කළමනාකරණය බාහිර සේවා සපයන ආයතන සම්බන්ධ රාජකාරි

මෙම අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහනක් පහතින් දැක් වේ.

මට්ටම	සේවක සංඛ්‍යාව		එකතුව
	ස්ත්‍රී	පුරුෂ	
1. ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටම	11	16	27
2. තෘතීය මට්ටම	03	01	04
3. ද්විතීය මට්ටම	107	25	132
4. ප්‍රාථමික මට්ටම	05	68	73
එකතුව	126	110	236

2017 වර්ෂය අවසානයේ වැය වී ඇති මුදල පහත පරිදි වේ.

අනු. අංකය	කාර්යය	ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන (රු.මි)	වැය කළ මුදල (රු.මි.)	මූල්‍ය ප්‍රගතිය %	භෞතික ප්‍රගතිය %
01.	ගොඩනැගිලි නඩත්තුව (නව ඉදිකිරීම් හා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු)	34.3	31.8	93	90
02.	යන්ත්‍රෝපකරණ නඩත්තුව	3.3	2.5	76	90
03.	වාහන නඩත්තුව	24.1	22.5	93	95
04.	පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම	2.5	0.7	30	50

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය යටතේ සීමිත සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රය තුළ වගා කටයුතු සිදු කිරීම හා හරිත පැහැ ගැන්වීම.

2017 වර්ෂය තුල දී ඉදි කළ නව ගොඩනැගිලි, සිදු කළ ප්‍රතිසංස්කරණ හා අළුත්වැඩියා

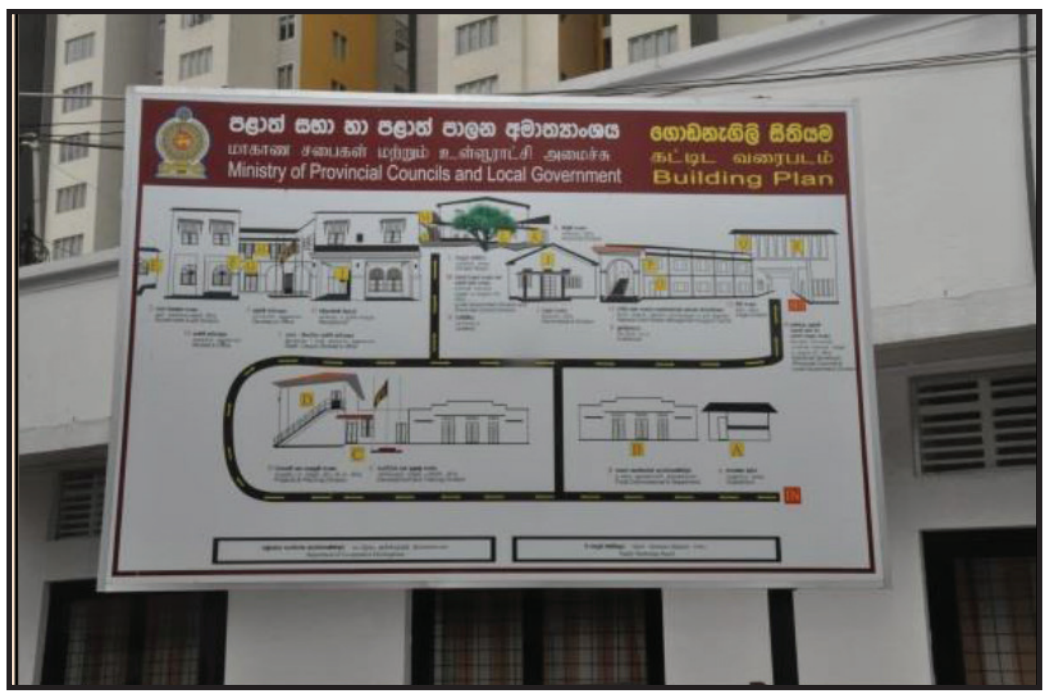

පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම

3.8 වියදම් විමංසන අංශය

විමංසන අංශය පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන) යටතේ ස්ථාපිතව පැවති අතර 2017 සැප්තැම්බර් මස සිට ගිණුම් අංශයේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී යටතට පත් කර ඇත. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීම, වාර්තා සකස් කිරීම හා ජාතික තලයේ ආයතනවලට එම තොරතුරු නිකුත් කිරීම මෙම අංශය යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරනු ලබයි. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා පහසුකම් සම්පාදනයේදී මෙන්ම එම ආයතන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදීද මෙම තොරතුරු අතිශයින් වැදගත් වේ.

විමංසන අංශයේ කාර්යභාරය

1. පළාත් සභා මූල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කිරීම.

   මධ්‍යම රජයේ ප්‍රදාන, පළාත් සභා ඇස්තමේන්තු, ආදායම්, වියදම් හා කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු රැස්කර පළාත් සභා මූල්‍ය කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් මාසික හා කාර්තු පදනමින් වාර්තා සකස් කරනු ලබයි.

2. පළාත් පාලන ආයතන මූල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කිරීම.

   පළාත් පාලන ආයතන ඇස්තමේන්තු, ආදායම්, වියදම්, කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු හා පොදු පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කර පළාත් පාලන මූල්‍ය කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් අර්ධ වාර්ෂික හා වාර්ෂික පදනමින් වාර්තා සකස් කරනු ලබයි.

3. ජාතික තලයේ ආයතනවලට තොරතුරු සැපයීම.

   ඉදිරි වර්ෂවල පුරෝකථන කටයුතු සඳහාත් ජාතික තලයේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණවලට එළඹීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහාත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, භාණ්ඩාගාරය, මුදල් කොමිෂන් සභාව හා ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතන වෙත පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන මූල්‍ය කාර්ය සාධන තොරතුරු නිකුත් කරනු ලබයි.

4. පළාත් පාලන ආයතනවල අධිභාර අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම.

   විගණකාධිපති විසින් පළාත් පාලන ආයතන මූල්‍ය කටයුතු විගණනය කිරීමෙන් අනතුරුව එම ආයතනවල සභිකයින් හා නිලධාරීන් වෙත පනවනු ලබන අධිභාර සම්බන්ධයෙන් අදාල නිලධාරීන් විසින් පළාත් පාලන පනතේ ප්‍රකාරව මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත කරනු අභියාචනා සලකා බැලීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම මේ යටතේ සිදුකරනු ලබයි.

2017 කාර්ය සාධනය

- 2017 වර්ෂයේදී, 2016 නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් සහ 2017 ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා පළාත් සභා මූල්‍ය කාර්ය සාධන මාසික වාර්තා සකස් කර අවසන් කර ඇති අතර පළාත් සභා මූල්‍ය කාර්ය සාධන 2016 සිව්වන කාර්තු වාර්තාව හා 2017 පළමු, දෙවන හා තෙවන කාර්තු වාර්තා සකස් කර අවසන් කරන ලදී.

- 2017 වර්ෂයේදී 2016 වර්ෂයට අදාලව පළාත් පාලන ආයතන මූල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තාව සකස් කර අවසන් කර ඇත.

- ඉහතින් දක්වා ඇති පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන මූල්‍ය කාර්ය සාධන වාර්තා මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,මහා භාණ්ඩාගාරය, මුදල් කොමිෂන් සභාව හා ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන වෙත නිකුත් කර ඇත.

- 2016 හා 2017 යන වර්ෂ තුළදී පළාත් පාලන ආයතන සභිකයින් හා නිලධාරීන් වෙතින් අධිභාර අභියාචනා 19ක් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර ඉන් අභියාචනා 05ක කටයුතු 2017 වර්ෂය තුළදී අවසන් කර ඇත. අනෙකුත් අභියාචනා සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ හා නිර්දේශ කැඳවීමට කටයුතු කර ඇති අතර 2018.01.01 දින සිට අධිභාර අභියාචනා විෂය අභ්‍යන්තර විගණන අංශය වෙත පවරා ඇත.

- පළාත් සභා වෙතින් ලබා ගන්නා ලද තොරතුරු පදනම් කරගෙන පිළියෙල කර ඇති 2015,2016 හා 2017 වර්ෂයන්ට අදාල අග්‍රිම මුදා හැරීම්, ආදායම් හා වියදම් සම්බන්ධ වාර්තා හා පළාත් පාලන ආයතන වෙතින් වාර්ෂිකව ලබා ගන්නා ලද ආදායම් වියදම් සම්බන්ධ තොරතුරු පදනම් කර ගෙන පිළියෙල කර ඇති වාර්තා පහතින් දක්වා ඇත.

විමංසන අංශය මගින් පිළියෙල කරනු ලබන පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මූල්‍ය කාර්යසාධන වාර්තා

3.9. අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

හැඳින්වීම
යහපත් රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයක් සඳහා අභ්‍යන්තර විගණනය සතු කාර්යභාරය දැඩි ලෙස අවධාරණය කෙරෙන මෙවන් යුගයක සාර්ථක අභ්‍යන්තර විගණන පරීක්ෂාවක් සැලසුම්කර ගැනීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වන විගණන වැඩසටහන සකස් කිරීම මෙහි පරමාර්ථයයි.

මෙය සකස් කිරීමේදී 2018 වර්ෂයේ අනුමත ඇස්තමේන්තුව, ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා නව යෝජනා සැලකිල්ලට ගෙන ඇති අතර, මේ සඳහා මු.රෙ. 134 (2) ප්‍රකාරව විගණකාධිපතිගේ උපදෙස් ද ලබාගෙන ඇත.

කාර්යභාරය
ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිළධාරී/ ගණන් දීමේ නිළධාරීන් වෙත පැවරෙන රාජ්‍ය සම්පත් කාර්යක්ෂමව, ඵලදායීව, අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් කලට වේලාවට අවසන් කිරීමේ වගකීම නිසි අයුරින් ඉටු කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර විගණනය සහාය වියයුතු ආකාරය මුදල් රෙගුලාසි 133 (ෂ) අ (ෂෂ) සඳහන් පරිදි" දෙපාර්තමේන්තුවට නියම කෙරුණු හෝ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් භාර ගන්නා ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ සැලසුම් සහ වැඩසටහන් සපුරාලීමෙහිලා ලබා ඇති ප්‍රගතිය නිශ්චය කිරීමට ගණන් දීමේ නිළධාරීයාට සහ ප්‍රගති අන්වේශන කමිටුවට සහය වීම "

මේ අනුව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශයට පැවරෙන කාර්යභාරය වන්නේ සියලු අංශ, ව්‍යාපෘති හා අනුබද්ධිත ආයතනවල රාජ්‍ය සම්පත් කාර්යක්ෂමව, ඵලදායීව, අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් කලට වේලාවට අවසන් කිරීමේ වගකීම නිසි පරිදි ඉටු කිරීම සඳහා විගණන සහාය ලබාදීමය.

2017 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරකම්

01. කළමණාකරණ විගණන ඩීඑම්ජ්/2009(1) හා 2009.06.09 දිනැති චක්‍රලේඛයෙහි ඇමුණුම 03 පරිදි අමාත්‍යාංශයේ මූලික වාර්තාව සකස් කර 2017.01.30 වන දින කළමණාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට යවා ඇත.

02. කළමණාකරණ විගණන ඩීඑම්ජ්/2009(1) හා 2009.06.09 දිනැති චක්‍රලේඛයෙහි 07 පරිච්ඡේදය අනුව ඇමුණුම 02 පරිදි අමාත්‍යාංශයේ 2017 වර්ෂයේ විගණන සැළැස්ම සකස් කර 2017.02.06 දින ඉදිරිපත් කල අතර අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම නැවත සංශෝධනය කර සකස් කිරීම නිසා නැවත එම සංශෝධිත ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව අමාත්‍යාංශයේ විගණන සැළැස්ම සකස් කර 2017.04.26 දින ලේකම්තුමාගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර 2017.04.28 වන දින කළමණාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවා ඇත.

03. 2017 වර්ෂය සඳහා විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් 04ක් පවත්වා ඇත.

04. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ, රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට යටත් වන ආයතනයන්හි මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ඇගයීම සඳහා සකස් කර ඇති තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය වෙත තොරතුරු කැඳවීම සඳහා සියළු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානින් කැඳවා 2017.10.27 දින රැස්වීමක් පවත්වා අදාල සංශෝධන ඇතුලත් වාර්තාවක් පිළියෙළ කර 2017.10.31 දින රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව වෙත යැවීම.

05. රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ පළාත් සභා, පළාත් පාලන ආයතන හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල මූල්‍ය කාර්ය සාධනය ඇගයීම සඳහා සකස් කළ ආකෘති පත්‍ර ප්‍රධාන උපාය මාර්ග 04ක් යටතේ සංශෝධනය වීමට අදාල වාර්තාව පිළියෙළ කර රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව වෙත 2017.11.24 දින යැවීම.

06. අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය පිළිබඳ අභ්‍යන්තර විගණනයක් සිදු කරන ලදී. එහිදි පහත කරුණු අනාවරණය විය. එහි අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ පවතින දුර්වලතැන් පිළිබඳ ඉහළ කළමනාකරණය දැනුවත් කිරීම පිළිබඳ 2017.11.24 දින වාර්තාව යවා ඇත.

07. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන විසින් එවන ලද තොරතුරු රාජ්‍ය ගිනුම් කාරක සභාවට යොමු කිරීම

පහත තොරතුරු යොමු කර ඇත.

අනු අංකය	තොරතුරු එවන ලද පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන	රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා රැස්වීම් පැවැත් වූ දිනය
01	දකුණු පළාත් සභාව	2017.0125
02	මධ්‍යම පළාත් සභාව	2017.02.23
03	කොළඹ මහා නගර සභාව	2017.03.10
04	බස්නාහිර පළාත් සභාව -සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඩෙංගු පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාව	2017.03.08
05	උතුරු මැද පළාත් සභාව	2017.03.23
06	ඌව පළාත් සභාව	2017.03.23
07	නැගෙනහිර පළාත් සභාව	2017.04.05
08	කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව	2017.07.27
09	මහා නගර සභා කොළඹ, දෙහිවල, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ, ගාල්ල, මාතර , හම්බන්තොට	2017.04.06
10	පානදුර නගර සභාව	2017.07.04
11	දකුණු පළාත් සභාව	2017.11.07
12	උතුරු පළාත් සභාව	2017.09.07
13	එරාවූර් නගර සභාව හා කාත්තාන්කුඩි නගර සභාව	2017.09.19
14	කොළඹ මහා නගර සභාව	2017.10.20

08. රජයේ විගණන අංශය විසින් අමාත්‍යාංශයට, අනුබද්ධිත ආයතයන වලට හා විදේශ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ විගණන විමසුම් වලට ලබාදෙන පිළිතුරු රජයේ විගණනය වෙත යොමු කිරීම

රජයේ විගණන අංශය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත විගණන විමසුම් වලට අදාල තොරතුරු යොමු කර ඇත

අනු අංකය	ආයතන	ලද විගණන විමසුම් සංඛ්‍යාව
01	අමාත්‍යාංශය	06
02	පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය	03
03	දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල	01
04	පුරනැගුම - ව්‍යාපෘතිය	31
05	මහ කොළඹ අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය	01
06	දෙවන සෞඛ්‍ය අංශ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	02

09. 2017 වර්ෂයේදී අභ්‍යන්තර විගණන අංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විගණන විමසුම්

අනු අංකය	විගණනය සිදු කල ආයතනය	විගණනය සිදු කල කාලය	විගණන විමසුම් ඉදිරිපත් කළ දිනය
01	පළාත් පාලන ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (පුර නැගුම -වයඹ පළාත)	2017.01.01-2017.01.28	2017.01.30
02	පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය 2016 - ෂෂ කාර්තුව	2017.03.01-2017.03.28	2017.03.28
03	පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය 2016 - ෂඪ කාර්තුව	2017.04.01-2017.06.16	2017.06.16
04	පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය 2017 - 1 කාර්තුව	2017.06.16-2017.08.08	2017.08.08
05	මහ කොළඹ අප ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය - 2015	2017.07.01-2017.08.09	2017.08.09
06	මහ කොළඹ අප ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය - 2016	2017.07.01-2017.08.29	2017.08.29
07	දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල - 2016	2017.08.01-2017.09.30	2017.10.24.
08	උතුරු නැගෙනහිර පළාත් පාලන ආයතන හා සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (හැඹීෂඡ)	2017.11.10-2017.12.11	2017.12.11
09	පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය 2017- 1ෂ කාර්තුව	2017.09.01-2017.12.15	2018.01.06
10	පෞද්ගලික ගොණු පරීක්ෂාව	2017.12.15-2017.12.31	2018.01.05

10. අමාත්‍යාංශයේ හා පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය ,දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල හා ව්‍යාපෘතිවල බැංකු සැසඳුම් විගණනය සිදු කර ඇත.

11. අමාත්‍යාංශය / පළාත් සභා /පළාත් පාලන ආයතන වල අභ්‍යන්තර පාලනය විධිමත් කිරීම සඳහා දැනට අභ්‍යන්තර චක්‍ර ලේඛ 04 නිකුත් කර ඇත.
    i. 01/2017
    ii. 02/2017
    iii. 03/2017
    iv. 04/2017

12. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන වලට අදාලව, රාජ්‍ය ගිනුම් කාරක සභාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඉල්ලුම් කරන වාර්තා, ඉදිරිපත් කිරීම දැනට වාර්තා 06ක් යවා ඇත.

i. 2016.10.04 වන දින පැවති සබරගමුව පළාත් සභා, රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා රැස්වීමේ 09 වන කරුණට අදාලව පසුගිය වර්ෂ 05 තුළ පළාත් සභා පැවැත්වූ ගිණුම් කාරක සභා සංඛ්‍යාව සහ පරීක්ෂා කල ගිණුම් සංඛ්‍යාව ඇතුලත් වාර්තාව

ii. 2016 අංක 21 දරණ පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත ප්‍රකාරව ඒ ඒ පළාත් සභා වලින් පසුගිය වසර 05 තුළ රැස්කළ මුදල් ප්‍රමාණය හා ඒවා බැර වී ඇති ආකාරය පිළිබඳ වාර්තාව

iii. උතුරු මැද පළාත් සභාවේ 2010 ,2011 ,2012 , 2013 හා 2014 වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති වාර්තා සහ වර්තමාන කාර්ය සාධන පරීක්ෂාව පිළිබඳ වාර්තාව

iv. 2017.03.10 දින පවත්වන ලද රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ 97 වන රැස්වීමේ මධ්‍යම පළාත් සභාවේ කාර්ය සටහන පිළිබඳ වාර්තාව

v. 2017.04.05 දින පවත්වන ලද රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ 107 වන රැස්වීමේ නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ කාර්ය සටහන පිළිබඳ වාර්තාව

vi. 2017.03.23 දින පවත්වන ලද රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ 101 වන රැස්වීමේ ඌව පළාත් සභාවේ කාර්ය සටහන පිළිබඳ වාර්තාව

13. 2017 වර්ෂයේ අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්මට අමතරව විශේෂ විමර්ෂණ 02ක් සිදු කර ඇත.

i. කෝට්ටේ නගර සභාවේ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව විගණකාධිපති වාර්තාවෙන් හෙළි වන කරුණු පිළිබඳව සහ ජනතාව වෙනුවෙන් වන වගකීම් පැහැර හැරීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම හා මීට අදාල විමර්ශණ වාර්තාව 2017.09.27 දින යවා ඇත.

ii. අමාත්‍යාංශයේ රියදුරන්ගේ අතිකාල හා ගමන් වියදම් ගෙවීම් සඳහා ඉටු කරන ලද රාජකාරී පිළිබඳ විමර්ශණයක් සිදු කර වාර්තාව 2017.10.04 දින ඉදිරිපත් කර ඇත.

3.10. පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය

හැඳින්වීම

1999 වර්ෂයේදී නිකුත් කරන ලද පළාත් පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් නිර්දේශ කර තිබිණි. ඉන් එක් නිර්දේශයක් වන්නේ පළාත් පාලන ආයතනවල මානව සංවර්ධනය සඳහා ජාතික මට්ටමේ පළාත් පාලන පුහුණු හා පර්යේෂණ ආයතනයක් පිහිටු වීමේ අවශ්‍යතාවයයි. ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින් 1999 වර්ෂයේදී පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය පිහිටු වන ලදී. ඒ අනුව පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය 1999 අංක 31 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මඟින් ස්ථාපිත කර තිබේ.

මෙම ආයතනයේ කටයුතු පරිපාලනය සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඇතුළු නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන් 8 දෙනෙකු සහ අමාත්‍යාංශයේ ගරු ඇමතිතුමා විසින් පත්කරනු ලබන සාමාජිකයන් 5 දෙනෙකු ඇතුලත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කර තිබේ. ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වන අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් ආයතනයට පැවරී ඇති කාර්යයන් මෙහෙයවනු ලැබේ.

ආයතනයේ කාර්යභාරය,

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ක්ෂේත්‍රයේ මහජන නියෝජිතයන් සහ නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා එම ක්ෂේත්‍රයන්හි පර්යේෂණ පැවැත්වීම ආයතනයට පැවරී ඇති ප්‍රධාන කාර්යයන් වේ. මීට අමතරව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පළාත් පාලනයට සම්බන්ධිත ආයතන සමඟ අන්තර් සබඳතා ගොඩනගා ගනිමින් පළාත් පාලනය පෝෂණය කිරීමද ආයතනයට පැවරී ඇති කාර්යයකි.

ඒ අනුව මෙම ආයතනය, පහත සඳහන් වැඩසටහන් දියත්කරනු ලබයි.

- ජාතික / ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ පුහුණු වැඩමුළු
- අන්තර් ජාතික / ජාතික මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණ
- ප්‍රායෝගික සැසි
- ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා
- සහතික පත්‍ර පාඨමාලා
- පර්යේෂණ
- උපදේශණ සේවා සැපයීම
- අත්පොත්, අත්පත්‍රිකා ප්‍රකාශයට පත්කිරීම
- ත්‍රෛමාසික ව පළාත් පාලන පුවත් ඇතුලත් පුවත් පත් සඟරා ප්‍රකාශයට පත්කිරීම.

ඉහත කාර්යයන් සිදුකිරීම සඳහා පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය පහත සඳහන් අංශ වලින් සමන්විත වී ඇත.

❖	ඉංජිනේරු අංශය	❖	නීති අංශය
❖	පොදු කළමනාකරණ සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය	❖	පර්යේෂණ අංශය
❖	මූල්‍ය කළමනාකරණ අංශය	❖	අධ්‍යයන අංශය
❖	භෞතික සැලසුම් අංශය	❖	ආයතනික ධාරිතා සංවර්ධන

පසු ගිය වසරේ දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සිදු කරන ලද පුහුණු අවශ්‍යතා අධ්‍යනය අනුව තෝරා ගත් පුහුණු වැඩසටහන් සෑම පළාතක් සඳහාම සිදු කරන ලදී.

2017 වර්ෂය මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය

ඉංජිනේරු අංශය

අංකය	වැඩමුළුවේ නම	අපේක්ෂිත වැඩමුළු ගණන	පවත්වන ලද වැඩමුළු ගණන	පැමිණි පුහුණුලාභීන් ගණන
01	සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂිත වැඩ පරිසරය කළමනාකරණය	09	10	417
02	බර වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ නඩත්තුව	09	08	357
03	ඉලෙක්ට්‍රික්, වයරින් හා ඇලුමිණියම් පිළිබඳ දැනුම හා කුසලතා	09	10	443
04	පාරිසරික නීති හා පනත් පිළිබඳ දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය	03	03	97

අධ්‍යයන අංශය

අංකය	වැඩමුළුවේ නම	අපේක්ෂිත වැඩමුළු ගණන/ කාලය	පවත්වන ලද වැඩමුළු	පැමිණි පුහුණුලාභීන් ගණන
01	පළාත් පාලන කළමණාකරණය සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකක සම්බන්ධීකරණ වැඩමුළුව (දින 01)	04	ගණන	සියළුම පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරුන් සහ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් පුහුණු
02	පළාත් සම්බන්ධීකරණ නිළධාරීන් සදහා වැඩමුළුව (දින 01)	04	04	සියළුම පළාත් සම්බන්ධීකරණ නිළධාරීන්
03	පළාත් පාලනය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 15 /16	මාස 18	03	60
04	පළාත් පාලනය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 16 / 17	මාස 18	01	65
05	පළාත් පාලනය පුවත්පත - සිංහල / දෙමළ	කලාප 04	01	සියලුම පළාත් පාලන ආයතන
06	ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ පුහුණු වැඩසටහන්	35	කලාප 04	2474
07	පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන	04	45	142
08	ප්‍රකාශන අංශය	-	04	
	පොදු කළමනාකරණ සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය			

අංකය	වැඩමුළුවේ නම	අපේක්ෂිත වැඩමුළු ගණන	පවත්වන ලද වැඩමුළු ගණන	පැමිණි පුහුණුලාභීන් ගණන
01	සේවා ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආකල්පීය වෙනසක් තුලින් සේවක අභිප්‍රේරණය	09	13	588
02	කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ඵලදායී මහජන සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීම සඳහා සන්නිවේදන කුසලතා වර්ධනය	09	11	563
03	කාර්යාල කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුව	09	12	522

මූල්‍ය කළමණාකරණ අංශය

අංකය	වැඩමුළුවේ නම	අපේක්ෂිත වැඩමුළු ගණන	පවත්වන ලද වැඩමුළු ගණන	පැමිණි පුහුණුලාභීන් ගණන
01	රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම් ප්‍රමිත අනුව පළාත් පාලන ආයතන වල මූල්‍ය ප්‍රකාශණ පිළියෙල කිරීම	09	10	513
02	වැටුප් කළමනාකරණය	09	10	456

නීති අංශය

අංකය	වැඩමුළුවේ නම	අපේක්ෂිත වැඩමුළු ගණන	පවත්වන ලද වැඩමුළු ගණන	පැමිණි පුහුණුලාභීන් ගණන
01	උසාවි කටයුතු	09	09	448
02	අතුරු ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම	09	09	426
03	පළාත් පාලන නීතිය	09	09	424
04	පළාත් පාලන නීතීඥවරුන් සඳහා පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීම	01	01	20

පර්යේෂණ අංශය

අංකය	වැඩමුළුවේ නම	පැමිණි පුහුණුලාභීන් ගණන
01	ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතන විසින් බදු හා වරිපනම් පැනවීමේ හා අයකිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ පර්යේෂණ අධ්‍යයනය	අවසන් කර ඇත
02	පළාත් සභා ලැයිස්තුවේ 21 වන විෂය යටතේ පැවරී ඇති බලතල උපයෝගී ආදායම් උත්පාදනය උදෙසා පළාත් සභා වල දායකත්වය පිළිබඳ පර්යේෂණ අධ්‍යයනයක්	අවසන් කර ඇත
03	පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන පුහුණු වැඩමුළු පිළිබඳ ඇගයීම.	අවසන් කර ඇත
04	පළාත් පාලන සඟරාව (සිංහල)	අවසන් කර ඇත
05	ආදර්ශ පළාත් පාලන ආයතනය	හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව

පරිගණක අංශය

අංකය	වැඩමුළුවේ නම	අපේක්ෂිත වැඩමුළු ගණන/ කාලය	පවත්වන ලද වැඩමුළු	පැමිණි පුහුණුලාභීන් ගණන
01	පරිගණක ජාලකරණය මඟින් පළාත් පාලන ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාවය වර්ධනය කිරීම.	09	09	370
02	සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි පිළිබඳ මහජනයා දැනුවත් කිරීම	09	09	417
03	සයිබර් නීතිය හා තොරතුරු ආරක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම පිළිබඳ වැඩමුළුව.	09	10	362

භෞතික සැලසුම් අංශය

අංකය	වැඩමුළුවේ නම	අපේක්ෂිත වැඩමුළු ගණන/ කාලය	පවත්වන ලද වැඩමුළු	පැමිණි පුහුණුලාභීන් ගණන
01	නගර සැලසුම්කරණයට අදාල නීති හා රෙගුලාසි	09	07	343
02	තක්සේරුකරණය හා බදුකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව	09	09	384
03	ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව	09	07	340

ප්‍රාදේශීය පුහුණු වැඩමුළු

ඒ ඒ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තු විසින් විශේෂයෙන් කරනු ලබන ඉල්ලීම් මත පුහුණු වැඩසටහන් 45 ක් පහත පරිදි පළාත් මට්ටමින් සංවිධානය කර පවත්වා ඇත.

පළාත	ආයතනය	වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව
බස්නාහිර පළාත	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	05
මධ්‍යම පළාත	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	11
මධ්‍යම පළාත	පළාත් සභාව	01
වයඹ පළාත	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	10
වයඹ පළාත	පළාත් සභාව	05
දකුණු පළාත	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	05
උතුරු මැද පළාත	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	03
ඌව පළාත	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	03
සබරගමුව පළාත	පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව	02

ආයතනය විසින් 2017 වසරේ සිදුකල ව්‍යාපෘති

- ප්‍රජා සහභාගීත්ව ආකෘති ගොඩ නැංවීම පිළිබඳ පස් දින පුහුණු වැඩමුළු - ස්පේස් ව්‍යාපෘතිය

පළාත	වැඩමුළු ගණන	සහභාගිත්වය
ඌව	04	180
මධ්‍යම	04	200
උතුර - දමිළ මාධ්‍ය	04	170

- පළාත් පාලනය පිළිබඳ උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - නෙල්සිප් ව්‍යාපෘතිය

පළාත	සහභාගිත්වය
ඌව, වයඹ, උතුරු මැද සහ මධ්‍යම	54
නැගෙනහිර - දමිළ මාධ්‍ය	45
උතුර - දමිළ මාධ්‍ය	04

- දිවයින පුරා දියත් කළ ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා දේශපාලනය සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2017 වර්ෂයේ ගමන්මග

වාර්ෂික සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය 2017

පළාත් පාලනය පිළිබද ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ වාර්ෂික සහතික ප්‍රදානෝත්සවය පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමා , ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති සම්පත් අමරතුංග මහතා හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කමල් පත්මසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළම බන්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාත්‍යාන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 03 වන දින පැවැත්විණි. එහිදී අප ආයතනයේ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවන් 11 ක් හැදැරූ පුහුණුලාභීන් 380 දෙනෙකු සදහා සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානය කෙරිණි. එහි විශේෂ දසුන් පහත දැක්වේ

පළාත් පාලනය පිළිබද ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ පුහුණු

2017 ජූලි මස 22 හා 23 දෙදින දකුණු පළාතේ පැවැත්වූ අතුරු ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය වැඩසටහන

2017 අගෝස්තු මස 16 හා 17 දෙදින ඌව පළාතේ පැවැත්වූ පරිගණක ජාලකරණය වැඩසටහන

2017 අගෝස්තු මස 21 දින සබරගමුව පළාතේ පැවැත්වූ සයිබර් නීතිය හා අන්තර් ජාල ආරක්ෂාව වැඩසටහන

පොදු කළමනාකරණ අංශය මගින් 2017 සැප්තැම්බර් මස 7 හා 8 දෙදින නැගෙනහිර පළාතේ පැවැත්වූ වැඩසටහන

පළාත් පාලන පුවත් පත

පළාත් පාලන පුවත්

පළාත් පාලන පුවත්

உள்ளூராட்சி செய்தி

உள்ளூராட்சி செய்தி

3.11. දේශීය ණය හා සංවර්ධන අරමුදල

3.11.1. හැඳින්වීම

දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල 1916 අංක 22 දරණ ආඥා පනත යටතේ ආරම්භ කර ඇති අතර වර්තමානයේ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ රජයේ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම අරමුදල දැනට පළාත් පාලන ආයතනවල දිගුකාලීන ආදායම් උත්පාදන හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට මූල්‍ය සවිය ලබාදෙන ප්‍රධානම රාජ්‍ය ආයතනය වේ.

දැක්ම

පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමේ ප්‍රධාන මූල්‍ය ආයතනය වීම මඟින් මෙරට ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනයට දායක වීම.

මෙහෙවර

ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය මූලික පහසුකම් සැපයීමට අවශ්‍ය දිගුකාලීන මූල්‍ය පහසුකම් සපයනු ලබන තිරසාර හා ස්වාධීන ආයතනය බවට පත්වීම.

3.11.2 අරමුදලේ ප්‍රධාන කාර්ය භාරය

දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුල සංස්ථාපනය කර ඇති මහ නගර සභා 24, නගර සභා 41 සහ ප්‍රාදේශීය සභා 276 ද ඇතුළුව සියළුම පළාත් පාලන ආයතන 341 සඳහා අවශ්‍ය දිගුකාලීන මූල්‍ය පහසුකම් සහනදායී පොළී අනුපාතයක් යටතේ සැපයීම අරමුදලේ මූලික කාර්ය භාරය වේ.

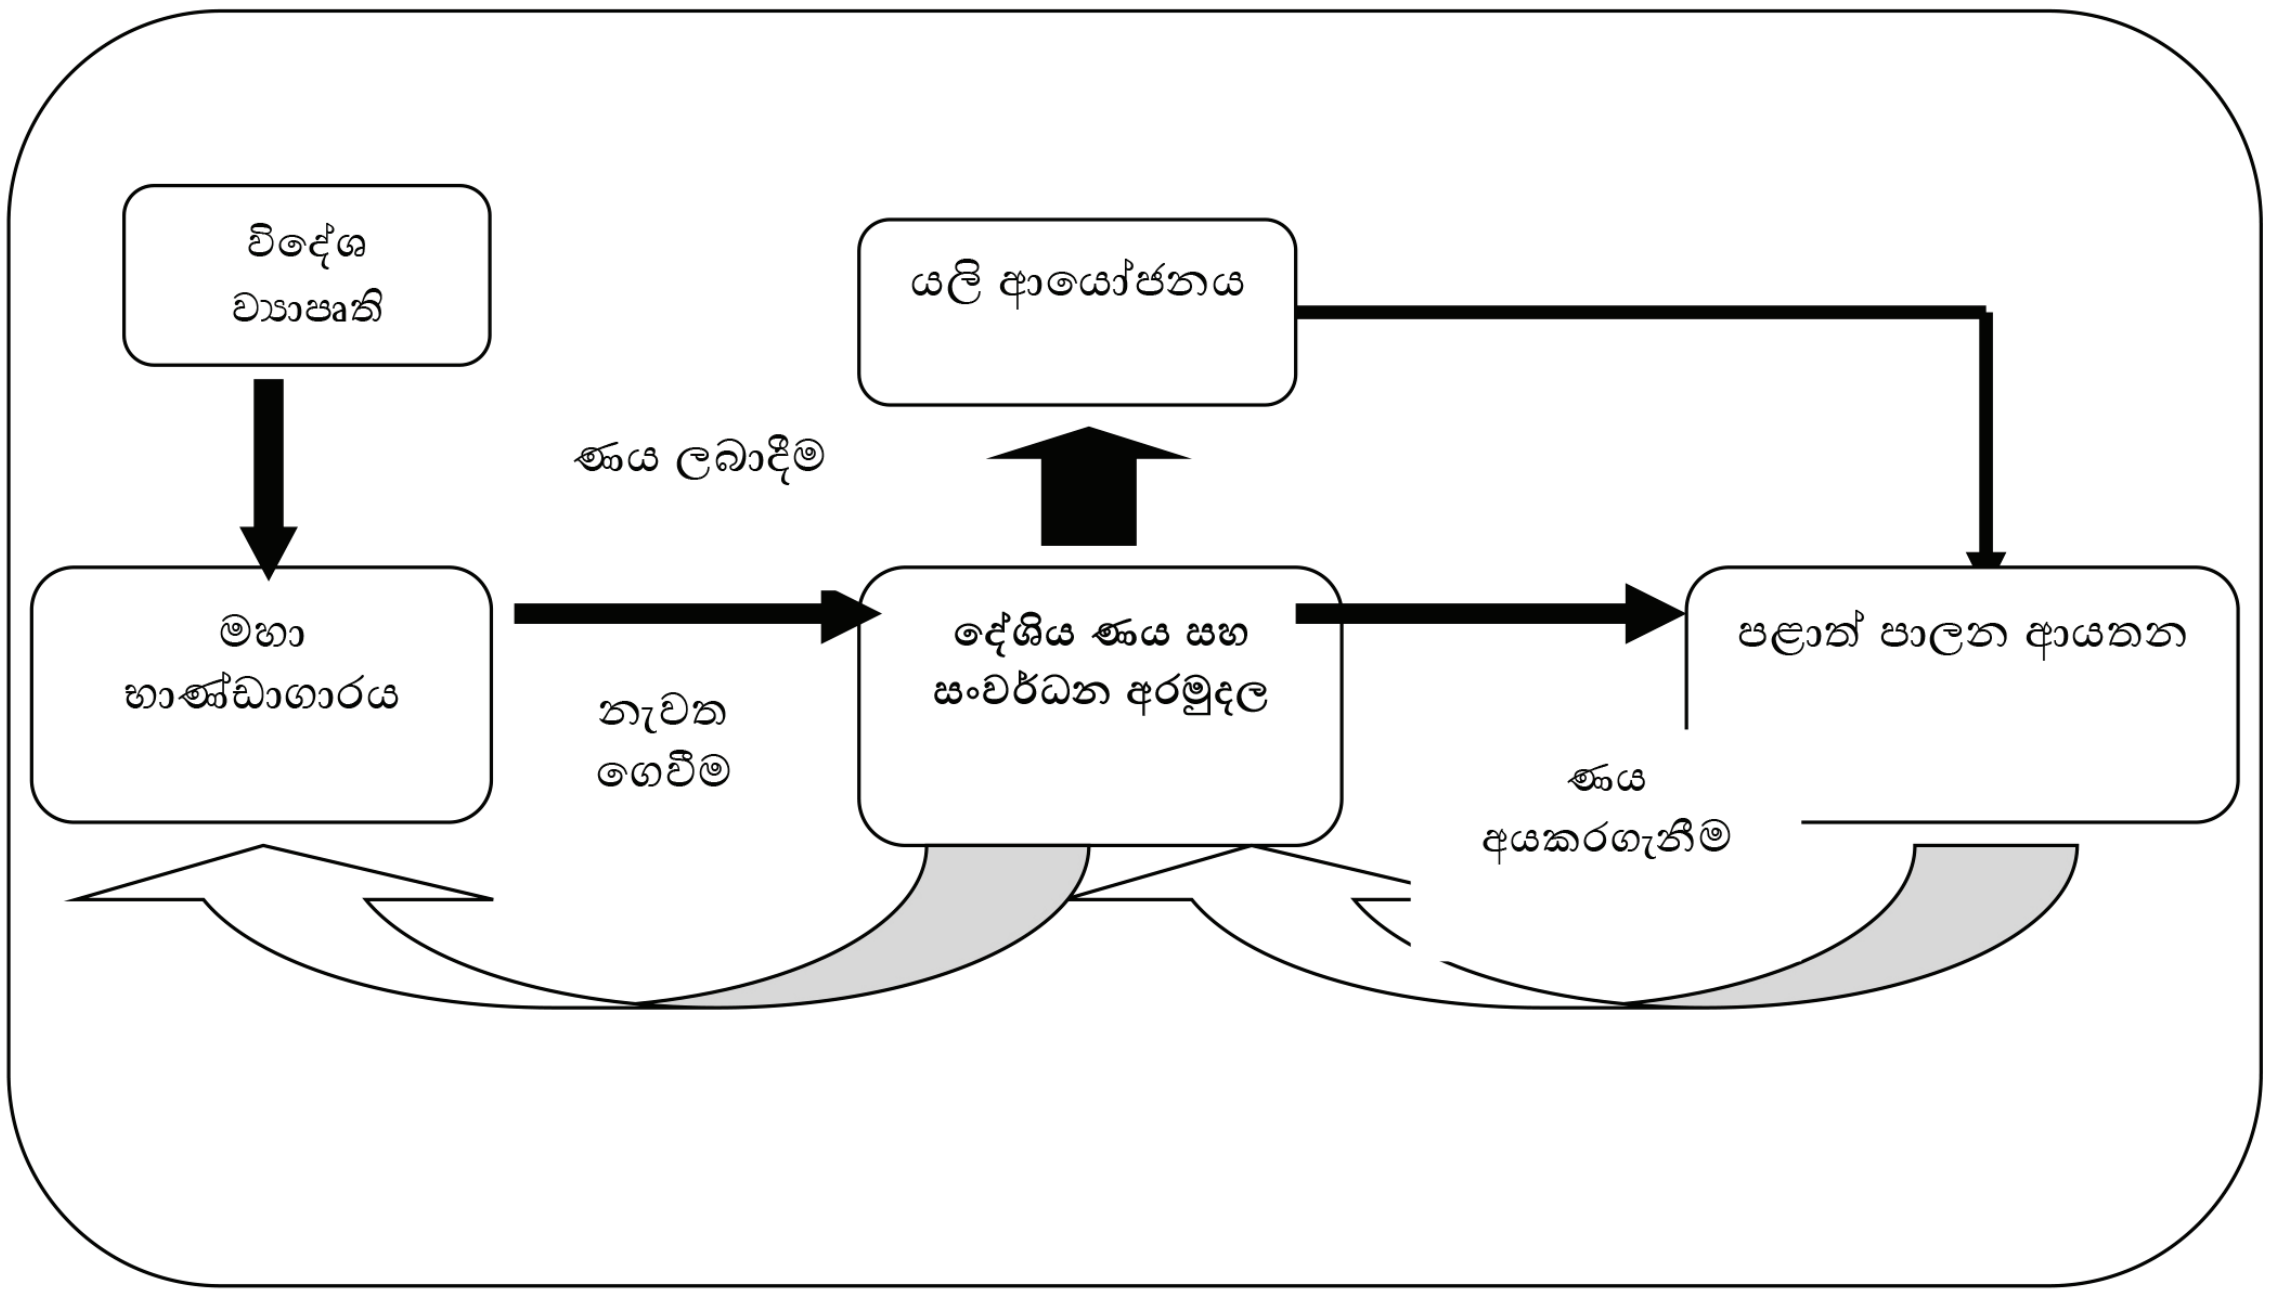

මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අරමුදලට ලබාදෙනු ලබන ප්‍රතිපාදන හා ණය, පළාත් පාලන ආයතනවල ඉල්ලීම අනුව එකඟ වූ පොළී අනුපාතයක් යටතේ දිගුකාලීන ණයක් ලෙස ලබාදෙන අතර ණය නැවත අයකර ගැනීමේදී යම් පොළී ප්‍රතිශතයක් ආදායමක් ලෙස අරමුදලෙහි රඳවා තබාගනු ලබයි. එය නැවත නැවත ණය දීම සහ ආයෝජනය කිරීම මඟින් අරමුදල ශක්තිමත් කරනු ලබයි. මේ ක්‍රියාදාමයේ හේතුවෙන් ස්වයං ආදායම ජනනය කරන ආයතනයක් ලෙස දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල 2010 වර්ෂයේ සිට මහා භාණ්ඩාගාරයේ ප්‍රතිපාදන ලබා නොගනී.

3.11.3. රජයේ විදේශ ණය ව්‍යාපෘති වලට අදාල ණය අයකර ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස කාර්ය භාරය

දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල ණය අයකර ගැනීමේ නියෝජිතයෙකු ලෙස පළාත් පාලන යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ඛඨෂෂඡ), නාගරික සංවර්ධන සහ අඩු ආදායම් නිවාස ව්‍යාපෘතිය (ඖඛෂ්‍යඡ), බහුවාර්ෂික භෝග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (ඡඣඡ) යන ව්‍යාපෘතිවල කටයුතු කරයි. මෙම ව්‍යාපෘති ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍යණයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරය සමඟ රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධීකරණයෙන් ආරම්භ කර ඇති අතර දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල මේවායේ ණය අයකර ගැනීමේ යාන්ත්‍රිකයා ලෙස කටයුතු කිරීම වෙනුවෙන් එකඟ වූ ප්‍රතිශතයක් සේවා ගාස්තු ලෙස අයකිරීම්වලින් රඳවා තබාගනී.

3.11.4. 2017 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය
3.11.4.1. ණය අනුමත කිරීම සහ මුදාහැරීම

2017 වර්ෂයේ දී ණය අනුමත කරන ලද ව්‍යාපෘති

	පළාත් පාලන ආයතනය		පළාත	ව්‍යාපෘතිය	අනුමත කරන ලද ණය මුදල (රු.)
1	නුවරඑළිය	ප්‍රා.ස.	මධ්‍යම	කාර්යාල සහ වාණිජ ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	40,000,000
2	කාරතිවු	ප්‍රා.ස.	නැගෙනහිර	ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ල සඳහා පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	2,000,000
3	නිකවැරටිය	ප්‍රා.ස.	වයඹ	ආදහනාගාරය ඉදිකිරීම	5,660,000
4	දෙහිවල ගල්කිස්ස	ම.න.ස.	බස්නාහිර	ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සඳහා සූර්යකෝෂ පද්ධතියක් සවි කිරීම	9,500,000
5	ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ	ම.න.ස.	බස්නාහිර	ජනජය සිටි වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම	300,000,000
6	පස්සර	ප්‍රා.ස.	ඌව	වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම	40,000,000
7	බිංගිරිය	ප්‍රා.ස.	වයඹ	බැකෝ යන්ත්‍රයක් මිලට ගැනීම	7,000,000
8	කල්මුනේ	ම.න.ස.	නැගෙනහිර	බෑ වෙළඳ දැන්වීම් පුවරුව	4,000,000
9	හඟුරන්කෙත	ප්‍රා.ස.	මධ්‍යම	පොදු වෙළඳපොල සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම	6,000,000
10	මහරගම	න.ස.	බස්නාහිර	ටිපර් රථ 02ක්, සිංගල් කැබ් රථයක් සහ ත්‍රීවීලරයක් මිල දී ගැනීම	10,000,000
11	කන්දෙකැටිය	ප්‍රා.ස.	ඌව	සති පොලෙහි පිහිටි ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	3,600,000
12	කුරුණෑගල	ප්‍රා.ස.	වයඹ	ජැක් යන්ත්‍රයක් මිලට ගැනීම	19,000,000

13	මාන්මුනේපත්තු	ප්‍රා.ස.	නැගෙනහිර	ටිපර් යන්ත්‍රයක් මිලට ගැනීම	4,400,000
14	නවින්දන්වේලි	ප්‍රා.ස.	නැගෙනහිර	මෘත ශරීර ප්‍රවාහන රථයක් මිලට ගැනීම	1,120,000
15	රඹුක්කන	ප්‍රා.ස.	සබරගමුව	සති පොල පිහිටි භූමියේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම	14,308,000
16	කෑගල්ල	ප්‍රා.ස.	සබරගමුව	පොදු වෙළඳපොල ඉදිකිරීම	15,000,000
17	කොත්මලේ	ප්‍රා.ස.	මධ්‍යම	රම්බොඩ දියඇල්ල පිහිටි භූමියේ පිහිටි සංචාරක නරඹුම් මැදිරිය නවීකරණය කිරීම	4,800,000
18	චාවකච්චේරි	චාවකච්චේරි	න.ස.	කම්පැක්ට් ලෝඩරයක් සහ බැකෝ යන්ත්‍රයක් මිල දී ගැනීම	6,000,000
19	ජා ඇල	ජා ඇල	න.ස.	වීථි පහන් නඩත්තු රථයක් මිල දී ගැනීම	6,000,000
20	දෙහිවල ගල්කිස්ස	දෙහිවල ගල්කිස්ස	ම.න.ස.	ගිනි නිවීමේ කටයුතු සඳහා ජල බවුසරයක් මිලදී ගැනීම	8,000,000
21	ගම්පහ	ගම්පහ	ප්‍රා.ස.	පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	151,000,000
22	කැස්බෑව	කැස්බෑව	න.ස.	කසල කළමනාකරණය සඳහා ටිපර් රථ 02ක් මිලට ගැනීම	8,800,000
				එකතුව	**666,188,000**

2017 වසරේ දී ණය මුදල් නිකුත් කරන ලද ව්‍යාපෘති

	පළාත් පාලන ආයතනය		පළාත	ව්‍යාපෘතිය	නිකුත් කරන ලද ණය මුදල (රු.)
1	මාන්මුනේ දකුණු එරුවිල් පත්තු	ප්‍රා.ස.	නැගෙනහිර	බැකෝ යන්ත්‍රයක් මිල දී ගැනීම	9,200,000
2	මීගමුව	ම.න.ස.	බස්නාහිර	පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	22,148,000
3	පහතහේවාහැය	ප්‍රා.ස.	මධ්‍යම	ආදහනාගාරය ඉදිකිරීම	5,100,000
4	කෝරලේපත්තු බටහිර	ප්‍රා.ස.	නැගෙනහිර	එස්කැවේටර් යන්ත්‍රයක් මිල දී ගැනීම	8,760,000
5	ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ	ම.න.ස.	බස්නාහිර	ජනජය සිටි වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම	300,000,000
6	නිකවැරටිය	ප්‍රා.ස.	වයඹ	ආදහනාගාරය ඉදිකිරීම	5,660,000

7	මහරගම	න.ස.	බස්නාහිර	ටිපර් රථ 02ක්, සිංගල් කැබ් රථයක් සහ ත්‍රීවීලරයක් මිල දී ගැනීම	10,000,000
8	පස්සර	ප්‍රා.ස.	ඌව	වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම	22,779,000
9	මැදවච්චිය	ප්‍රා.ස.	උතුරු මැද	වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම	12,000,000
10	හඟුරන්කෙත	ප්‍රා.ස.	මධ්‍යම	පොදු වෙළඳපොල සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම	6,000,000
11	මහර	ප්‍රා.ස.	බස්නාහිර	ආදහනාගාරය ඉදිකිරීම	1,830,000
				එකතුව	403,477,000

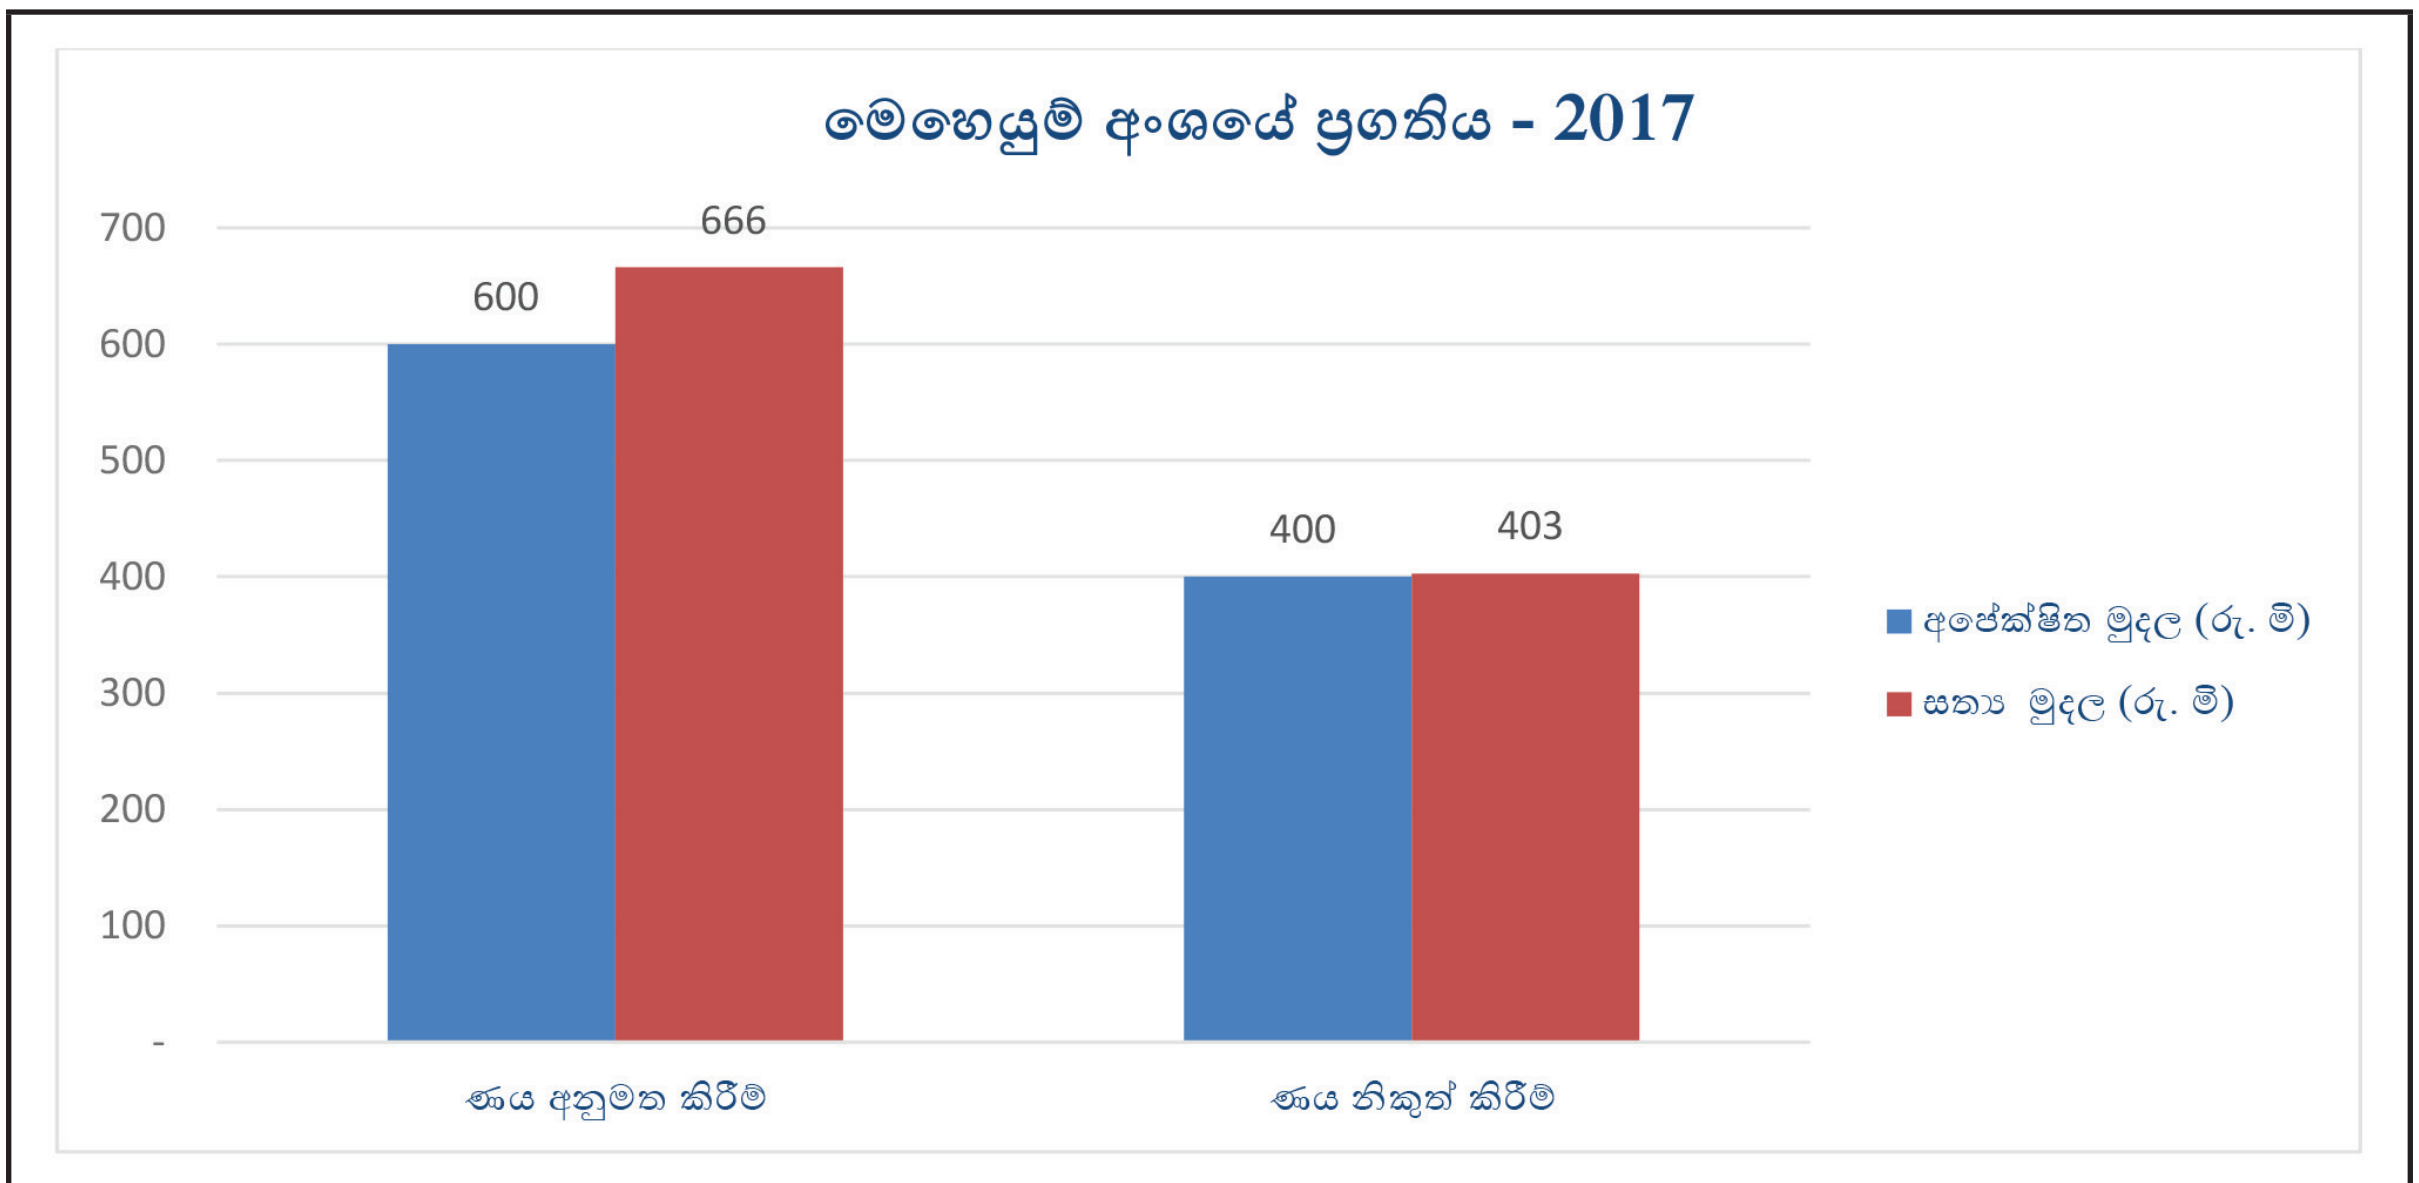

3.11.4.2 ණය අයකර ගැනීම

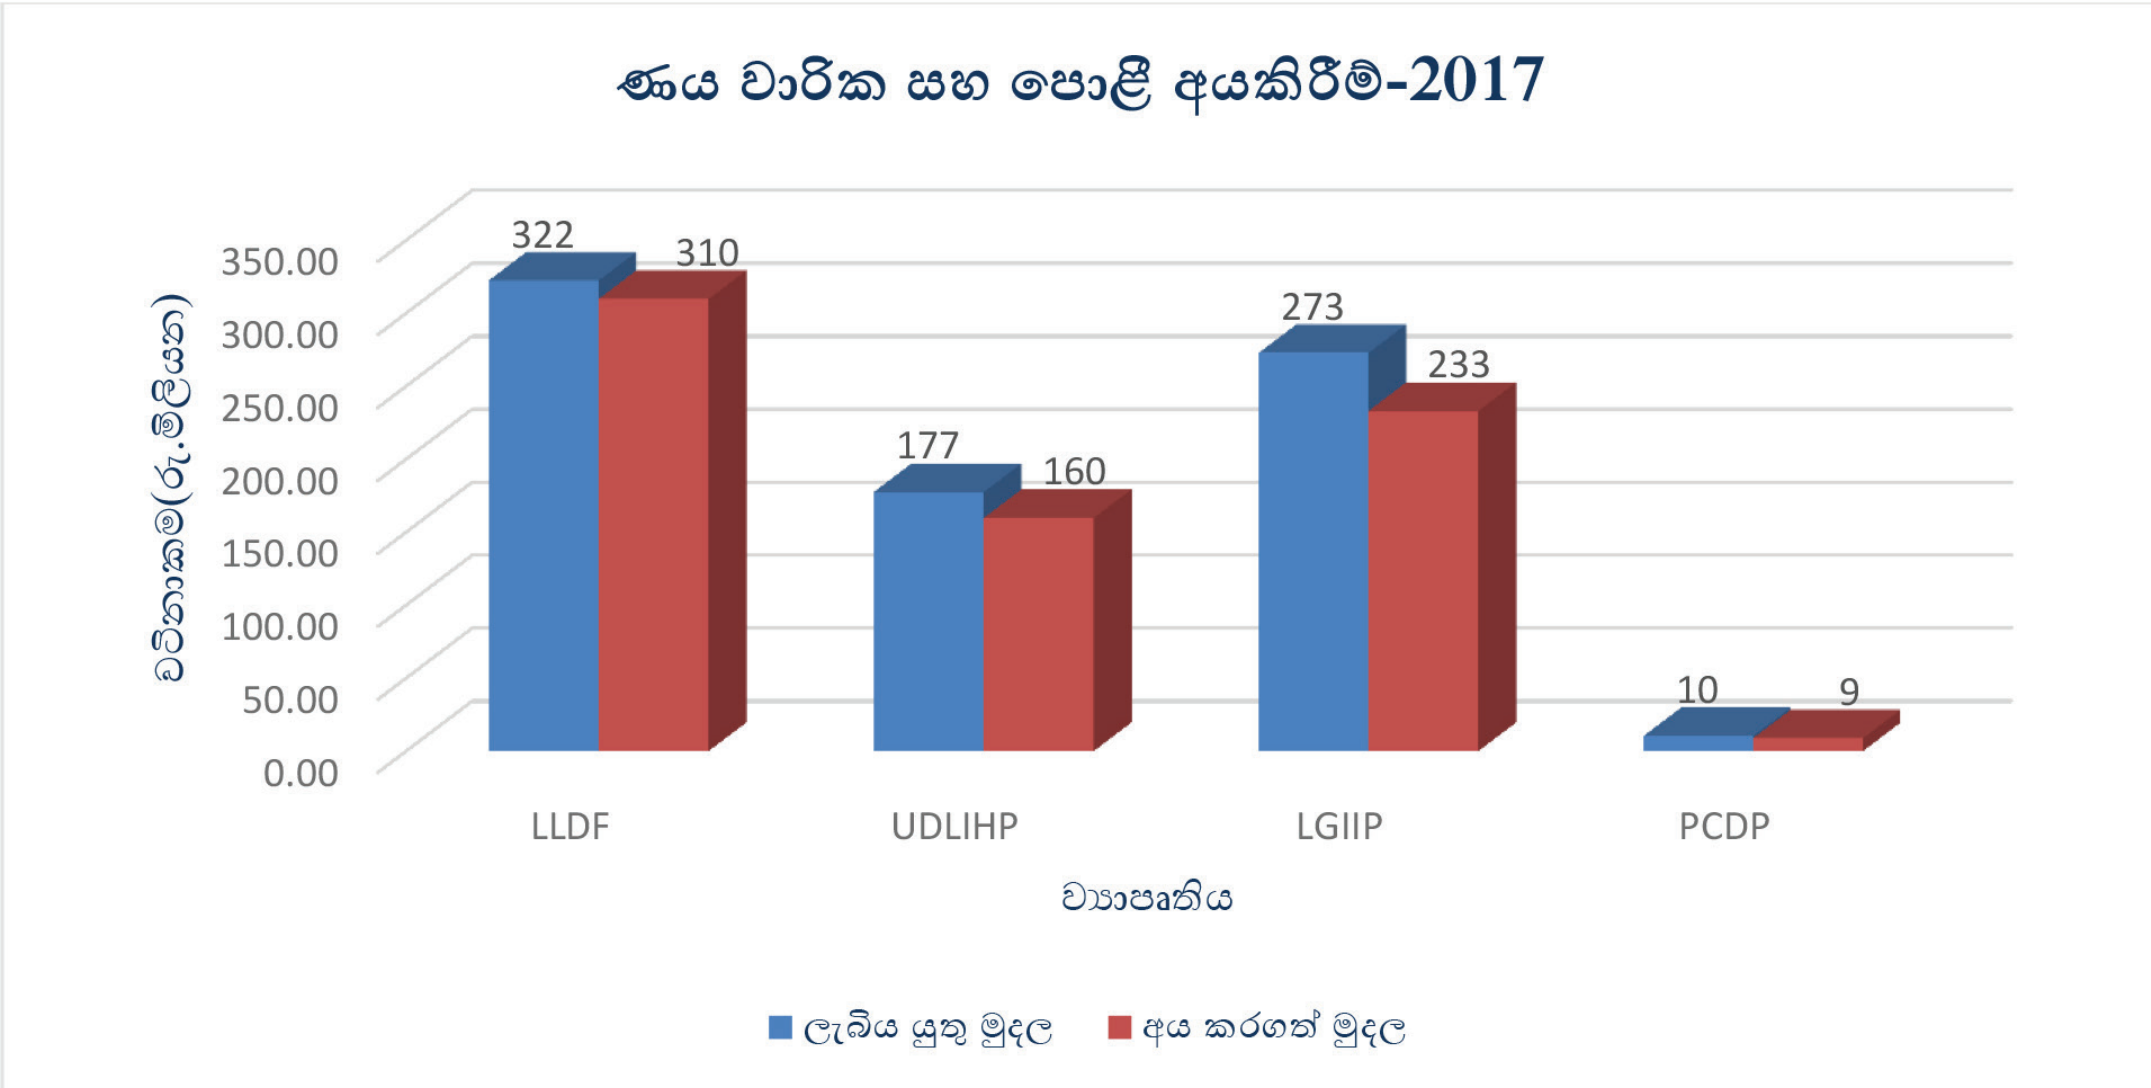

3.11.4.3 ප්‍රචාරණ වැඩසටහන්

දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදලේ අලෙවි ප්‍රචාරණ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගීතාවයෙන් "ණය පොල" සංකල්පය 2017 වසරේ හඳුන්වා දුන් අතර වසර තුල ණයපොල 03 ක් උතුර, ඌව සහ සබරගමුව යන පළාත් වල සාර්ථකව පවත්වන්නට යෙදුණි.

3.11.4.4 ණය අයකිරීම හා මහා භාණ්ඩාගාරයට ගෙවීම

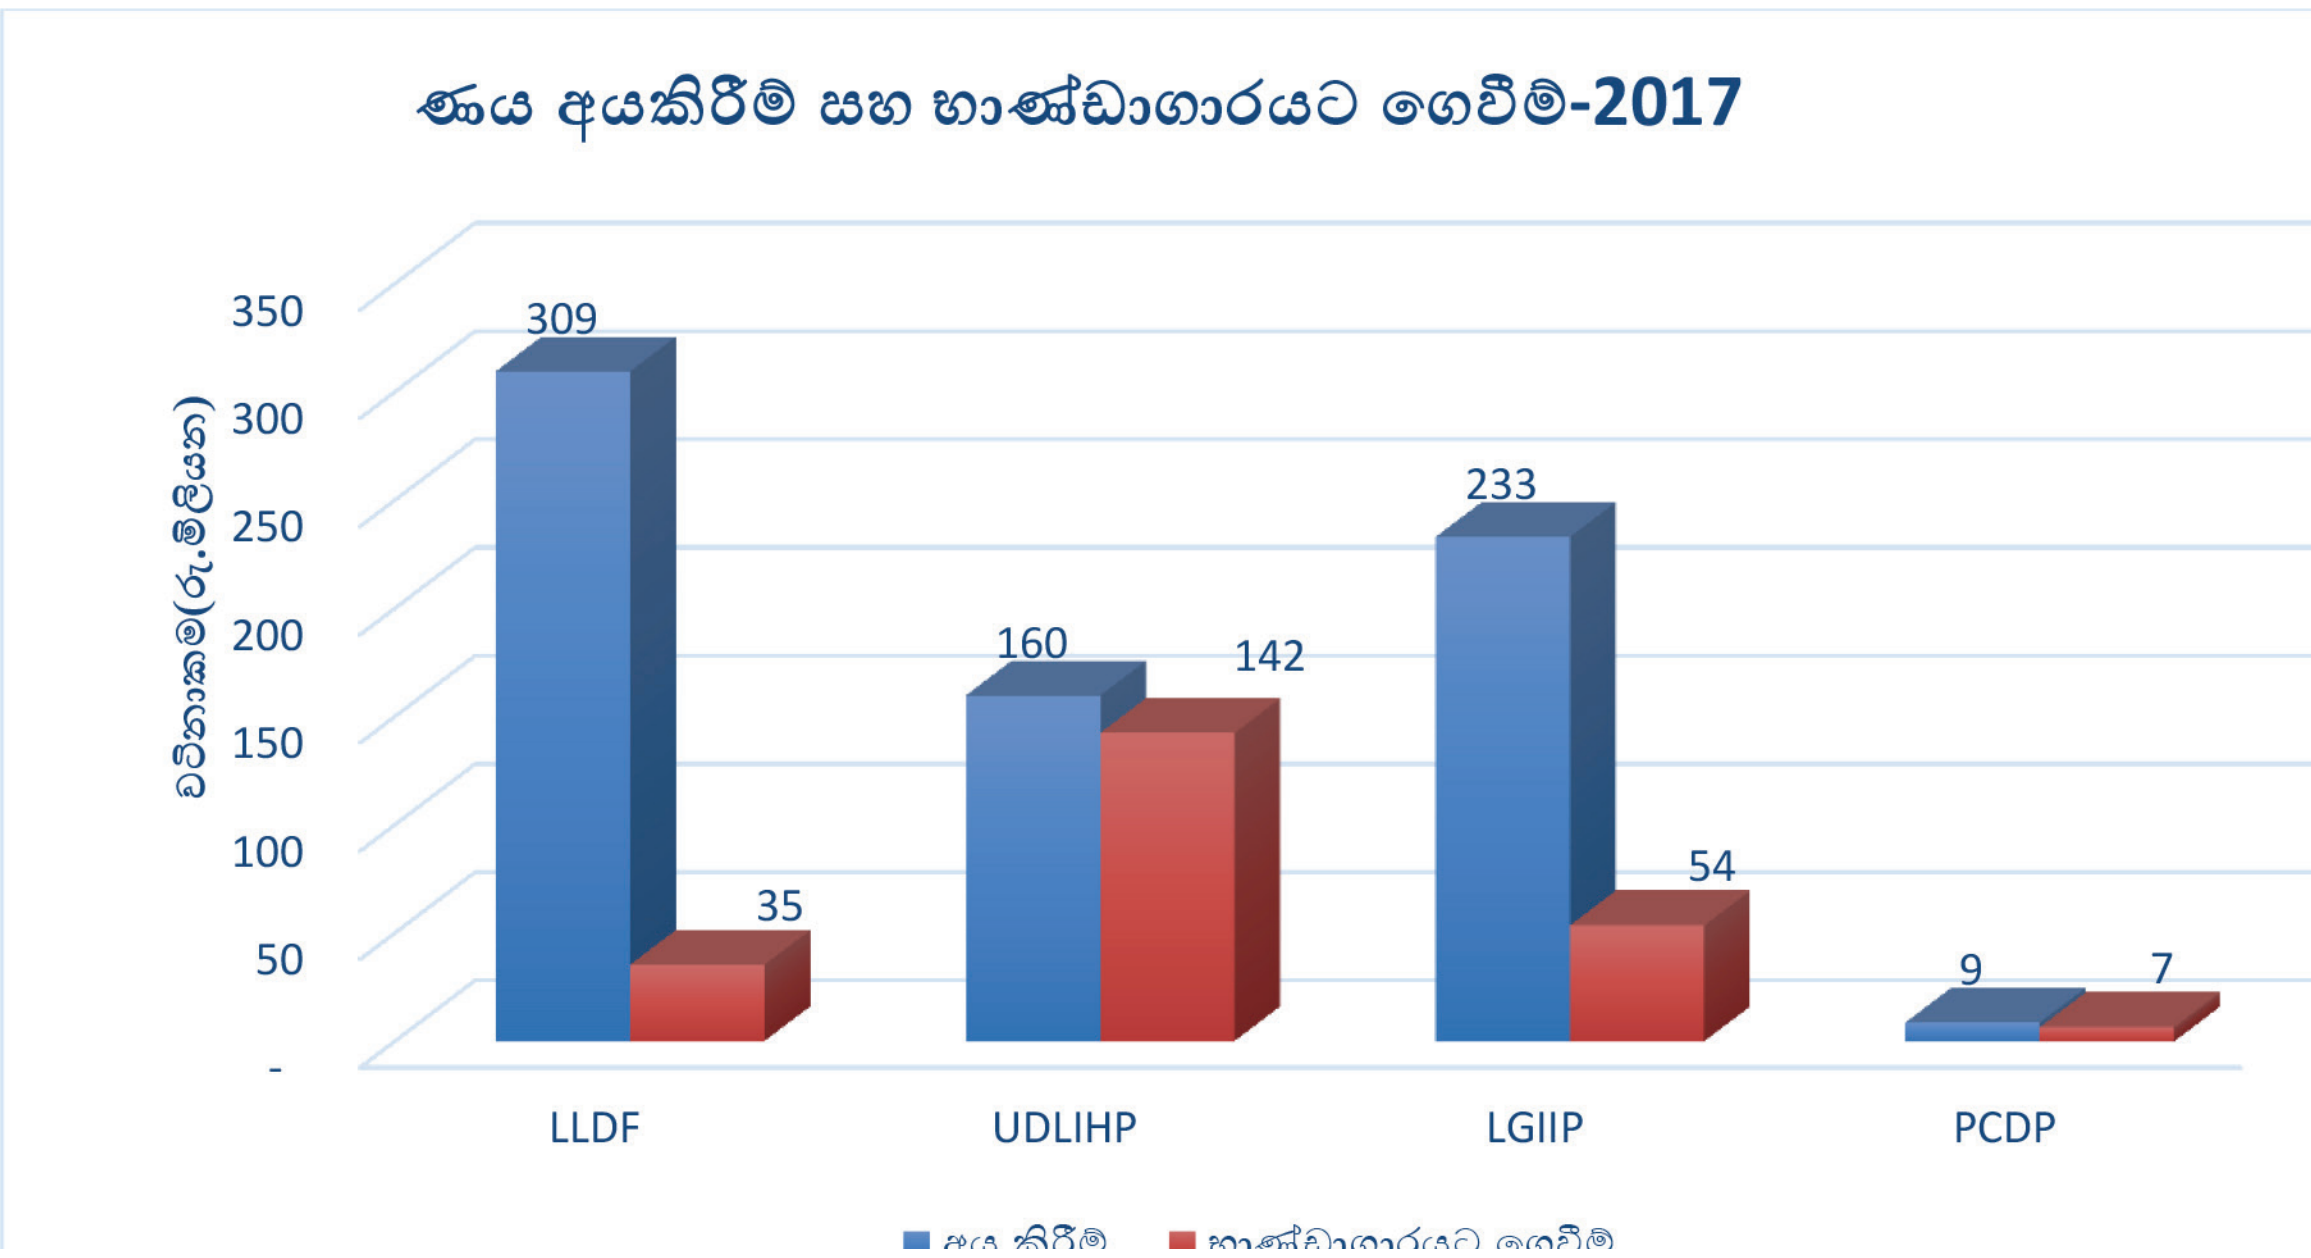

3.11.4.5 ණය අය නොවන ව්‍යාපෘති

දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදලේ අය නොවන ණය ශේෂ අයකර ගැනීම සඳහා නීති නිලධාරියෙකුගේ සහය ලබාගන්නා ලද අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අය නොවන ණය ශේෂ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩුකර ගැනීමට අරමුදලට හැකිවිය.

2017-01-01 දිනට අය නොවන ණය ශේෂවල එකතුව =රු..541,851,537

4. අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ -2017

2017 වර්ෂය තුළ පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ එක් එක් අංශ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශ 52 ක ප්‍රගතිය මෙම ඡේදය යටතේ විස්තර කර ඇත.

4.1 පළාත් සභා අංශය

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01.	CP/2017/19	ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය යටතේ පවතින ඉඩම් කොටසක් හලාවත නගර සභාව, හලාවත ප්‍රාදේශීය සභාව සහ ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඒකාබද්ධ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා නිදහස් කිරීමට ඉල්ලීම	2017.08.02	සංදේශයේ අවසන් පූර්ව ඡේදයේ සඳහන් දෙවන, තෙවන සහ සිව්වන නිර්දේශ සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සමාජීය හා පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුවක් සිදුකරන ලෙස වයඹ පළාත් සභාව වෙත දැනුම් දීම	2017.08.17 දින අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා වයඹ පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත යොමු කර ඇත.
02.	CP/2017/20	පළාත් පාලන ආයතනවල විශේෂිත වූ කණිෂ්ඨ සේවක තනතුර සඳහා අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලිහිල් කිරීම	2017.07.26	රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 36/2013 විධිවිධාන පරිදි අවශ්‍ය පියවර ගැනීම	සියලුම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරු දැනුවත් කර ඇත.

03.	CP/2017/29	ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වෙත සුදුසු ඉඩම් ලබාගැනීම	2017.09.15	ඒකාබද්ධ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් සකස් කිරීම	ඒකාබද්ධ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය 2018.02.16 දින ඉදිරිපත් කර ඇත.
04.	CP/2017/50	පළාත් පාලන ආයතන සඳහා කළමනාකරණ සේවාවන් ස්ථාපිත කිරීම			කැබිනට් තීරණය මේවන තෙක් ලැබී නොමැත.

4.2 ගිණුම් අංශය

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01.	CP/2017/32	වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම - 2015	2017.11.01	කැබිනට් පත්‍රිකාවේ පිටපතක් මේ සමඟ අමුණමි.	ෙ
02.	CP/2017/47	රාජ්‍ය අංශ ගිණුම් ප්‍රමිති අනුව පළාත් පාලන ආයතන සඳහා පොදු ගිණුම් ක්‍රමයක් සකස් කිරීම.	2018.0105	කැබිනට් පත්‍රිකාවේ පිටපතක් මේ සමඟ අමුණමි.	කැබිනට් තීරණය අනුව කටයුතු කරගෙන යමින් පවති.

4.3 ඝන අපද්‍රව්‍ය අංශය

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01	CP$2017$04	පළාත් මට්ටමින් කවෂිමා කොම්පෝස්ට් යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීම	2017.04.04	ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් අනුකාරක සභාව වෙත නිරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර ඇත.	නිරීක්ෂණ ලබා දී ඇත.
02	8$2017	කසල බැහැර කරන ස්ථානවල වන අලි ගැවසීම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම (තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයකි)	2017.06.07	සංදේශයේ අවසන් ඡේදයේ සඳහන් 1,2,3 යෝජනා සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම. සංදේශයේ සඳහන් විදුලිවැටවල් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය පිරිවැය 2017 වසර සඳහා වන ජීවී අමාත්‍යාංශය වෙත වෙන්කළ අයවැය ප්‍රතිපාදන තුලින් කළමනාකරණය කරගන්නා ලෙස වනජීවී අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට නියම කිරීම.	කවෂිමා යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කරන ස්ථානවල අලිවැටවල් ඉදිකිරීමට පියවර ගැනීම
03	CP$2017$11	කොළඹ මහා නගර සභාවේ කසල බැහැර කිරීම සඳහා සනීපාරක්ෂක කසල රැඳවුමක් ඉදි කිරීම	2017.05.03	යෝජනා සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත.	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක නොවිණි.
04	CP$2017$12	කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශයන්හි නගර අලංකරණය විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාම සඳහා කාර්ය සාධක බලකායක් හා මෙහෙයුම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම	2017.05.03	අනුමැතිය ලැබී ඇත	මෙහෙයුම් කාර්යාලය ස්ථාපිත කර ඇත.

05	CP/2017/14	පළාත් මට්ටමින් කවෂිමා කොම්පෝස්ට් යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීම	2017.05.23	ප්‍රසම්පාදන කමිටුවලට නිලධාරීන් පත් කර ඇත.	අදාල කමිටුව පත් කර ඇත.
06	CP/2017/17	ආපදා අවදානම අවම කිරීම හා ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවල සහාය ලබාග ැනීම(පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයකි)	2017.07.19	(මේ සම්බන්ධව ඉදිරි කටයුතු සඳහා පළාත් පාලන අංශය වෙත යොමු කර ඇත,)	
07	CP/2017/18	පළාත් මට්ටමින් කවෂිමා කොම්පෝස්ට් යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීම	2017.07.19	සියළු යෝජනා සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත.	කවෂිමා යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී
08	CP/2017/21	කොළඹ මහා නගර සභාවේ කසල බැහැර කිරීම සඳහා සනීපාරක්ෂක කසල රැඳවුමක් ඉදිකිරීම(අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහනකි)			
09	CP/2017/26	කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල අවිධිමත් ලෙස ඝණ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම වැලැක්වීම හා ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තිය මර්ධනය කිරීම සඳහා ගතයුතු හදිසි පියවර	2017.07.26	රජය විසින් ගනු ලැබ ඇති ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසු විපරම් කිරීම සඳහා ඵලදායී ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස යෝග්‍ය පියවර ගැනීම.	මෙහෙයුම් කාර්යාලය මගින් කටයුතු කරනු ලැබේ.

10	CP/2017/31	කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල කසල ප්‍රවාහන රථ සඳහා GPS මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම හා කසල බැහැර කරන ස්ථාන සඳහා රැහැන් රහිත විද්‍යුත් සමීප නිරීක්ෂණ කැමරා CCTV භාවිතා කිරීම	2017.09.13	සංදේශයේ සඳහන් යෝජනා පිළිබඳව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා සමග සාකච්ඡා කොට එකගවනු ලබන කරුණු පිළිබඳව සලකා බැලීම	සාකච්ඡා මට්ටමේ පවතී.
11	CP/2017/36	අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් ඉදිකිරීම හා ජපන් තාක්ෂණික කවෂිමා කොම්පෝස්ට් යන්ත්‍රය ස්ථාපිත කිරීම			
12	CP/2017/42	කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල කසල ප්‍රවාහන රථ සඳහා GPS මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම හා කසල බැහැර කරන ස්ථාන සඳහා රැහැන් රහිත විද්‍යුත් සමීප නිරීක්ෂණ කැමරා CCTV භාවිතා කිරීම			

4.4 නීති අංශය

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01	CP/2017/01	පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ පනත් කෙටුම්පත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි පත් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව.	2017-06-28	සංදේශයේ සඳහන් යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලැබී ඇත.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.

02	CP/2017/02	පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වූ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය-2017.03.31	2017-05-02	අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නිරීක්ෂණ වල අවධාරණය කරනු ලැබ ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන ඒ අනුව ක්‍රියාකරන ලෙස පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ලේකම්ට නියම කිරීමට තීරණය කරන ලදි.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
03	CP/2017/07	1901 අංක 25 දරණ බල්ලන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත (477 වන අධිකාරය) සංශෝධන කිරීම-අයාලේ යන සුනඛයන් හේතුවෙන් පොදු මහජනතාවට සිදුවන දුෂ්කරතා වැලැක්වීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම .	2017-03-21	සංශෝධන ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් දීම සහ සම්පාදනය කරනු ලබන පනත් කෙටුම්පත ගරු අමාත්‍යතුමා මගින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සහ මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමතිතුමාගේ නිරීක්ෂණවල යෝජිත පරිදි අයාලේ යන ගවයින්ගෙන් මහජනතාවට සිදුවන අවහිරතා වැලැක්වීම සඳහා අදාල නීති සංශෝධනය කිරීම පිණිස කඩිනම් පියවර ගැනීම.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.

04	CP/2017/09	පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) සංශෝධනය කිරීම.	2017-05-16	පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ එල කිරීම . අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ යෝජනා ඇතුලත් කර වැඩිදුර සංශෝධන කෙටුම්පත් කරණ ලෙසට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් ලබා දීම .	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
05	CP/2017/15	පළාත් පාලන ආයතන වලින් අය කරනු ලබන බදු බලපත්‍ර ගාස්තු සහ වෙනත් ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් මතු වී ඇති මහජන විරෝධතා හේතුවෙන් ඒවා නියාමනය කිරීමේ ක්‍රම වේදයක් සැකසීම	2017-10-10	අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයේ අවසන් ඡේදයේ සඳහන් 1,2 සහ 3 නිර්දේශ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට තීරණය කරන ලදි.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
06	CP/2017/28	පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනය තුලින් සංහිදියාව සහ සමානාත්මතාවය පදනම් කරගත් සමාජ සාරධර්ම සහ මානසික බුද්ධිමය හර පද්ධතින් සංවර්ධනය කිරීමෙහි විශ්වීය වැඩසටහන.	2017-08-01	සංදේශයේ අවසන් ඡේදයේ 1 සහ 2 යෝජනා සඳහා සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට තීරණය කරන ලදි.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.

07	CP/2017/30	වතු ප්‍රජාවගේ සුභ සාධනය සැලසීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සභා පනත සංශෝධනය කිරීම.	2017-09-26	ප්‍රාදේශීය සභා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීම සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154උ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර පළාත් සභාවල අදහස් ලබා ගැනීම පිණිස එකී පනත් කෙටුම්පත පළාත් සභා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සහ අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
08	CP/2017/33	මහා නගර සභා ආඥා පනත, නගර සභා ආඥා පනත සහ ප්‍රාදේශීය සභා පනත සංශෝධන යෝජනාවලිය.	2017-08-29	සංශෝධන ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් කරන ලෙස නිති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් ලබා දීම.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
09	CP/2017/34	මහා නගර සභා ආඥා පනත, නගර සභා ආඥා පනත සහ ප්‍රාදේශීය සභා පනත සංශෝධන කෙටුම්පත්	2017-08-29	සංදේශයේ සඳහන් යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලැබී ඇත.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
10	CP/2017/35	පවතින පළාත් සභා මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කිරීම	2017-09-06	සංදේශයේ අවසන් ඡේදයේ සඳහන් නිර්දේශ 4 සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
11	CP/2017/38	පුදුකුඩුඉරිප්පු සහ මුහුදු බඩපත්තු ප්‍රාදේශීය සභා වල නිල නාම යෝජනා නැවත කැඳවීම	2017-09-26	රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීම සහ අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.

12	CP/2017/39	පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනය තුලින් සංහිදියාව සහ සමානාත්මතාවය පදනම් කරගත් සමාජ සාරධර්ම සහ මානසික බුද්ධිමය හර පද්ධතින් සංවර්ධනය කිරීමෙහි විශ්වීය වැඩසටහන	2017-10-03	නිළධාරී කමිටුවක් පත්කර එහි කැඳවුම්කරු ලෙස පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නම් කර කමිටුවේ නිර්දේශ සලකා බැලීම පිණිස සති 03ක් ඇතුලත ගරු අමාත්‍යතුමා විසන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
13	CP/2017/41	පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත සංශෝධනය කිරීම	2017-10-12	සංශෝධන ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් දීම සහ එකී පනත් කෙටුම්පත අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය ලැබී ඇත.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
14	CP/2017/46	නව මැතිවරණ ක්‍රමය සහ ඒ තුල කාන්තා නියෝජනය පිළිබඳ මහජනතාව සහ සිවිල් සංවිධාන දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන	2017-10-27	සංදේශයේ 3 ඡේදයෙහි සඳහන් (ස) ,(සස) සහ (සසස) යෝජනා සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට තීරණය කරන ලදි.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
15	CP/2017/49	පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනය තුලින් සංහිදියාව සහ සමානාත්මතාවය පදනම් කරගත් සමාජ සාරධර්ම සහ මානසික බුද්ධිමය හර පද්ධතින් සංවර්ධනය කිරීමෙහි විශ්වීය වැඩසටහන		මේ සම්බන්ධවම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ළමා සහ කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින්ද ඉදිරිපත් කර ඇත.	

16	CP/2017/51	පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත සංශෝධනය කිරීම	2017-10-24	රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීම සහ අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය ලැබී ඇත.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කටයුතු කර ඇත.
17	CP/2017/56	පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනය තුලින් සංහිඳියාව සහ සමානාත්මතාවය පදනම් කරගත් සමාජ සාරධර්ම සහ මානසික බුද්ධිමය හර පද්ධතින් සංවර්ධනය කිරීමෙහි විශ්වීය වැඩසටහන			

4.5 පාලන අංශය

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01	CP$2017$45	අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන - ගරු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා සඳහා අමාත්‍යාංශ උපදේශකවරයෙකු පත් කිරීම	2017.11.08	ගරු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා සඳහා අමාත්‍යාංශ උපදේශකවරයෙකු වශයෙන් පී. කොඩිතුවක්කු මහතා පත් කිරීම	100%
02	CP$2017$54	දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල සඳහා අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීගේ කොන්ත්‍රාත් සේවා කාලය දීර්ග කිරීම	තීරණ මෙතෙක් ලැබී නොමැත		
03	CP$2017$59	ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය විසින් හෙල්ලයෙන් මසුන් මැරීම තහනම් කිරීම	තීරණ මෙතෙක් ලැබී නොමැත		

4.6 සංවර්ධන අංශය

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01	CP/2017/27	හදිසි ගංවතුරෙන් සහ නායයෑම් වලින් ආපදාවටපත් ප්‍රජාවට සහන සැලසීම සඳහා බලපෑමට ලක්වී ඇති දිස්ත්‍රික්කවල පළාත් පාලන ආයතන වෙත අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.	2017.09.13	(i) ප්‍රථම කොට, සංදේශයේ සඳහන් නිර්දේශ පිළිබඳව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සහ (ii) ඉහත (i) හි පරිදි සාකච්ඡා කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව එකඟ වනු ලබන කරුණු සලකා බැලීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.	
02	CP/2017/44	කොළඹ 07 මලලසේකර මාවතේ අංක 17 දරණ ස්ථානයෙහි පිහිටි පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ (SLILG) නව කාර්යාල ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව			

4.7 පළාත් පාලන අංශය

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01	CP/2017/22	නව පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය හා පවත්නා පළාත් පාලන ආයතන උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම	2017.07.25	නව පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය හා පවත්නා පළාත් පාලන ආයතන උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා නිර්ණායක මඟින් ඇගයීමේ ක්‍රියාවලිය සහිත විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.	නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය එම ක්‍රමවේදය පදනම් කර ගෙන සංස්ථාපන නිර්දේශ ලබා දීම සඳහා පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් වෙත යොමු කරන ලදී. ඒ අනුව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශ අනුව පැවැති අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සීමා සංශෝධනය කරමින් ■ අඹගමුව ප්‍රාදේශීයසභාව ■ මස්කෙළිය ප්‍රාදේශිය සභාව ■ නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාව යන නව ප්‍රාදේශිය සභා 3 ක් ද, පැවැති නුවර එළිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ සීමා සංශෝධනය කරමින් ■ නුවරඑළිය ප්‍රාදේශිය සභාව ■ කොටගල ප්‍රාදේශිය සභාව ■ ආගරපතන ප්‍රාදේශිය සභාව ලෙස ප්‍රාදේශිය සභා 03 ක් ද සංස්ථාපනය කරන ලදි. (අංක 2043/57 - 2017.11.02 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය)

02	CP/2017/40	පළාත් පාලන සීමා නිර්ණය අභියාචනා විමර්ශන කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීම	09.26.2017	පළාත් පාලන සීමා නිර්ණය අභියාචනා විමර්ශන කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීම සඳහා i. සාමාජිකයින් පස් දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් පත් කිරීමටත් ii. එම කමිටුවේ සම්පූර්ණ කාර්යය සඳහා වියදම් දැරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.	කමිටු නිර්දේශය අනුව අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ අත්සනින් යුතු අංක 2047/51 හා 2017.12.02 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය හා විෂය භාර ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අත්සනින් යුතු අංක 2047/52 හා 2017.12.02 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරන ලදී.
03	CP/2017/43	පළාත් පාලන සීමා නිර්ණය අභියාචනා විමර්ශන කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීම (නියෝජිතයින් දෙදෙනෙකු පත් කිරීම)	06.10.2017	පළාත් පාලන සීමා නිර්ණය අභියාචනා විමර්ශන කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීම සඳහා යෝජිත නියෝජිතයින් දෙදෙනා පත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත.	නියෝජිතයින් දෙදෙනා පත් කරන ලදී.

04	CP/2017/60	පළාත් පාලන මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ දී මහර ප්‍රාදේශීය සභාවේ කොට්ඨාස සීමා නිරණය කිරීම සම්බන්ධව මතු ව ඇති ගැටලුව	2018.01.03	මෙම ගැටළුව ආගමික නායකයින් විමසමින් විසඳාලිය යුතු බැවින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත නැවත වාර්තා කරන ලෙසත්, මෙම තීරණය සම්මත කරනු ලැබුවා සේ සැලකීමටත්, අදාල බලධාරීන් වෙත මෙම තිරණය දන්වා යැවීමටත් තීරණය කරන ලදි.	කමිටු නිර්දේශය අනුව ගරු විෂය භාර අමාත්‍යතුමාගේ අත්සනින් යුතු 2052/34 හා 2018.01.05 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරමින් "අක්බාර් ටවුන්" කොට්ඨාස නාමය "එඩේරමුල්ල 1" ලෙස සංශෝධනය කරන ලදී.
05	CP/2017/53	පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය පළාත් පාලන සංසදයේ මහා සභා රැස්වීම හා සම්මන්ත්‍රණය 2019 වර්ෂයේ ශ්‍රි ලංකාවේ පැවැත්වීම පිළිබඳ යෝජනාව	16.11.2016	මණ්ඩලීය පළාත් පාලන සංසදයේ මහා සභා රැ ස්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම සඳහා වන යෝජනාව 2017 මෝල්ටා සමුළුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. . අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයේ 2 ඡේදයේ සඳහන් ඉදිරි මාස කිහිපය තුල හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තුවන වැඩසටහන් වලට අදාළ ක්‍රියාකාරි සැලැස්මණි සලකා බැලීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස උපදෙස් ලැබී ඇත	ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මූලික සාකච්ඡාවට කිහිපයක් පවත්වා ඇත.

06	CP/2017/48	ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතන සහෝදර නගර හෝ මිතුරු නගර සංකල්පය යටතේ විදේශ රාජ්‍යයන්හි පළාත් පාලන ආයතන සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹීම			අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් කෙටුම්පත් කර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කරමින් නිරීක්ෂණ ඉල්ලා ඇත.

4.8 ව්‍යාපෘති අංශය

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01	CP/2017/03	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන මහ කොළඹ පානීය ජල හා අපජල කළමණාකරණ සංවර්ධන ආයෝජන වැඩසටහන - කොන්ත්‍රාත් නාමය : කොළඹ මහනගර සභාවෙහි කිරුළපන අපජල පෝෂිත ප්‍රදේශය සඳහා නව ගුරුත්ව අපජලාපවහන පද්ධතියක්, අපජල පොම්පාගාර සහ ප්‍රධාන නළ ඉදි කිරීම - කොන්ත්‍රාත් අංකය : GCWWMIP-/01/ICB/උදරනි/01/2015	2017-03-22	1. ප්‍රසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය විසින් අවම හා පරිපූර්ණ මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කල යුතු ලංසුකරු ලෙස බ්රිැබ) ඔදමඉරද බසපසඑා සමාගම නිර්දේශ කිරීමට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කල නිර්දේශය අහෝසි කරමි. 2. ප්‍රසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය විසින් ඍ් දෙ ඛඔබ ඡරදවැජඑ(ඡඩඑ) බඑා ිබා ඡර්එයසශ් ෂබාමිඑරසැ ලංසුකරු සමඟ මිල ගණන් කේවල් කිරීම කරන ලෙස අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට දැනුම් දෙන ලෙස කරන ලද නිර්දේශය අවලංගු කිරීම. 3. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙහි ඇමණුම අංක 6 යටතේ ලබාදී ඇති එකඟතාව මත, මහ කොළඹ පානීය ජල හා අපජල කළමණාකරණ සංවර්ධන ආයෝජන වැඩසටහන - ව්‍යාපෘතිය 03, යටතේ කොළඹ මහනගර සභාවෙහි කිරුළපන අපජල පෝෂිත ප්‍රදේශය සඳහා නව ගුරුත්ව අපජලාපවහන පද්ධතියක්, අපජල පොම්පාගාර සහ ප්‍රධාන නළ ඉදි කිරීම - කොන්ත්‍රාත්තුව, පරිපූර්ණ හා අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කල ලංසුකරු වන Larsen) Toubro බසපසඑා සමාගමට අදාල ඒ්ඹ බදු වලට යටත්ව ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 7,015,919,086.00 ට ප්‍රදානය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපේක්ෂා කරමි.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කර ඇත.

02	CP/2017/05	ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින සාම්ප්‍රදායික විදුලිපහන් වෙනුවට කාර්යක්ෂම එල්.ඊ.ඩී.(LED) විදුලිපහන් සවි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	2017-03-22	1. සියලුම පළාත් පාලන ආයතන ආවරණය වන පරිදි කොරියන් ටෙලිකොම් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති තාක්ෂණික යෝජනාව, වීදි පහන් ආලෝක කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු යෝජනාවක් ලෙස පිළිග ැනීමටත්, 2. කොරියන් ටෙලිකොම් ආයතනය ඉදිරිපත් කර ඇති මූල්‍ය යෝජනාව විවෘත කර ඇගයීම නිර්දේශ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කර ඇත.
03	CP/2017/06	ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය - අදියර II - විනිමය අනුපාත විචලනය මත වූ ඉතුරුම් තුළින් වන කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රභේදනය	2017-03-29	ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, අපනයන ණය පහසුකමේ අගය වන ඇමරිකානු ඩොලර් 128, 600,000 නොඉක්මවමින් 2014 මැයි මස 06 වන දින අත්සන් තබන ලද කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ එකඟ වන ලද මිල ගණන් මතම, විනිමය අනුපාත වෙනස් වීම නිසා වන ණය මුදලේ ශේෂය උපයෝගි කරගනිමින් අතිරේක පාලම් 63 ක් ප්‍රසම්පාදනය සහ ඉදිකිරීම් සඳහා අතිරේක මාස 03ක කාලයක්න් ව්‍යාපෘතියේ ණය ගිවිසුම හා ඉදිකිරීමේ ගිවිසුම 2018.03.08 වන දින දක්වා දීර්ඝ කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපේක්ෂා කරමි.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කර ඇත.

04	CP/2017/08	ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින සාම්ප්‍රදායික විදුලිපහන් වෙනුවට කාර්යක්ෂම එල්.ඊ.ඩී.(LED) විදුලිපහන් සවි කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	2017-03-29	1. සියලුම පළාත් පාලන ආයතන ආවරණය වන පරිදි කොරියන් ටෙලිකොම් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති තාක්ෂණික යෝජනාව, වීදි පහන් ආලෝක කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු යෝජනාවක් ලෙස පිළිග ැනීමටත්, 2. කොරියන් ටෙලිකොම් ආයතනය ඉදිරිපත් කර ඇති මූල්‍ය යෝජනාව විවෘත කර ඇගයීම නිර්දේශ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම. දැනට ප්‍රදානය කර ඇති අපජල පවාහන පද්ධතියේ නවීකරණය කිරීමේ සහ අපජල පොම්පාගාර නවීකරණය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත් දෙකෙහි වැඩ නිම කිරීම සඳහා ණය ගිවිසුමෙහි කාලය 2019 මාර්තු 31 දක්වා දීර්ඝ කිරීම.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කර ඇත.
05	CP/2017/55	ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘතියෙහි ඉතිරිව ඇති අවිනිශ්චිත වියදම් ඵලදායී ලෙස යොදා ගැනීම	2018-01-03	1. අතිරේක ග්‍රාමීය පාලම් 35 ක් දක්වා සහ මීටර් 36ක් දිගින් යුතු තාවකාලික (bailey bridge)පාලම් 09 ක් සැලසුම් කර ඉදිකිරීම. 2. එම කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා 2018 මාර්තු 09 දින සිට 2018 අගෝස්තු 31 වන දින දක්වා ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කිරීම.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කර ඇත.

07	CP/2017/57	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ, යෝජිත ද්විතීයික නගර තිරසර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 05ක ණය පහසුකම් ලබාග ැනීම	2018-01-10	1. , යෝජිත ද්විතීයික නගර තිරසර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙහි මූලික කටයුතු යටතේ එන උප ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම, මූලික ප්‍රසම්පාදන සහ විධිමත් පරිපාලන ක්‍රමවේද හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන උපදේශන සේවා ප්‍රසම්පාදනය වෙනුවෙන් භාවිතා කිරීමට, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 05ක තාක්ෂණික සහයෝගිතා ණය පහසුකමක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මඟින් ලබාගැනීම. 2. ඉහත කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමත ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් පත් කිරීම. 3. අදාළ පාර්ශවකරුවන්ගේ උපදේශකත්වය සහිතව ව්‍යාපෘති සැකසීම, සැලසුම් කිරීම, ප්‍රසම්පාදනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යභාර්යන් පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට පැවරීම.	අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව කටයුතු කර ඇත.

மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

இல 330, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு - 02

செயற்சாதனை அறிக்கை - 2017

செய்திகள்

நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் 3

1. மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் ஒழுங்கமைப்புப் பின்னணிகள 4
   1.1. நோக்கு மற்றும் பணிக்கூற்று 4
   1.2. விடயப் பரப்புக்கள் மற்றும் செயற்பாடுகள் 5
   1.3. கொள்கை மற்றும் மூல உபாயத் திட்டங்கள் 6
   1.4. அமைச்சிற்குரிய பிரிவுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 7

2. செயற்சாதனைச் சுருக்கம் - 2017 8
   2.1. நிதிச் சுருக்கம் 8
   2.2. பௌதீக செயற்திறன் 9
   2.3. பௌதீக செயற்சாதனை சுருக்கமாக 10

3. அமைச்சின் பிரிவுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் செயற்சாதனைகள் 16
   3.1. அபிவிருத்திப் பிரிவு 16
      3.1.1. உள்நாட்டு நிதியத்திற்கமைய அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள செயற்திட்டங்கள் 17
   3.2. செயற்திட்டங்கள் மற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு 36
      3.2.1. பிரதான பணிகள் 36
      3.2.2. வெளிநாட்டு நிதியத்திற்கமைய அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் 38
   3.3. தேசிய திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ உதவியாளர் மத்திய நிலையம் 84
   3.4. உள்ளூராட்சி மன்றப் பிரிவு 89
   3.5. மாகாண சபைப் பிரிவு 97
   3.6. நிருவாகப் பிரிவு 107
   3.7. செலவின கண்காணிப்புப் பிரிவு 111
   3.8. உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு 114
   3.9. உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகம் 119
   3.10. உள்நாட்டுக் கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம் 127

4. அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் 135

நிறைவேற்றுச் சுருக்கம்

இவ் அறிக்கையின் மூலம் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் விடயப் பரப்பிற்கமைய 2017 ஆம் ஆண்டுக்குள் அமுல்படுத்தப்பட்ட சகல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு உதவி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்கள் மற்றும் வேலைத்திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்ட கொள்கைகள். வழிகாட்டல் ஆலோசனை உட்பட மறுசீரமைக்கப்பட்ட கட்டளைச் சட்டங்கள் போன்றவைகளில் ஆண்டு இறுதிய செயற்சாதனைகள் அமைச்சின் கீழ் காணப்படும் அவ்வவ் பிரிவுகளின் கீழ் விளக்கமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய 2017 ஆம் ஆண்டில் அமுல்படுத்தப்பட்ட சகல செயற்திட்டங்கள் மற்றும் வேலைத்திட்டங்களின் முழுமையான நிதிப் பெறுமதி 44,814 மில்லியன் என்பதுடன் அச் செயற்திட்டத்தின் மூலம் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சுத் துறையின் சேவை உட்பட உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் வகுக்கப்பட்ட கொள்கை, வழிகாட்டல் ஆலோசனை மற்றும் சமகாலத்தில் மறுசீரமைக்கப்பட்ட கட்டளைச் சட்டங்கள் என்பதுடன் பிரதேச சபை, நகர சபை மற்றும் மாநகர சபைச் சட்டங்களும் விசேடமானவைகளாகும். அக்கட்டளைச் சட்டங்கள் உள்ளூராட்சி மன்றத்துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கொள்கைகளை அமுல்படுத்துவதற்குத் தேவையான அடிப்படைப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

நாட்டின் பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாசார அபிவிருத்திக்கு முன்னேற்றகரமான பங்களிப்பினை வழங்கி மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்காக உரிய முதலீட்டினை மேற்கொள்வதற்கும் சமகாலக் கொள்கைகளை வகுப்பதற்கும் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற கௌரவ அமைச்சரின் தலைமையில், அமைச்சின் செயலாளரின் வழிகாட்டலைப் போன்று மேலதிக செயலாளர்கள் உட்பட ஏனைய அமைச்சின் ஊழியர்களினால் வழங்கப்பட்ட பங்களிப்புக்கள் முன்னேற்றகரமானதாக காணப்படுகின்றது.

1

மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் ஒழுங்கமைப்புப் பின்னணிகள்

1.1. நோக்கு மற்றும் பணிக்கூற்று

நோக்கு

வினைத்திறன், ஒத்துழைப்பைப் போன்று மக்களுக்குப் பொறுப்புக் கூற வேண்டிய உயர் மற்றும் பண்புசார் தரம்மிக்க சமூக சேவையினை வழங்கும் மாகாண சபைகள மற்றும் உள்ளூராட்சி முறையினை ஏற்படுத்தல்.

பணிக்கூற்று

- மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற முறையினை விருத்தி செய்வதற்கான கொள்கைகள் உட்பட சட்டங்களை வகுத்தல்.
- மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு அவற்றின் அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி சேவைகளை வழங்குவதற்காக அவற்றின் இயலுமைகளை மேம்படுத்தல்.
- மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற முறை மூலம் மக்களின் அபிலாசைகள் நிறைவேற்றப்படுவதை உறுதிப்படுத்தல்.
- மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் உட்பட ஏனைய நிறுவனங்களுடன் தொடர்புகளைப் பேணி சகலரினதும் சுபீட்சத்திற்கான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளல்.

1.2. விடயப் பரப்பு மற்றும் செயற்பாடுகள்

2015.09.30 ஆம் திகதிய இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தல் மூலம் வெளியிடப்பட்ட புதிய அமைச்சுக்களின் விடயப் பரப்புக்கள் மற்றும் பணிகள் தொடர்பான அறிவித்தலுக்கமைய மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் விடயப்பரப்புக்கள் மற்றும் பணிகள் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டவாறு அமைகின்றன.

- மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவன விடயப்பரப்பு உட்பட உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகம் மற்றும் உள்நாட்டுக் கடன் அபிவிருத்தி நிதியம் ஆகிய நிறுவனங்களின் உரிய கொள்கைகள், வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் செயற்பாடுகளை வகுத்தலும் பின்னூட்டல்களை மேற்கொள்ளல் மற்றும் மதிப்பீடுகள்.

- மாகாண சபைகளுக்குரிய பணிகளை மேற்பார்வை செய்தல்.

- மாகாண சபைகளின் உறுப்பினர்கள், உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்குப் பயிற்சியளித்தல்.

- உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்குரிய அரச பணிகளை முன்னெடுத்தல்.

- பொதுவசதிகளை விருத்தி செய்வதற்காக உள்ளூராட்சி ஆளுகை நிறுவனங்களுக்குக் கடன் வசதிகளை வழங்குதல்.

- உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்கள், உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்குப் பயிற்சியளித்தல்.

- மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவன ஆளுகையின் சகல கோணங்கள் தொடர்பிலும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளல்.

- உள்ளூராட்சி நிருவாகம் தொடர்பான இலங்கை நிறுவகம் மற்றும் உள்நாட்டுக் கடன் அபிவிருத்தி நிறுவகம் ஆகிய நிறுவனங்களுக்குப் பொறுப்பளிக்கப்பட்டுள்ள ஏனைய சகல விடங்களுக்குரிய பணிகள்.

- மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் மேற்பார்வைப் பணிகளை மேற்கொள்ளல்.

1.3. கொள்கைகள் மற்றும் உபாயத் திட்டங்கள்

மாகாணங்களில் சுயமான உறுதியான செயற்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தி சமமின்மைகளைக் குறைத்து மற்றும் மொத்தத் தேசிய உற்பத்திக்கு மாகாணங்களிடமிருந்து கிடைக்கும் ஒத்துழைப்பினை விருத்தி செய்தல்.

உபாயத் திட்டங்கள் :

1. நல்லாட்ச்சி மூல அம்சங்களைப் பின்பற்றி அந்தந்த மாகாணங்களில் காணப்படும் மானிட மூலதனம் மற்றும் சூழல் வளத்தை வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்தி சகல மாகாணங்களுக்கும் வருமானத்தை ஈட்டும் இயலுமைகளை விருத்தி செய்தல்.

2. குடியேற்ற விகிதாசாரங்களுக்கிணைவாக உயரிய மட்டத்தில் காணப்படும் மாகாணங்களில் அம்மட்டத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்காக மிகுந்த பொருத்தமான கொள்கைகள் மற்றும் நீண்டகால வேலைத்திட்டங்களை வகுத்தலும் அறிமுகப்படுத்தலும்.

3. நாட்டின் மொத்த சமூகப் பொருளாதார அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளுக்கு பங்களிப்பு வழங்குவதற்காக அவ்வவ் மாகாணங்களில் காணப்படும் மானிட வளப் பயன்பாட்டினை உறுதிப்படுத்தல்.

4. கீழ் மட்டத்திலிருந்து சமூக அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளுக்காக சமூகப் பங்கேற்பினை விருத்தி செய்தல் மூலம் மாகாணங்களில் காணப்படும் வளங்களை நேரடிப் பயன்பாடு மற்றும் கிராமிய சமூகத்தின் இயலுமைகள் மற்றும் திறமைகளை வலுப்படுத்தல்.

5. ஒவ்வொரு மாகாணங்களிலும் காணப்படும் இயற்கை வளங்களை நிலையான செயற்பாட்டிற்கமையப் பயன்படுத்துவதினை உறுதிப்படுத்துவதுடன் அனர்த்த அபாயங்களைக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் அனர்த்தங்களை எதிர்கொள்வதற்கான செயற்பாடுகளை பிரதேச மட்டத்தில் அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளுடன் கூட்டிணைத்தல்.

6. மானிட வள விருத்தி மற்றும் விஞ்ஞான அடிப்படைக்கமைய உள்ளூராட்சி மன்றங்களை மேம்படுத்துவதன் மூலம் பயன்மிக்க வினைத்திறன் கொண்ட மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிருவாக முறையினை உறுதிப்படுத்தல்.

1.4. அமைச்சிற்குரிய பிரிவுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்

01. மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சரின் அலுவலகம்

2. நிருவாகப் பிரிவு

3. அமைச்சின் செயலாளர் அலுவலகம்

   i. உள்ளூராட்சி மன்ற மறுசீரமைப்பு அலகு

   ii. முறைப்பாடுகள் மற்றும் தகவல் அலகு

4. மாகாண சபைப் பிரிவு

5. உள்ளூராட்சி மன்றப் பிரிவு

6. அபிவிருத்திப் பிரிவு

7. செயற்திட்டம் மற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு

   i. செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு

   ii. திட்டமிடல் பிரிவு

   iii. தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு

9. சட்டப் பிரிவு

10. நிதிப் பிரிவு

11. செலவினக் கண்காணிப்புப் பிரிவு

12. உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு

13. தேசிய திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவ உதவி நிலையம்

   i. டெங்கு ஒழிப்புப் பிரிவு

14. ஊடகப் பிரிவு

15. உள்ளூராட்சி ஆளுகை இலங்கை நிறுவனம்

16. உள்நாட்டு கடன் அபிவிருத்தி நிதியம்

2

செயற்சாதனைச் சுருக்கம்

2.1. நிதிச் சுருக்கம்

அட்டவணை இலக்கம் 1 - நிதிச் சுருக்கம்

வேலைத்திட்டங்கள்	2017 இற்கான மதிப்பீடு (ரூபா)	2017.12.31 திகதியன்று செலவினம் (ரூபா)
மீண்டெழும் செலவினம்		
தனிநபர் சம்பளம் கொடுப்பனவு	133,550,000	125,649,199
ஏனைய மீண்டெழும் செலவினம்	1,766,363,000	301,323,583
மொத்தம்	**1,899,913,000**	**426,972,782**
மூலதனச் செலவினம்		
மூலதனச் சொத்துப் புணரமைப்புக்கள் மற்றும் அபிவிருத்திகள்	**39,400,000**	**35,803,590**
கட்டடம் மற்றும் நிர்மானிப்பு	33,300,000	30,948,003
இயந்திரம் மற்றும் இயந்திர உபகரணம்	800,000	99,498
வாகனம்	5,300,000	4,756,089
மூலதனச் சொத்துக்களைப் பொறுப்பேற்றல்	**46,500,000**	**46,455,428**
வாகனம்	42,000,000	42,000,000
மனைப் பொருட்கள் மற்றும் அலுவலக உபகணரங்கள்	2,860,000	2,836,958
இயந்திரம், கட்டடம் மற்றும் நிர்மானிப்பு	1,640,000	1,618,470
ஏனைய மூலதனச் செலவினம்	7,926,920,000	4,727,895,847
உள்நாட்டு உதவிபெறும் செயற்திட்டங்கள்	6,408,083,000	1,849,588,458
வெளிநாட்டு உதவிபெறும் செயற்திட்டங்கள	21,532,180,000	12,248,231,866
மொத்தம்	**35,867,183,000**	**18,825,716,171**
முழு மொத்தம்	**37,852,996,000**	**19,334,947,971**

மூலம் - நிதிப் பிரிவு

2017.12.31 ஆம் திகதியன்று அமைச்சின் மொத்த நிதி முன்னேற்றம் 45%

2.2. பௌதீக செயற்திறன்

2017 ஆம் ஆண்டு அமைச்சினால் 13 வெளிநாட்டு உதவி செயற்திட்டங்கள் மற்றும் 10 உள்நாட்டு உதவி அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் 8 செயற்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. இவ் அனைத்து வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் செயற்திட்டங்களுக்கான பௌதீக முன்னேற்றம் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இல	விபரம்	பௌதீக முன்னேற்றம் (மூ)
01	உள்நாட்டு உதவி மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் மற்றும் வேலைத்திட்டங்கள்	50
02	வெளிநாட்டு உதவி மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்	90
03	அமைச்சின் மொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்	70

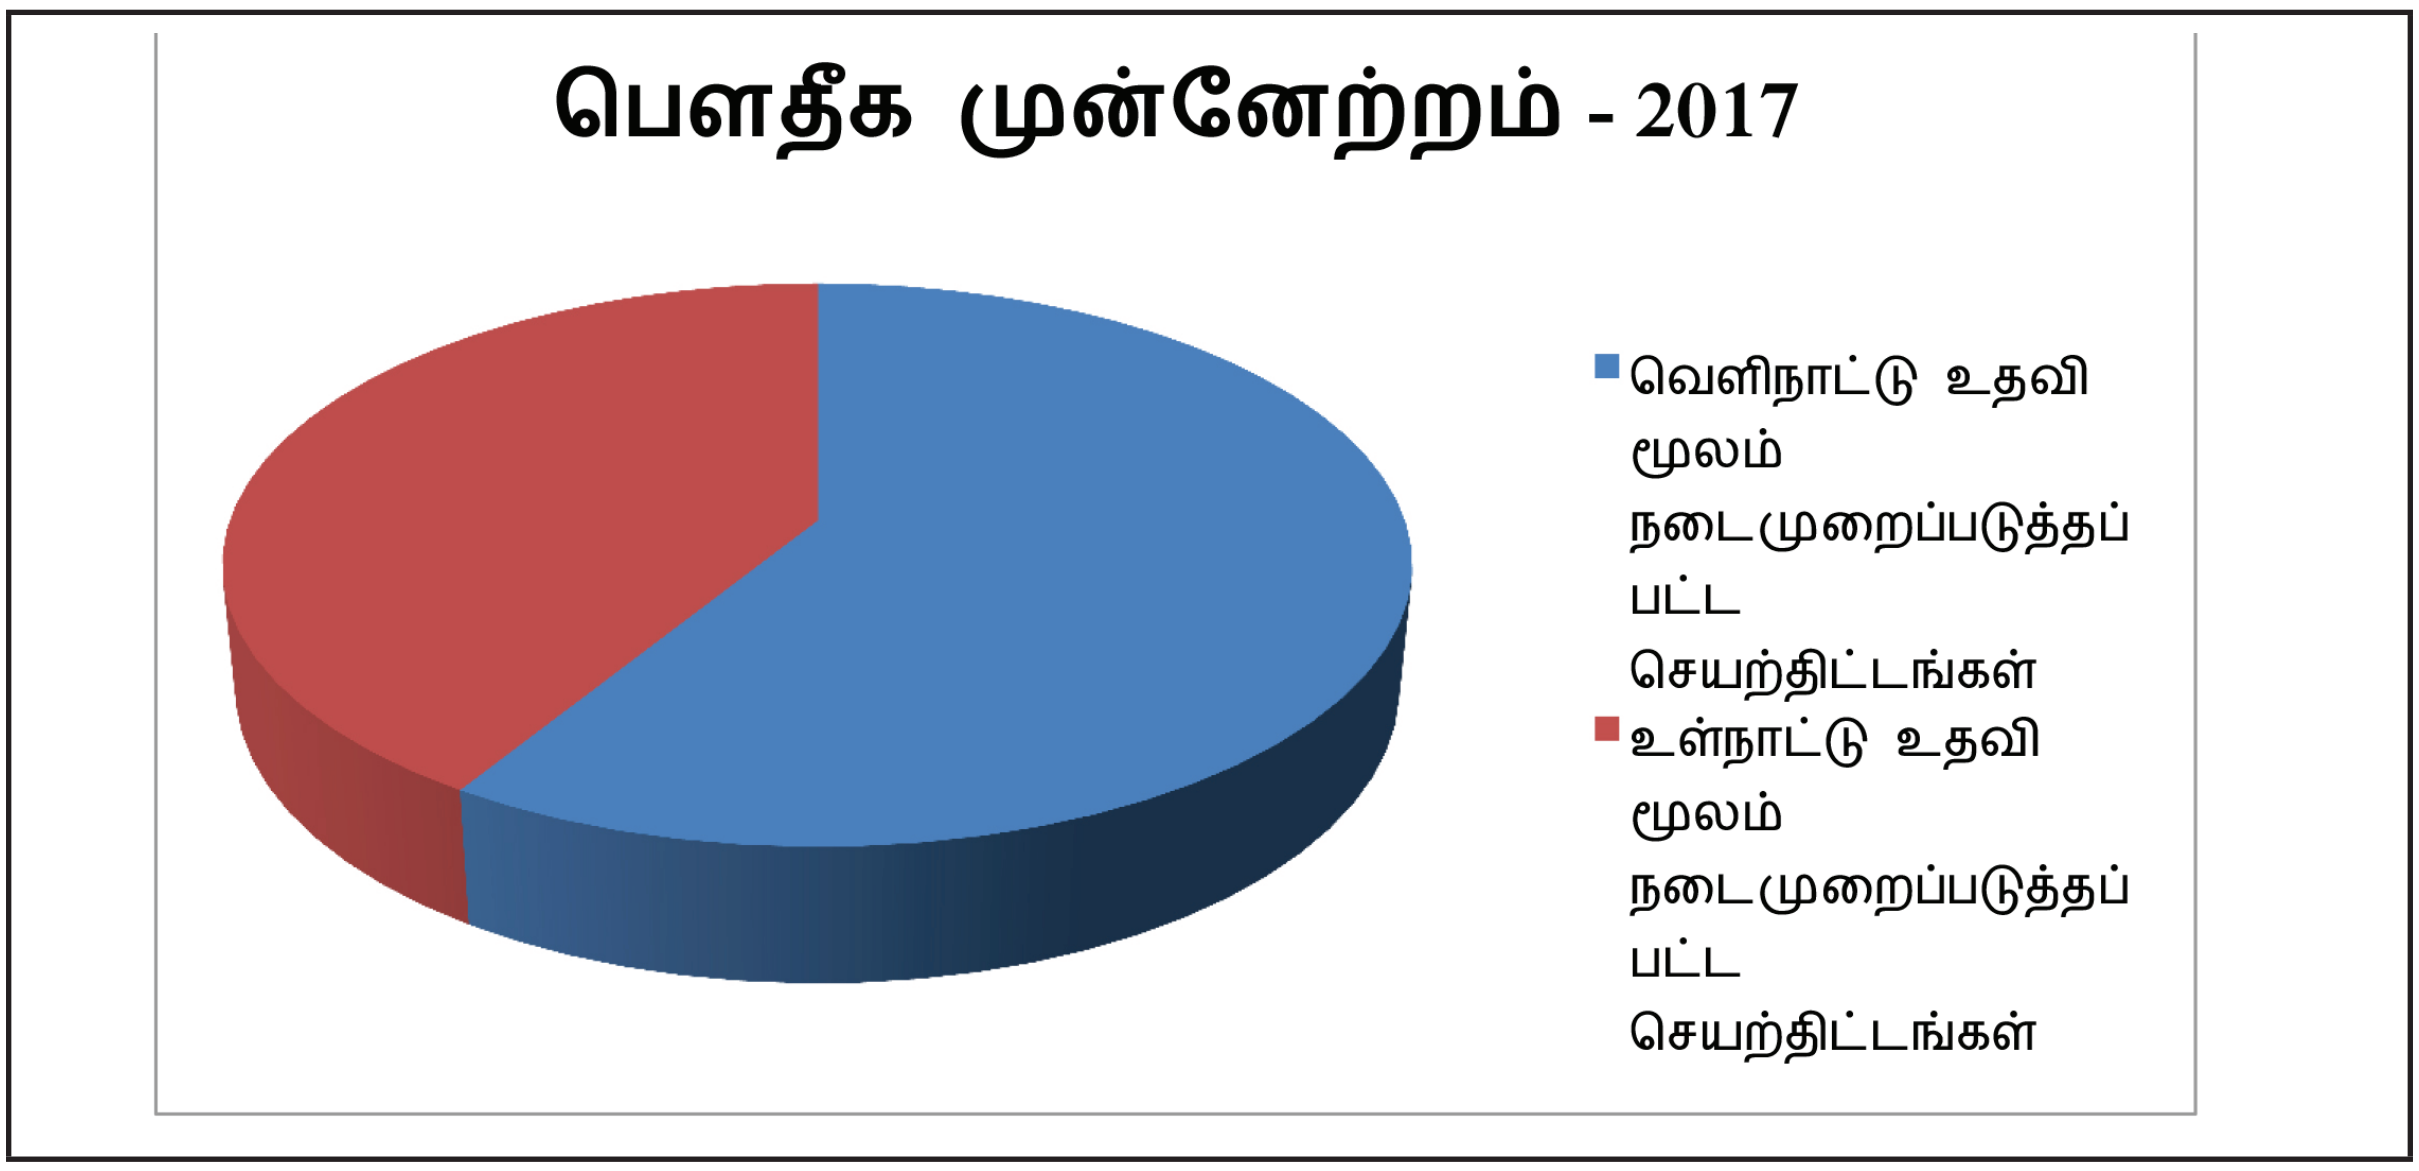

2.2. பௌதீக செயற்சாதனைச் சுருக்கம

அட்டவணை இலக்கம் 2 - பௌதீக செயற்சாதனை

	அபிவிருத்திப் பணிகள் / துறைகள்	பணி நிறைவு
மாகாண சபை / கிராமிய வீதி மற்றும் பாலம் அபிவிருத்தி		
01	அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட மாகாண வீதிகளின் தூரத்தின் அளவு	10 கி.மீ
02	நிர்மானிக்கப்பட்ட மற்றும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட கிராமிய வீதிகளின் எண்ணிக்கை (தார், கொங்கிரிட், கிறவல்)	1590
	கிராமிய வீதியின் கீழ் நிர்மானிக்கப்பட்ட பாலங்கள் / கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை	7
	கிராமிய வீதியின் கீழ் நிர்மானிக்கப்பட்ட கட்டுமானங்களின் எண்ணிக்கை	11
03	நிர்மானிக்கப்பட்ட கிராமியப் பாலங்களின் எண்ணிக்கை	349
நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி (இரணைமடு - கிளிநொச்சி)		
01	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பிரதான கால்வாய்த் தொகுதிகளின் தூரத்தின் அளவு	30 கி.மீ
02	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஏனைய கால்வாய்த் தொகுதிகளைக் கொண்ட வீதிகளின் தூரத்தின் அளவு	466 கி.மீ
03	கால்வாய்த் தொகுதிகள் ஊடாக நிர்மானிக்கப்பட்ட பாலம் / வாய்க்கால்களின் எண்ணிக்கை	15
04	இரணைமடு நீர்தேக்கத்தின் பிரதான அணைக்கட்டை உயர்த்தி நிர்மானித்தல் மற்றும் புணரமைப்புப் பணிகள்	100மூ பணிகள் பூர்த்தி
05	இரணைமடு நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவுகள் மற்றும் குளக்கட்டுமானப் புணரமைப்புக்கள்	
06	இரணைமடு நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் அலை பாதுகாப்பு அரண் (Rip Rap Protection) நிர்மானிப்பு	
07	இரணைமடு உத்சான நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தைப் புணரமைத்தல்	
கழிவு நீர்த் தொகுதியினைப் புணரமைத்தல் (கொழும்பு மாநகர சபை அதிகாரப் பிரதேசம்)		
01	கடலுக்கு கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படும் பிரதான நான்கு குழாய் மார்க்கங்கள் (ரு1இ ரு3இ வு34இ வு36) புணரமைப்புக்கள்	100மூ
02	கழிவு நீர் வெளியேற்றும் குழாய்த் தொகுதிகள் பொருத்தி முடிக்கப்பட்ட தூரத்தின் அளவு (ஆ26)	1423 மீ

03	கழிவு நீர்த் தொகுதியினைச் சுத்தப்படுத்தல் மற்றும் கழிவு நீர் அகற்றும் தொகுதியின் நிலைமைகளை ஆய்விற்குட்படுத்தல் ஊஊஊவுஏ மூலம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட தூரத்தின் அளவு	125 கி.மீ
உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதி அபிவிருத்தி		
01	நிர்மானிக்கப்பட்ட / அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட வாராந்தச் சந்தைகளின் எண்ணிக்கை	96
02	நிர்மானிக்கப்பட்ட / அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட வர்த்தக மத்திய நிலைய எண்ணிக்கை	38
03	நிர்மானிக்கப்பட்ட / அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட சுற்றுலா கவர்ச்சிமிக்க இடங்களின் எண்ணிக்கை	17
04	நிர்மானிக்கப்பட்ட பஸ் தரிப்பிட நிலையம / வாகனம் நிறுத்தும் இடங்களின் எண்ணிக்கை	30
05	நிர்மானிக்கப்பட்ட நூலகங்களின் எண்ணிக்கை	53
06	நிர்மானிக்கப்பட்ட ஆயுள்வேத மற்றும் சுகாதார மத்திய நிலையங்களின் எண்ணிக்கை	11
07	நிர்மானிக்கப்பட்ட பொது வசதி மத்திய நிலையங்கள் மற்றும் பொது மலசல கூடங்களின் எண்ணிக்கை	106
08	நிர்மானிக்கப்பட்ட பகற்காப்பு மத்திய நிலையங்களின் எண்ணிக்கை	08
09	நிர்மானிக்கப்பட்ட பொதுக் கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை	07
10	நிர்மானிக்கப்பட்ட நீர் வழங்கும் செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	88
11	நிர்மானிக்கப்பட்ட மயானங்களின் எண்ணிக்கை	17
12	நிர்மானிக்கப்பட்ட பூங்கா / விளையாட்டு மைதானங்களின் எண்ணிக்கை	62
13	நிர்மானிக்கப்பட்ட கலாசார மத்திய நிலையங்களின் எண்ணிக்கை	11
14	நிர்மானிக்கப்பட்ட அலுவலகக் கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை	20
15	நிர்மானிக்கப்பட்ட கால்வாய்த் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை	53
16	தாபிக்கப்பட்ட மூல அலுவலகங்களின் எண்ணிக்கை	101
கல்வி உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி		
01	நிர்மானிக்கப்பட்ட பாடசாலை விஞ்ஞான ஆய்வுகூடக் கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை	135

02	நிர்மானிக்கப்பட்ட / புணரமைக்கப்பட்ட வலயக் கல்வி அலுவலகக் கட்டடங்களின் எண்ணிக்கை	27
03	நிர்மானிக்கப்பட்ட / புணரமைக்கப்பட்ட கோட்டக் கல்வி அலுவலகங்களின் எண்ணிக்கை	68
04	விசேட கல்வி பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களுக்காக பங்கேற்ற மாணவர் எண்ணிக்கை	11484
05	முறைசாரா கல்வி பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களில் பங்கேற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	12051
06	சுகாதாரம் மற்றும் போசாக்கு அபிவிருத்திக்கான வேலைத்திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்ட பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை	6837
07	சமூக நல்லிணக்க வேலைத்திட்டம் நடாத்தப்பட்ட பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை	6382
08	நடாத்தப்பட்ட ஏனைய பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	8785
சுகாதாரத் துறையின் அபிவிருத்திகள்		
01	கணணி புள்ளிவிபரத் தொகுதியினைப் பயன்படுத்தும் வைத்தியசாலைகளின் எண்ணிக்கை	196
02	வைத்தியசாலைகளில் அவசர வைத்தியப் பிரிவுகளைத் தாபித்தல் மற்றும் தற்போதுள்ள சிகிச்சைப் பிரிவுகளை அபிவிருத்தி செய்தல்	191
03	மகப்பேற்று மற்றும் சிறுவர் சிகிச்சைப் பிரிவினை அபிவிருத்தி செய்தல்	450
04	மக்களுக்காக அறிவுறுத்தும் வேலைத்திட்டங்களை நடாத்துதல்	9996
05	சுகாதார வாழ்க்கை முறை மத்திய நிலையத்தைத் தாபித்தல்	127
06	தர முகாமைத்துவப் பிரிவைத் தாபித்தல்	38
07	மருந்துக் களஞ்சியசாலையை புணரமைத்தல்	35
திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்தை முறைப்படுத்தல்.		
01	நிர்மானிக்கப்பட்ட சேதனப் பசளைப் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை	11
02	அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட சேதனப் பசளைப் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை	23

03	உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட பொப்கட் (டீழடி ஊயவ) இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை	09
04	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட மனை சேதனப் பசளை பொதிகளின் எண்ணிக்கை	4000
05	உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட கழி பவுசர்களின் எண்ணிக்கை	09
06	உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்காக விநியோகிக்கப்பட்ட ஜப்பான் தொழில்நுட்ப சேதனப் பசளை இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கை	09
07	நிர்மானிக்கப்பட்ட கழிவகற்றல் மீள் சுழற்சி மத்திய நிலையங்களின் எண்ணிக்கை	04
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற சட்ட முறைமையினை மீள் கட்டமைத்தல்		
01	உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்காக மகளிர் பிரதிநிதித்துவத்தை 25ூ தினால் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் உரிய சட்டத்தை பாராளுமன்றத்தில் அங்கீகரித்தல்	பூர்த்தி
02	மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்காக ஒழுக்கவிழுமிய முறைமை (Code of Conducts) வகுத்தல்	பூர்த்தி
03	நகர சபை, மாநகர சபை மற்றும் பிரதேச சபைகளுக்கான கட்டளைச் சட்டங்களை மறுசீரமைப்பதற்காக குழுவை நியமித்து அதன்மூலம் உரிய மறுசீரமைப்புகளுக்காக சமகால யோசனைகளை மற்றும் அறிக்கைகளை வகுத்தல்.	பூர்த்தி
04	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனத் தேர்தல் கட்டளைச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல்	பூர்த்தி
05	மாகாண சபைச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல்	பூர்த்தி
06	தோட்டத் தொழிலாளர்களின் நலன்புரிக்காக பிரதேச சபைச் சட்டத்தை மறுசீரமைக்க உரிய செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்தல்	99% பூர்த்தி
07	நீதிமன்ற தண்டப்பணம் மற்றும் காணி வழங்குவதற்கமைய அறவிடப்படும் முத்திரைக் கட்டணம் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு கிடைப்பதை முறைப்படுத்தல் மற்றும் துரிதப்படுத்துவதற்காக மாகாண சபைச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல்	80% பூர்த்தி
தேசிய எல்லை நிர்னயக் குழுவின் பணிகள்		

01	தேசிய எல்லை நிர்னயத்தை நிர்னயிக்கும் குழுவின் அறிக்கையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமாணி அறிவித்தலுக்கமைய வட்டார எல்லைகளின் உண்மைத் தன்மையைப் போன்று பொதுமக்களினால் வழங்கப்பட்ட முறைப்பாடுகள்/ யோசனைகள் / மேன்முறையீடுகளை ஆய்விற்குட்படுத்துவது தொடர்பில் நியமிக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற வட்டார எல்லை நிர்னய மேற்பார்வை விசாரனைக் குழுவின் பணிகளை பூர்த்தி செய்து இறுதி அறிக்கை கையளித்து இலக்கம் 2006.∶.44 மற்றும் 2017.02.17 ஆம் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தல் மூலம் வெளியிடப்பட்டது.	பூர்த்தியடைந்தது
	தேசிய எல்லை நிர்னயக் குழுவின் அறிக்கையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமாணி அறிவித்தலில் (1928/ 26) மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற வட்டார எல்லை நிர்னய மேன்முறையீட்டு விசாரனைக் குழுவின் அறிக்கையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமாணி அறிவித்தலில் (2006/ 44) காணப்பட்ட அச்சுக் கோளாறு, இலக்கணம், முற்றுப் புள்ளி இடல், வட்டார எல்லை, பெயர் மற்றும் இலக்கம் தொடர்பிலான குறைகள் குறித்து பல்வேறுபட்ட அமைப்புக்கள் உட்பட பிரதானமாக தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கோரிக்கையினைக் கருத்திற் கொண்டு அதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழுவினால் உரிய குழு அறிக்கை 2017.11.20 ஆம் திகதி கையளிக்கப்பட்டது.	பூர்த்தியடைந்தது
	அதற்குரியதாக அதிமேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதியின் கையொப்பதுடன் 2047/ 51 மற்றும் மாகாண சபை உட்பட உள்ளூராட்சி மன்ற கௌரவ அமைச்சரின் ஒப்பத்துடன் இலக்கம் 2047/ 52 என இரண்டு அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தல்கள் 2017.12.02 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டது.	பூர்த்தியடைந்தது
	உள்ளூராட்சி மன்ற வட்டார எல்லை நிர்னய மேன்முறையீட்டு விசாரனைக் குழுவினால் வெளியிடப்பட்ட இலக்கம் 2006.∶.44 கொண்ட வர்த்தமாணி அறிவித்தலில் இலக்கம் 2 கம்பஹா மாவட்டத்தில் இலக்கம் 16 மகர பிரதேச சபையின் இலக்கம் 34 கொண்ட கோட்டத்தின் கோட்ட நாமம் "அக்பார் டவுன்" எனக் காணப்பட்டதுடன், அது "என்டேரமுல்ல" என மறுசீரமைத்து அதற்குரிய குழு அறிக்கை 2017.12.23 ஆம் திகதி கையளிக்கப்பட்டது. இதற்குரியதாக இலக்கம் 2052.∶.34 இலக்கம் கொண்ட அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தல் 2018.01.05 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டது.	பூர்த்தியடைந்தது

அமைச்சின் மானிட வள அபிவிருத்தி		
01	வெளிநாட்டுக் கொள்ளளவு பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களுக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களின் எண்ணிக்கை	27
02	உள்நாட்டுக் கொள்ளளவு பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களுக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களின் எண்ணிக்கை	289
உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் மக்கள் பிரதிநிதிகள் / உத்தியோகத்தர்களுக்கான பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களை நடாத்துதல் (உள்ளூராட்சி மன்றம் தொடர்பான இலங்கை நிறுவகம்)		
01	உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் தொடர்பாக உயர் டிப்ளோமா பாடநெறி உட்பட நடாத்தப்பட்ட பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை (தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள், பணி நிருவாகிகள் உட்பட ஏனைய தொழில்நுட்பம் அல்லாத பணியாளர் சபை)	222
உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக சலுகை நிபந்தனைகளுக்கமைய கடன் வழங்குதல் (உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம்)		
01	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவங்களின் 22 அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட சலுகைக்கடன் அளவு	666 ரூபா. மில்லியன
02	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவங்களின் 13 அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டத்திற்காக விடுவிக்கப்பட்ட சலுகைக்கடன் அளவு	403 ரூபா. மில்லியன்

3

அமைச்சின் பிரிவுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் செயற்சாதனைகள

3.1. அபிவிருத்திப் பிரிவு

நோக்கம் :

உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் அதிகாரப் பிரதேசத்தில் வாழும் மக்களுக்கு பயன் வழங்கக்கூடிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்வதற்காக உள்நாட்டு வெளிநாட்டு நிதிக்கமைய அமைச்சினால் அமுல்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களைத் திட்டமிடல் மற்றும் செயற்படுத்துவதன் மூலம் மாகாணங்களுக் கிடையிலான முறன்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பங்களிப்புச் செய்தல்.

உபாயத் திட்டங்கள்

1. நாட்டின் மொத்த சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளுக்குப் பங்களிப்புச் செய்வதற்காக அவ்வவ் மாகாணங்களில் காணப்படும் மானிட வளப் பயன்பாட்டினை உறுதிப்படுத்தல்.

2. மானிட வள அபிவிருத்தி மற்றும் விஞ்ஞான அடிப்படைக்கமைய உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வினைத்திறன்மிக்க மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிருவாக முறையினை உறுதிப்படுத்தல்.

3. குடியேற்ற விகிதாசாரம் ஒப்பீட்டு அடிப்படையில் உயரிய மட்டத்தில் காணப்படும் மாகாணங்களில் அம்மட்டத்தை மட்டுப்படுத்துவதற்ககாக மிகவும் பொருத்தமான கொள்கைகள் மற்றும் நீண்ட கால வேலைத்திட்டங்களை வகுத்தல் உட்பட அறிமுகப்படுத்தல்.

4. அவ்வவ் மாகாணங்களில் காணப்படும் இயற்கை வளங்களின் நிலையான பயன்பாடு உறுதிப்படுத்தப்படுவதுடன் அனர்த்த அபாயங்களைக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் அனர்த்த நிலைமைகளை எதிர்கொள்ளும் செயற்பாடுகளை பிரதேச மட்டத்திலான அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளில் கூட்டிணைத்தல்.

5. கீழ் மட்டத்திலிருந்து சமூக அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளுக்காக சமூகப் பங்கேற்பினை விருத்தி செய்வதன் மூலம் மாகாணங்களில் காணப்படும் வளங்களின் நேரடிப் பயன்பாடுகள் மற்றும் கிராமிய சமூகத்தின் பெறுமதி மற்றும் இயலுமைகளை வலுவூட்டல்.

6. நல்லாட்சி மூல அம்சங்களைப் பின்பற்றுவது அவ்வவ் மாகாணங்களில் காணப்படும் மானிட மூலதனம் மற்றும் சூழல் வளங்களை வினைத்திறனுடன் பயன்படுத்தி சகல மாகாணங்களுக்கும் வருமானங்களை ஈட்டக்கூடிய இயலுமைகளை விருத்தி செய்தல்.

	நிதி (ரூபா. மில்)	விகிதாசாரம்
2017 ஆம் ஆண்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீகள்	12,069.00	100%
செலவினம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)	5,994.13	50%

3.1.1. உள்நாட்டு நிதிக்கமைய அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்

01. பிரதேச சபைகளைப் பலப்படுத்தும் தேசிய வேலைத்திட்டம் - 2017

கட்டம் 1 :

இக்கட்டத்தின் கீழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேச சபைக்காக ரூபா. 20 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகின்றது.

கட்டம் 2 :

இக்கட்டத்தின் கீழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேச சபைக்காக ரூபா 10 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்படுகின்றது.

நோக்கம்

நகரமயமாக்கலுடன் மாற்றமடைந்து செல்லும் பொது மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் சுயமாக ஈட்டப்படும் வருமான மட்டம் ஈட்டப்படுவதைப் போன்று அந்நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படும் பொது மக்கள் சேவையின் பண்புசார் தரம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில் உரிய அதிகாரப் பிரதேசங்களில் அத்தியாவசிய சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை முறையாகப் பேணல் ∴ புணரமைத்தல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்	சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளைப் பராமரித்தல், பழுது பார்த்தல், புணரமைத்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல்.
அமுல்படுத்தும் பிரதேசம்	கட்டம் 1 - ரூபா 10 மில்லியனை விடக் குறைந்த வருடாந்த சுமயாக ஈட்டப்பட்ட வருமானம் கொண்ட 53 பிரதேச சபைகள் கட்டம் 2 - ரூபா. 10 மில்லியன் தொடக்கம் 20 வரை (ரூபா. 20 மில்லியனை விடக் குறைந்த) வருடாந்த சுயமாக உழைக்கும் வருமானத்தைக் கொண்ட 72 பிரதேச சபைகள்

2017 ஆம் ஆண்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீடு	1446.00 ரூபா. மில்லியன்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்ட பெறுமதி (ரூபா)	1218.98 ரூபா. மில்லியன்
செலவினம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)	113.61 ரூபா. மில்லியன்

பிரதேச சபைகளைப் பலப்படுத்தும் வேலைத்திட்டங்கள் - 2017
அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)

தொடர். இல	மாகாணம்	நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை	செயற்திட்ட எண்ணிக்கை	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி (ரூபா)
1	வடமேல் மாகாணம்	6	41	12	75,559,799.65
2	வடமத்திய மாகாணம்	16	46	35	248,889,122.55
3	மேல் மாகாணம்	4	35	21	53,671,172.51
4	தென் மாகாணம்	12	61	40	126,259,878.68
5	மத்திய மாகாணம்	9	37	29	104,001,281.90
6	ஊவா மாகாணம்	15	89	57	120,203,395.41
7	கிழக்கு மாகாணம்	17	71	51	238,378,227.42
8	சப்ரகமுவ மாகாணம்	12	70	51	116,472,611.89
9	வட மாகாணம்	7	26	15	135,546,026.99
	மொத்தம்	**98**	**476**	311	**1,218,981,517.00**

இவ் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் செயற்திட்டங்களை அமுல்படுத்தும் பிரதான துறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டவாறு அமைகின்றன.

- சமூக நீர் செயற்திட்டங்களை அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.
- சந்தையின் வசதிகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.
- சுற்றுலா கவர்ச்சி மிக்க இடங்களை அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.
- பொதுச் சுத்திகரிப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.
- உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவன அதிகாரப் பிரதேசங்களில் இனங்காணப்படும் ஏனைய பராமரிப்பு மற்றும் புணரமைப்புப் பணிகள்

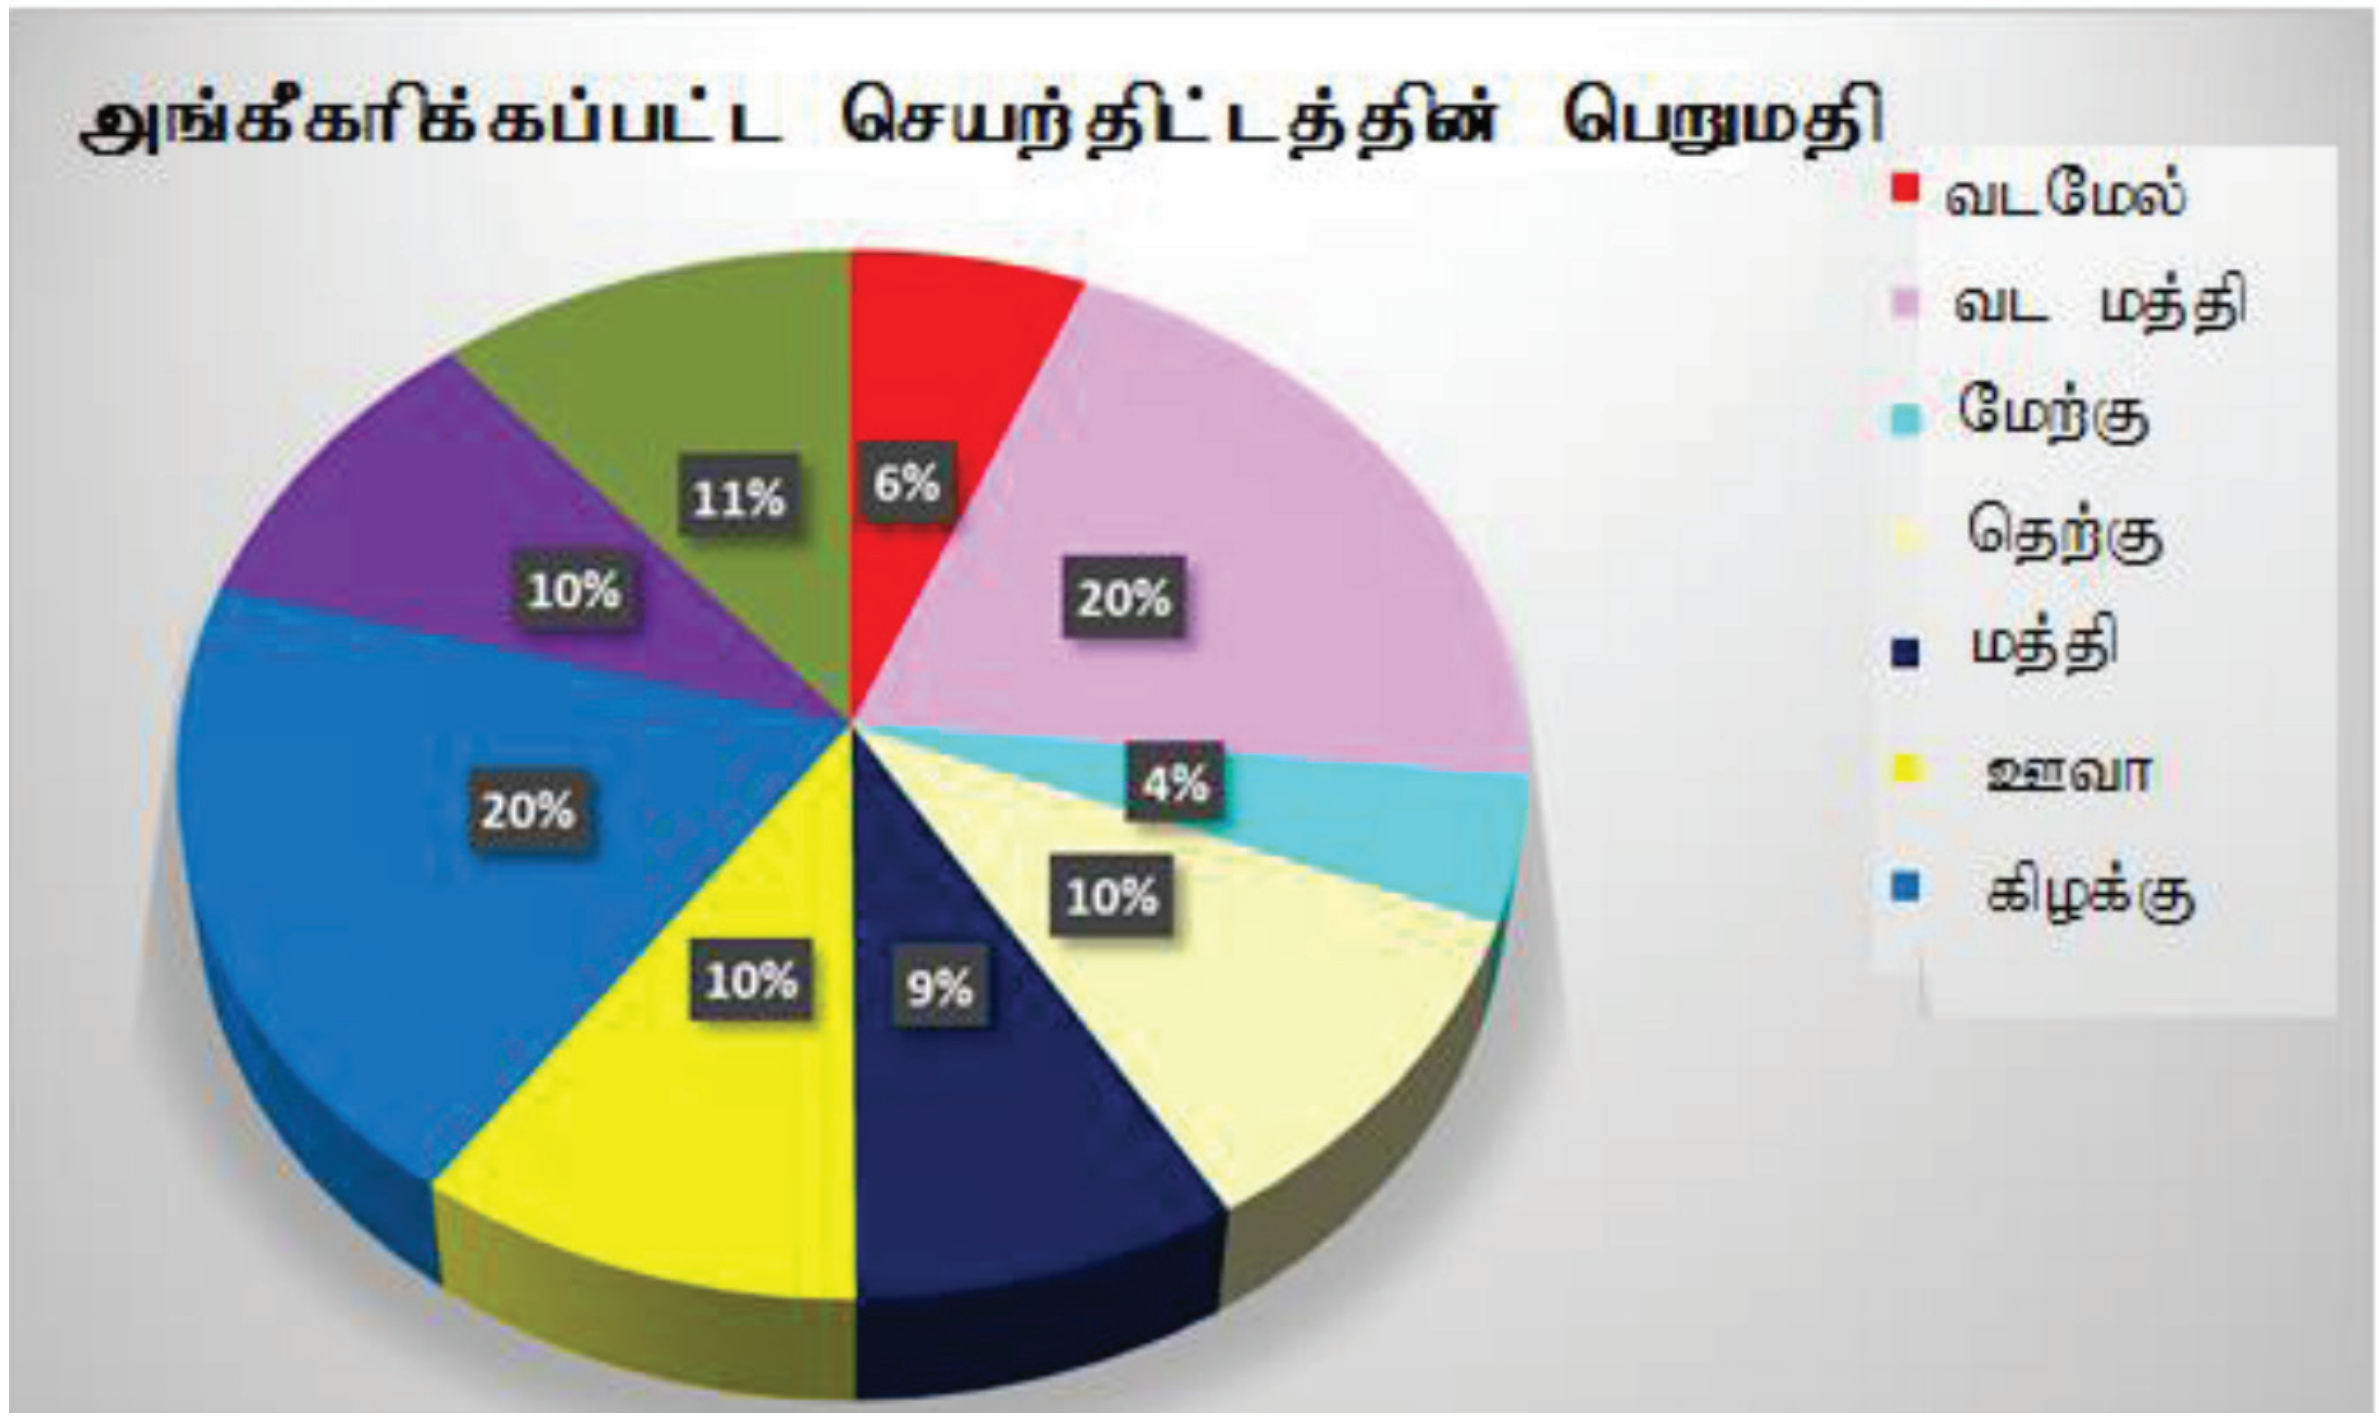
அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டத்தின் பெறுமதி
வடமேல்
வட மத்தி
மேற்கு
தெற்கு
மத்தி
ஊவா
கிழக்கு
6%
20%
4%
10%
9%
10%
20%
10%
11%

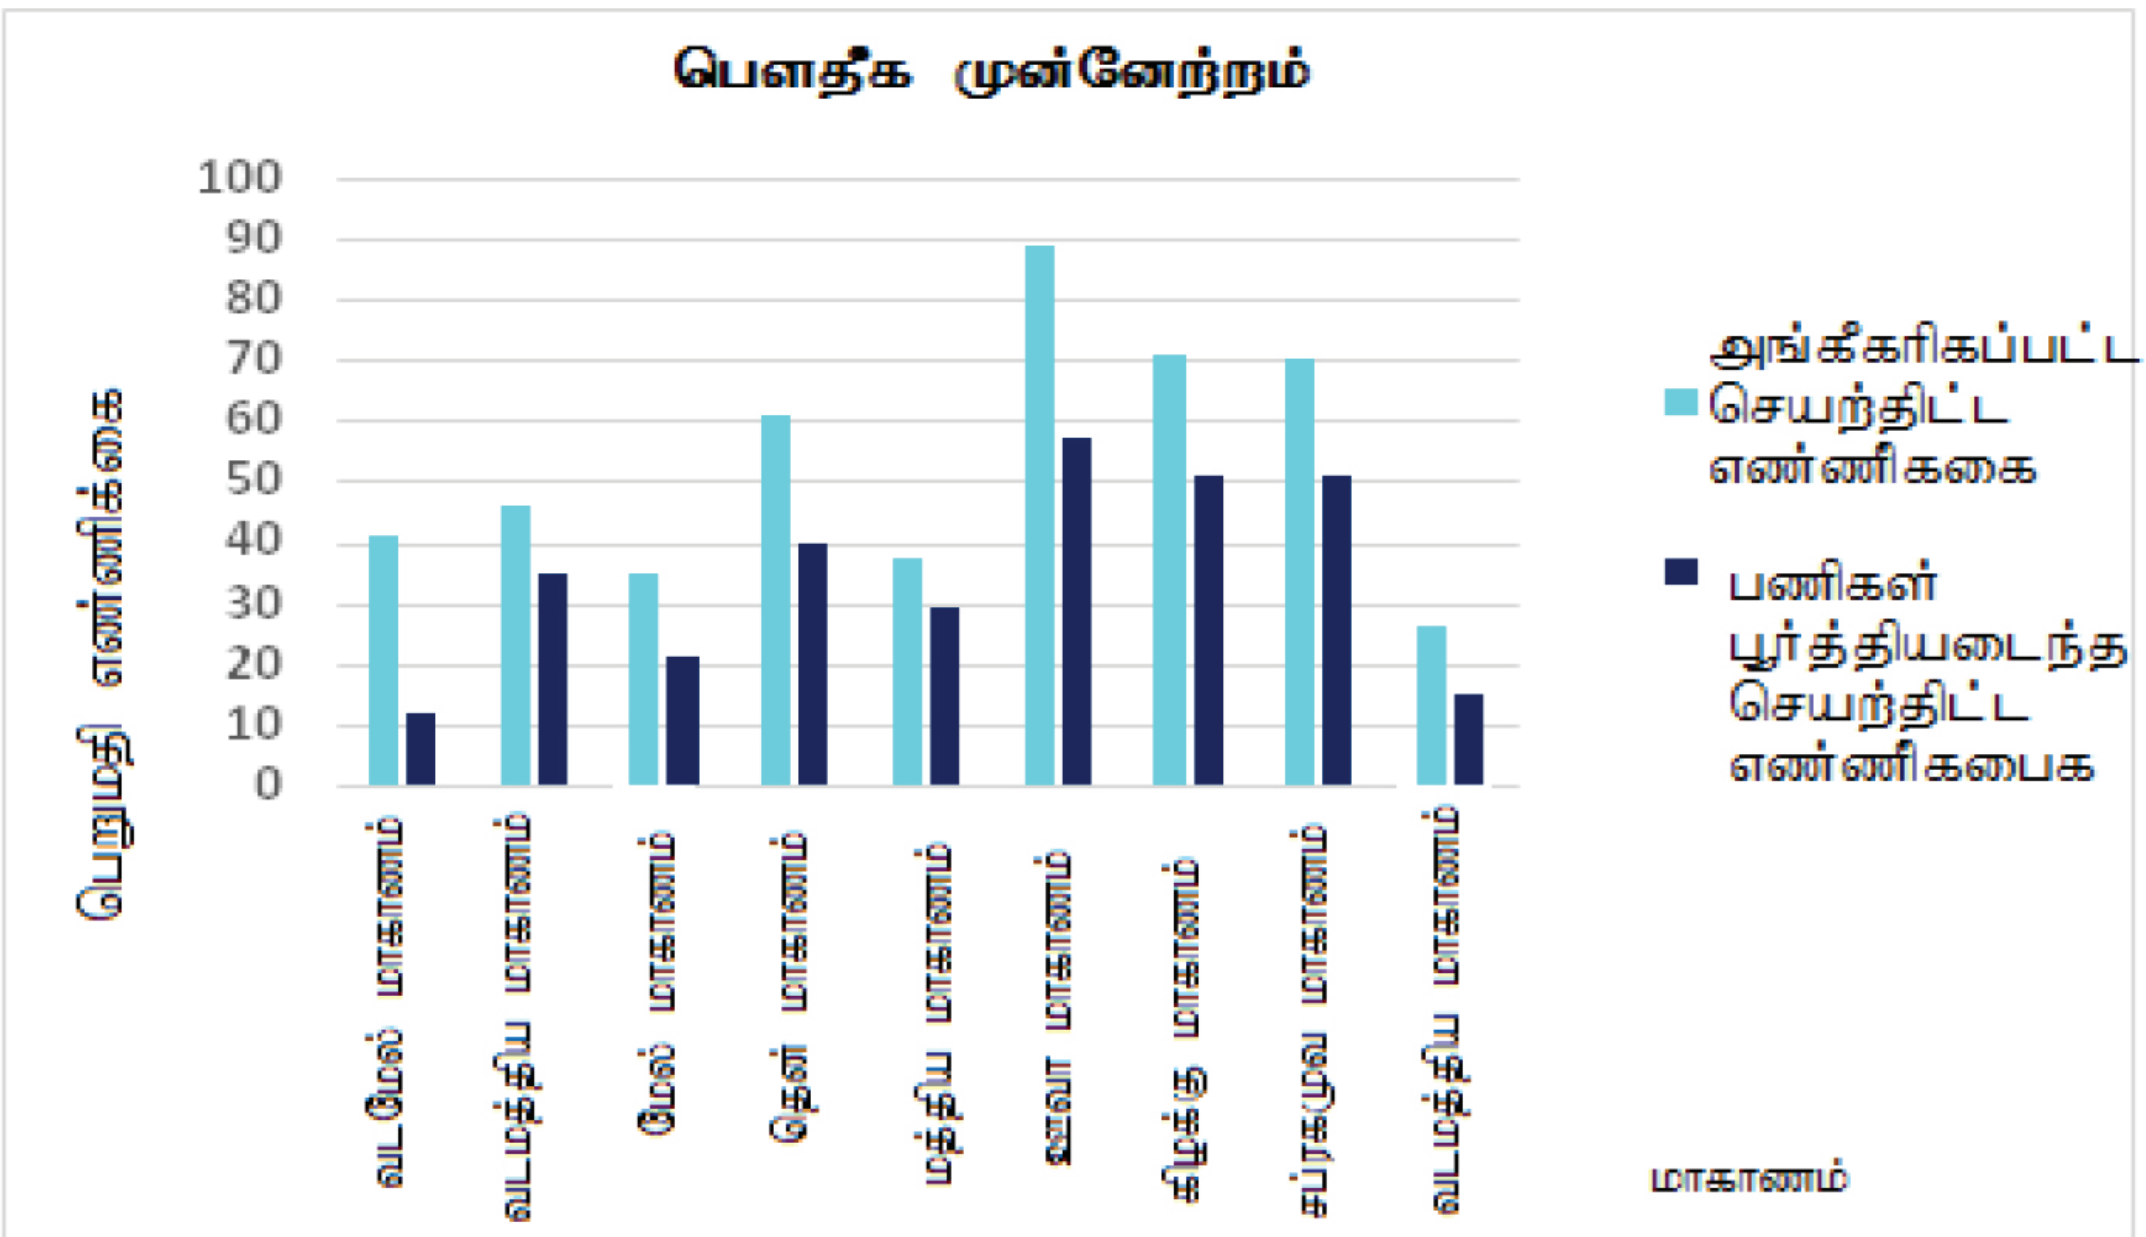
பௌதீக முன்னேற்றம்
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
பெறுமதி எண்ணிக்கை
வடமேல் மாகாணம்
வடமத்திய மாகாணம்
மேல் மாகாணம்
தென் மாகாணம்
மத்திய மாகாணம்
ஊவா மாகாணம்
கிழக்கு மாகாணம்
சப்ரகமுவ மாகாணம்
வடமத்திய மாகாணம்
மாகாணம்
அங்கீகரிகப்பட்ட செயற்திட்ட எண்ணிககை
பணிகள் பூர்த்தியடைந்த செயற்திட்ட எண்ணிகைபக

பதவிய பிரதேச சபைக் கட்டட நிர்மானிப்பு

அமுல்படுத்தும் பிரதேசங்கள்	சகல உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் அதிகாரப் பிரதேசங்கள் (மாநகர சபை, நகர சபை மற்றும் பிரதேச சபைகள்)

22. உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான மூலதன வேலைத்திட்டங்கள் - 2017

நோக்கம்

நகரமயமாக்கலுடன் மாற்றமடைந்து செல்லும் சமூகத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் சுயமாக ஈட்டப்படும் வருமான மட்டத்தை விருத்தி செய்வதற்கும் அதேபோன்று இந்நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படும் பொது மக்கள் சேவைகளின் பண்புசார் தரம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்தக்கூடிய வகையில் அந்நிறுவன அதிகாரப் பிரதேசங்களில் அத்தியாவசிய சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை புதிதாக நிர்மானித்தல் மற்றும் காணப்படும் வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.

இவ் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்படும் பிரதான துறைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டவாறு அமைகின்றன.

- சமூக நீர் வழங்கல் செயற்திட்டங்களை அமுல்படுத்தல்
- சந்தை வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.
- சுற்றுலா கவர்ச்சிமிக்க இடங்களை அபிவிருத்தி செய்தல்.

2017 ஆம் ஆண்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீடு	1350.00 ரூபா. மில்லியன்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டத்தின் பெறுமதி	937.12 ரூபா. மில்லியன்
செலவினம்	734.86 ரூபா. மில்லியன்

புதிய சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் மூலதன வேலைத்திட்டங்கள் - 2017

அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)

தொடர் இல	மாகாணம்	உள்ளூ ராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் பெறுமதி (ரூபா)
1	வடமேல் மாகாணம்	7	16	13	57,586,330.31
2	வடமத்திய மாகாணம்	6	41	5	111,624,018.93
3	மேல் மாகாணம்	21	280	141	391,706,910.92
4	தென் மாகாணம்	10	55	4	69,180,478.85
5	மத்திய மாகாணம்	10	116	85	63,828,850.01
6	ஊவா மாகாணம்	5	33	1	25,678,626.73
7	கிழக்கு மாகாணம்	9	25	14	104,189,410.87
8	சப்ரகமுவ மாகாணம்	12	106	70	68,671,811.68
9	வட மாகாணம்	10	22	16	44,659,187.50

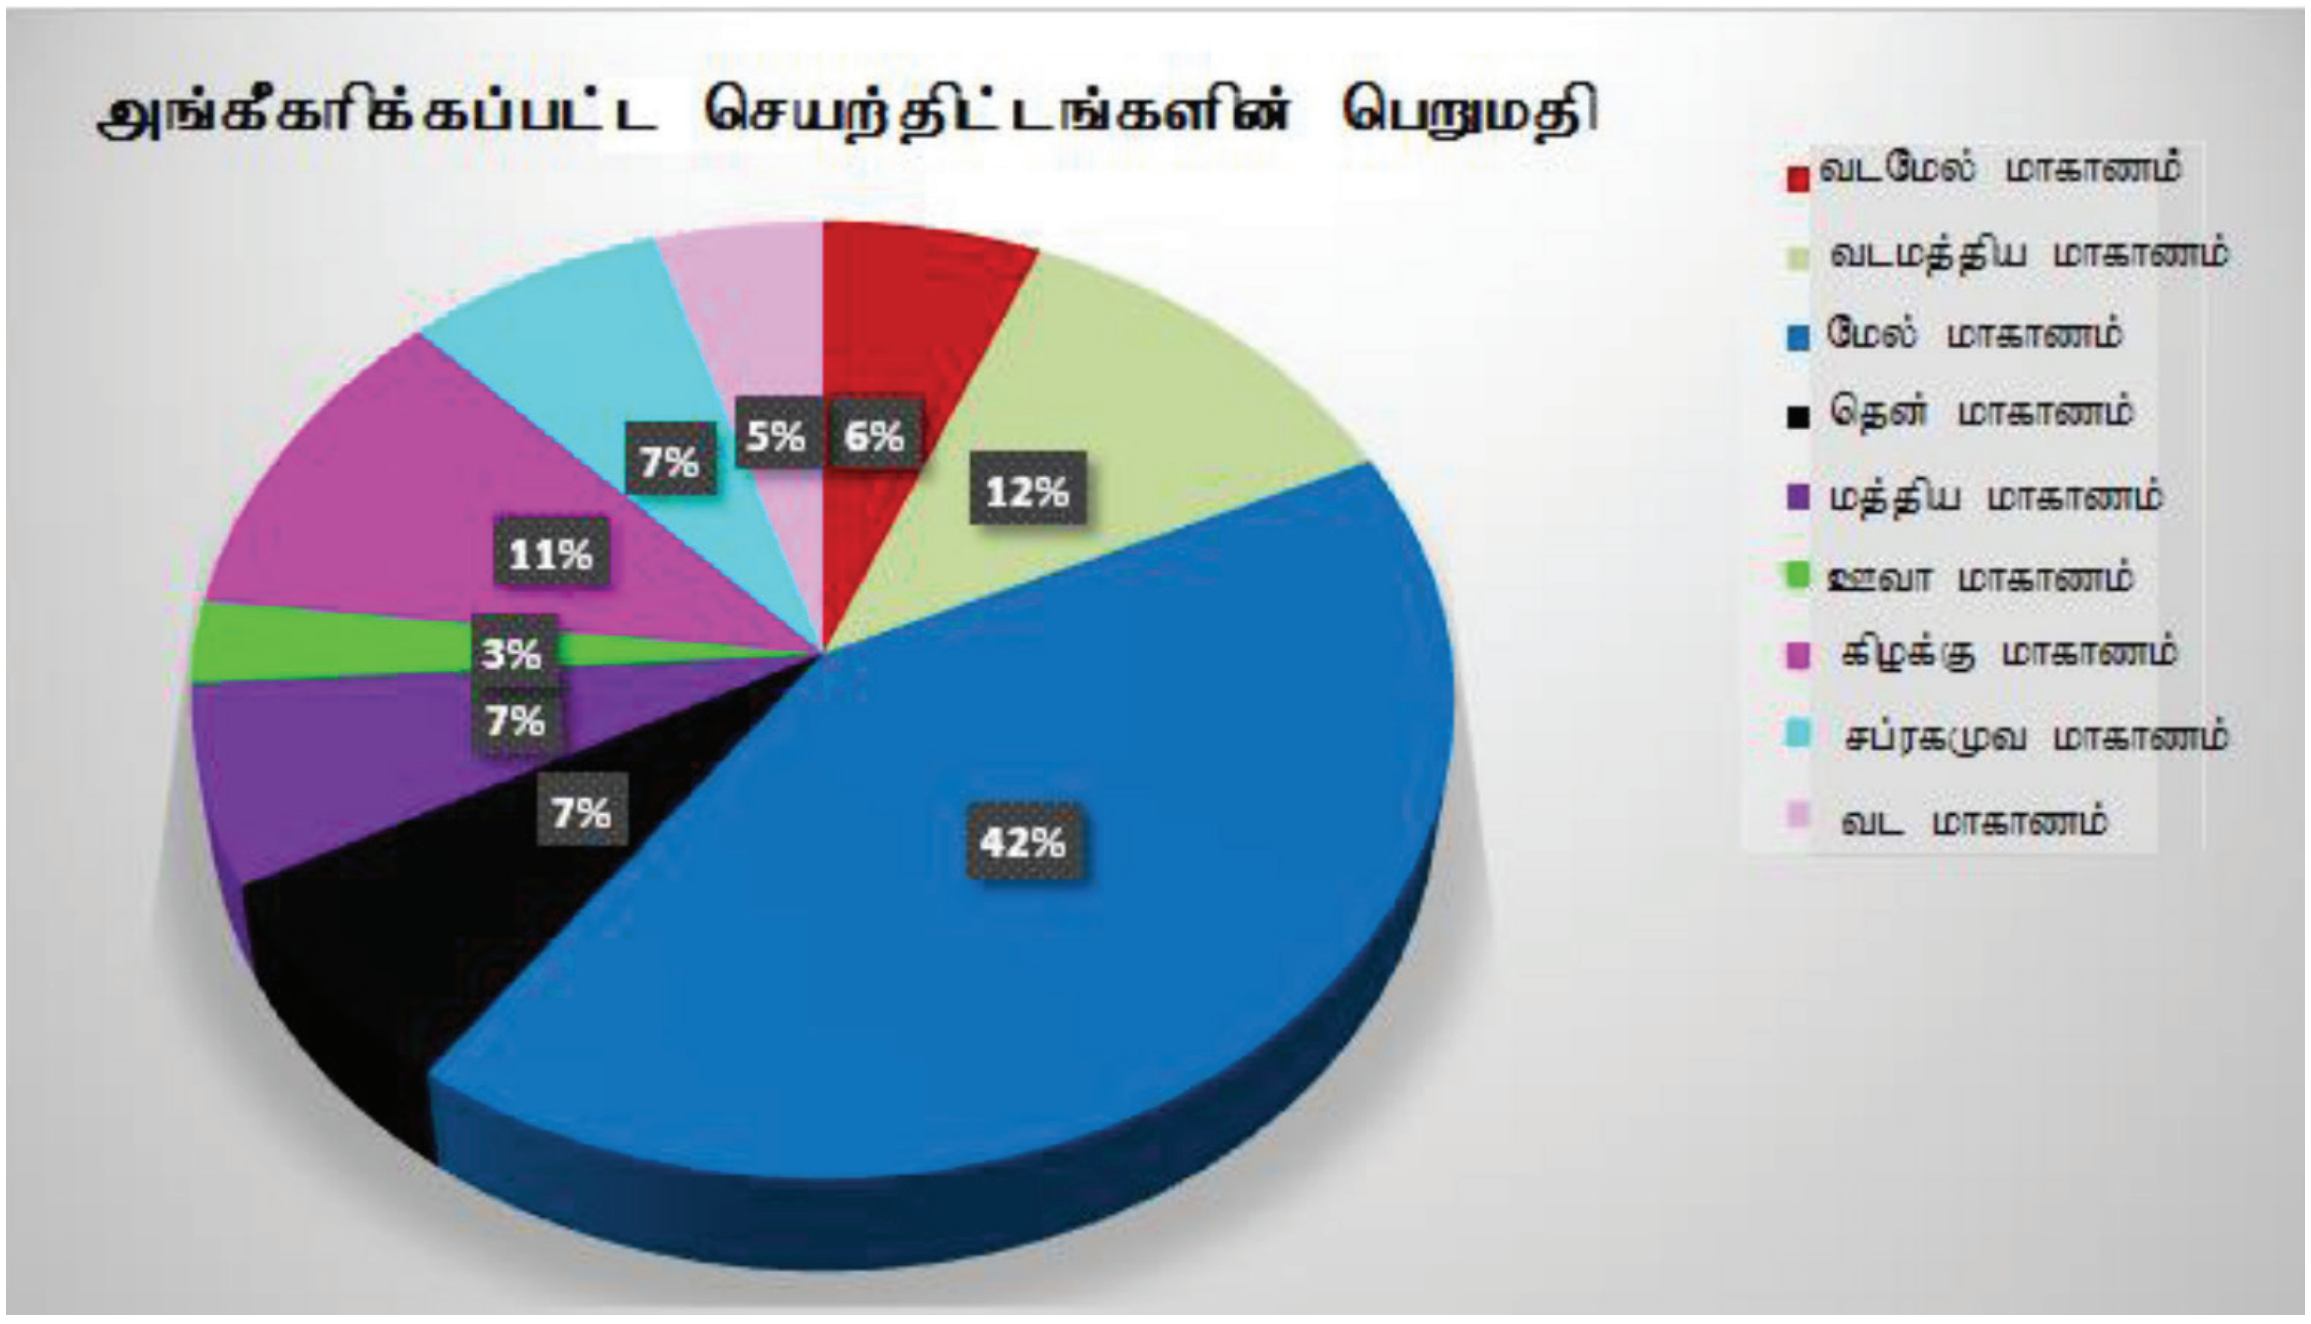

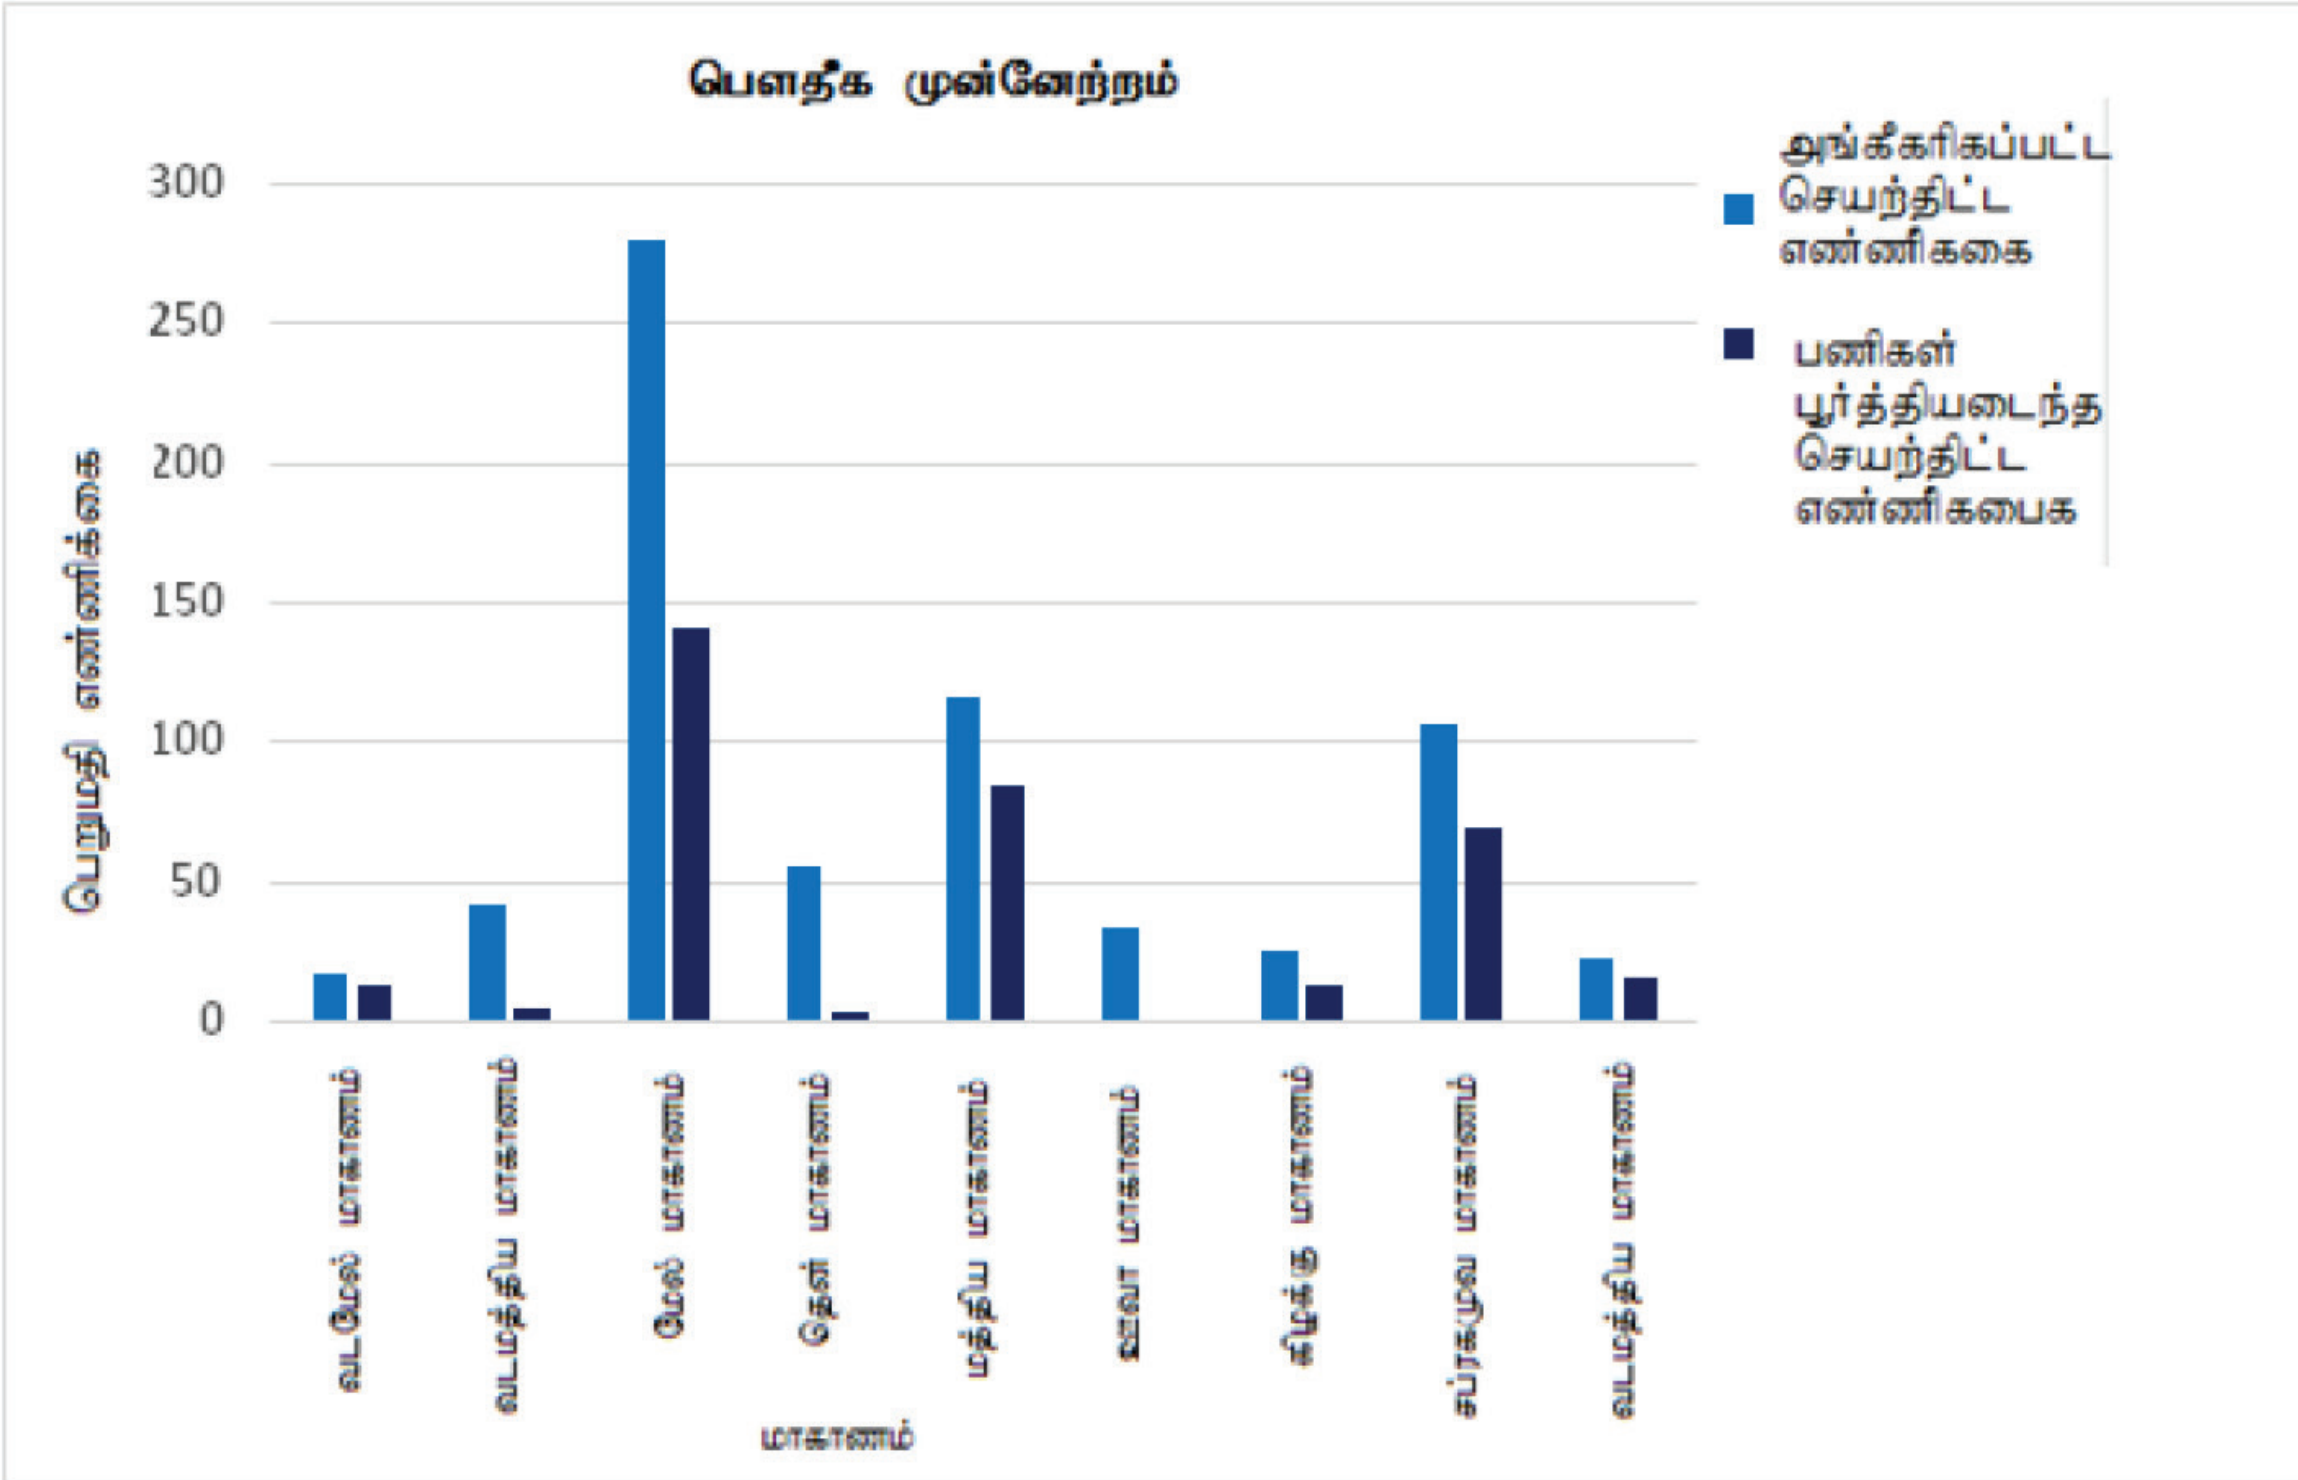

3. கிராமிய பிரதேச வீதிகள் 1000 கிலோ மீற்றர் அபிவிருத்தி செய்யும் வேலைத்திட்டம் - 2017

நோக்கம்

பொது மக்களின் போக்குவரத்து மற்றும் பிரயாணத் தேவைகளை வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்றுவதற்காக அத்தியாவசிய வீதி உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வகுப்பதன் மூலம் கிராமியப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தல் மற்றும் அதனூடாக நாட்டின் மொத்தப் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு நேரடியாகப் பங்களிப்புச் செய்வது இவ் வேலைத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாகும்.

நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய முறையான பொருளாதார அபிவிருத்தியுடன் கிராமியப் பொருளாதாரத்திலும் ஊக்கத்தை மேம்படுத்தி கிராமியப் பிரதேசங்களில் விவசாயக் கைத்தொழில் மற்றும் சிறிய, நடுத்தரளவு கைத்தொழில் சார்ந்த உற்பத்திகளின் அபிவிருத்தி தொடர்பில் பயன்மிக்கதாக அமைகின்றது. கிராமிய மக்களின் உற்பத்தி சந்தையை நோக்கி முன்னெடுத்தலும் அதற்காக முன்னேற்றகரமான கிராமிய வீதித் தொகுதி காணப்படுவதும் அத்தியாவசியமாகும். இதற்கமைய வீதி அபிவிருத்தி தொடர்பில் விசேட கவனம் செலுத்தும் செயற்பாடுகள் இவ் வேலைத்திட்டத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதன்மூலம் பொது மக்களின் போக்குவரத்துத் தேவையை வினைத்திறனுடன் நிறைவேற்றுவதற்கான இயலுமைகள் கிடைக்கின்றன.

பிரதான செயற்பாடுகள்	கிராமியப் பிரதேசங்களின் வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல்.
அமுல்படுத்தும் பிரதேசம்	சகல உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் அதிகாரப் பிரதேசங்கள் (மாநகர சபை, நகர சபை மற்றும் பிரதேச சபை)

2017 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள்	2025 ரூபா. மில்லியன்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி (ரூபா.)	
செலவினம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)	2088.00 ரூபா. மில்லியன்
	307.88 ரூபா. மில்லியன்

இதன் கீழ் வீதி அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய முறைகள்

- கொங்கிரிட் இடல்.
- இடைத் தொடர்பு சிறு கற்களைப் பதித்தல்.
- கற்களை பதிய வைத்து தார் இடல், காப்பட் இடல்.

கிராமிய பிரதேச வீதிகள் 1000 கிலோ மீற்றர் அபிவிருத்தி செய்யும் வேலைத்திட்டம் - 2017 (அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)

தொடர் இல	மாகாணம்	உள்ளூ ராட்சி மன்றி நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் எண்ணக்கை	பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட செயற் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் பெறுமதி (ரூபா)
1	வடமேல் மாகாணம்	24	110	110	248,897,904.35
2	வடமத்திய மாகாணம்	25	66	51	146,200,490.66
3	மேல் மாகாணம்	32	497	415	551,696,881.25
4	தென் மாகாணம்	33	188	170	304,956,911.57
5	மத்திய மாகாணம்	24	118	64	139,675,227.18
6	ஊவா மாகாணம்	12	121	112	116,551,090.65
7	கிழக்கு மாகாணம்	29	110	96	282,449,310.88
8	சப்ரகமுவ மாகாணம்	9	20	19	94,207,446.45
9	வட மாகாணம்	34	34	34	204,243,385.29
மொத்தம்		**222**	**1264**	**1071**	**2,088,878,648.28**

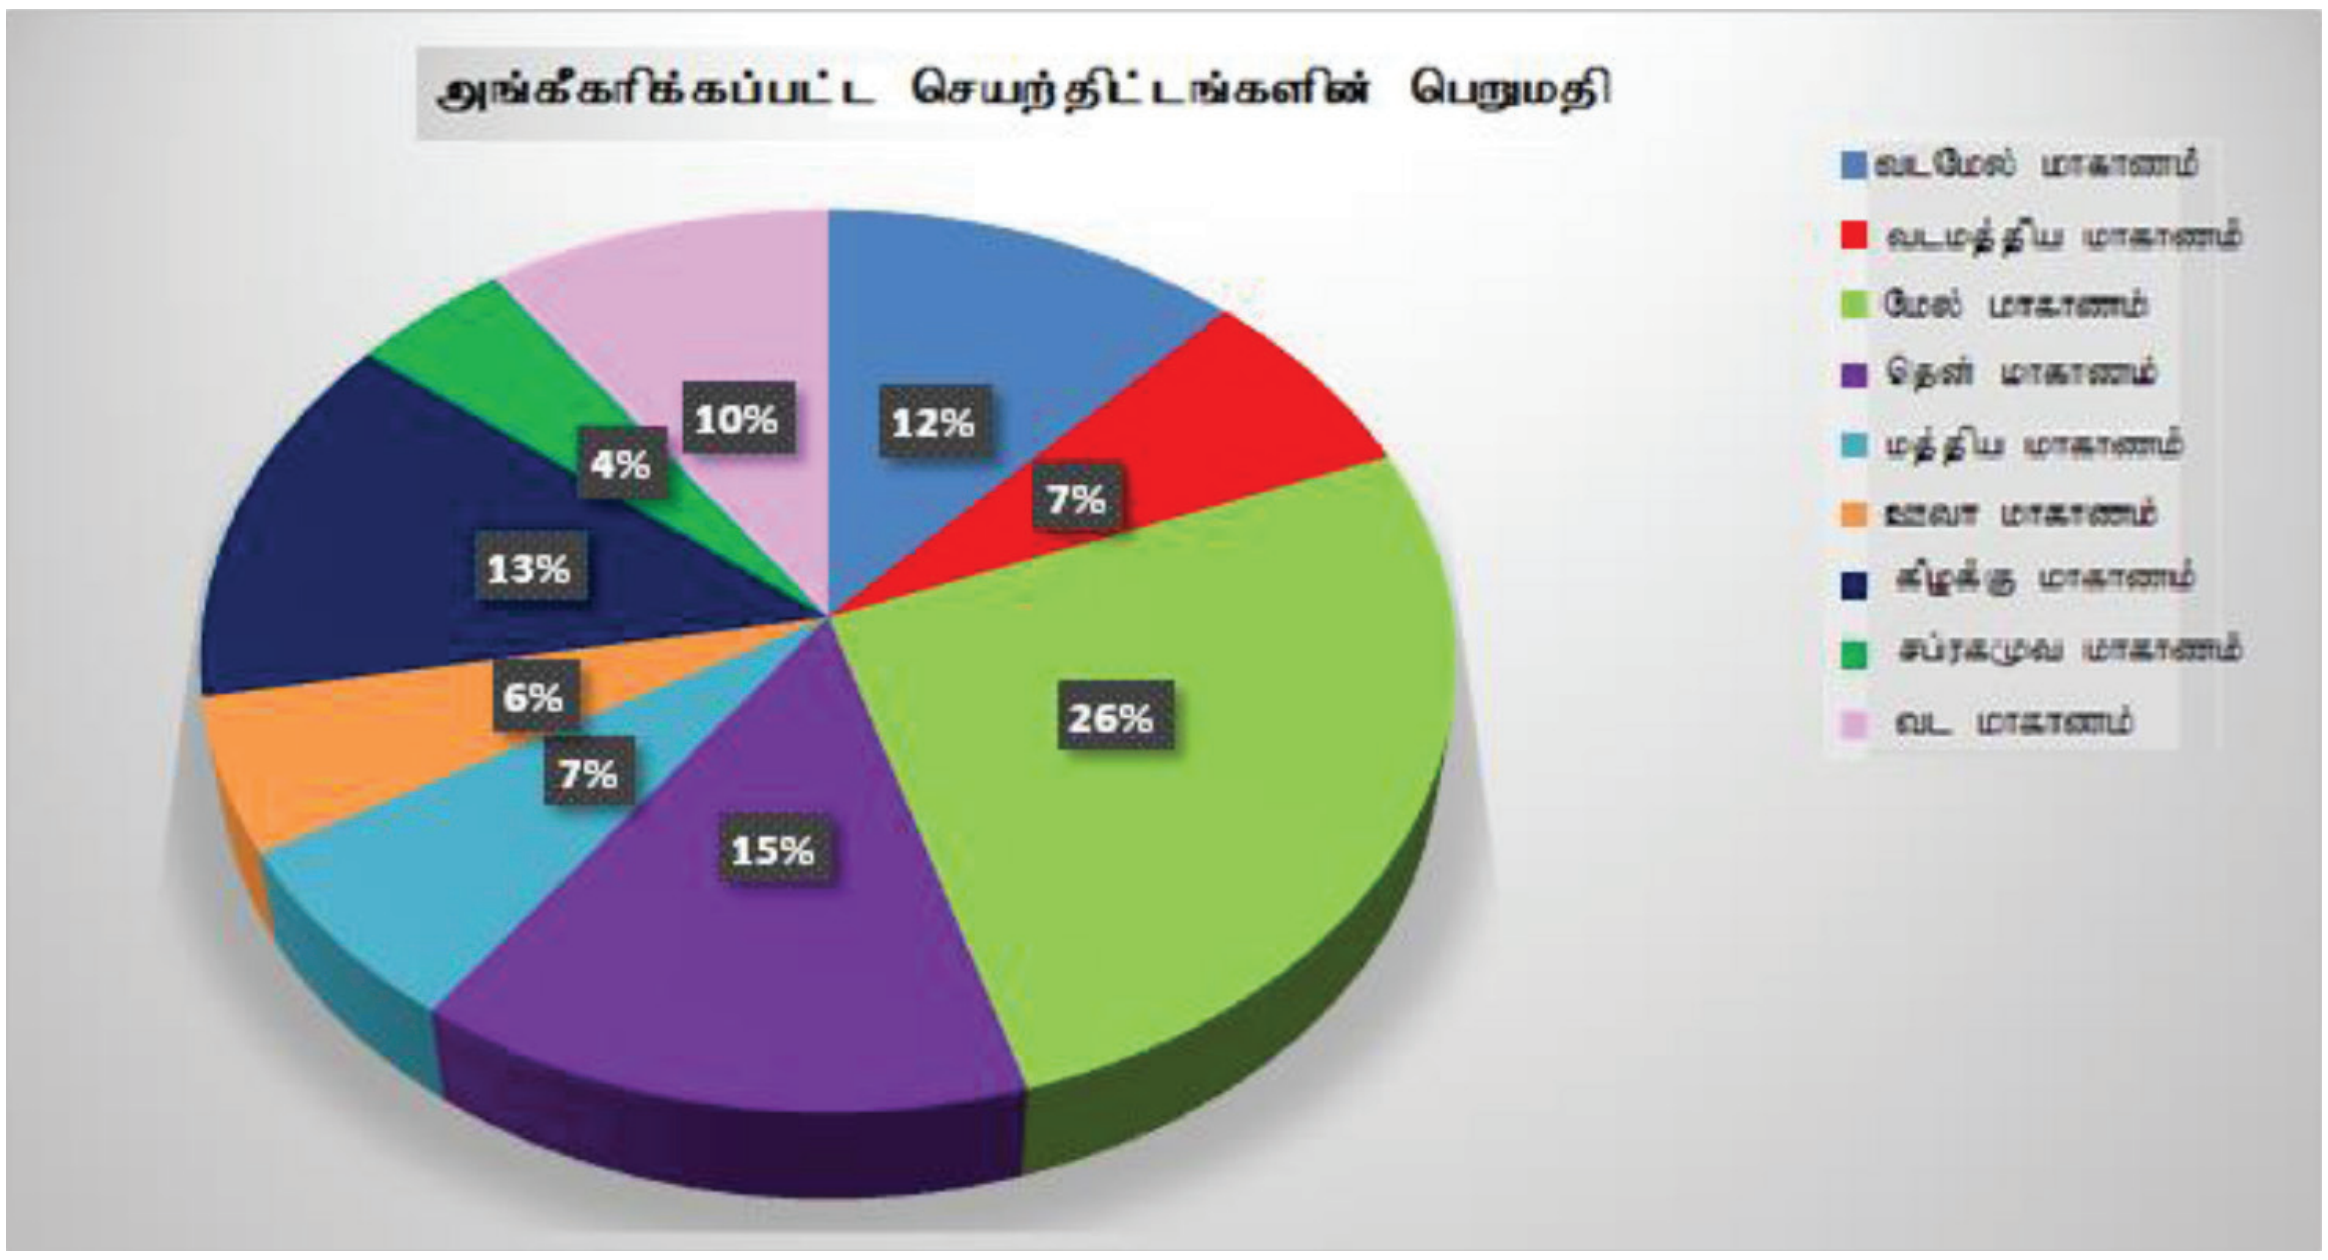
அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்களின் பெறுமதி
வடமேல் மாகாணம்
வடமத்திய மாகாணம்
மேல் மாகாணம்
தென் மாகாணம்
மத்திய மாகாணம்
ஊவா மாகாணம்
கிழக்கு மாகாணம்
சப்ரகமுவ மாகாணம்
வட மாகாணம்
12%
7%
26%
15%
7%
6%
13%
4%
10%

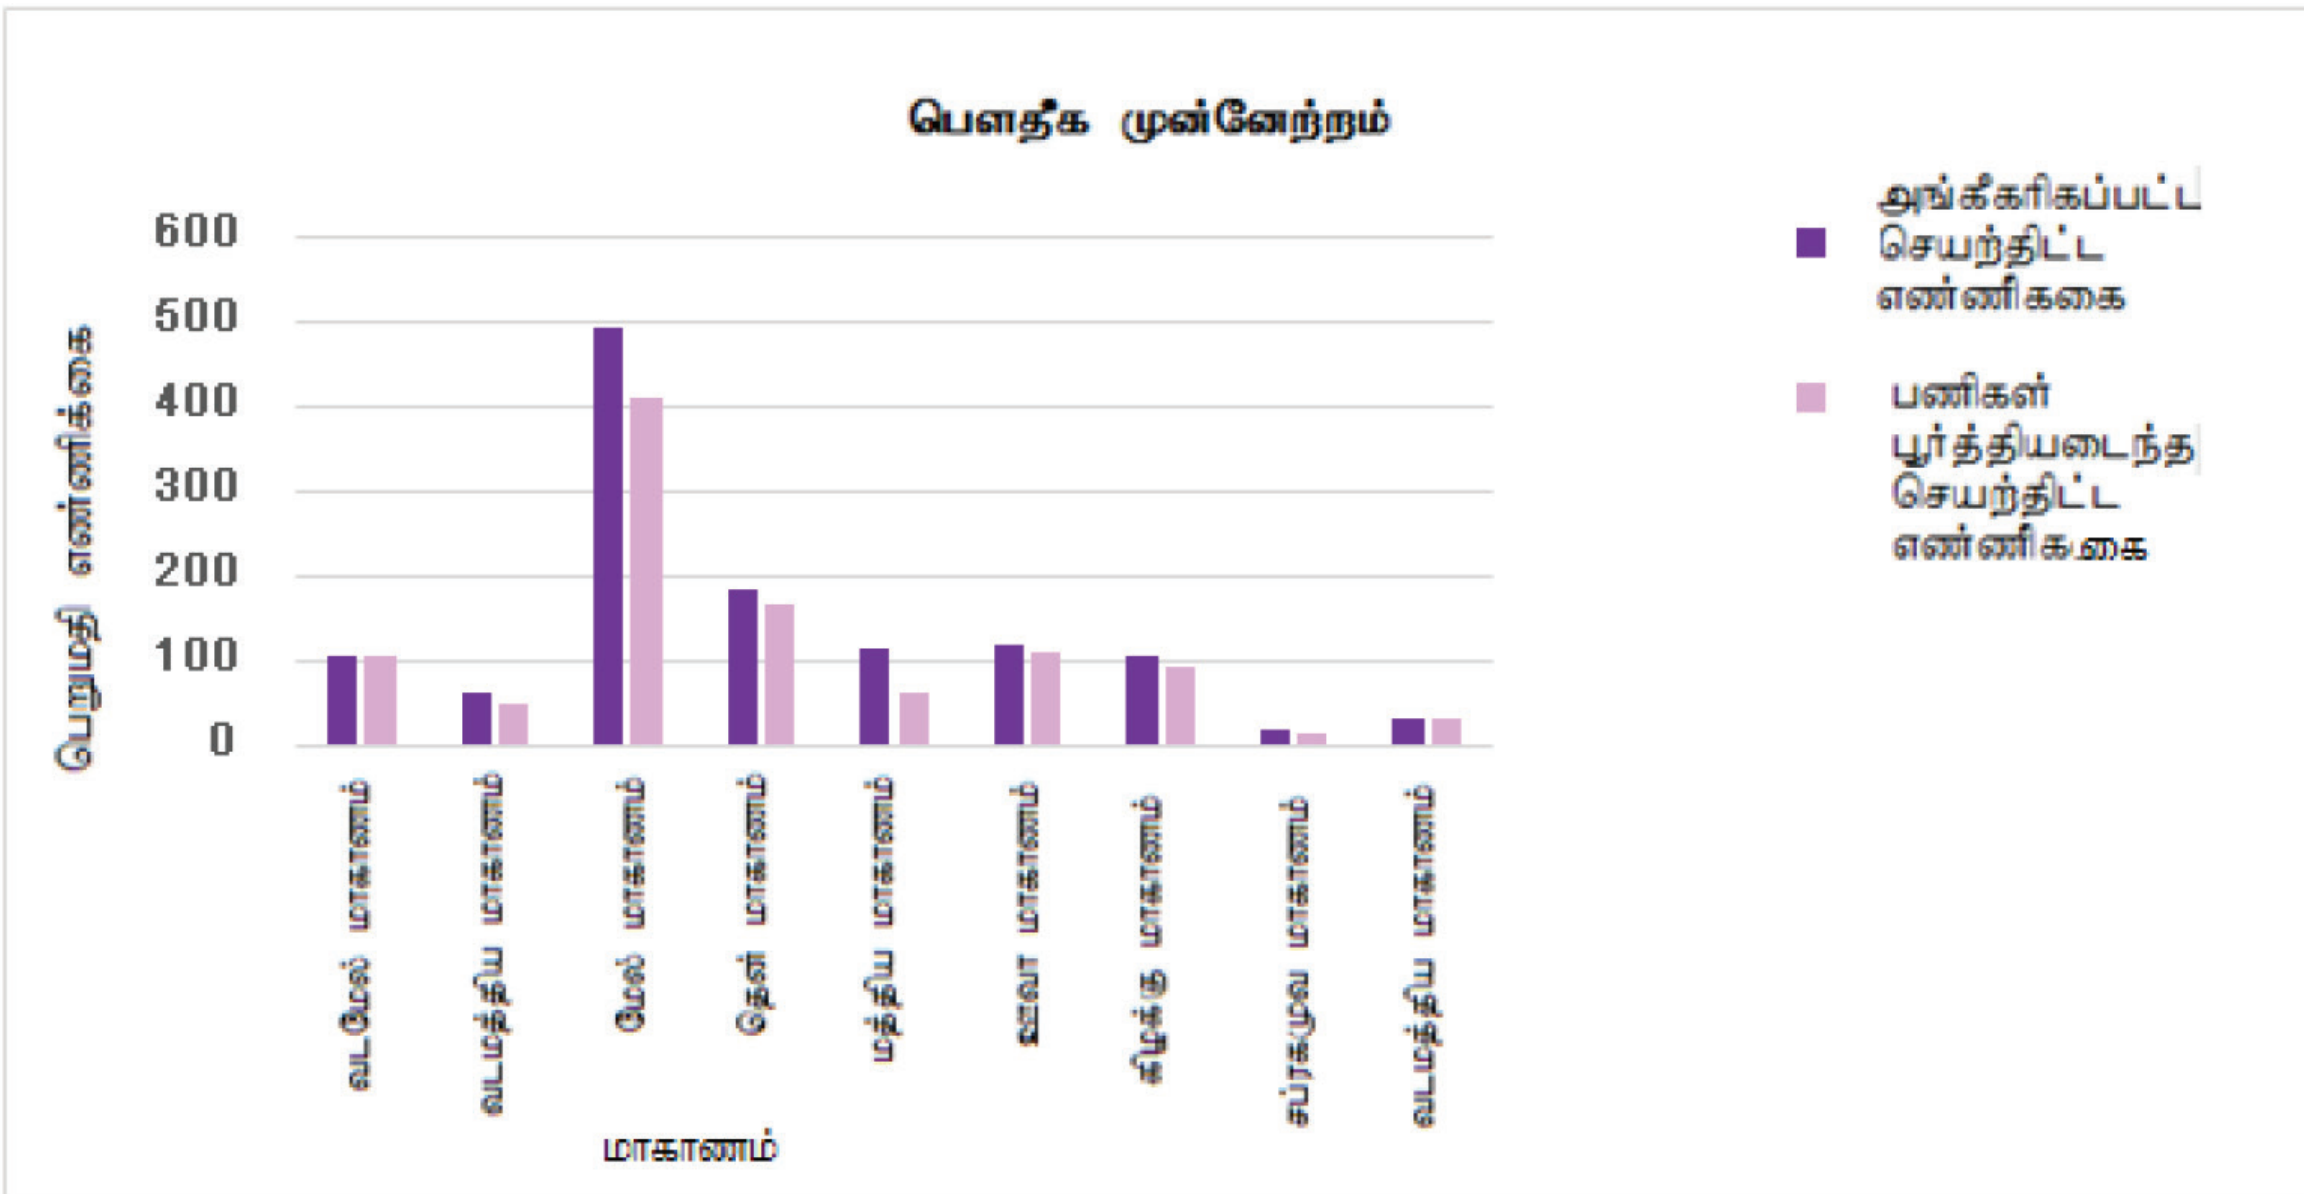
பௌதீக முன்னேற்றம்
600
500
400
300
200
100
0
பெறுமதி எண்ணிக்கை
வடமேல் மாகாணம்
வடமத்திய மாகாணம்
மேல் மாகாணம்
தென் மாகாணம்
மத்திய மாகாணம்
ஊவா மாகாணம்
கிழக்கு மாகாணம்
சப்ரகமுவ மாகாணம்
வடமத்திய மாகாணம்
மாகாணம்
அங்கீகரிகப்பட்ட செயற்திட்ட எண்ணிகை
பணிகள் பூர்த்தியடைந்த செயற்திட்ட எண்ணிகை

4. பின்னடைந்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக உதவும் வேலைத்திட்டம் - 2017

நோக்கம்

குறைந்த வருமானம் பெறும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் சுயமாக வருமானத்தை ஈட்டும் மட்டத்தை ஊக்குவித்தல் மற்றும் அதற்குரிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்வதற்குத் தேவையான உதவிகளை வழங்குவது இதன் அடிப்படை நோக்கமாகும்.

அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வருமானத்தை ஈட்டும் மாகாணங்கள் 13 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள்
2017 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு	90.00 ரூபா. மில்லியன்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி	101.29 ரூபா. மில்லியன்
செலவினம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)	7.26 ரூபா. மில்லியன்

இவ் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் அமுல்படுத்தப்படும் செயற்திட்டத் துறைகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டவாறு அமைகின்றன.

- சமூக நீர் வழங்கல் செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்தல்.
- வர்த்தக வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.
- சுற்றுலா கவர்ச்சிமிக்க இடங்களை அபிவிருத்தி செய்தல்.

உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் சுயமாக வருமானம் ஈட்டும் மட்டம் வரை விருத்தி செய்யக்கூடியவாறு அந் நிறுவன அதிகாரப் பிரதேசங்களில் குடிநீர் வழங்கல் செயற்திட்டங்கள், சந்தை வசதிகள் மற்றும் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பிரயாணிகள் உட்பட பக்தர்களுக்காகத் தேவையான பொது வசதிகளை தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு அபிவிருத்தி செய்வது இத்திட்டத்தின் கீழ் இடம்பெறுகின்றது.

பின்னடைந்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக உதவி வழங்கும் வேலைத்திட்டங்கள் - 2017

அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)

தொட இல	மாகாணம்	நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை	செயற்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி (ரூபா)
1	வடமேல் மாகாணம்	2	2	2	17,825,560.00
2	வடமத்திய மாகாணம்	3	3	3	25,331,132.89
3	மேல் மாகாணம்	1	1	1	10,800,000.00
4	தென் மாகாணம்	ெ	ெ	ெ	ெ
5	மத்திய மாகாணம்	1	1	1	1,685,000.00
6	ஊவா மாகாணம்	2	2	2	11,650,917.00
7	கிழக்கு மாகாணம்	2	2	2	21,921,322.25
8	சப்ரகமுவ மாகாணம்	1	1	1	7,083,043.91
9	வட மாகாணம்	1	1	1	5,000,000.00
	மொத்தம்	13	13	13	**101,296,976.05**

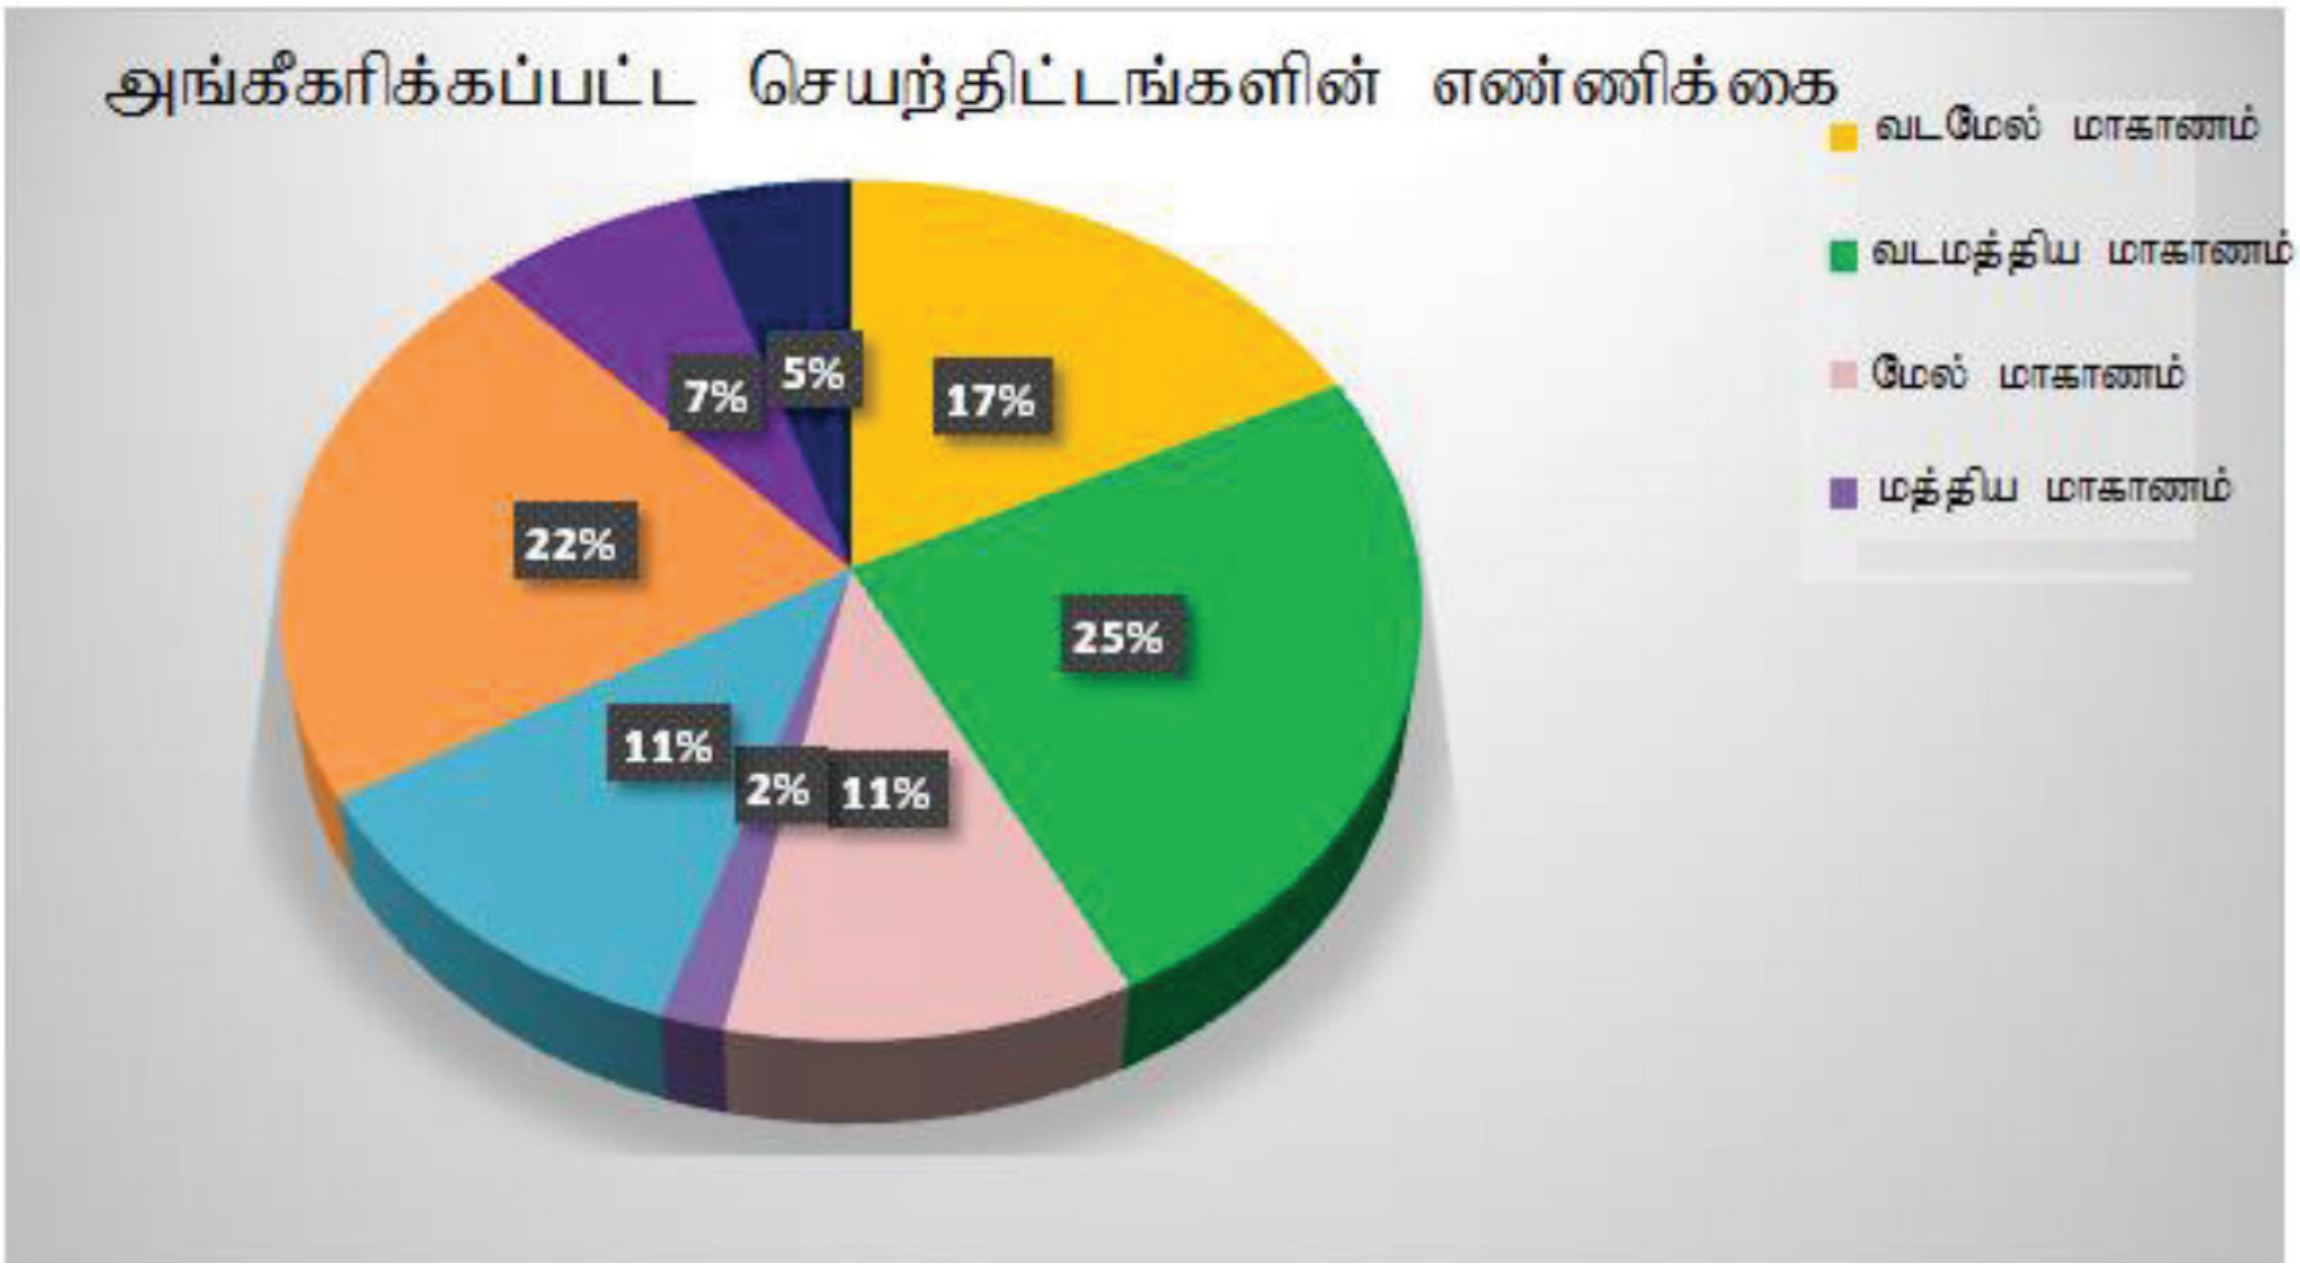

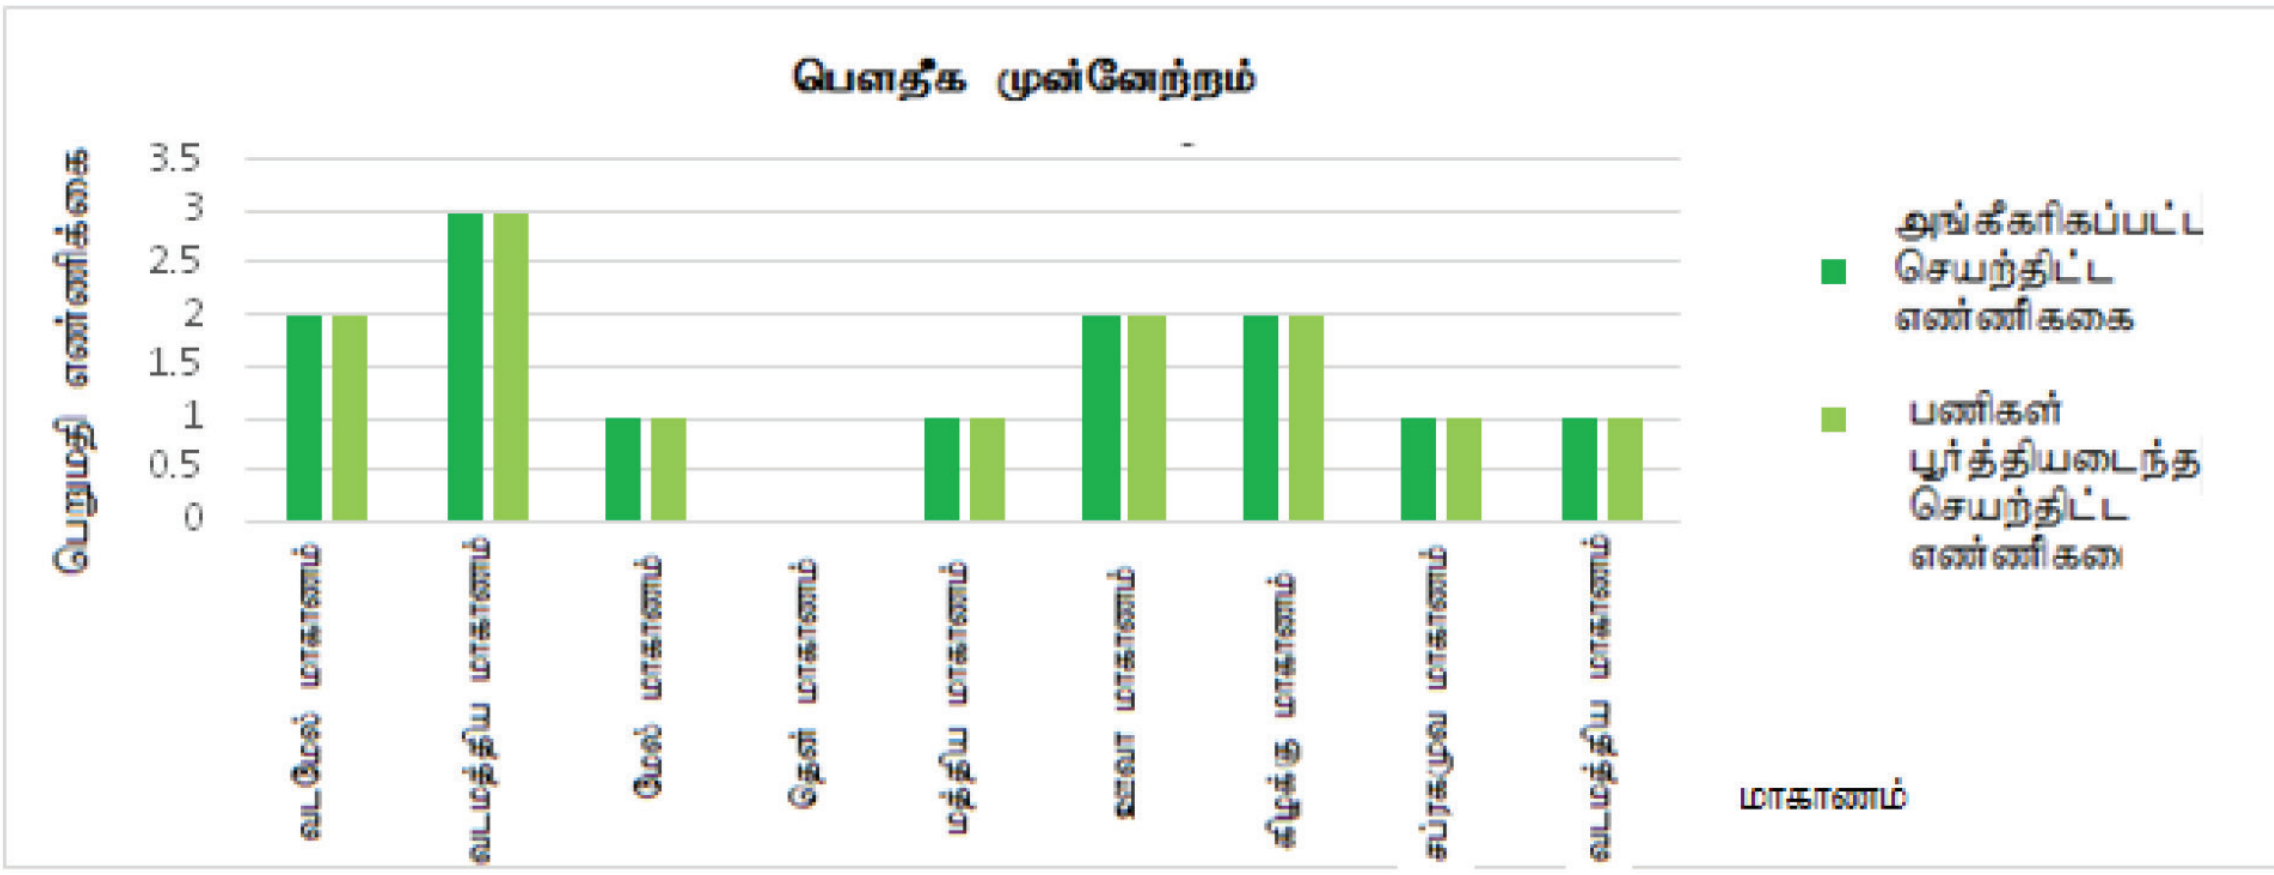

5. நூலக அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள் - 2017

அறிமுகம் :

தகவல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நூலகங்களை வினைத்திறன்மிக்கதாக பயன்படுத்தும் நோக்குடன் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில்நுட்ப நிபுனத்துவ உதவியுடன் 2016 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நூலகங்கள் சுயமாக செயற்படும் செயற்திட்டத்தின் கீழ் கூட்டிணைந்த மற்றும் சர்வதேச அங்கீகாரங்களுக்கமைய நூலக கணணி உள்ளீடுகளைப் பயன்படுத்தி நூலகங்கள் வாசகர்களைக் கேந்திரமாகக் கொண்டு உயர் சேவையினை வழங்குவதற்காக நூலகங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தேவையான வளங்கள் வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் பயிற்சியினையும் வழங்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

இச் செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்தும் போது பெறப்பட்ட அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தற்போது சுயமாகச் செயற்படக்கூடிய 30 நூலகங்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் சுயமாக செயற்படக்கூடிய உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் நூலகங்களும் இலத்திரணியல் நூலக வலையமைப்பாக தொடர்புபடுத்தும் மத்திய நிலையத்தைத் தாபிக்க 2017 ஆம் ஆண்டில் நூலகங்களின் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின்

தொழில்நுட்ப உதவியுடன் அமுல்படுத்த உரிய அடிப்படைத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டன.

நோக்கம் :

1. தற்போது சுயமாக செயற்படுத்தப்பட்டுள்ள மற்றும் எதிர்காலத்தில் சுயமாக செயற்படும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்குரிய பொது நூலக வலையமைப்புடன் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய பிரிவாக இலத்திரணில் நூலகங்களைத் தாபித்தல்.
2. நவீன முன்னேற்றகரமாக நூலகப் பிரிவிகளைக் கொண்ட மற்றும் 21 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ஏற்றவாறு வினைத்திறன் மிக்க சேவையினை வழங்குவதற்கான இயலுமைகள் கொண்ட மாதிரி நூலகமாக முன்னெடுத்தல்.
3. நாட்டின் பொருளாதார விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப அபிவிருத்திக்காக உதவிகளை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் பொது நூலக வள முறைமையினைத் தாபித்தல்.
4. நூலகங்களில் ஊழியர்களுக்கு நூலகத் தொழில்நுட்பம் தொடர்பில் பயிற்சிக்காக வாய்ப்பினை வழங்குதல்.
5. நூலகங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நவீன தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் மற்றும் பயன்படுத்துவது தொடர்பில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்கும் தகவல் தொழில்நுட்ப மாதிரிகளை உருவாக்குவதற்காகவும் வாய்ப்பினை வழங்குதல்.
6. மத்திய நிலைய முகாமைத்துவத்திற்காக தொழில்நுட்ப மற்றும் முறைகளைத் தாபித்தல்.

எதிர்பார்க்கப்படும் பெறுபேறுகள்

1. நவீன நூலகங்கள் மற்றும் இலத்திரணியல் நூலகங்களின் நிலைமைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் (பொது மக்கள், பொது நூலகப் பொறுப்பாளர்கள், மற்றும் நூலக நிருவாக உத்தியோகத்தர்கள் போன்ற தரப்பினர்களுக்கு)
2. நவீன நூலக சூழலில் பிரயோகப் பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்தின ஊடாக புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய நூலகங்களில் சேவையாற்றுவதற்கான நம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்புதல்.
3. நூலகப் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் பொது மக்களின் தேவைகளுக்கமைய உள்நாட்டு இலத்திரணியல் நூல்களை இணையத்தளம் ஊடாக பரிசீலனை செய்வதற்கு வாய்ப்பினை வழங்குதல்.
4. நவீன தகவல் தொழில்நுட்பச் சூழலில் தகவல்களின் செயற்பாடுகளை ஆய்விற்குட்படுத்த நூலக தகவல் முறையினையினை தொழிலாளர்களுக்கு மற்றும் புத்திஜீவிகளுக்கு ஆராய்ச்சிகளுக்காக வாய்ப்புகள் உருவாகுதல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்	1. நூலகங்கள் சுயமாக செயற்படக்கூடிய வேலைத்திட்டங்களின் எதிர்கால பெறுகைச் செயற்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்தல். 2. பொது இலத்திரணியல் நூலக மத்திய நிலையத்தைத் தாபித்தல். ◆ நவீன இலத்திரணியல் (நூலகத்திற்காக உட்கட்டமைப்பினைத் தாபித்தல் (கட்டடங்களை புணரமைத்தல் மற்றும் நவீன மயப்படுத்தல்) ◆ இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில்நுட்ப நிபுனத்துவ சேவையினைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.
அமுல்படுத்தப்படும் இடம்	கொழும்பு பொது நூலகம்
2017 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு	20.0 ரூபா. மில்லியன்
செலவினம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)	ருபா. 4.7 மில்லியன் (2016 ஆம் ஆண்டில் எஞ்சிய பெறுகைப் பணிகளுக்கான செலவினம்)

உத்தேச இலத்திரணியல் மத்திய நூலக நிலைய நிர்மானிப்பதற்காக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நிதி ரூபா. 15.3 மில்லியன் என்பதுடன் 2017 ஆம் ஆண்டில் செயற்திட்ட பணிகளை பூர்த்தி செய்யத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் பெறுகைச் செயற்பாடுகளில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக 2018 ஆம் ஆண்டில் அமுல்படுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது.

தொடர் இல	மாகாணம்	மாவட்டம்	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனம்	நூலகப் பட்டியல
1		கொழும்பு	கொழும்பு மாநகர சபை	கொட்டாஞ்சேனை பொது நூலகம்
2			கொழும்பு மாநகர சபை	மஹரகம நகர சபை பொது நூலகம்
3			சீதாவக்க பிரதேச சபை	சீதாவக்க பொது நூலகம்
4			கொடிகாவத்த பிரதேச சபை	கொடிகாவத்த பிரதேச சபையின் சிறிமாவே பண்டாரநாயக்க பொது நூலகம்
5	மேல் மாகாணம்		கொழும்பு மாநகர சபை	கிருளப்பனை பொது நூலகம்
6			கொழும்பு மாநகர சபை	மருதானை நகர பொது நூலகம்
7			பொரளஸ்கமுவ நகர சபை	பொரளஸ்கமுவ நகர சபையின் பி.எச் பெரேரா மத்திய நூலகம்
8		களுத்துறை	பாணத்துறை நகர சபை	மீகெட்டுவத்தே குணானந்த பொது நூலகம்
9		கம்பஹா	மினுவங்கொட பிரதேச சபை	மினுவங்கொட பொது நூலகம்
10	சப்ரகமுவ	இரத்தினபுரி	எகலியகொட பிரதேச சபை	எகலியகொட பொது நாதலகம்
11		கேகாலை	கேகாலை நகர சபை	கேகாலை பொது நூலகம்
12		குருநாகல்	மாவத்துகம பிரதேச சபை	மாவத்துகம பொது நூலகம்
13	வடமேல	புத்தளம்	ஆணமடுவ பிரதேச சபை	ஆணமடுவ பிரதேச சபை பொது நூலகம்
14			புத்தளம் நகர சரப	புத்தளம் நகர சபை பொது நூலகம்
15		காலி	புத்தளம் நகர சரப	புத்தளம் நகர சபை பொது நூலகம்
16		ஹம்பாந்தோட்டை	காலி மாநகர சபை	ரிச்சட் பத்திரன பொது நூலகம்
17			பொலியத்த பிரதேச சபை	பெலியத்த பொது நூலகம்
18		மாத்தறை	வெலிகம நகர சபை	வெலிகம நகர சபை பொது நூலகம்

19		அனுராதபுரம்	கெகிராவ பிரதேச சபை	கெகிராவ பிரதேச சபை பொது நூலகம்
20			அனுராதபுரம் மாநகர சபை	அனுராதபுரம் பொது நூலகம்
21	வடமத்தி	பொலன்னறுவை	தமன்கடுவ பிரதேச சபை	தமன்கடு பிரதேச சபை புத்தி மண்டப பொது நூலகம்
22			கிங்குரக்கொட பிரதேச சபை	பண்டாரநாயக்க பொது நூலகம்
23		மாத்தளை	பில்கமுவ பிரதேச சபை	பில்கமுவ பொது நூலகம்
24		கண்டி	நாவலப்பிட்டிய நகர சபை	நாவலப்பிட்டி பொது நூலகம்
25	மத்தி		அக்குரன பிரதேச சபை	அக்குறன பொது நூலகம்
26			கம்பொல நகர சபை	கம்பொல பொது நூலகம்
27		நுவரெலியா	நுவரெலியா மாநாகர சபை	நுவரெலியா மாநகர சபை பொது நூலகம்
28		பதுளை	பதுளை மாநகர சபை	பதுளை மாநகர சபை பொது நூலகம்
29	ஊவா	மொனராகலை	மொனராகலை பிரதேச சபை	மொனராகலை பிரதேச சபை பொது நூலகம்
30			வெல்லவாய பிரதேச சபை	வெல்லவாய பொது நூலகம்
31		வவுனியா	வவுனியா தெற்கு பிரதேச சபை	வவுனியா தெற்கு பிரதேச சபை பொது நூலகம்
32		மன்னார்	மன்னார் பிரதேச சபை	தலைமன்னார் பொது நூலகம்
33		கிளிநொச்சி	கரச்சி பிரதேச சபை	கரச்சி பிரதேச சபை பொது நூலகம்
34	வடக்கு	முல்லைத்தீவு	மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபை	மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபை பொது நூலகம்
35		யாழ்ப்பாணம்	சாவகச்சேரி நகர சபை	சாவகச்சேரி நகர சபையின் பொது நூலகம்
36			நல்லூர் பிரதேச சபை	நல்லூர் பிரதேச சபை பொது நூலகம்

eLibrary Project

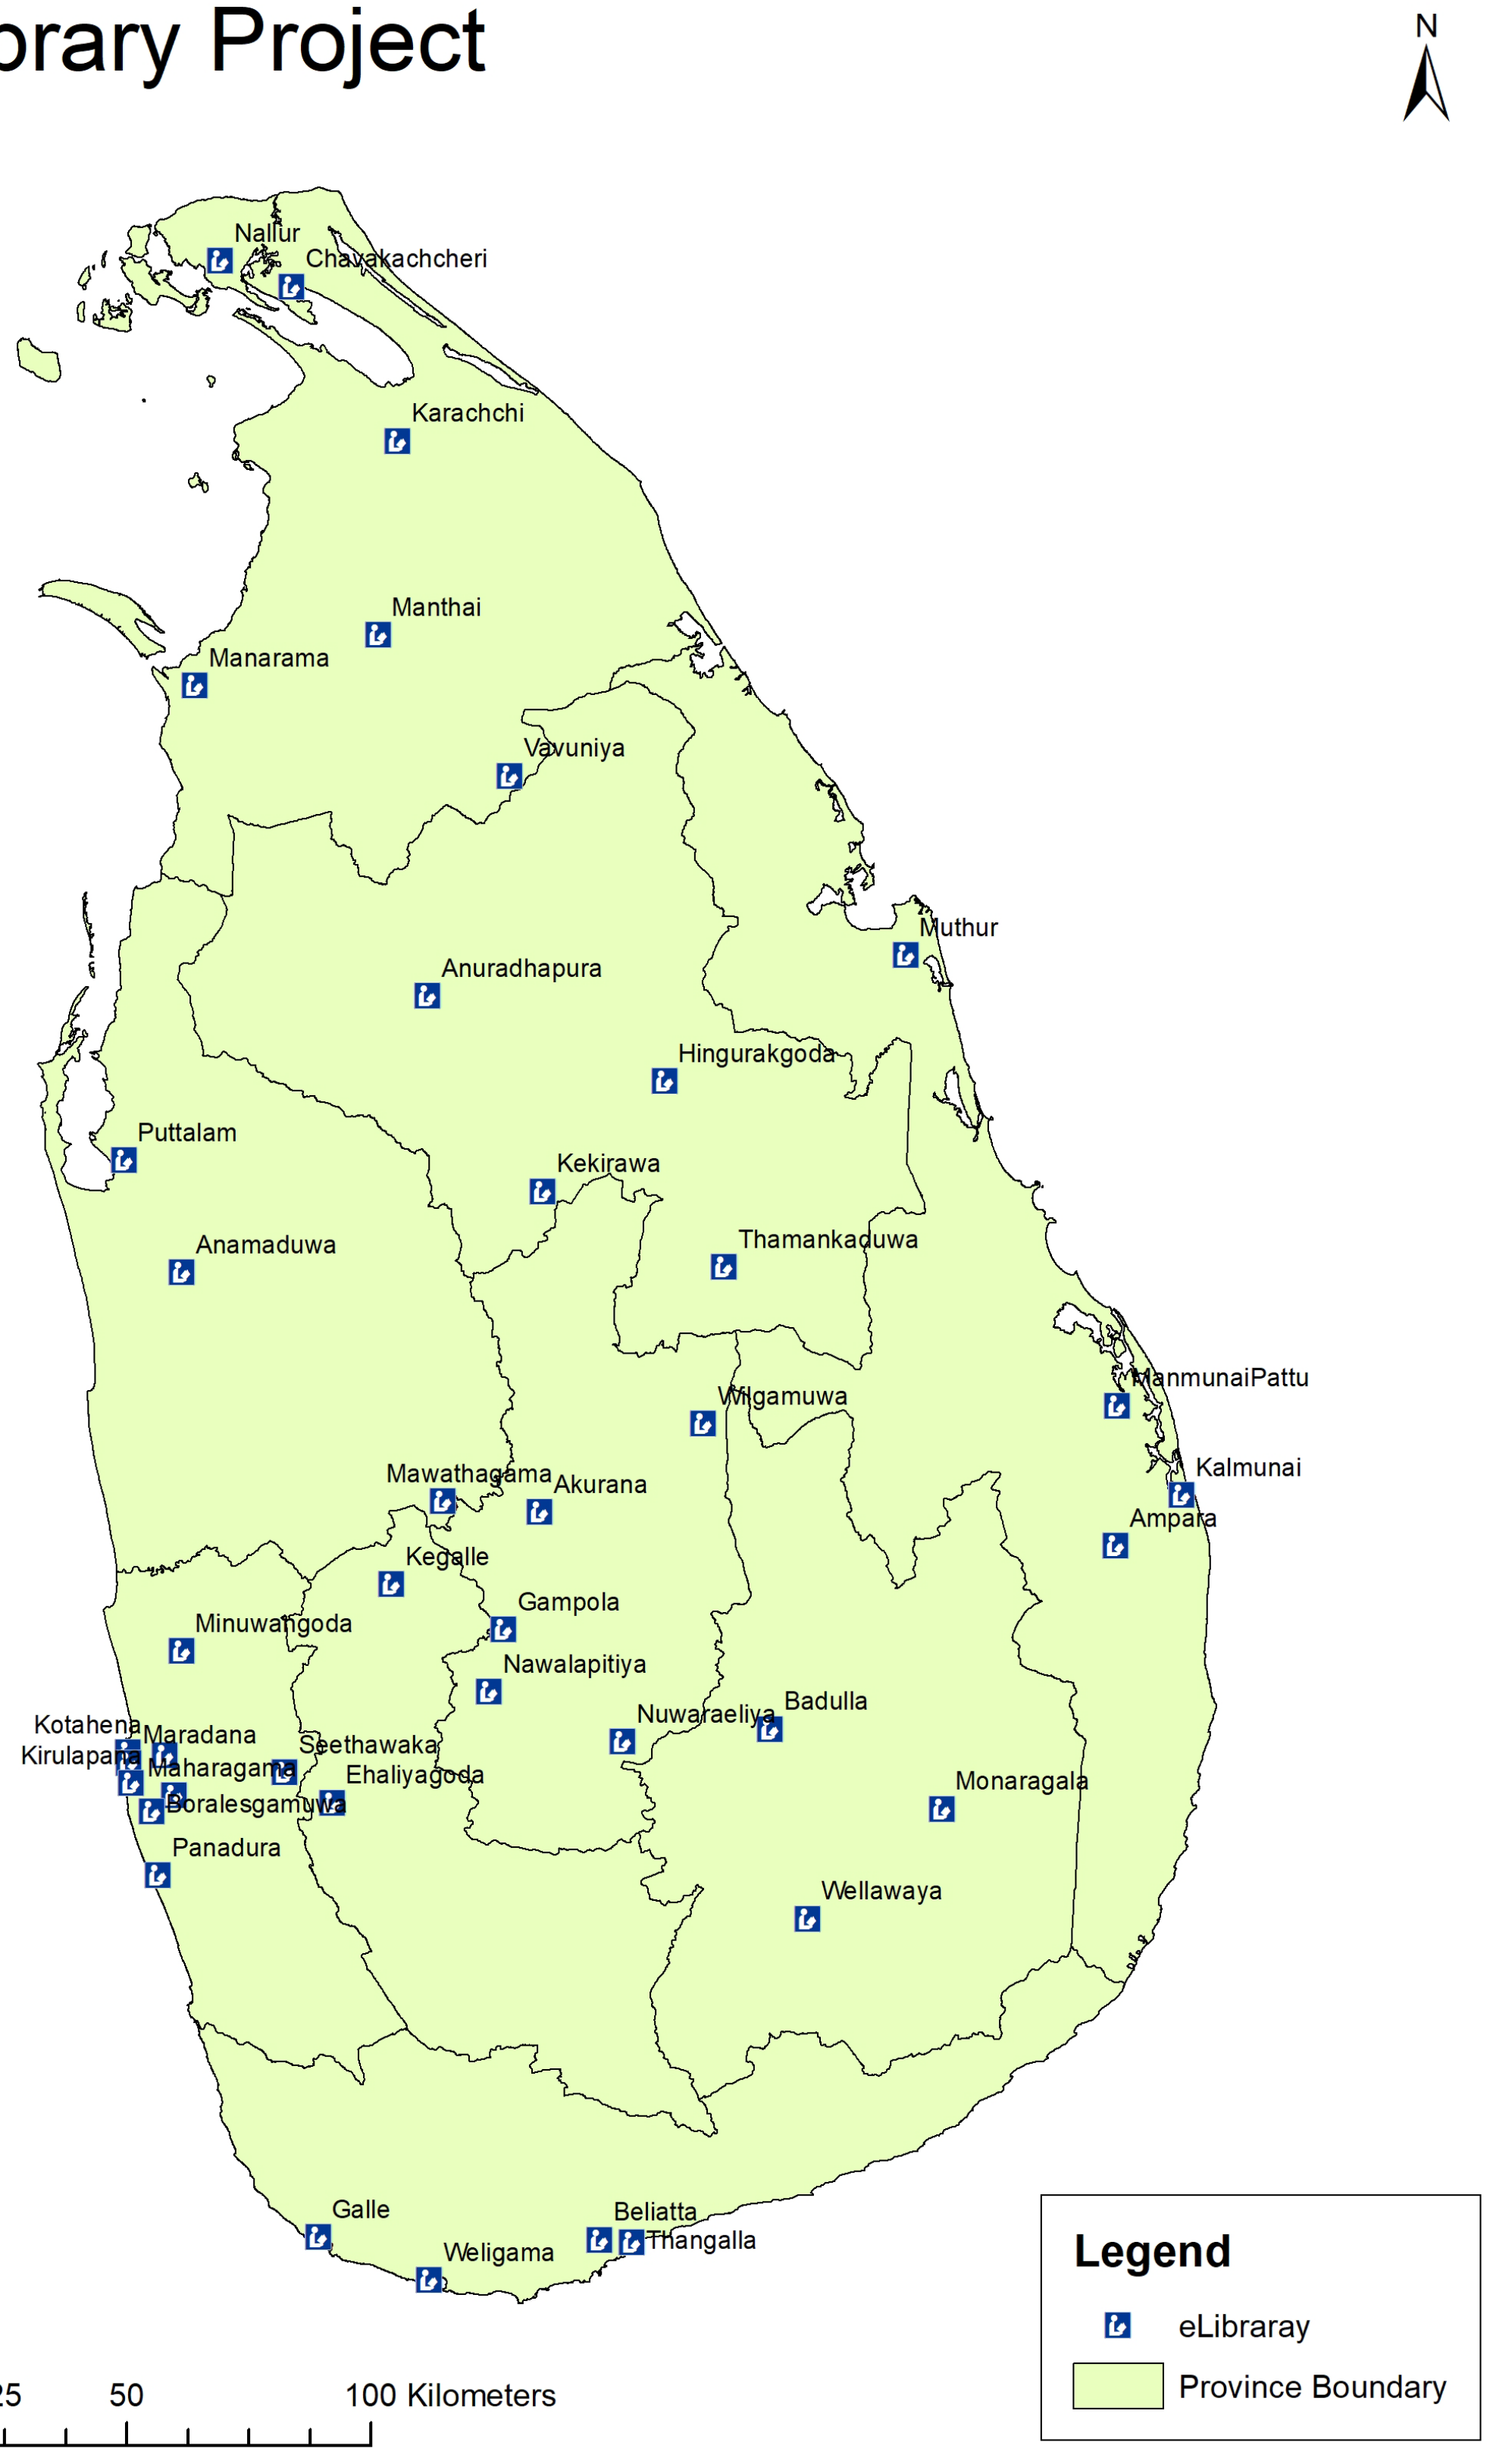

37	கிழக்கு	திருகோணமலை	மூதுார் பிரதேச சபை	மூதுார் பொது நூலகம்
38		மட்டக்களப்பு	மண்முனை தெற்கு / மேற்கு பிரதேச சபை	களுவான்சுகுடி பொது நூலகம்
39		அம்பாறை	அம்பாறை நகர சபை	அம்பாறை நகர சபை பொது நூலகம்
40			கல்முனை மாநகர சபை	கல்முனை பொது நூலகம்

6. மீரிகம செத்செவன அரச முதியோர் இல்லத்தை நவீனமயப்படுத்தல்.

பின்னணி :

இந்தியா பங்களாதேஷ், பாக்கிஸ்தான், நேபாளம் மற்றும் இலங்கை ஆகிய தெற்காசிய நாடுகளில் சனத்தொகையில் குறிப்பிடத்தக்களவு விகிதாசாரம் துரிதகதியில் வயோதிபத்தை அடையக்கூடிய நிலைமைகளில் அதிகரிப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. தற்போது இலங்கையின் மொத்த சனத்தொகையில் 12.47மூ தை முதியோர் சனத்தொகையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதுடன், இது 2041 ஆம் ஆண்டளவில் 24.8மூ தினால் அதிகரிக்கும் என ஊகிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் முதியோருக்காக சமூகத்தினால் காண்பிக்கும் கவனையீனம் மற்றும் சமநிலை இன்மைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துச் செல்வதனால் உரிய துறையின் பல சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றில் முதியோர் இல்லங்களில் இணையும் முதியோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்குநாள் அதிகரித்துச் செல்வதுடன் அவர்களின் கௌரவம் அபிமானத்தைப் பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் அவர்களை வீடுகளின் வைத்திருப்பதன் தேவை எழுந்துள்ளது. இந் நிலைமையினை எதிர்கொள்வதற்காக இலங்கையில் செயற்படக்கூடிய அரசாங்கத்தின் 05 முதியோர் இல்லங்கள் மேல் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள மிகப் பெரிய முதியோர் இல்லங்களாகும். மீரிகம செத்செவன அரச முதியோர் இல்லம் என்பதுடன் இது மகாமானிய டி.எஸ் சேனாநாயக்கவின் ஞாபகார்த்தத்திற்காக தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. மேல் மாகாண சமூக சேவைத் திணைக்களத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் இவ் முதியோர் இல்லத்தில் தற்போது 265 முதியோர்களுக்கு வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இது எவ்வாறாக இருப்பினும் இவ் முதியோர் இல்லங்களில் ஒரு சில கட்டடங்கள் சேதமடைந்து மற்றும் நீர் உட்பட மலசல கூட வசதிகள் போதியளவு இன்மை போன்ற பிரச்சினைகள் காரணமாக தங்கியிருக்கும் முதியோருக்கு உயரிய பண்புசார் தரம்மிக்க சேவைகளை வழங்குவதில் சிரமங்கள் காணப்படுகின்றன. இதனைக் கருத்திற் கொண்டு 2016.06.22 ஆம் திகதிய அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய இதனைப் புணரமைப்பதற்காக மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சிற்கு ஒதுக்கீடுகளை வழங்க பொதுத் திறைசேரியினால் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்தும் பணிகள் மேல்மாகாண சமூக சேவைத் திணைக்களத்திற்கு பொறுப்பளிக்கப்பட்டது.

நோக்கம் :

மீரிகம முதியோர் இல்லத்தின் சேவைகளை சிறந்த மட்டத்தில் முன்னெடுப்பதற்காகத் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்	i. ை. முதியோர் இல்லங்களை புணரமைத்தல். ii. நீர்த் தாங்கியினை நீர்மானித்தல். iii. கோதமி பீ பிரிவின் மலசலகூடத் தொகுதியினை நவீன மயப்படுத்தல
2017 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு	21.8 ரூபா. மில்லியன்
2017 ஆம் ஆண்டில் செலவினம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)	8.63 ரூபா. மில்லியன்
பௌதீக முன்னேற்றம்	100மூ

7. கிழக்கு மாகாணத்தில் கழிவுநீர் அகற்றும் தொகுதியினை அபிவிருத்தி செய்தல்.

கிழக்கு மாகாணத்தில் நகர மயமாக்கல் அதிகரித்துள்ளமையினைத் தொடர்ந்து நகரப் பிரதேசங்களில் சனத்தொகை அதிகரித்துள்ளமையினால் கால்வாய்த் தொகுதிகள் தடைப்பட்டுள்ளமையினால் மழை காலங்களில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்படல் மற்றும் டெங்குக் காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள் பரவும் அபாயம் அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது.

இந் நிலைமையினைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அத்தியாவசிய மழை நீர் வழிந்தோடக்கூடிய கால்வாய்த் தொகுதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக 2017 ஆம் ஆண்டில் 100 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கீடு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மாவட்டங்கள்	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள்
மட்டக்களப்பு	மட்டக்களப்பு மாநகர சபை
	ஏறாவூர் நகர சபை
	காத்தான்குடி நகர சபை
அம்பாறை	கல்முனை மாநகர சபை
	அக்கரைப்பற்று மாநகர சபை
	பொத்துவில் பிரதேச சபை
திருகோணமலை	திருகோணமலை நகர சபை
	கிண்ணியா நகர சபை

நோக்கம் :

1. கிழக்கு மாகாணத்தில் நகரப் பிரதேசங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதற்கமைய இனங்காணப்பட்ட மழை நீர் அகற்றும் தொகுதிகளை நிர்மானிப்பதன் மூலம் பாதுகாப்பான வாழ்வினை உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் அதன் பயனாக இப்பிரதேசங்களில் வாழும் சமூகத்தின் வாழ்க்கை மட்டத்தை மேம்படுத்தல்.

2. கிழக்கு மாகாணத்தின் பிரதேசங்களில் பல்வேறுபட்ட நோய்கள் பரவுவதை தடுப்பதன் மூலம் நோய்களற்ற சுகாதார வளம்மிக்க சமூகத்தை உருவாக்குதல்.

பிரதான செயற்பாடுகள்	கிழக்கு மாகாணத்தில் 11 உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் நகர அதிகாரப் பிரதேசங்களில் கழிவுநீா் தொகுதிகளை நிர்மானித்தல்.
2017 ஆம் ஆண்டுக்குரிய ஒதுக்கீடுகளின் அளவு	90.00 ரூபா. மில்லியன்
2017 ஆம் ஆண்டுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி (ரூபா.)	98.17 ரூபா. மில்லியன்
2017 ஆம் ஆண்டில் செலவினம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)	10.12 ரூபா. மில்லியன்

3.2. செயற்திட்டம் மற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு

22017 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் அமைச்சுடன் இணைந்த புதிய பிரிவாகும். இப் பிரிவு பிரதானமாக செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு, திட்டமிடல் பிரிவு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவினைக் கொண்டமைந்துள்ளது.

நோக்கு :

அமைச்சின் சகல செயற்பாடுகளுக்குமான மூல உபாயத் திட்டங்களை வகுத்தல் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செயற்திட்டத்திற்காக தூதுச் செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல்.

பிரதான நோக்கங்கள் :

1. இலங்கையின் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் மூலம் சேவைகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளைப் பொறுப்புடன் வழங்குவதற்கு உதவுதல்.

2. கிராமிய மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தில் பண்புசார் தரத்தை விருத்தி செய்வதற்குத் தேவையான வழங்கலை வழங்குதல்.

3.2.1. பிரதான பணிகள்

3.2.1.1. செயற்திட்ட மற்றும் முகாமைத்துவப் பிரிவு

1. வெளிநாட்டு உதவிச் செயற்திட்டங்களுக்குரியதான பணிகள் நிரல் அமைச்சு, திணைக்களம், செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு மற்றும் ஏனைய நிறுவனங்களுடனான இணைப்புக்கள் மூலம் செயற்திட்ட நோக்கங்களை எட்டுவதற்காக நடவடிக்கை எடுத்தல்.
2. அமுலில் உள்ள செயற்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் தொடர்பான பின்னூட்டல்களை மேற்கொள்ளல்.
3. தேசிய செயற்திட்ட செயற்பாட்டுக் குழுக் கூட்டத்தை நடாத்துதல்.
4. செயற்திட்டங்களுக்குரிய அமைச்சரவைப் பத்திரத்தைத் தயாரித்தல்.
5. செயற்திட்டப் பணியாளர் சபையை சேர்த்துக் கொள்ளல் உட்பட நிருவாகப் பணிகளை மேற்கொள்ளல்.
6. அமைச்சின் ஏனைய பிரிவுகளுக்கிடையே உரிய இணைப்பினைப் பேணுதல்.

3.2.1.2. திட்டமிடல் பிரிவு

1. அமைச்சின் வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் மூல உபாயத் திட்டங்களை வகுத்து உரிய நிறுவனங்களுக்குச் சமர்ப்பித்தல்.
2. அமைச்சின் முன்னேற்ற அறிக்கையினை மாதாந்தம், காலாண்டு மற்றும் வருடாந்த அடிப்படையில் தயாரித்தல் மற்றும் உரிய நிறுவனங்களுக்கு சமர்ப்பித்தல்.
3. அமைச்சின் முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டங்களை நடாத்துதல்.
4. எதிர்காலத்திற்குரிய செயற்திட்ட யோசனைகளை இனங்காணுதல்.
5. மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் இணைப்புப் பணிகள் மூலம் புதிய செயற்திட்ட யோசனைகளைச் சமர்ப்பித்தல்.

6. வருடாந்த செயற்சாதனை அறிக்கையினைத் தயாரித்தல் மற்றும் பாராளுமன்ற வரவு செலவு செயற்குழு சபைச் சந்தர்ப்பத்தில் தேவையான செயற்சாதனைகள் மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்களை உள்ளடக்கிய அறிக்கையினைத் தயாரித்தல்.
7. செயலமர்வு ஒழுங்கமைப்பு மற்றும் அதனை முன்னெடுத்தல்.

3.2.1.3. தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு

1. அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தை வாராந்தம் சமகாலப்படுத்தல்.
2. தகவல் தொகுதியினைப் பேணுதல் மற்றும் தகவல்களைச் சேகரித்தல்.
3. இணையத்தள வசதிகளை முன்னெடுக்கத் தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குதல்.
4. அமைச்சின் சகல பிரிவுகளுக்கும் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களுக்குத் தேவையான தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியினை வழங்குதல்.

இப் பிரிவின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண்டில் 12 வெளிநாட்டு உதவிச் செயற்திட்டங்கள் மாத்திரம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இச் செயற்திட்டங்களின் சுமார் 500 பணியாளர்கள் சேவையாற்றுவதுடன் சகல மாகாணங்களையும் தழுவக்கூடியவாறு உரிய மாகாண சபைகள் ஊடாக இவை அமுல்படுத்தப்படுகின்றன. இவ் வெளிநாட்டு உதவிச் செயற்திட்டங்களின் முழுமையான முதலீடு ரூபா. 20,000 மில்லியனாகும். பல்வேறுபட்ட நிதி நிறுவனங்களினால் கடன் மற்றும் வழங்கல்களாக முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

Development Projects 2015 -2018

Ministry of Provincial Councils & Local Government

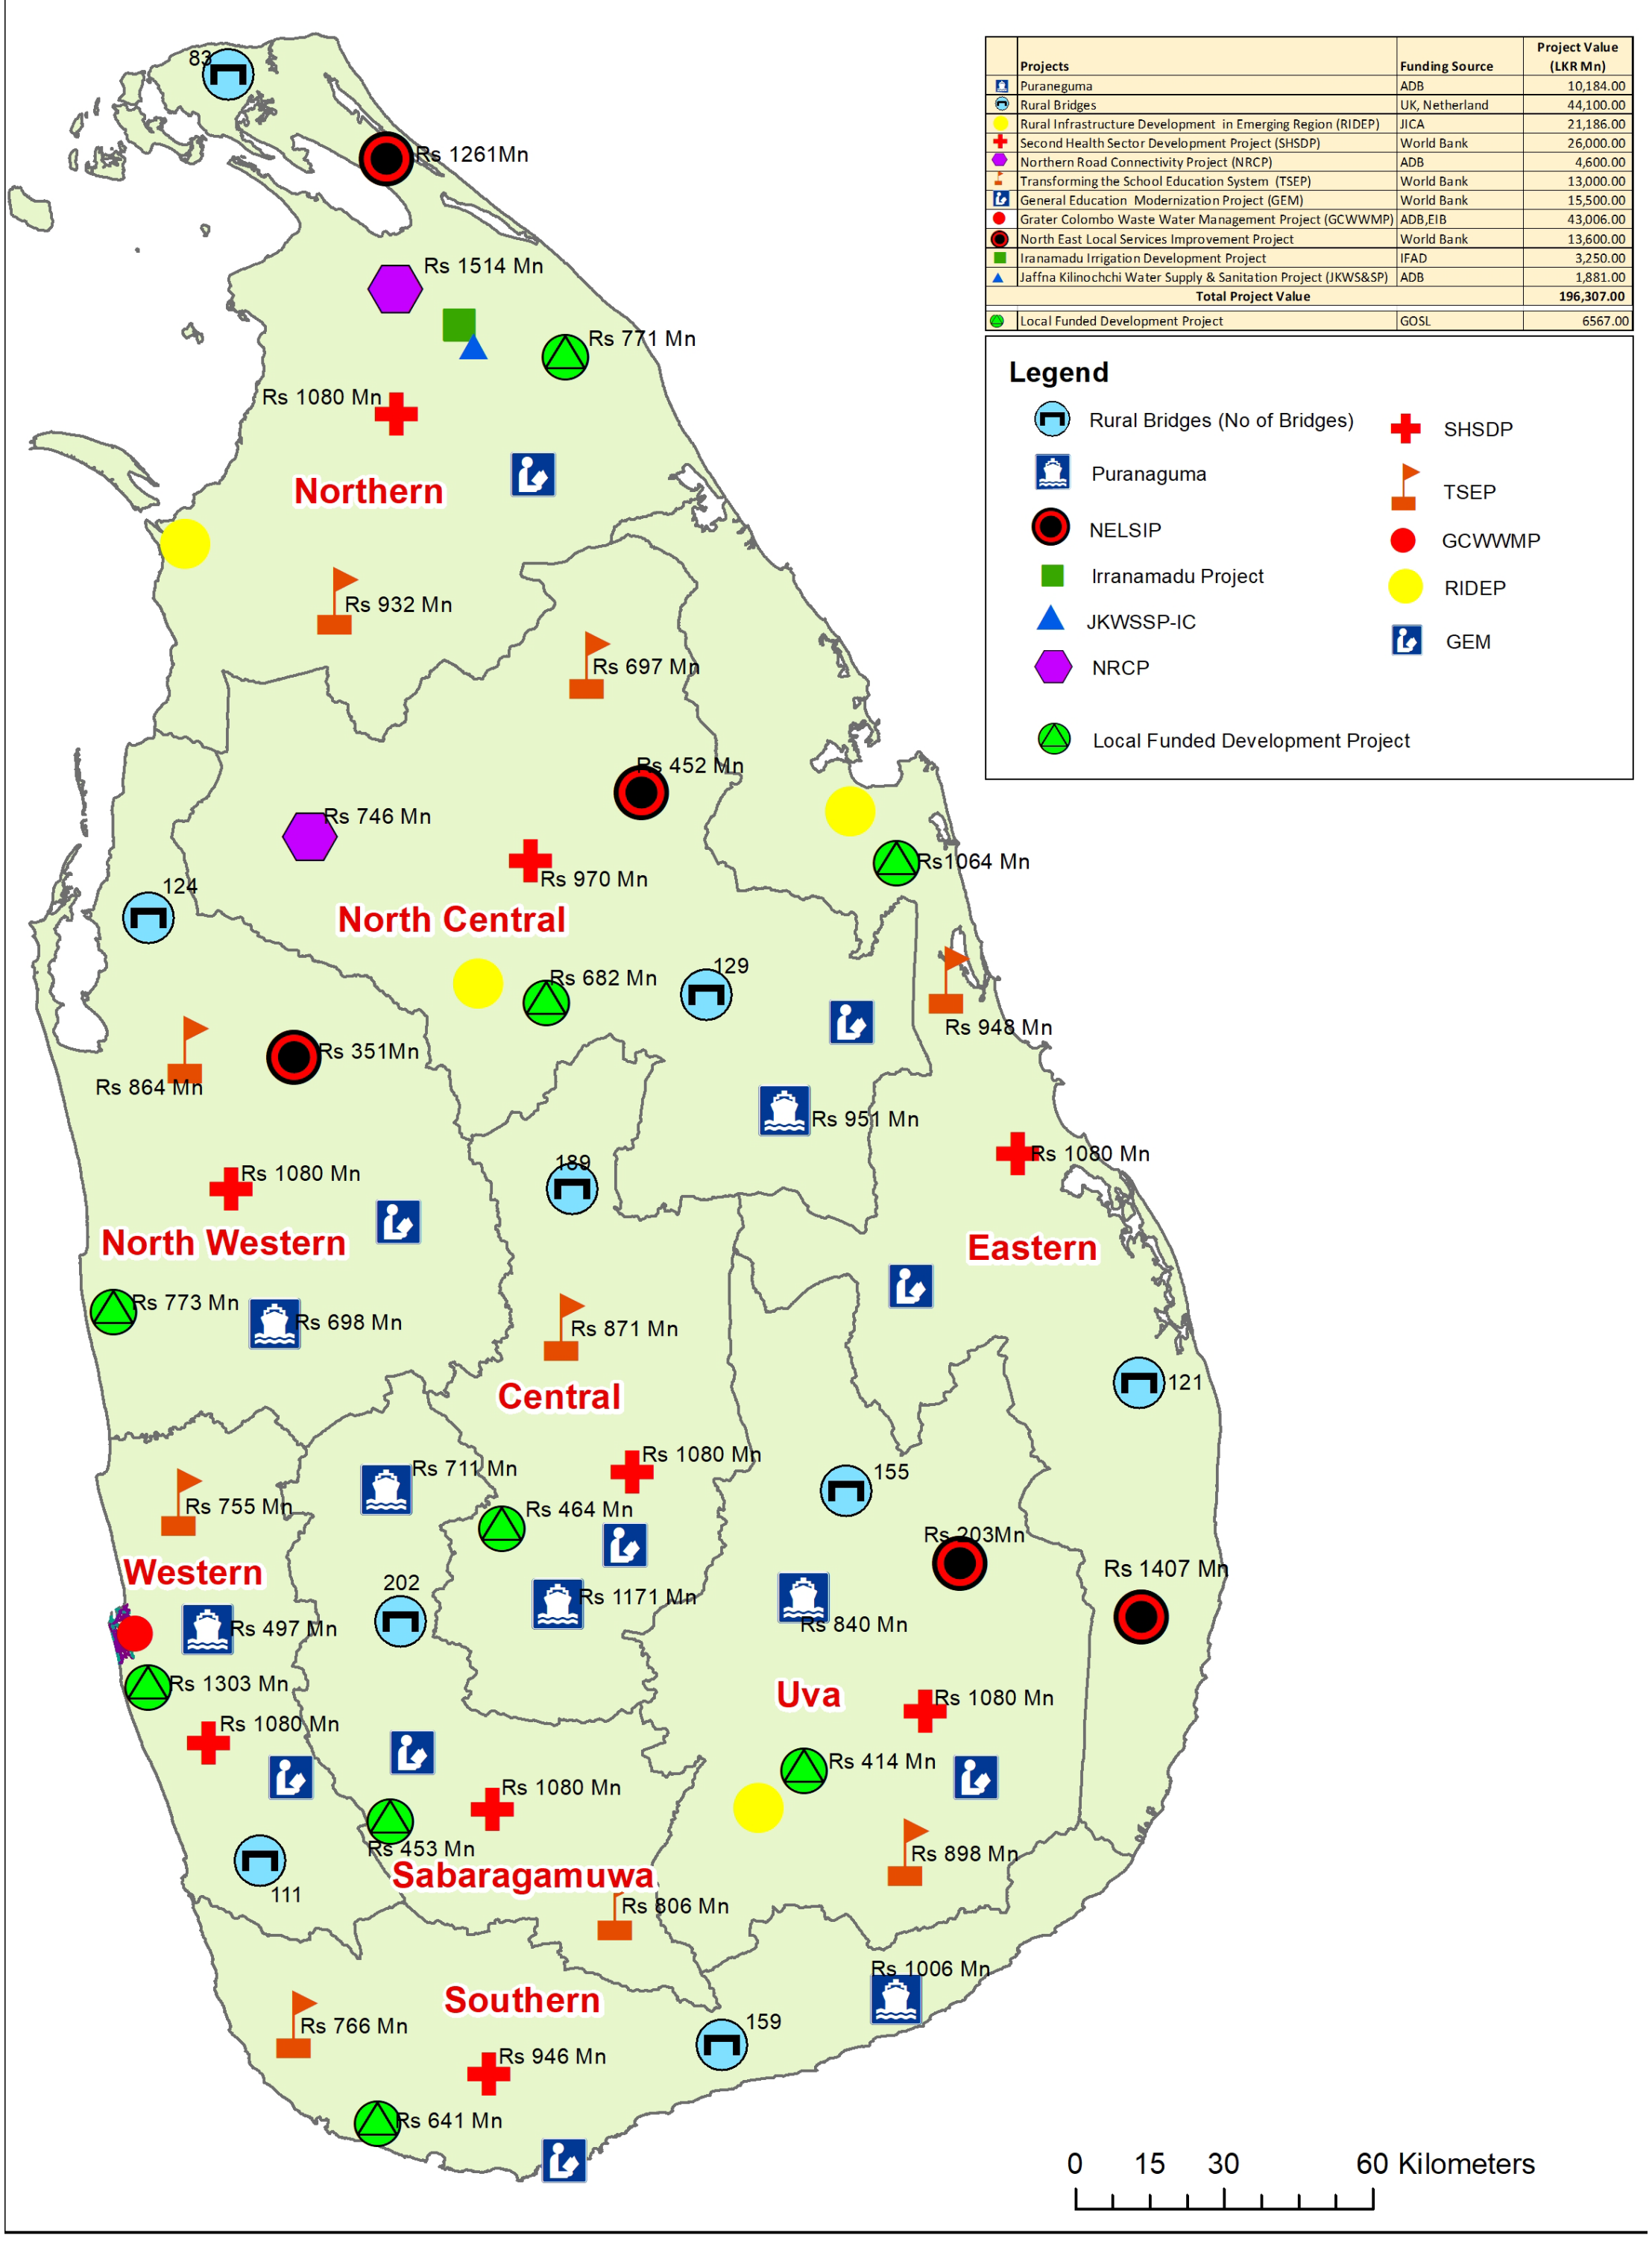

Projects	Funding Source	Project Value (LKR Mn)
Puraneguma	ADB	10,184.00
Rural Bridges	UK, Netherland	44,100.00
Rural Infrastructure Development in Emerging Region (RIDEP)	JICA	21,186.00
Second Health Sector Development Project (SHSDP)	World Bank	26,000.00
Northern Road Connectivity Project (NRCP)	ADB	4,600.00
Transforming the School Education System (TSEP)	World Bank	13,000.00
General Education Modernization Project (GEM)	World Bank	15,500.00
Grater Colombo Waste Water Management Project (GCWWMP)	ADB,EIB	43,006.00
North East Local Services Improvement Project	World Bank	13,600.00
Iranamadu Irrigation Development Project	IFAD	3,250.00
Jaffna Kilinochchi Water Supply & Sanitation Project (JKWS&SP)	ADB	1,881.00
Total Project Value		**196,307.00**
Local Funded Development Project	GOSL	6567.00

3.2.2. வெளிநாட்டு நிதியுதவிக்கமைய அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள செயற்திட்டங்கள்

3.2.2.1. புறநெகும

<table>
<tr><td colspan="4">நோக்கம்
உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் செயற்பாடுகளை மீள் கட்டமைத்தல் மற்றும் பின்னடைந்த உள்ளூ ராட்சி மன்ற 137 அதிகாரப் பிரதேசங்களுக்கு 383 உப துணைச் செயற்திட்டங்களுக்கமைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல்</td></tr>
<tr><td rowspan="10"> </td><td>கடன் உதவி வழங்கும் நிறுவனம்</td><td colspan="2">ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி</td></tr>
<tr><td>செயற்திட்டச் செலவினம் (ரூபா. மில்)</td><td colspan="2">16,800.00</td></tr>
<tr><td>செயற்திட்டக் காலம்</td><td colspan="2">2011 - 2020</td></tr>
<tr><td>அமுல்படுத்தப்பட்ட பிரதேசம்</td><td colspan="2">மேற்கு, வடமேல், தெற்கு, சப்ரகமுவ, ஊவா, மத்தி, வடமத்தி ஆகிய மாகாணங்கள்</td></tr>
<tr><td>ஆரம்ப ஒதுக்கீடுகளின் பௌதீக முன்னேற்றம்</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>மேலதிக ஒதுக்கிடுகளின் பௌதீக முன்னேற்றம்</td><td colspan="2">9%</td></tr>
<tr><td>மொத்த நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா.மில்)</td><td colspan="2">8780.00</td></tr>
<tr><td>2017 ஒதுக்கீடு (ரூபா. மில்)</td><td colspan="2">1892.00</td></tr>
<tr><td>2014 நான்காவது காலாண்டுக்கு நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம்</td><td>1892.00</td><td>1532.00</td></tr>
<tr><td>2017.12.31 அம் திகதியன்று பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம் மேலதிக ஒதுக்கீடு</td><td>10%</td><td>9%</td></tr>
</table>

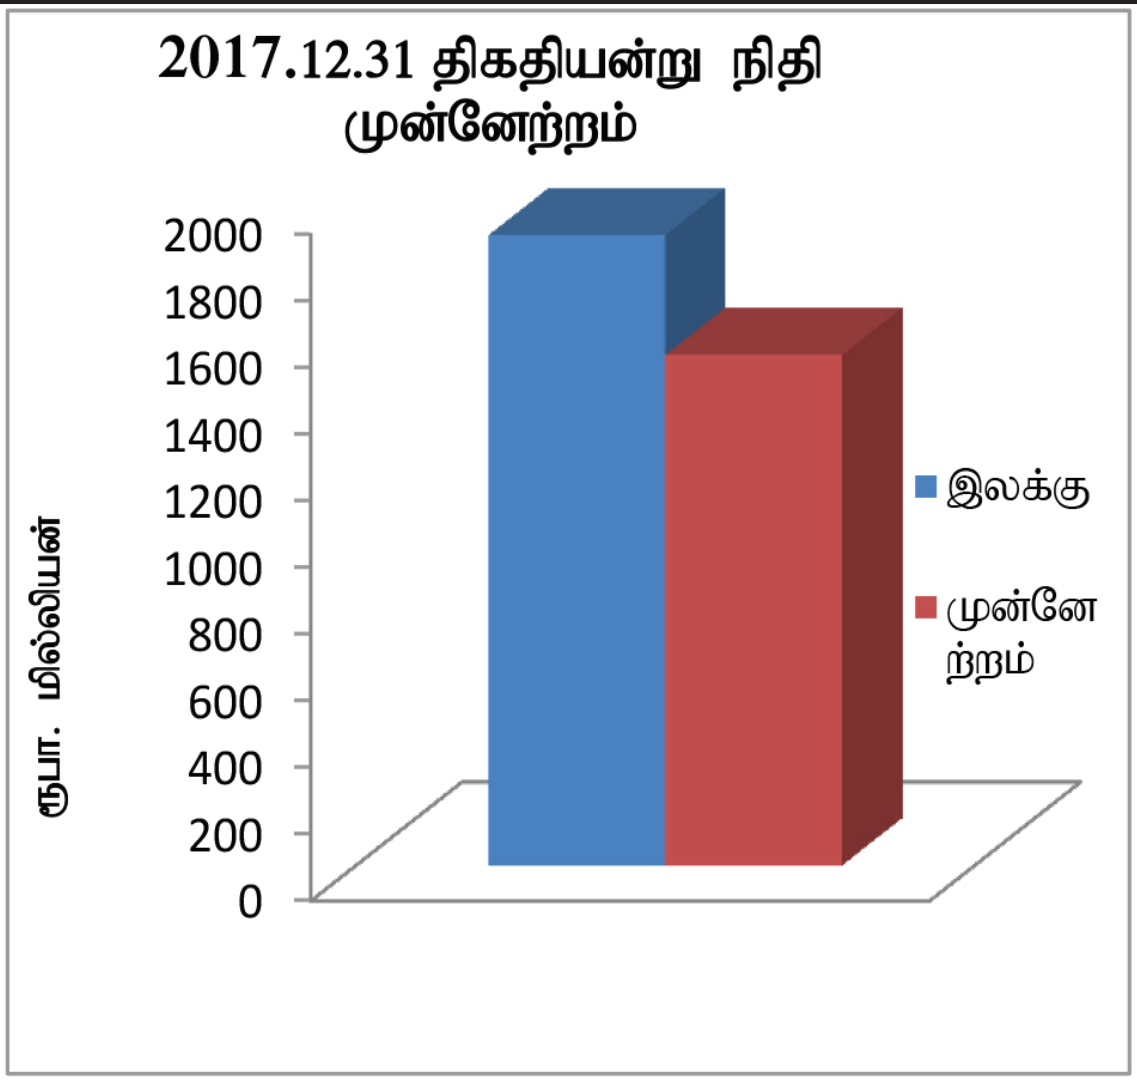

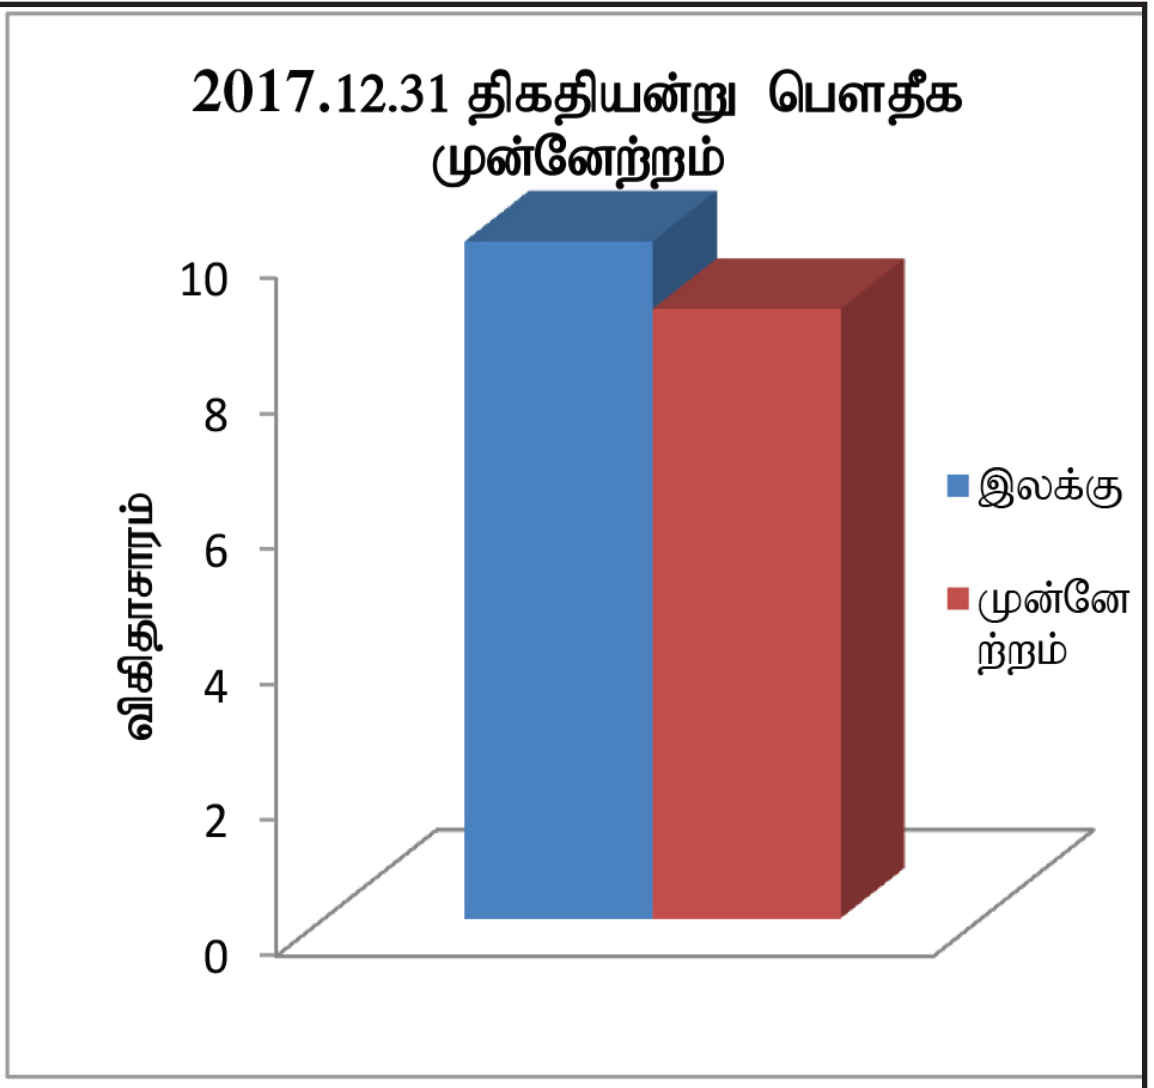

அட்டவணை இலக்கம் 14 - புறநெகும செயற்திட்டத்தின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள செயற்திட்டங்கள்

ஆரம்ப ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள வேலைத்திட்டங்கள்	நிர்மானிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள அளவு	மேலதிக ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள வேலைத்திட்டங்கள்	நிர்மானிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள அளவு
சுகாதார மத்திய நிலையம்	31	வழங்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் (குடிநீர் வழங்கல் யோசனைத் திட்டம்)	08
பகற்காப்பு மத்திய நிலையம்	19		
வசதிகள் மத்திய நிலையம்	28	திட்டமிடல் சந்தர்ப்பத்தில் காணப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் (குடிநீர் வழங்கல் யோசனைத் திட்டம்)	17
திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம்	03		
மயானம்	02	வழங்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் (உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்)	05
நீர் வழங்கல் யோசனைத் திட்ட முறைகள்	23		
வாராந்த சந்தை	45		
நூலகம்	40	விலைமனு கோரப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் (உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்)	05
பஸ் தரிப்பு நிலையம்	14		

பொதுக் கட்டடம்	74	திட்டமிடல் கட்டத்தில் காணப்படும் செயற்திட்டங்கள் (உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்)	19
வீதி / பாலம்	23		
மொத்தம்	**302**	மொத்தம்	**49**

இதற்கு மேலதிகமாக பிரதேச சபையினால் வழங்கப்படும் சேவைகளை மிகுந்த வினைத்திறன் மற்றும் உற்பத்தித் திறன்மிக்க முறையில் மேற்கொள்ளக்கூடியவாறு இந் நிறுவனத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் முறையின் விருத்தி செய்தல், வரிப்பணம் உட்பட ஏனைய பொது அறவீடுகள் மற்றும் அனுமதிப்பத்திரங்களை வெளியிடும் செயற்பாடுகளை இலகுபடுத்தல் மற்றும் அவற்றை அங்கீகரிக்கும் முறைகளை மிகுந்த நெகிழ்வுத் தன்மையுடன் மேற்கொள்ளக்கூடியவாறு பிரதேச சபையின் கொள்கைகளை மறுசீரமைப்பதைப் போன்று உள்ளூ ராட்சி மன்றங்களுக்காக இயந்திர உபகணரங்களை வழங்கும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

சியம்பலாண்டுவ பிரதேச சபை

பல்செயற்பாட்டு கட்டடம் - மினிபே பிரதேச சபை

Puraneguma Project 2015-2017

Ministry of Provincial Councils & Local Government

Province	Year	No of Sub Projects
Central	2015	18
	2016	6
	2017	5
North Central	2015	14
	2016	12
	2017	4
North Western	2015	19
	2017	2
Sabaragamuwa	2015	9
	2016	15
Southern	2015	20
	2016	7
Uva	2015	23
	2016	4
	2017	2
Western	2015	10
	2016	4
	2017	3
Grand Total		177

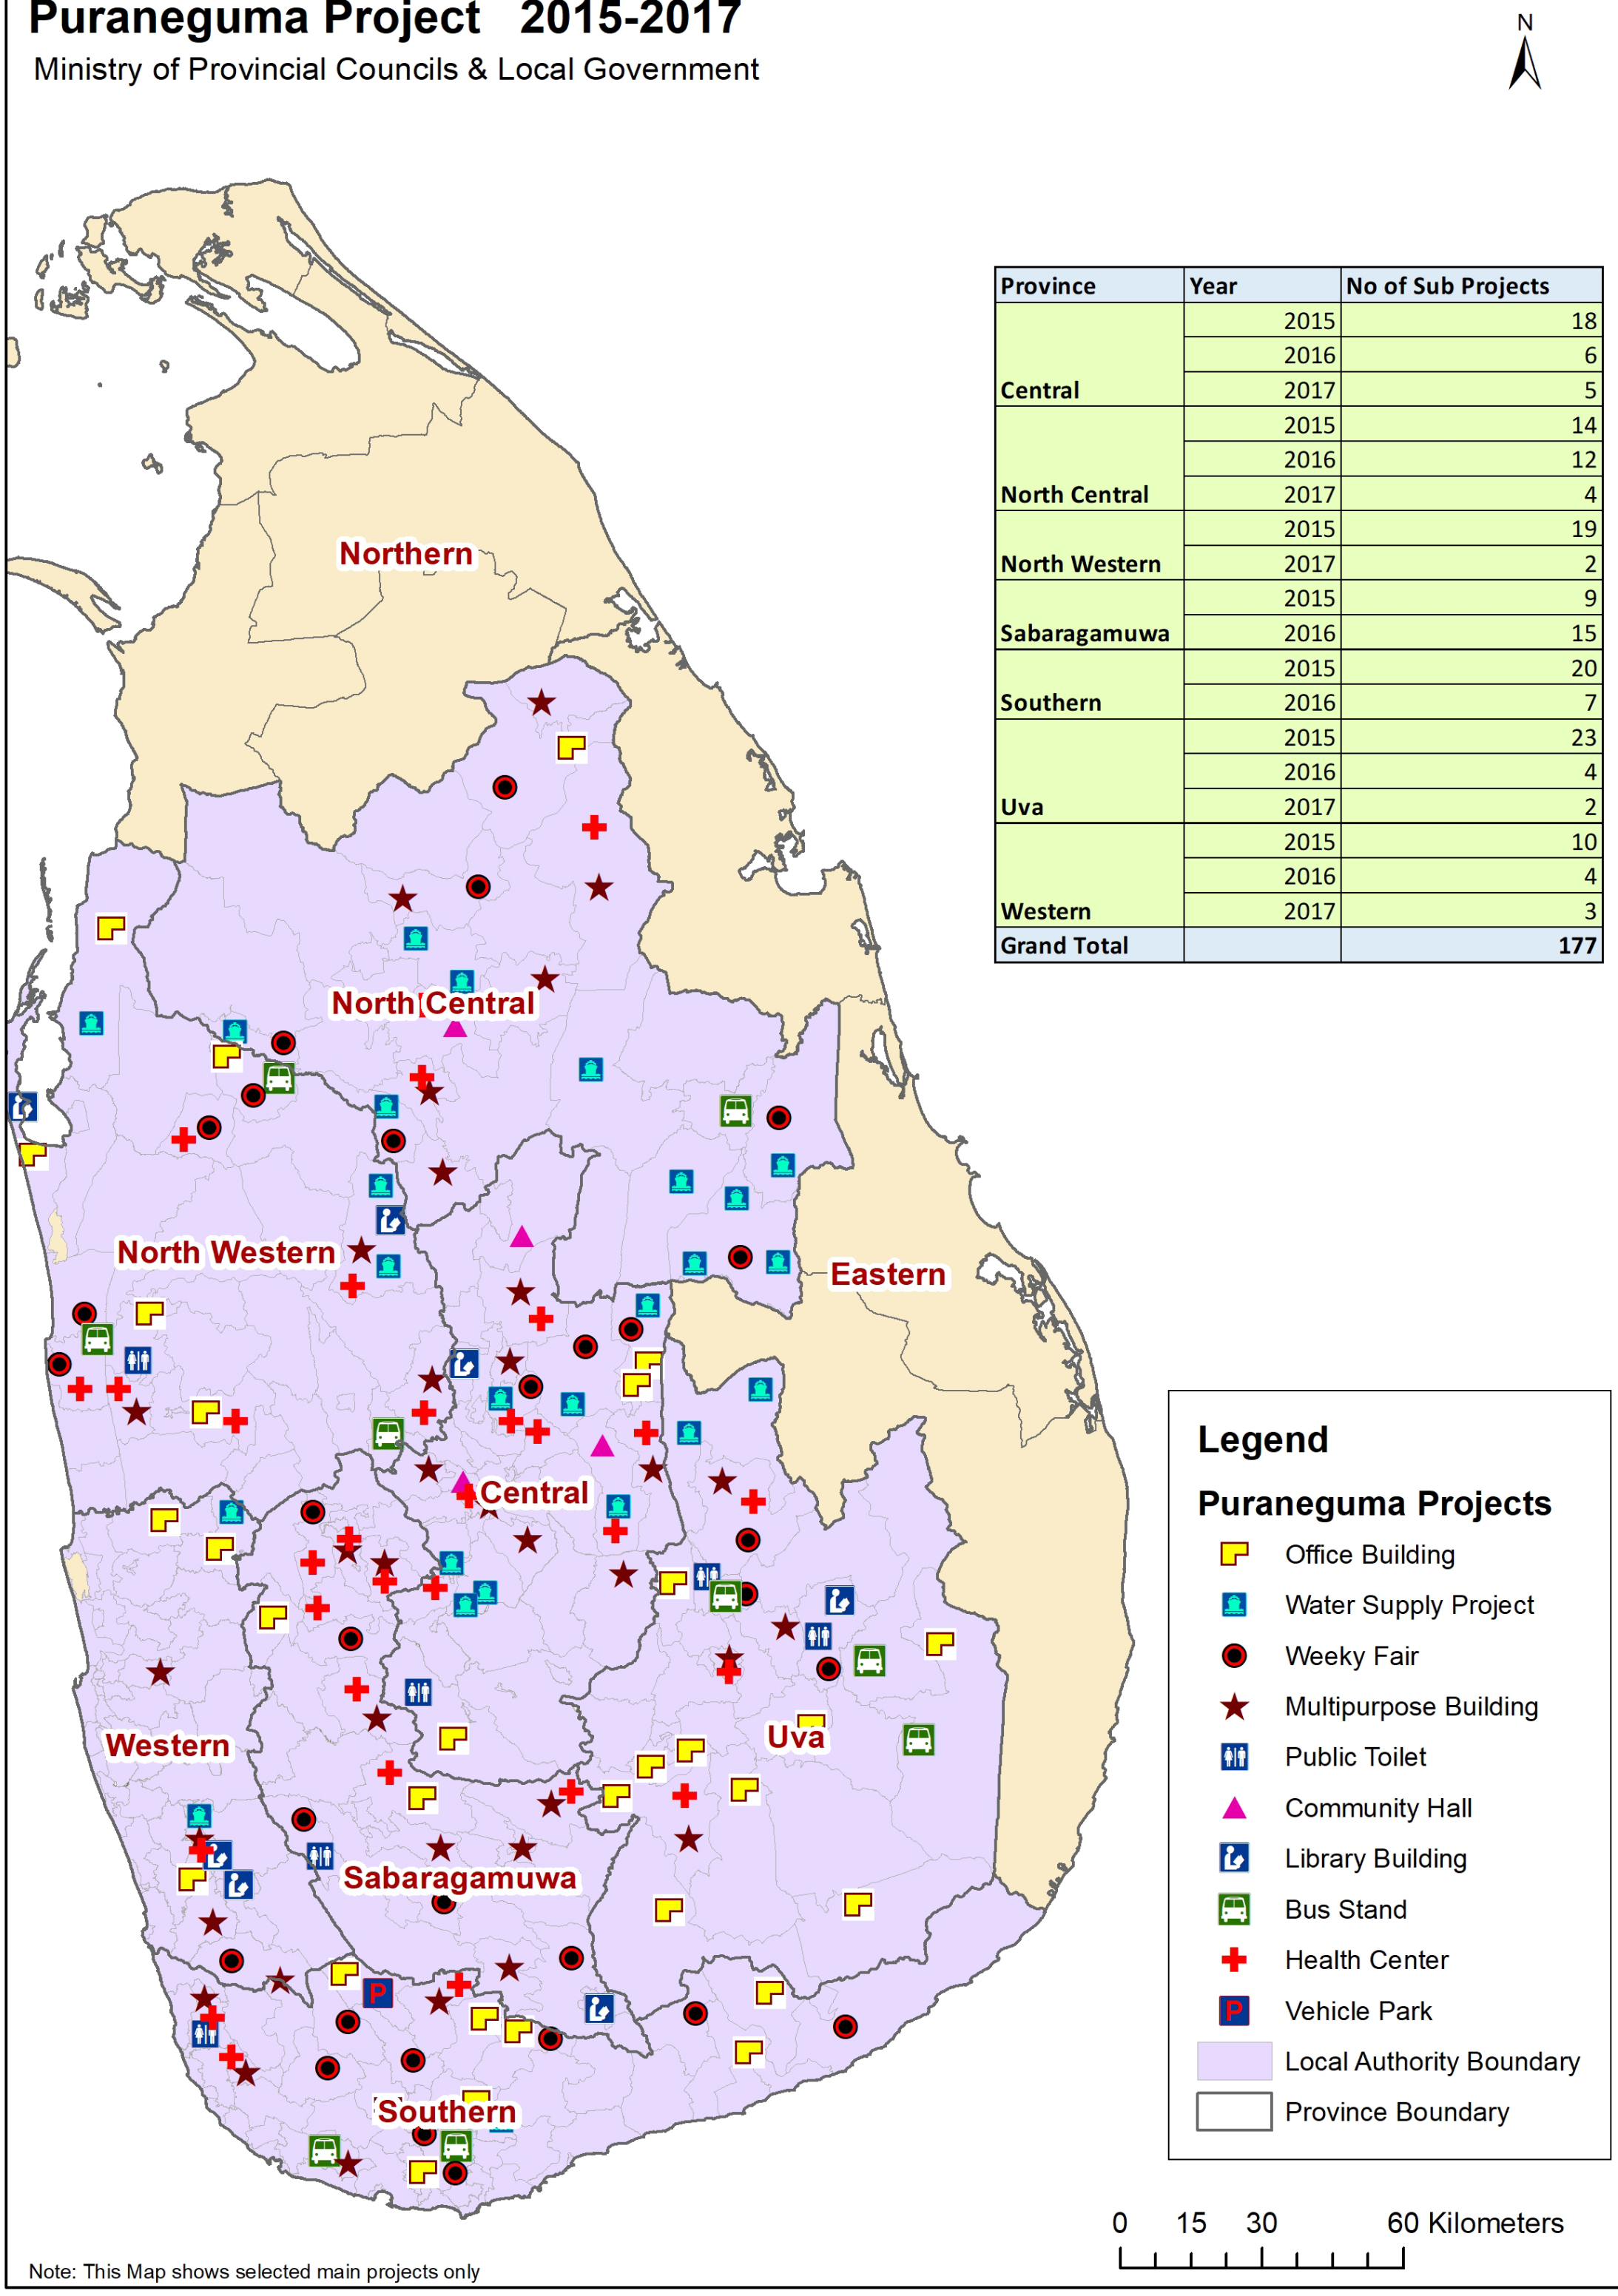

Note: This Map shows selected main projects only

மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏனைய செயற்திட்டச் செயற்பாடுகள்

- செயற்திட்டத்திற்காக இணையத் தளத்தை வகுத்தல் - ஐஐஐ.ரசயநெபரஅய.டம
- பிரச்சினைகளை சமநிலைப்படுத்தும் செயற்பாட்டு அபிவிருத்திகளை அமுல்படுத்தல்.
- ஆண், பெண் பால் சமநிலை தொடர்பான செயற்பாட்டுத் திட்டத்தை அமுல்படுத்தல்.
- பாதுகாப்பு முறையினை அமுல்படுத்தல்.

3.2.2.2. கொழும்பு பெரும்பாக கழிவுநீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டம்

கொழும்பு மற்றும் அதனைச் சூழவுள்ள நகரங்களில் வாழும் 838,000 மக்களுக்காகப் பொருத்தமான சுகாதார வளம்மிக்க சூழலை உருவாக்குவதன் மூலம் அதிசிறந்த வாழ்க்கை முறையினை வழங்கும் நோக்குடன் பாரிய கொழும்பு கழிவு நீர் முகாமைத்துவ செயற்திட்டம் திட்டமிடப்பட்டது. அத்துடன் இதன்மூலம் கொழும்பு பெரும்பாகப் பிரதேசத்தின் 2.5 மில்லியன் மக்களுக்காக வாழ்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமான சூழலை உருவாக்குவது இச் செயற்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

செயற்திட்டம் கொழும்பு, தெளிவளை - கல்கிசை, கொலன்னாவை ஆகிய 03 உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கொழும்பு பிரதேசத்தில் செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்தும் செயற்பாடுகள் கொழும்பு மாநகர சபையினால் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சு நிருவாகப் பணிகளை மேற்கொள்கின்றது.

தொழில்நுட்ப, தாபன, முகாமைத்துவ மற்றும் செயற்பாட்டுப் பின்னடைவுகள் ஆகிய பிரச்சினைகளுக்கான முன்னுரிமைத் தொடருக்கமைய முதலீடுகளை மேற்கொள்ளும் அடிப்படையில் செயற்திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. கொழும்பு மாநகர சபை எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள கழவுநீர் அகற்றும் தொகுதியினை நவீனமயப்படுத்துவதற்காக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நிதி (சந்தேகத்திற்குரிய நிதி உட்பட) ரூபா. 12,171 மில்லியன் என்பதுடன் இந் நிதி மூலம் 10,455 மில்லியன் இலங்கை அரசாங்கம் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்ட கடன் மூலம் வழங்கப்படுவதுடன் எஞ்சிய நிதி இலங்கை அரசாங்கத்தினால் முதலீடு செய்யப்படுகின்றது.

நோக்கம்

கொழும்பு நகரில் கழிவு நீர் வெளியேற்றும் முறைமையினை நவீன மயப்படுத்துவது மூலம் நகரில் மற்றும் அதனை சூழவுள்ள நகரங்களில் வாழும் நகர வாசிகளுக்காக முறையான கழிவுநீர் வெளியேற்றும் முறையினை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களுக்கு பொருத்தமான சுகாதார வளம்மிக்க சூழலை உருவாக்குதல்.

நிதி மூலம்	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, இலங்கை அரசாங்கம்	
மொத்த செயற்திட்ட செலவினம் (ரூபா. மில்)	12,171.00	
செயற்திட்ட காலம்	2010-2019	
அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	கொழும்பு மாநகர அதிகாரப் பிரதேசம்	
மொத்த பௌதீக முன்னேற்றங்கள்	8156.44	
மொத்த நிதி முன்னேற்றங்கள் (ரூபா. மில்)	77%	
2017 ஒதுக்கீடு ரூபா. மில்	3380.00	
2017.12.31 நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம்	3380.00	1775.74
2017.12.31 பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம்	85%	77%

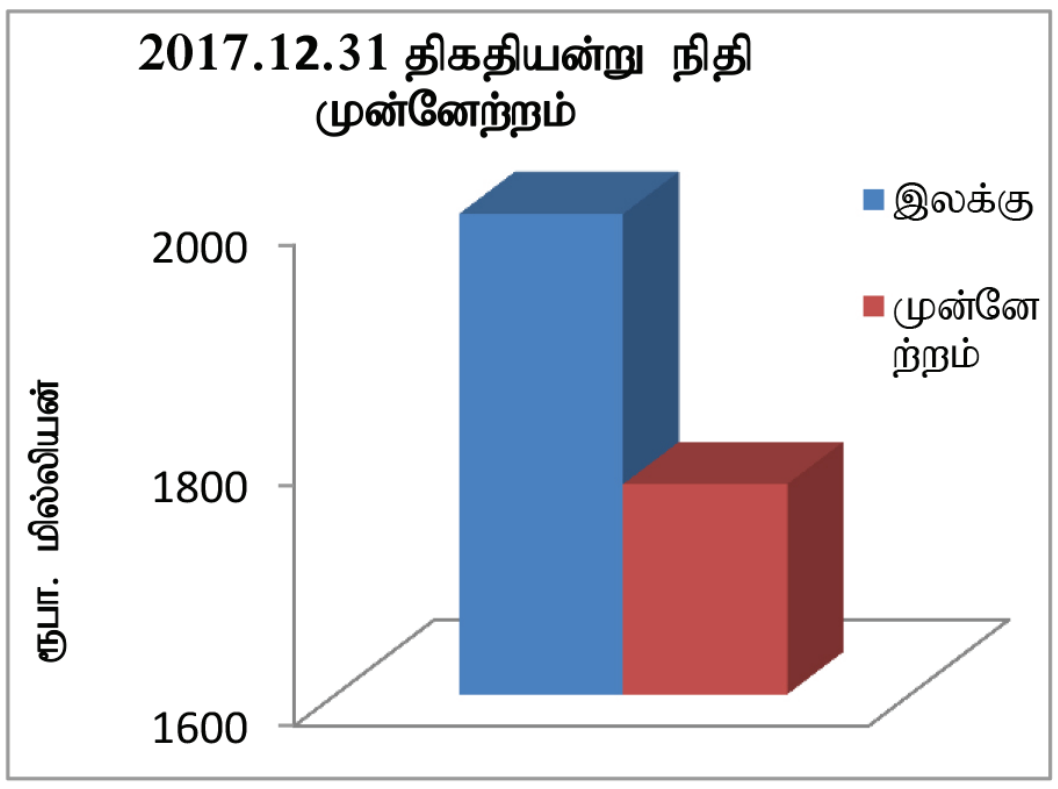

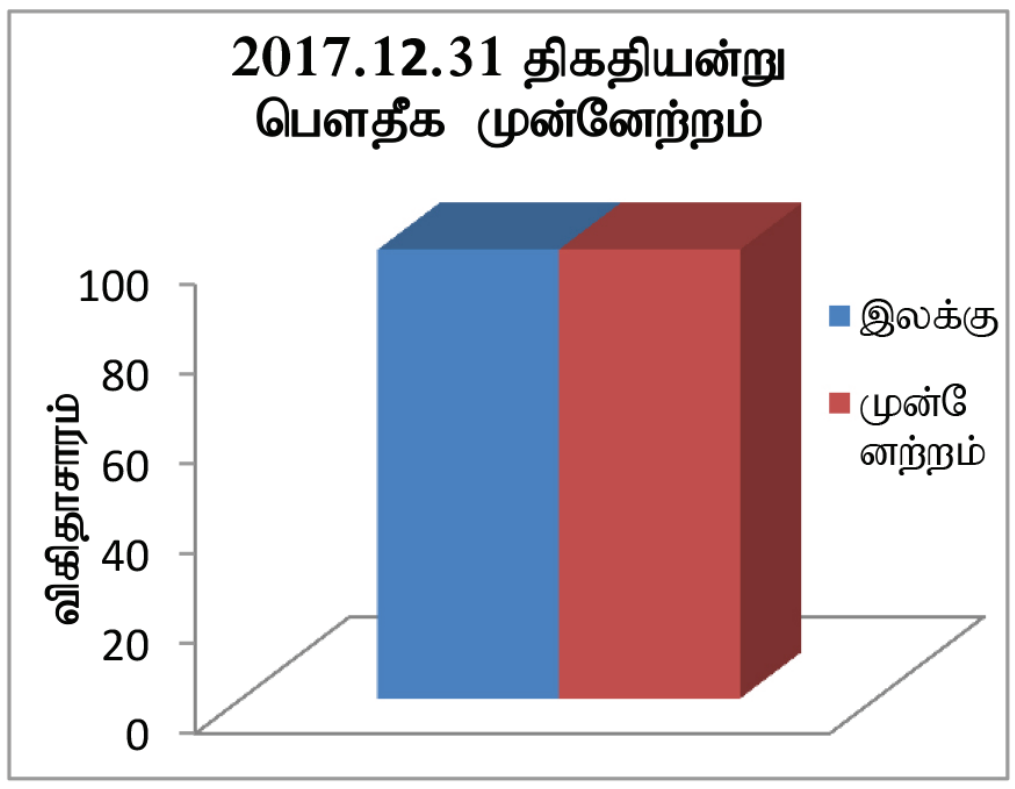

எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் மற்றும் செயற்பாட்டுத் திட்டங்கள் - 2017

தொ. இல	விபரங்கள்	2017 டிசம்பர் 30 முன்னேற்றம்	2018 செயற்பாட்டுத் திட்டங்கள்
01	வெள்ளவத்தை மற்றும் முதுவெல்லயில் உள்ள கழிவுநீரை கடலுக்குள் அனுப்பும் குழாய்த் தொகுதியினை புனரமைத்தல்	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
02	கழிவு நீர் வெளியேற்றும் குழாய் தொகுதியின் கொள்ளளவு குறைந்த 10 கிலோ மீற்றர் அளவில் கொள்ளளவினை மேம்படுத்தல் மற்றும் 125 கிலோ மீற்றர் தரப் பரிசோதனையை மேற்கொள்ளல்	கழிவு நீர் வெளியேற்றும் தொகுதியின் தர ஆய்வினை மேற்கொள்வதற்கு புள்ளிவிபரத் தொகுதியினை வகுப்பதற்காக முன்னெடுக்கப்படும் ஊஊவுஏ ஆய்வு உட்பட முறைமையினை சுத்தப்படுத்தும் வேலைத்திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. ரு1, ரு3, வு36 மற்றும் வு34 இடங்களில் நவீன மயப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆ26 இடத்தில் குழாய்த் தொகுதியினை இணைப்புச் செயற்பாடுகள் 63.18மூ பூர்த்தியடைந்துள்ளன. மொத்த பௌதீக முன்னேற்றங்கள் 93.4மூ சமூத்ர மாவத்தையில் மற்றும் ரஜின மாவத்தையில் 3.3 கிலோ மீற்றர் அளவு ஆஉைசழ வரநெடபைெ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கழிவுநீர் குழாய்த் தொகுதிகளை மீளப் பொருத்தும் பணிகள் பூர்த்தியடைந்துள்ளன.	மாளிகாவத்தை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு இடம் வரை M26 குழாய் நீர்த் தொகுதியினை நவீன மயப்படுத்தல்.

03	சிறைச்சாலையில் மேற்கொள்ளப்படும் தொடர்ந்தும் கழிவு நீர் வெளியேற்த்திற்காக தீர்வாக மேற்கொள்ளக்கூடிய வனாத்தமுல்ல பிரதேசத்தின் 02 கிலோ மீற்றர் கழிவு நீர் குழாய்களை நவீன மயப்படுத்தல்.	சீவலி மாவத்தையில் மற்றும் சரனபால மாவத்தையில் 662 மீற்றர் கழிவு நீர்க் குழாய்கள் பொருத்தப்படுவதுடன் மனுவில் 27 நிர்மானப் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. மொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் 65மூ பௌதீக முன்னேற்றம் 65மூ	ஒப்பந்தம் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது
04	கொழும்பு நகர பிரதேசத்திற்குள் கழிவு நீர் வெளியேற்றும் 14 பம்பிகளை நவீன மயப்படுத்தல்.	பம்பியினை புதிதாக நிர்மானித்தல் மற்றும் நவீன மயப்படுத்தும் செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றங்கள் கீழக் குறிப்பிடப்பட்டவாறு அமைகின்றன.	பம்பி நிலையத்தை நிர்மானித்தல் மற்றும் வனாத்தமுல்ல பிஸ்ரிக் குழாய்த் தொகுதிகளை பொருத்துதல், பிரதான வேலைத்தளத்தின் நிர்மானப் பணிகளை பூர்த்தி செய்தல்.
		மத்திய செயற்பாட்டு அலகு மற்றும் புதிய 4 பம்பிகளின் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரதான வேலைத்தளத்தின் செயற்பாடுகளில் 84.4மூ பூர்த்தியடைந்துள்ளன. வனாத்தமுல்ல பம்பி 50% மாளிகாவத்தை 34.4% பொரள்ளை 2.7% பம்பலப்பிட்டி 53.3% விஸ்ரிவிக் 40.7% திம்பிரிகஸ்யாய 32.4% ஊளு3 19.5% ளுடயளநஜளடயனெ 18.3% மொத்த முன்னேற்றம் 28.9%	பம்பி நிலையத்தை நிர்மானித்தல் மற்றும் வனாத்தமுல்ல பிஸ்ரிக் குழாய்த் தொகுதிகளை பொருத்துதல், பிரதான வேலைத்தளத்தின் நிர்மானப் பணிகளை பூர்த்தி செய்தல்.

05	CS19 கழிவுநீர் தொகுதியினை நவீன மயப்படுத்தல் மற்றும் வனாத்தமுல்ல கழிவு நீர் வெளியேற்றும் தொகுதியை அபிவிருத்தி செய்தல்.	பெறுகைச் செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.	ஒப்பந்தம் வழங்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப் பட்டுள்ளன.
06	மீள் குடியமர்த்தல்	மல்லிகாராம வீதி மற்றும் புகையிர விடுதி வீதி மற்றும் இடங்களில் சட்ட விரோதமாக குடியமர்ந்துள்ள 11 குடும்பங்கள் கோணமுல்ல “ரந்தியஉயன” வீடுகளில் குடியமர்த்தும் பணிகளை மேற்கொள்ளல்.	குடியமர்த்தும் செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.

3.2.2.3. கொழும்பு பெரும்பாக நீர் முகாமைத்துவத்தை விருத்தி செய்யும் முதலீட்டு வேலைத்திட்டம் ளள - (GCWWMIIP)

கட்டம் 2 மற்றும் கட்டம் 3

கொழும்பு மாநகர சபை எல்லைப் பிரதேசத்திற்குள் வினைத்திறன் மற்றும் தொடர்ச்சியான நீர் வழங்கல் மற்றும் முறையான கழிவு நீர் சேவைகளை வழங்க கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவு நீர் முகாமைத்துவத்தை விருத்தி செய்வது முதலீட்டு வேலைத்திட்டத்தின் எதிர்பார்ப்பாகும்.

இலங்கை அரசாங்கத்தினால் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் பல்செயற்பாட்டு அபிவிருத்தி யோசனை வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் தற்போது அமுலில் உள்ள கொழும்பு கழிவுநீர் அகற்றும் தொகுதியின் புணரமைப்புப் பணிகளை தொடர்ந்தும் முன்னெடுப்பதற்கு மற்றும் கொழும்பு பிரதேச நீர் மற்றும் கழிவுநீர் வசதிகளை விருத்தி செய்வதற்கு வழங்கும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் மூலம் கொழும்பு தெற்கு பிரதேசத்தின் எதிர்கால புதிய அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளுக்குப் பொருத்தமானவாறு கழிவு நீர் அகற்றும் தொகுதியினைத் தாபித்தல். தற்போது கழிவு நீர் அகற்றும் வசதிகள் அற்ற பிரதேசங்களுக்காக கழிவு நீர் அகற்றும் தொகுதிகளைத் தாபித்தல் மற்றும் கழிவு நீரை கடலுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்னர் சுத்திகரிப்புக்கள் மேற்கொள்ளவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இலங்கை அரசு இதற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதியத்திற்கு மேலதிகமாக குறைநிரப்பு நிதியம் ஐரோப்பிய முதலீட்டு வங்கியிலிருந்து (நுஐடீ) பெற்றுக் கொள்ள எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

நோக்கம்

கொழும்பு மாநகர சபை எல்லைக்குள் வினைத்திறன் மற்றும் தொடர்ச்சியாக நீர் விநியோக சேவைகளை வழங்குதல்.

நிதி மூலம்	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, இலங்கை அரசாங்கம்
மொத்த செயற்திட்ட செலவினம் (ரூபா.மில்)	
கட்டம் 2	1396.0
கட்டம் 3	26,061.00
செயற்திட்ட காலம்	
கட்டம் 2	2014-2019
கட்டம் 2	2015-2020

அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	கொழும்பு மாநகர அதிகாரப் பிரதேசம்	
மொத்த நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா. மில்)	902.53	
மொத்த பௌதீக முன்னேற்ம்	6.8%	
கட்டம் 2		
2017 ஒதுக்கீடு (ரூபா. மில்லியன்)	280	
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம் (ரூபா.மில்)	280	74.3%
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம்	26.9%	22.5%
கட்டம் 3		
2017 ஒதுக்கீடு (ரூபா. மில்லியன்)	2456	
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம் (ரூபா.மில்)	2456	776.1
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம்	7.6%	5.9%

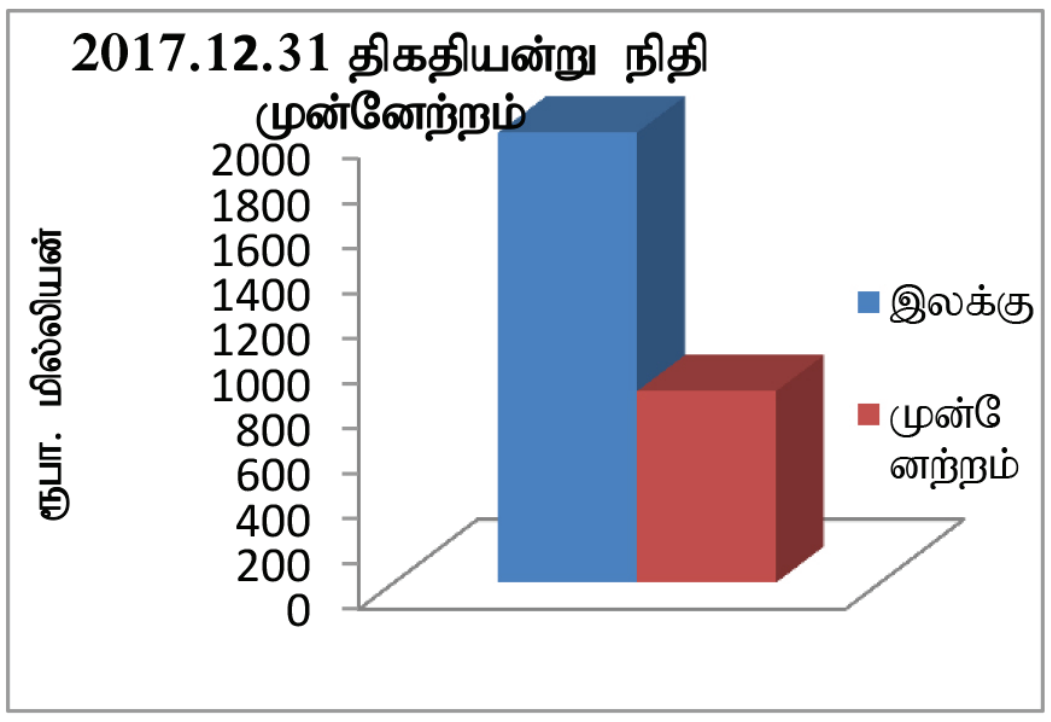

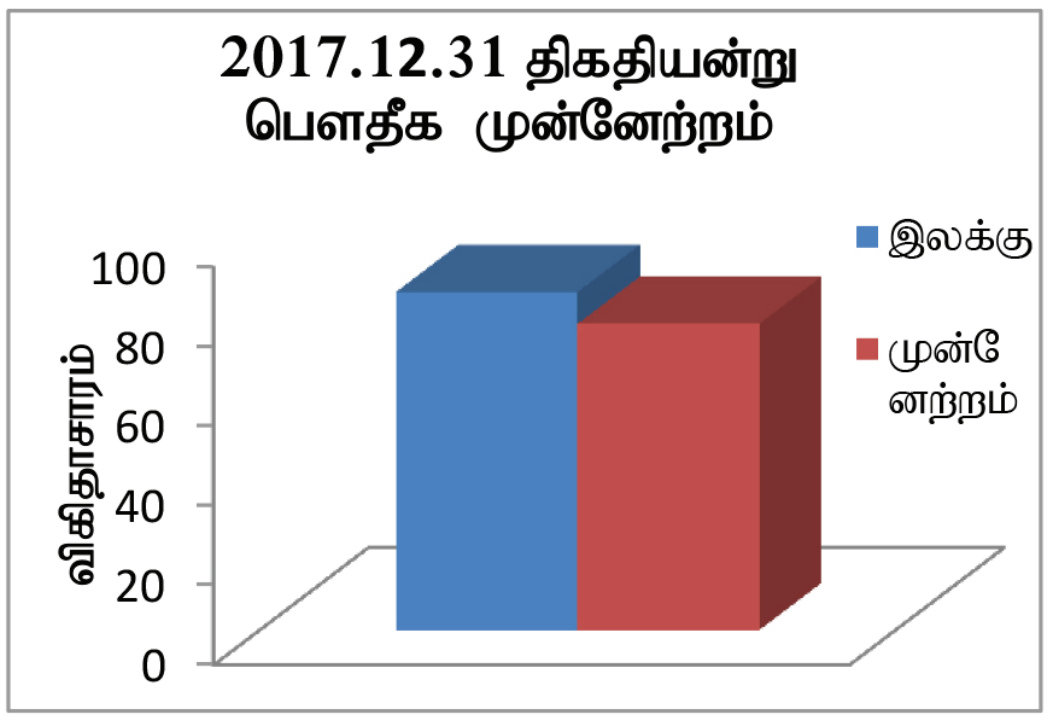

எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னேற்றங்கள் மற்றும் செயற்பாட்டுத் திட்டங்கள் - 2018

தொ. இல	விபரங்கள்	2017 டிசம்பர் 31 முன்னேற்றம்	2018 செயற்பாட்டுத் திட்டங்கள்

01	திட்டமிலை மேற்கொள்ளல், மேற்பார்வைகளை மேற்கொள்ளல் மற்றும் நிறுவன அபிவிருத்திக்காக உதவும் ஆலோசகர்கள்	வடக்கில் போசிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களைத் திட்டமிடல் தெற்கில் போசிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களைத் திட்டமிடல் பௌதீன முன்னேற்றம் 16.5மூ	வடக்கு மற்றும் தெற்கில் போசிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் கழிவு நீர்த் தொகுதிகளை அபிவிருத்தி செய்யும் பணிகளை திட்டமிடல், கிருளப்பனை மற்றும் வெள்ளவத்தை நிர்மான மேற்பார்வைகளை மேற்கொள்ளல். துறைமுக நகர அபிவிருத்தியுடன் இணைப்புச் செய்வதன் மூலம் செயற்திட்டம் மேலும் விரிவுபடுத்தப் பட்டுள்ளது.
02	கழிவு நீர்த் தொகுதி 125 கிலோ மீற்றர் ஊஊவுஏ ஆய்வுகள் மற்றும் சுத்தப்படுத்துவதன் மூலம் தர ஆய்வினை மேற்கொள்ளல்.	கழிவு நீர்த் தொகுதியின் தர ஆய்வுப் பணிகளை இனங்கண்டு அதற்காக பெறுகைச் செயற்பாடுகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.	ஊஊவுஏ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கழிவுநீர் வெளியேற்றும் தொகுதியின் தர ஆய்வுகள்
03	தற்போது கொழும்பு கிருளப்பனை பிரதேசத்தில் கழிவுநீர் அகற்றும் வசதிகள் அற்ற பிரதேசங்களை தழுவக்கூடியவாறு 29.40 கிலோ மீற்றர் தூரத்திற்கு கழிவுநீர் தொகுதி மற்றும் 03 பம்பிகளை நிர்மானித்தல்.	பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. பௌதீக முன்னேற்றம் 7.4மூ	பம்பி மற்றும் கழிவுநீர்த் தொகுதியினை நிர்மானித்தல்.

04	15.61 கிலோ மீற்றர் கழிவுநீர் குழாய் தொகுதிகளைப் பழுது பார்த்தல், மீளப் பொருத்துதல் மற்றும் சுத்தப்படுத்துவதன் மூலம் கொழும்பு தெற்கு கழிவு நீர் ஊட்டல் பிரதேசத்தில் தற்போது காணப்படும் கழிவு நீர்த் தொகுதியின் கழிவு நீர் குழாய்களின் செயற்பாடுகள் வீழ்ச்சியடைந்து தடைப்பட்டிருத்தல் மற்றும் சேறு உட்பட மணல் சேர்த்திருப்பதை இனங்காணுதல் மற்றும் தீர்வுகளை எட்டுதல்.	திட்டமிடல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பௌதீக முன்னேற்றம் 10.4.மூ	ஒப்பந்த வழங்கல்களை மேற்கொள்ளல் மற்றும் கழிவுநீர் கொண்டு செல்லும் தொகுதியினை புணரமைத்தல்.
05	கொழும்பு தெற்கு ஊட்டல் பிரதேசங்களில் 6.22 கிலோமீற்றர் நீளம் கொண்ட கழிவு நீர்த் தொகுதி மற்றும் 03 பம்பிகளை நிர்மானித்தல்.	மண் மாதிரிகளை ஆய்விற்குட்படுத்தல், துறைசார்ந்த பரிசோதனைப் பணிகள், கழிவு நீர் வெளியேற்றல் மற்றும் பம்பி தொகுதியினை திட்டமிடல் பணிகள் பூர்த்தியடைந்துள்ளன. பம்பியினை பொருத்துவதற்காக கணியினை சுவிகரித்தலில் பௌதீக முன்னேற்றம் 22மூ	ஒப்பந்த வழங்கல்கள் மற்றும் கழிவு நீர் வெளியேற்றம் தொகுதியினை நிர்மானித்தல்.

06	திட்ட நிர்மானிப்பு மற்றும் செயற்பாட்டு முறைகளின் கீழ் நாளொன்றுக்கு 50000 கனமீற்றர் கொள்ளளவினை கொண்ட இரட்டை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு கைத்தொழிற்சாலையினை வெள்ளவத்தை பிரதேசத்தில் நிர்மானித்தல்.	பெறுகைச் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வதன் பௌதீக முன்னேற்றம் 5ழு	ஒப்பந்த வழங்கல்களை மேற்கொள்ளல் ஆய்வுப் பணிகள் உட்பட திட்டங்களை வகுத்தல்.
06	மீள் குடியேற்றம்	கிருளப்பனை கழிவுநீர் செயற்திட்டத்தின் கீழ் 10 குடும்பங்கள் கொலன்னாவை “லக்சிறி செவன” வீடுகளில் குடியமர்த்தத் திட்டமிடல்	உரிய குடும்பங்களைக் குடியமர்த்தல்.

3.2.2.4. வட மாகாண வீதி இணைப்புச் செயற்திட்டம் (ஆரம்பம்)

நோக்கம்
வடமாகாணத்தில் வவுனியா மற்றும் மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களில் வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் மாகாணத்திற்கு இணைப்பினை விருத்தி செய்தல் உட்பட வடமாகாண வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தைப் பலப்படுத்தல்.

	கடனுதவி வழங்கும் நிறுவனம்	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி	
	செயற்திட்ட செலவினம் (ரூபா. மில்)	3600.00	
	செயற்திட்ட காலம்	2010 - 2016	
	அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	வடமாகாணம்	
	மொத்த பௌதீக முன்னேற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள்	100%	
	மொத்த நிதி முன்னேற்றங்கள் (ரூபா. மில்)	3281.11	
	2017 ஒதுக்கீடு ரூபா. மில்	200.31	
	2017.12.31 ஆம் திகதியன்று நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம்	200.31	149.78
	2017.12.31 ஆம் திகதியன்று பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம்	100%	100%

இலங்கை அரசாங்கத்தின் கோரிக்கைக்கமைய ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் 173 மில்லியன் அ.டொலர் கடனுதவி நாட்டின் வடமாகாணத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாகாண வீதிகளைப் புணரமைப்பதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 24.4 மி.அ.டொலர் மாகாண உள்ளீட்டின் கீழ் வட மாகாணத்தின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாகாண வீதிகள் 154 கிலோ மீற்றரைப் புணரமைப்பதற்காக மற்றும் வட மாகாண வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தைப் பலப்படுத்துவதற்காகவும் பயன்படுத்த எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

அமுல்படுத்தும் நிறுவனம்
வட மாகாணத்தின் மாகாண வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

பௌதீக முன்னேற்றங்கள்

இச் செயற்திட்டத்தின் மாகாண உள்ளீட்டின் கீழ் வட மாகாண வீதி ஒப்பந்தங்கள் 08 மற்றும் கட்டட ஒப்பந்தம் 01 வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், ஏற்கனவே இவ் வீதியின் 08 ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கட்டட ஒப்பந்தங்களின் பணிகள் பூர்த்தியடைந்துள்ளன.

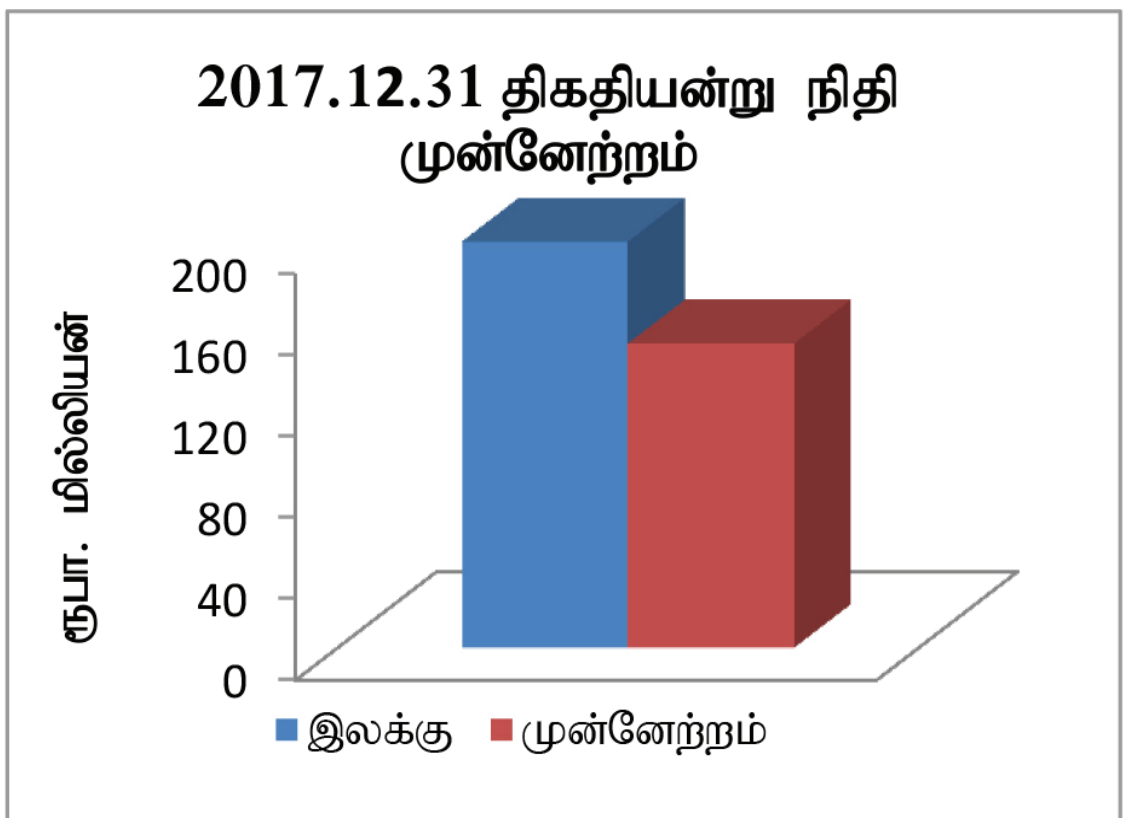

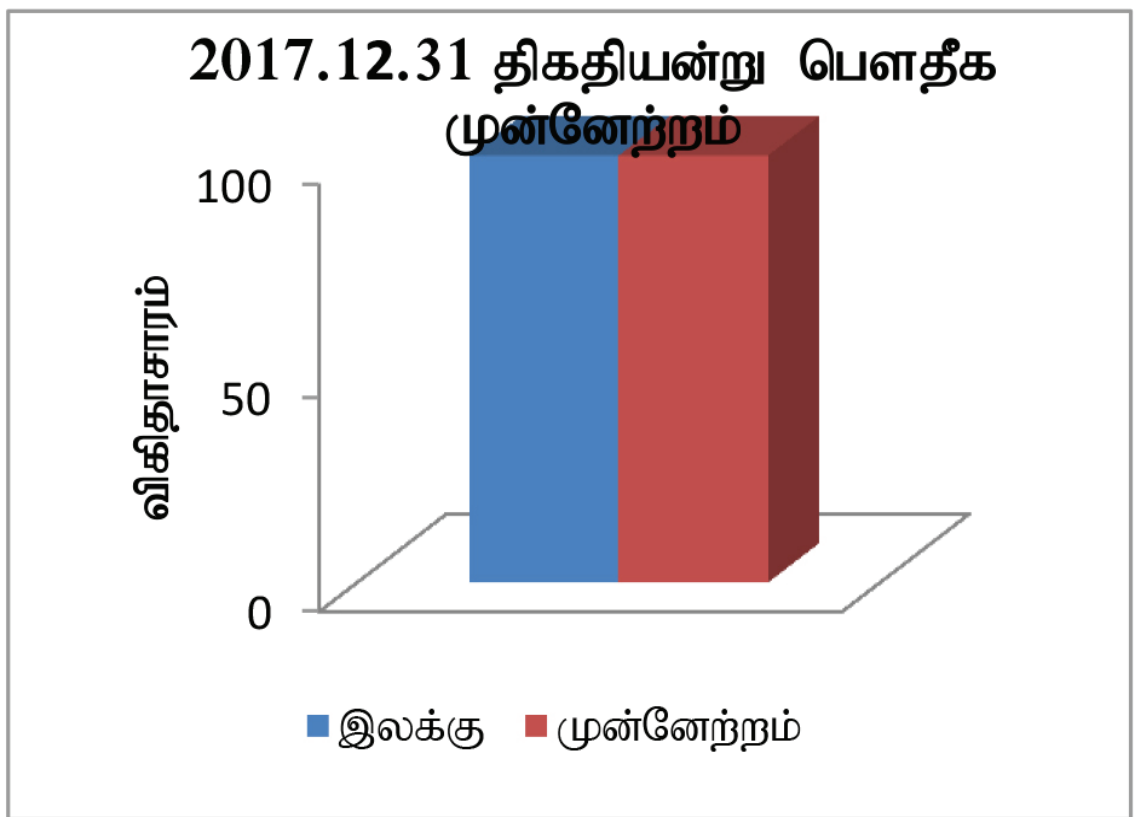

அட்டவணை இலக்கம் 17 - வடமாகாண வீதி தொடர்பான செயற்திட்டம் (ஆரம்பம்) 2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)

ஒப்பந்த இலக்கம்	மாவட்டம்	ஆரம்ப ஒப்பந்தப் பெறுமதி	மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஊழு பெறுமதி ரூபா. மில்	உண்மையான செலவினம் ரூபா. மில்	நிதி முன்னேற்றம்	செயற்திட்டக் காலம்		பௌதீக முன்னேற்றம்	
						ஆரம்பத் திகதி	இறுதித் திகதி	இலக்கு %	உண்மையான %
NP - 01	மன்னார்	414.06	457.93	437.12	95.46%	2011-10-02	21/06/2013	100%	100%
NP - 02		413.23	454.72	448.03	98.53%	2011-11-02	31/05/2014	Mutually Terminated	
NP - 03		371.68	378.32	364.34	96.31%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 02R		345.54	345.54	313.67	90.78%	24/02/2015	31/07/2016	100%	100%
NP - 09		507.69	507.69	455.84	89.79%	16/03/2015	30/09/2016	100%	100%
NP - 04	வவுனியா	351.92	351.92	312.40	88.77%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 05		390.64	448.44	426.08	95.02%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 06			279.11	263.38	94.36%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%

NP - 07	யாழ்ப்பாணம் PRDD கட்டடம்	76.69	88.24	83.32	94.42%	2014-10-06	2015-09-06	100%	100%
மொத்தம		**3,227**	**3,312**	3,104.18					

மூலம் - வடமாகாண வீதி இணைப்புச் செயற்திட்டம் (ஆரம்பம்)

வ.மா-03 - உனிக்குளம் - மாங்குளம் நானந்தன் வாய்க்கால் தொகுதி நிர்மானிப்பு

வ.மா-03 - உனிக்குளம் - மாங்குளம் நானந்தன் வாய்க்கால் தொகுதி நிர்மானிப்பு

வ.மா - 02சு - வேப்பம்குளம் பெரிய முறிப்பு வீதி (MAC029)

வ.மா - 02சு - வேப்பம்குளம் பெரிய முறிப்பு வீதி (MAC029)

வ.மா - 09 - மகிழங்குளம் பாலமடு வீதி (MAC028)

வ.மா - 09 - மகிழங்குளம் பாலமடு வீதி (MAC028)

வ.மா - 4 - இரட்டைபெரியகுளம் புதூர் வீதி (VAC027)

வ.மா - 04 - பண்டிவிரிச்சான் அன்டியபுளியங்குளம் வீதி (VAC034)

வ.மா - 05 - மடுகந்தை இரட்டைபெரியகுளம் வீதி (VAC007)

வ.மா - 05 - மகிழங்குளம் பாலமடு வீதி (VAC010)

வ.மா - 5 - மகிழங்குளம் பாலமடு வீதி

வ.மா - 05- மடுகந்தை இரட்டைபெரியகுளம் வீதி

வ.மா - 06 - மாங்குளம் மருதமடு மிங்கெட்டிகம வீதி (VAC032)

வ.மா - 06 - புதுார் பாலமேட்டை வீதி (VAC014)

3.2.2.5. வடமாகாண வீதி இணைப்புச் செயற்திட்டம் (மேலதிக ஒதுக்கீடு)

நோக்கம்

வடமாகாணத்தில் கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு ஆகிய இரு மாவட்டங்களில் மற்றும் வடமத்திய மாகாணத்தில் அனுராதபுர மாவட்டத்தில் வீதி வலையமைப்பினை விருத்தி செய்வதன் மூலம் மாகாணத்தின் உள்ளக இணைப்புக்களை விருத்தி செய்தல் மற்றும் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி நிறுவனத்தைப் பலப்படுத்தல்.

கடனுதவி வழங்கும் நிறுவனம்	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி	
செயற்திட்ட செலவினம் (ரூபா. மில்)	4,600.00	
செயற்திட்ட காலம்	2013 - 2018	
அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	வட மாகாணம் மற்றும் வட மத்திய மாகாணம்	
மொத்த பௌதீக முன்னேற்றங்கள்	98%	
மொத்த நிதி முன்னேற்றங்கள் (ரூபா. மில்)	4104.26	
2017 ஒதுக்கீடு ரூபா. மில்	600.72	
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம்	600.00	360.76
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம்	100%	98%

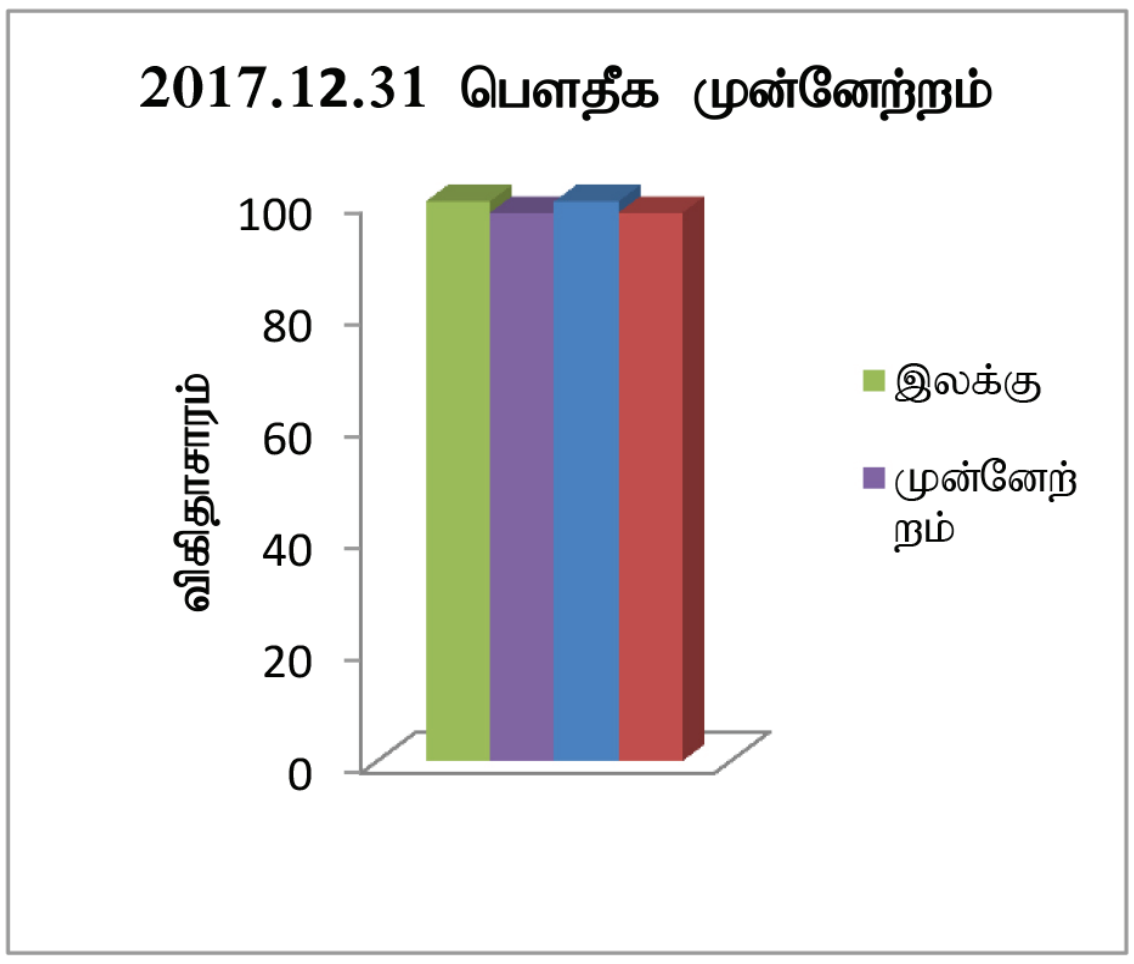

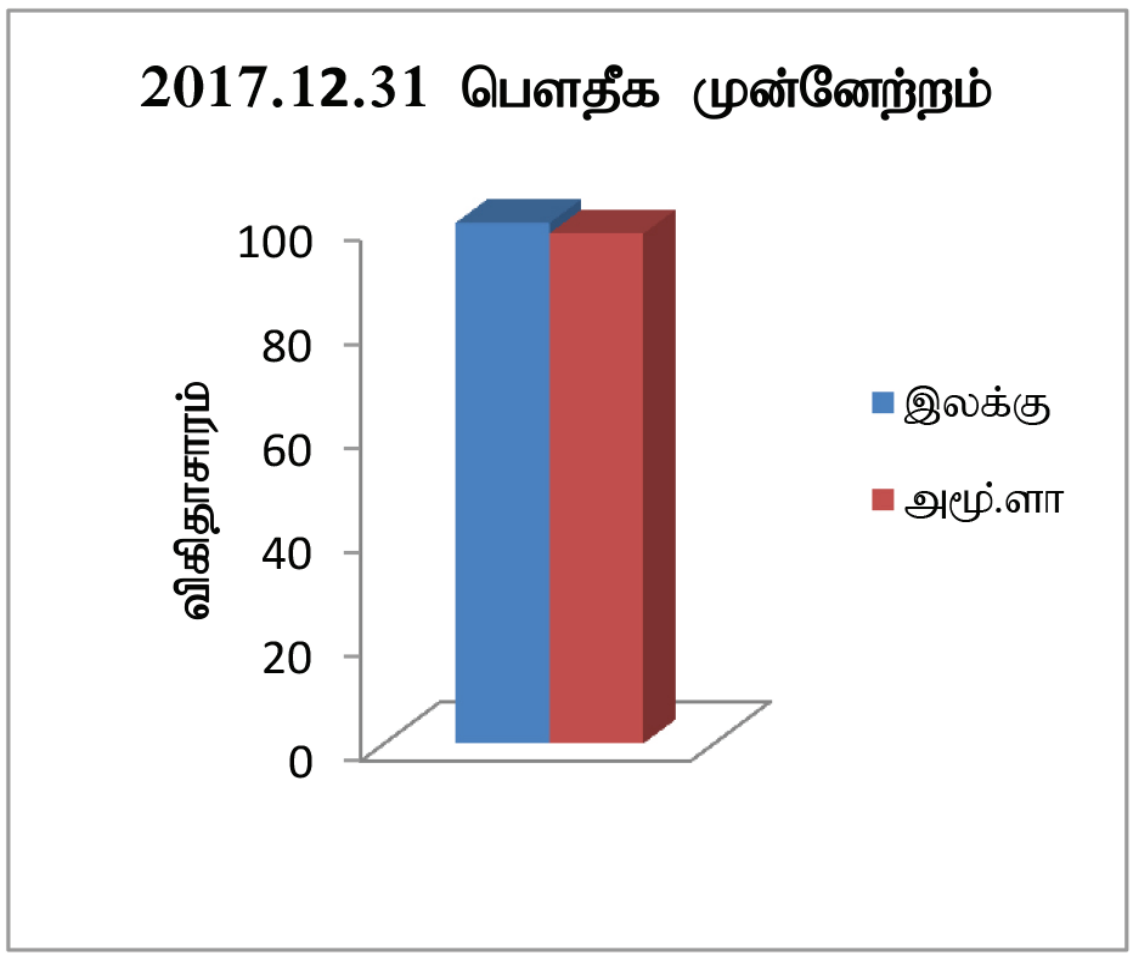

ஆரம்பச் செயற்திட்டத்தின் வெற்றியினை அடிப்படையாகக் கொண்டு இலங்கை அரசாங்கத்தின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் வட மாகாண வீதி தொடர்பான செயற்திட்டத்திற்கு மேலதிக நிதியாக 68 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் கடனுதவி நாட்டின் வடபகுதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாகாண வீதியினைப் புணரமைப்பதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 30 மில்லியன் அ.டொலர் மாகாண உள்ளீட்டின் கீழ் வடக்கு மற்றும் வட மத்திய மாகாணங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாகாண வீதிகள் 125 கி.மீற்றர் புணரமைப்பதற்காக மற்றும் வடக்கு மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களில் வீதி சார்ந்த நிறுவனத்தினைப் பலப்படுத்துவதற்காகவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அமுல்படுத்தும் நிறுவனம்

வடமாகாணத்தில் மாகாண வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம் மற்றும் வட மத்திய மாகாணத்தில் மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை

பௌதீக முன்னேற்றங்கள்

மேலதிக நிதியின் கீழ் வடமத்திய மாகாணத்தில் 05 வீதி ஒப்பந்தங்களும், வட மாகாணத்தில் 04 வீதி ஒப்பந்தங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் வடமத்திய மாகாணத்தில் 05 ஒப்பந்தங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், வடமாகாணத்தில் 04 ஒப்பந்தங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் 05 வருட காலங்களுக்காக அவ் வீதிப் பராமரிப்புப் பணிகளுக்கு உரியதாக ஒப்பந்ததாரரினால் தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படவுள்ளன. இவ் ஒப்பந்ததாரர்களின் குறைபாடுகள் நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றன.

NRCP/NP/NCB/MU-03
வற்றாப்பளை கேப்பாப்பிளவு புதுக்குடியிருப்பு வீதி (MUC011)

NRCP/NP/NCB/MU-03
வற்றாப்பளை கேப்பாப்பிளவு புதுக்குடியிருப்பு வீதி (MUC011)

NRCP/NP/NCB/KL-06
L.B ஆயபைெ ஊாட.சுழயன அக்கராயன்குளம் வீதி (KLC004)

NRCP/NP/NCB/KL-06
R.B Main Chl.Road அக்கராயன்குளம் வீதி (KLC014)

கென்னடி வீதி

ஒட்டிசுட்டான் - புதுக்குடியிருப்பு மாத்தளன் வீதி

அட்டவணை இலக்கம் 18 - தற்போது அமுலில் உள்ள வீதிகளின் முன்னேற்றங்கள் - வட மாகாண வீதி இணைப்புச் செயற்திட்டம் (மேலதிக ஒதுக்கீடு)

மாகாணம்	மாவட்டம்	வீதியின் பெயர	நீளம் (கி.மீற்)	மதிப்பீடு ரூபா.மில்	செலவினம் ரூபா. மில்	நிதி முன்னேற்றம் ூ	பௌதீக முன்னேற்றம்	
							இலக்கு	முன்னேற்றம் ூ

வடக்கு	கிளிநொச்சி	எல்.பி பிரதான வீதி, அக்கராயன்குளம் வீதி (7.06 கி.மீ),	13.66	473.19	307.45	64.97%	100%	78%
		வற்றாப்பளை - கேப்பாய்ப்பிளவு புதுக்குடியிருப்பு வீதி ஒட்டிசுட்டான் புதுக்குடியிருப்பு புதுமாத்தளன் வீதி	10.45	456.55	451.33	98.86%	100%	100%
வடக்கு	முல்லைதீவு	வற்றாப்பளை - கேப்பாய்ப்பிளவு புதுக்குடியிருப்பு வீதி	12.85	647.63	566.21	87.43%	100%	97%
		ஒட்டிசுட்டான் புதுக்குடியிருப்பு புதுமாத்தளன் வீதி	11.64	463.38	421.75	91.39%	100%	100%
வட மத்தி	ரமஙசனமூஅஙசா	கெப்பிதிகொல்லாவ கந்தகல வீதி	12.09	295.34	282.11	95.52%	100%	100%
		தஞ்சிதமன பழைய கல்மில்லாவ வீதி (கி.மீ 4.70) வீதி 5.68 (கி.மீ)	10.35	343.31	266.94	77.76%	100%	100%
		கிரிகத்வெவ பண்டார உள்பத்த கெப்புகொல்லாவ வீதி	20.30	559.91	484.51	86.53%	100%	100%
		யக்காவெவ மகா கொங்கஸ்கட வீதி	13.80	458.55	388.63	84.75%	100%	100%
		அத்கந்த அடகமகஸ் வீதி (6.80 கி.மீ) கிரிகொல்லாவ கீருள்கம வீதி (11.5 கி.மீ)	18.30	408.80	356.25	87.15%	100%	100%
மொத்தம்			**124.25**	**4104.81**	**853.98**	**85.88**		

3.2.2.6. யாழ்ப்பாணம் - கிளிநொச்சி நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் செயற்திட்டம்

நோக்கம்

யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களில் நீர் வழங்கல் சேவைகளை விருத்தி செய்வதற்காக யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை எல்லைக்குள் மக்களுக்காக சுத்திகரிப்பு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் யாழ் குடாநாட்டில் நீர்வழங்கல் முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டத்தை பலப்படுத்தும் பல்வேறு பிரவேசங்களின் கீழ் முறைமை நீர்ப்பாசன மாகாணத்தின் வடக்கு புணரமைப்புப் பணிகளுக்காக அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள முதலாவது நீர்ப்பாசன செயற்திட்டம் இதுவாகும். இப்பிரவேசங்களுக்கிடையே நீர் முகாமைத்துவம், விவசாயம் மற்றும் சந்தைப்படுத்தலின் கீழ் முன்னேற்றங்கள் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன. நீர்ப்பாசன கூட்டிணைந்த முகாமைத்துவம், பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக நிதி ஒதுக்குதல், விவசாய செயற்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்காக செயற்திட்டக் குழுவினைத் தாபித்தல், மொத்த அடிப்படையில் நீர் விநியோக ஒதுக்கீட்டு முறைகளின் கீழ் விநியோகித்தல், வர்த்தக உடன்படிக்கை செய்து கொள்வதற்காக சந்தைப்படுத்தல் ஊக்குவிப்புப் பணிகள் மற்றும் விவசாய வர்த்தகத்திற்காக கடன்வசதிகளை வழங்குதல். போன்றன மேற்கூறப்பட்ட பிரவேசங்களின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்ட பிரதான செயற்பாடுகளாகும்.

இச் செயற்திட்டத்தின் பிரதான செயற்பாடுகள் மற்றும் பணிகள் வடமாகாண மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்ததை மேம்படுத்தல் உட்பட விவசாயத் துறையின் அபிவிருத்திக்காக முன்னெற்றகரமான பங்களிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

செயற்திட்டத்தின் பணிகள் மற்றும் விவசாய உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்தல்.

- ❖ நீர்ப்பாசனத் தொகுதியினை புணரமைத்தல்.
- ❖ காணியின் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்தல் (243 ஹெக்டேயர்)
- ❖ விவசாய செய்கைக் காணியின் அளவின் பயன்பாட்டினை மேம்படுத்தல்.
- ❖ விவசாய செய்கையின் அளவினை மேம்படுத்தல்.

செயற்திட்டத்தின் பிரதான எதிர்பார்ப்புக்கள் மற்றும் தாக்கங்கள்

பிரதானமாக செயற்திட்டத்தை தழுவக்கூடிய பிரதேசத்தில் முழுமையான விவசாய உற்பத்தித் திறன் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ்க்குறிப்பிட்ட அழுத்தங்கள் வடமாகாணத்தின் விவசாயத் துறைக்கு இச் செயற்திட்டத்தின் மூலம் ஏற்பட்டுள்ளன.

1. நீர்ப்பாசனத் தொகுதியினை புணரமைத்தல்.
2. முழுமையான நீர்ப்பாசனத் தொகுதியினை விரிவுபடுத்தல்.

இதன் கீழ்

- விளைநிலத்தின் உற்பத்தித் திறனை 50மூ தினால் மேம்படுத்தல்.
- விளை நிலத்தின் அளவு 688 ஹெக்டேயரினால் மேம்படுத்தல்.
- விவசாய செய்கையினை 23மூ தினால் அதிகரித்தல்.
- இரணைமடு நீர்த்தேக்கத்தின் புணரமைப்புக்களை மேற்கொள்வதற்காக கீழ்க்

குறிப்பிடப்பட்ட தொழில்நுட்பச் செயற்பாடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

கடன் உதவி வழங்கும் நிறுவனங்கள்	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி	
செயற்திட்டச் செலவினம் (ரூபா.மில்)	2,178.57	
செயற்திட்டக் காலம்	2012 - 2020	
அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	கிளிநொச்சி மாவட்டம்	
மொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்	87%	
மொத்த நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா.மில்)	1,742.53	
2017 ஒதுக்கீடு (ரூபா.மில்)	909.00	
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம்	909.00	940.52
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம்	100%	80%

1. நீர்க் கசிவினை நிர்வகிப்பதற்காக கட்டுமானத்தைப் பலப்படுத்தல்.

நீர்க்கசிவினால் 30 மீற்றர் உயர நீர்க் கொள்ளவினைப் பேண முடியாதுள்ளது. இதனால் இக்கட்டுமானத்திற்கு நேராக குழியொன்றை வெட்டி அதனை களிமண் தட்டுக்களை வைத்து அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இந்தக் குழியை வென்டொய்ட் கலவை மூலம் நிரப்பிய பின்னர் அகற்றி அதன் சுவர்கள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனைத் தொடர்ந்து குழியின் மண், சீமெந்து, வென்டொயிட் மற்றும் நீர் மூலம் நிரப்பி குழி மூடப்பட்டுள்ளது. இத்தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக நீர்கசிவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட சுவர் (ளுஊடீ) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

2. இயந்திர ரெடியல் வான் கதவினை செயற்படுத்தல்.

இயந்திரம் அல்லாத வான்கதவுத் தொகுதிக்குப் பதிலாக இயந்திர வான் கதவுத் தொகுதி பொருத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் வான் கதவின் செயற்பாட்டு வீதம் நிமிடத்திற்கு 0.025 தொடக்கம் 2 மீற்றர், 3 மீற்றரினால் அதிகரிக்க முடிந்துள்ளது.

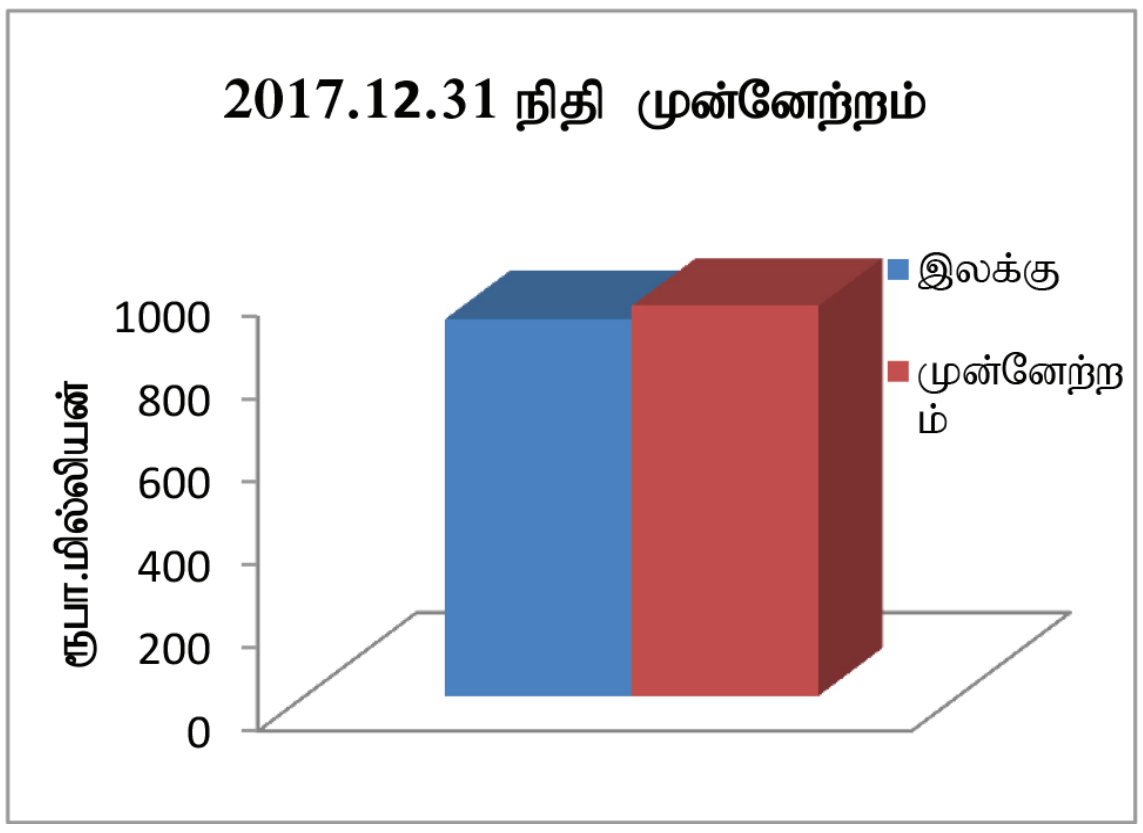

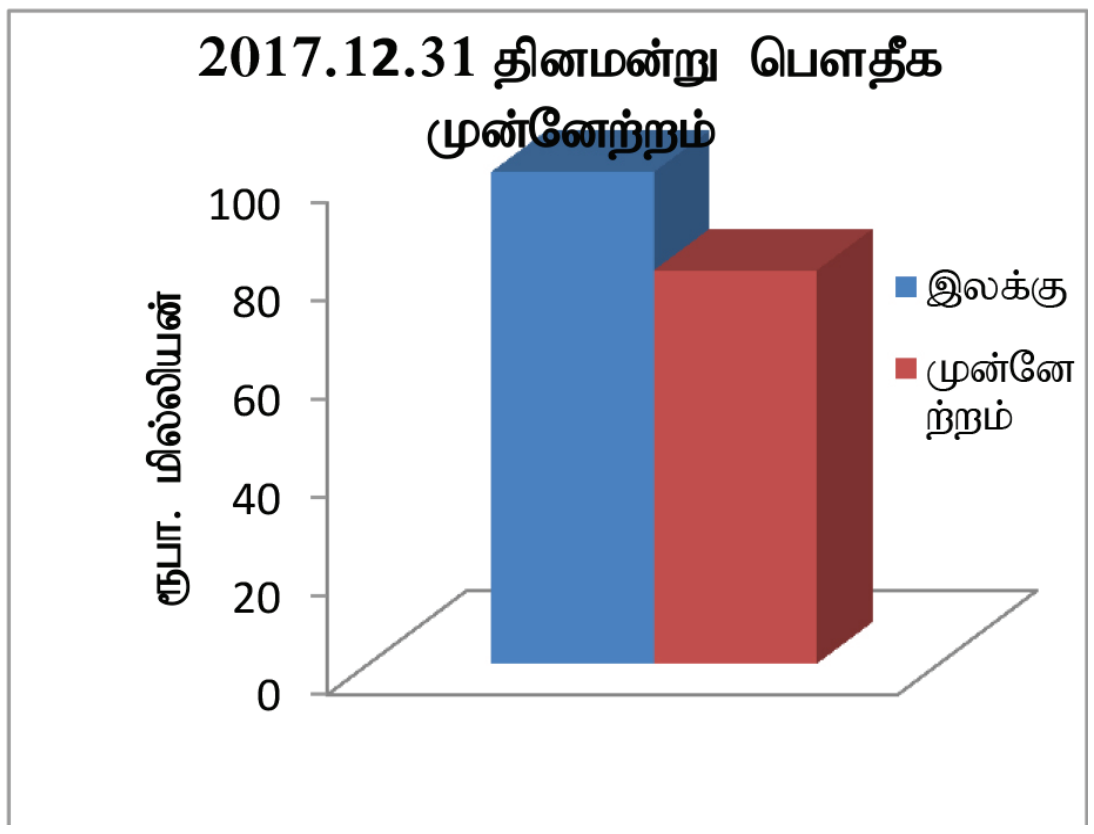

இச் செயற்திட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெறுபேறாகக் காணப்படுவது வீதியை அகலமாக்கி புணரமைக்கப்பட்ட இரணைமடு நீர்த்தேக்கம் மற்றும் இரணைமடு நீர்த் தேக்கத்தின் கீழ் புணரமைக்கப்பட்ட இறுதி நீர்ப்பாசனத் திட்டமாகும்.

இதன்மூலம் 10,000 விவசாயக் குடும்பங்களுக்குப் பயன் கிடைப்பதுடன் 8455 ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பில் பயிர்ச் செய்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும். திருவையாறு உத்சான நீர்வழங்கல் திட்டத்தின் கீழ் 447 ஹெக்டேயர் பிரதேசத்தில் பயிர்ச்செய்கை மேற்கொள்ள முடிந்த போதிலும் மோதல்கள் இடம்பெற்ற காலப்பகுதி தொடக்கம் இது செயற்படவில்லை. இச்செயற்திட்டத்தின் மூலம் சிறுபோகச் செய்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் வயற்காணியின் அளவு சுமார் 4000 ஏக்கரினால் அதிகரிக்க முடியும் என கணிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது.

3.2.2.7. இடைநிலைச் சுகாதாரத் துறைசார்ந்த அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்கள்

நோக்கம்

பொதுச் சுகாதார முறைமையின் செயற்சாதனை மட்டத்தை மேம்படுத்தல் மற்றும் அதன் மூலம் மந்தபோசாக்கு மற்றும் தொற்றாத நோய்கள் போன்ற சவால்களுக்காக சிறந்த வரவேற்பினை வழங்கக்கூடிய இயலுமைகளை வழங்குவதே இச் செயற்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

நிதி வழங்கப்படும் முகவர் நிறுவனம்	உலக வங்கி
மொத்த செயற்திட்ட செலவினம்	26,000 மில்லியன் ரூபா (200 மில்லியன் அ.டொலர்)
மாகாண சுகாதாரத்திற்காக எதிர்பார்க்கப்பட்ட சலுகைகள்	ரூபா. 15163.20 மில்லியன் (105.5 மில்லியன் அ.டொலர்)
செயற்திட்ட கால எல்லை	2013 - 2017
செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	நாடு பூராகவும்
செயற்திட்டத்தின் பிரதிலாபங்கள்	நாட்டின் மொத்த மக்கள் இலக்காகக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது
2017 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடுகள்	3இ260 ரூபா.மில்.
2017 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிதி முன்னேற்றம்	முன்னேற்றம் ரூபா.மில். 3இ130.50
2017 ஆம் ஆண்டுக்குள் பௌதீக முன்னேற்றம்	இலக்கு: 100% முன்னேற்றம்: 96%

- பொதுச் சுகாதார சேவையின் கீழ் தங்கியுள்ள வறுமைக் கோட்டின் கீழ் உள்ள பாதிப்புக்களுக்குட்படக்கூடிய மக்கள்.
- குறைப் போசாக்குக் கொண்ட இலகுவில் நோய்களுக்குட்படக்கூடிய குழுவினர்.
- 05 வயதை விடக் குறைந்த சிறார்கள், கர்ப்பினித் தாய்மார்கள் மற்றும் பாலூண்டும் தாய்மார்கள் உட்பட இளம் பருவத்திலுள்ள பெண் பிள்ளைகள்.
- மகப்பேற்று சிறுவர் சுகாதாரம் தொடர்பான பிரச்சினைகள்.
- தொற்று நோய்கள் (காசநோய், டெங்கு, லெப்டஸ் பைரெசிஸ் தொற்று, எச்.ஐ.வி. ∴ எயிட்ஸ், விசர் நாயக்கடி, மிருகங்களினால் பரவக்கூடிய ஏனைய நோய்கள்)
- இளைஞர்கள், தொழில்களில் ஈடுபடும் வயதிலுள்ள மற்றும் முதிய ஆண், பெண் எதிர்கொள்ளக்கூடிய தொற்றாத நோய்கள்.

பிரதாக தொனிப் பொருள் மற்றும் செயற்பாடுகள்

- சுகாதார முறைமையை விருத்தி செய்தல்.
- மகப்பேற்று மற்றும் சிறுவர் சுகாதார போசாக்கு
- தொற்று நோயைக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் தடுத்தல்.
- தொற்றாத நோயைத் தவிர்த்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல்.
- செயலமர்வு, சுகாதார ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகள்

திரண்ட பௌதீக முன்னேற்றம் : 94%

திரண்ட நிதி முன்னேற்றம் : ரூபா. மில் 11இ086

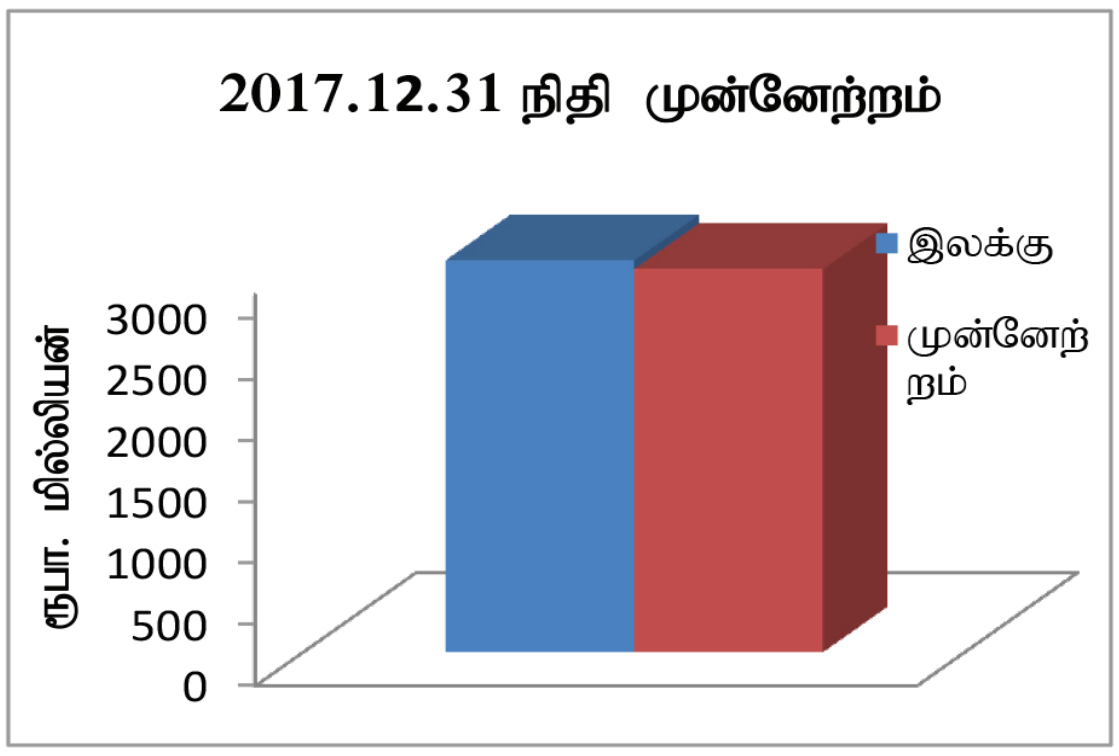

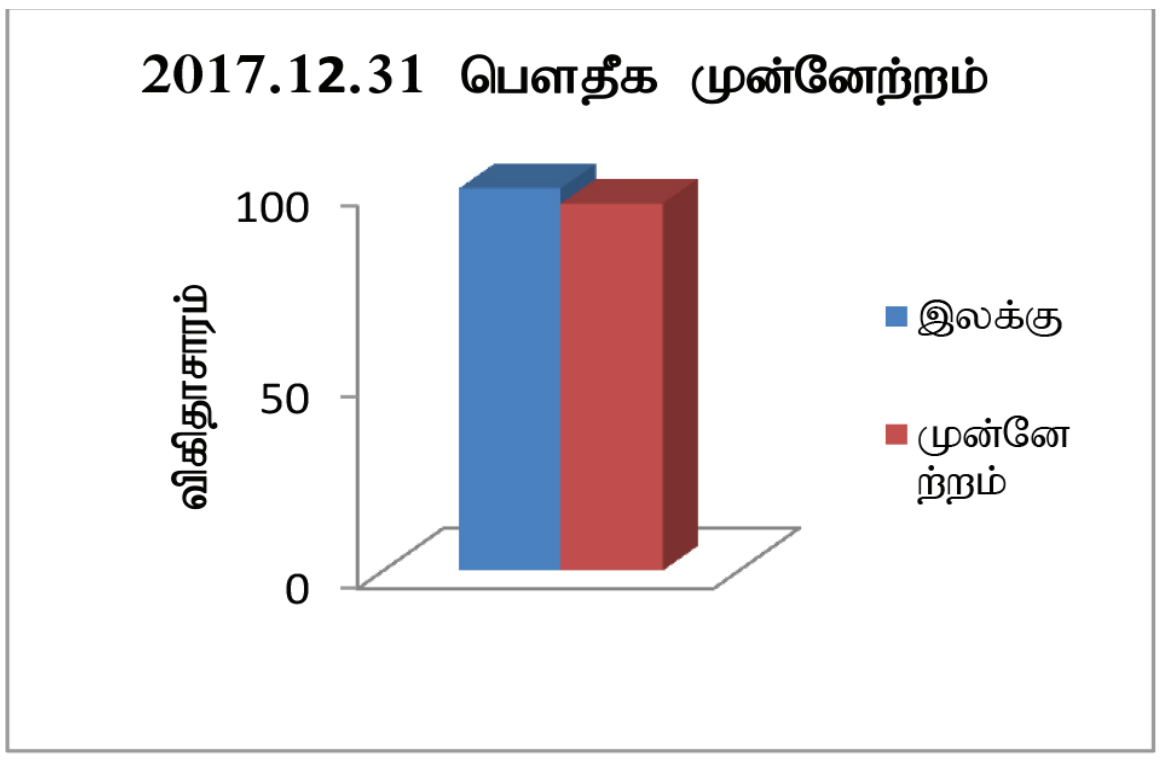

மாகாணங்களுக்கமைய அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்

தொ .இல	பூர்த்தி செய்யப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்	பௌதீக முன்னேற்றம்									முழு மொத்தம்
			வட மாகாணம்	கிழக்கு மாகாணம்	வடமத்திய மாகாணம்	மத்திய மாகாணம்	ஊவா மாகாணம்	வடமேல் மாகாணம்	சப்ரகமுவ மாகாணம்	தென் மாகாண ம்	
01	அவசர சிகிச்சைப் பிரிவினை தாபித்தல் / அபிவிருத்தி செய்தல்	36	51	44	27	89	41	53	50	45	436
02	நோய் நிலைமை மற்றும் மரணத் தகவல்களை கணணி மயப்படுத்தப்படும் மாகாண சபை வைத்தியசாலை	40	49	46	51	85	40	49	35	48	443
03	மகப்பேற்று மற்றும் சிறுவர் அவசர சிகிச்சையினை விருத்தி செய்தல்	434	274	370	220	598	381	494	372	492	3635
04	சுவதிவி மத்திய நிலையத்தைத் தாபித்தல்	36	30	44	28	46	24	39	29	46	322

05	தர முகாமைத்துவ முறைமையினைத் தாபித்தல் (ஞஆளு)	10	11	13	05	06	07	06	04	08	**70**
06	மருந்துக் களஞ்சியசாலையை புணரமைத்தல்	-	04	76	08	35	20	16	28	-	**187**

கிழக்கு மாகாணம்

மாகாணப் பயிற்சி மத்திய நிலையத்தை நிர்மானித்தல் - திராய்மடு - மட்டக்களப்பு
Completion of Main Building of Provincial Training Centre at Thiraimadu" Batticaloa

மத்திய மாகாணம்

அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு அபிவிருத்தி - மாவட்ட வைத்தியசாலை, ரத்தொட்ட

வடமேல் மாகாணம்

அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு அபிவிருத்தி - மாவட்ட வைத்தியசாலை - கொட்டுகச்சி
Construction of Emergency Room - DH Kottukachchiya

வட மாகாணம்

ஹஅவசர சிகிச்சை பிரிவினை அபீவருத்தி செய்தல் - மாவட்ட வைத்தியசாலை - காரைநகர், பூநகரி, புதுக்குடியிருப்பு

மாகாண சுகாதார மத்திய நிலைய நிர்மானிப்பு - மில்லெனிய
Construction of MOH Office - MIlleniya

3.2.2.8. கிராமியப் பாலங்களின் நிர்மானச் செயற்திட்டங

நோக்கம்

1. நாட்டின் தேசிய பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு மக்களின் செயற்பாடுகள் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தின் பண்புசார் தரத்தை விருத்தி செய்தல்.
2. கிராமிய மக்களின் பொதுப் பாதுகாப்பினை விருத்தி செய்தல்.
3. கிராமியப் பிரதேசங்களில் இதுவரையில் பயன்படுத்தப்படாத வளங்களை உயர்ந்த பட்சம் பயன்படுத்துவதைப் போன்று கிராமிய சமூகத்தின் வாழ்க்கை நிலைமையினை விருத்தி செய்வதனை நோக்காகக் கொண்டு புதிய உற்பத்திச் சந்தர்ப்பங்களுக்காக அவர்களின் உள்நாட்டு அறிவினைப் பயன்படுத்தல்.

அட்டவணை இலக்கம் 19

	கட்டம I	கட்டம II	கட்டம III
கடனுதவி வழங்கும் நிறுவனம்	ஐக்கிய இராட்சியம்	ஐக்கிய இராட்சியம்	நெதர்லாந்து
செயற்திட்ட செலவினம் (ரூபா.மில்)	7,400.00	20,200.00	16,500.00
செயற்திட்ட காலம்	2013 - 2016	2014 - 2017	2014 - 2017
அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	அனைத்து தீவுகளையும் உள்ளடக்கியது		
மொத்த பௌதீக முன்னேற்றங்கள்	100%	85%	85%
மொத்த நிதி முன்னேற்றங்கள் (ரூபா. மில்)	7,366.41	19,892.71	14,694.43
2017 நான்காவது காலாண்டிற்கு நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம் (ரூபா.மில்)	40.00 / 15.22	4205.00 / 5300.00	3100.00 / 2530.05
2017 நான்காவது காலாண்டிற்கு பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம்	பணிகள் பூர்த்தியடைந்துள்ளன.	100% / 21%	100% / 34%

அட்டவணை இலக்கம் 20

நிதி உதவி	மொத்தச் செலவினம்	2017 க்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு ரூபா. மில்	நிர்மானிக்கப்படும் பாலங்களின் எண்ணிக்கை	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட எண்ணிகை	நிதி முன்னேற்றம் (2017 ரூபா. மில்)	மொத்த நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா. மில்)	மொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்
ஐக்கிய இராட்சியம் கட்டம் I	7,400.00	20	210	210	15.22	7,372.87	100%
ஐக்கிய இராட்சியம் கட்டம் II	20,200.00	3500	537	348	2,693.82	17,286.12	85%
நெதர்லாந்து கட்டம் III	16,500.00	2800	463	241	1,751.76	13,550.44	78%
மொத்தம்	**44,100.00**	**6320**	**1,210**	**799**	**4,460.80**	**38,209.43**	

இச் செயற்திட்டத்தின் முதலாவது கட்டத்தின் பணிகள் பூர்த்தியடைந்துள்ளன. இரண்டாவது கட்டத்தின் கீழ் உரிய பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்படாத பாலங்களின் எண்ணிக்கை 189 மற்றும் மூன்றாவது கட்டத்தின் கீழ் நிர்மானப் பணிகள் பூர்த்தி செய்யாத 222 பாலங்களின் நிர்மானப் பணிகள் இடம்பெறுகின்றன.

முன்னர் இருந்த நிலைமை

தற்போதைய நிலைமை

முன்னர் இருந்த நிலைமை

தற்போதைய நிலைமை

Second Health Sector Development Project (SHSDP)

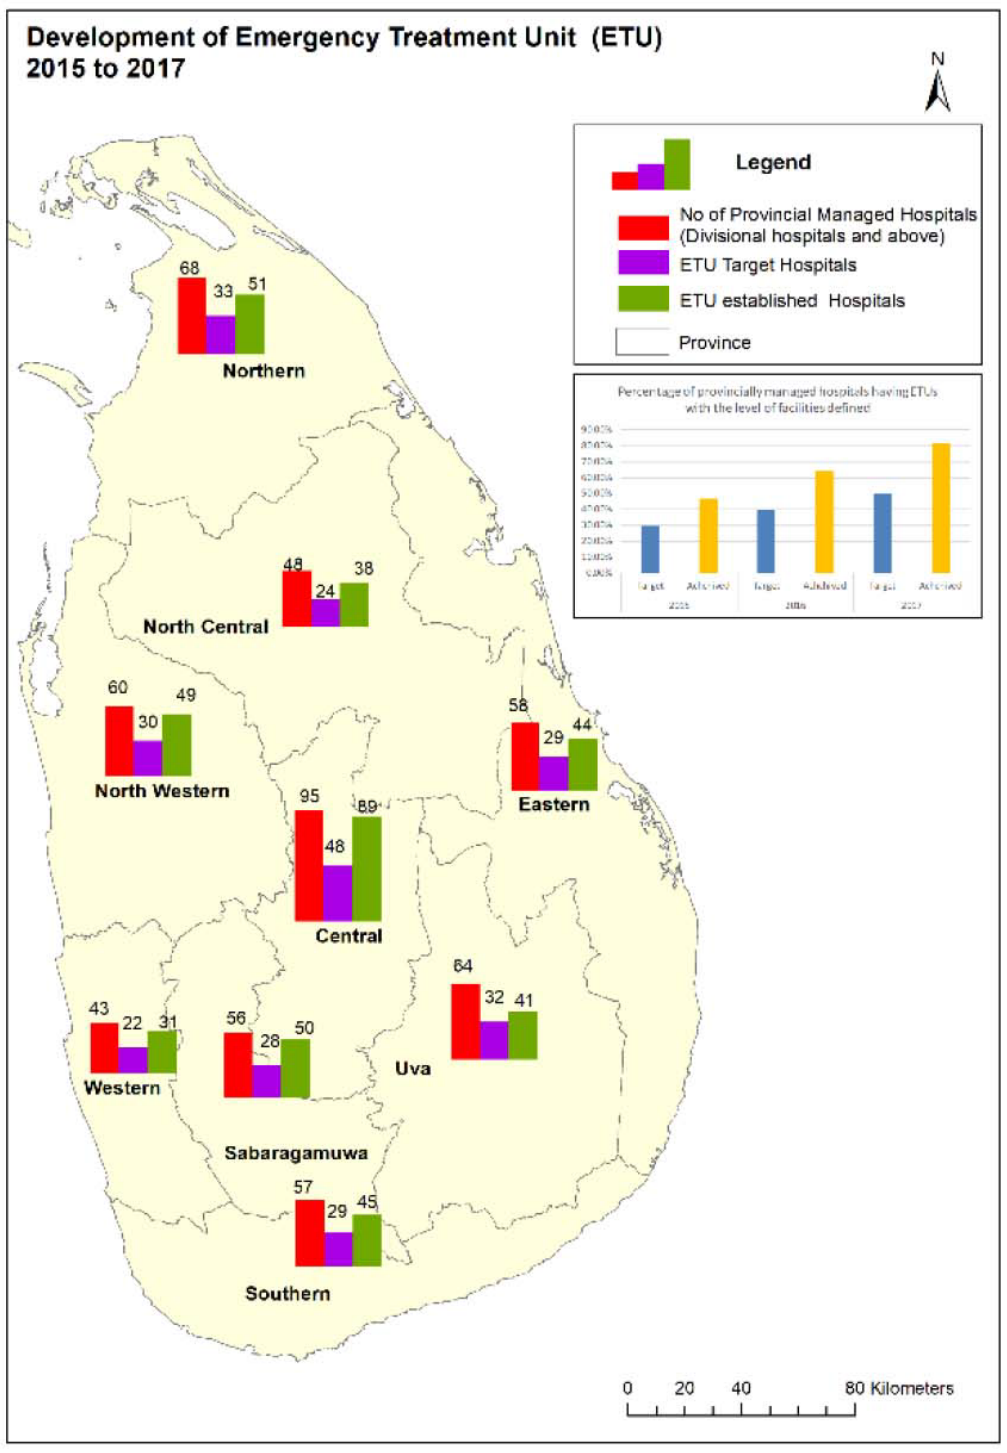

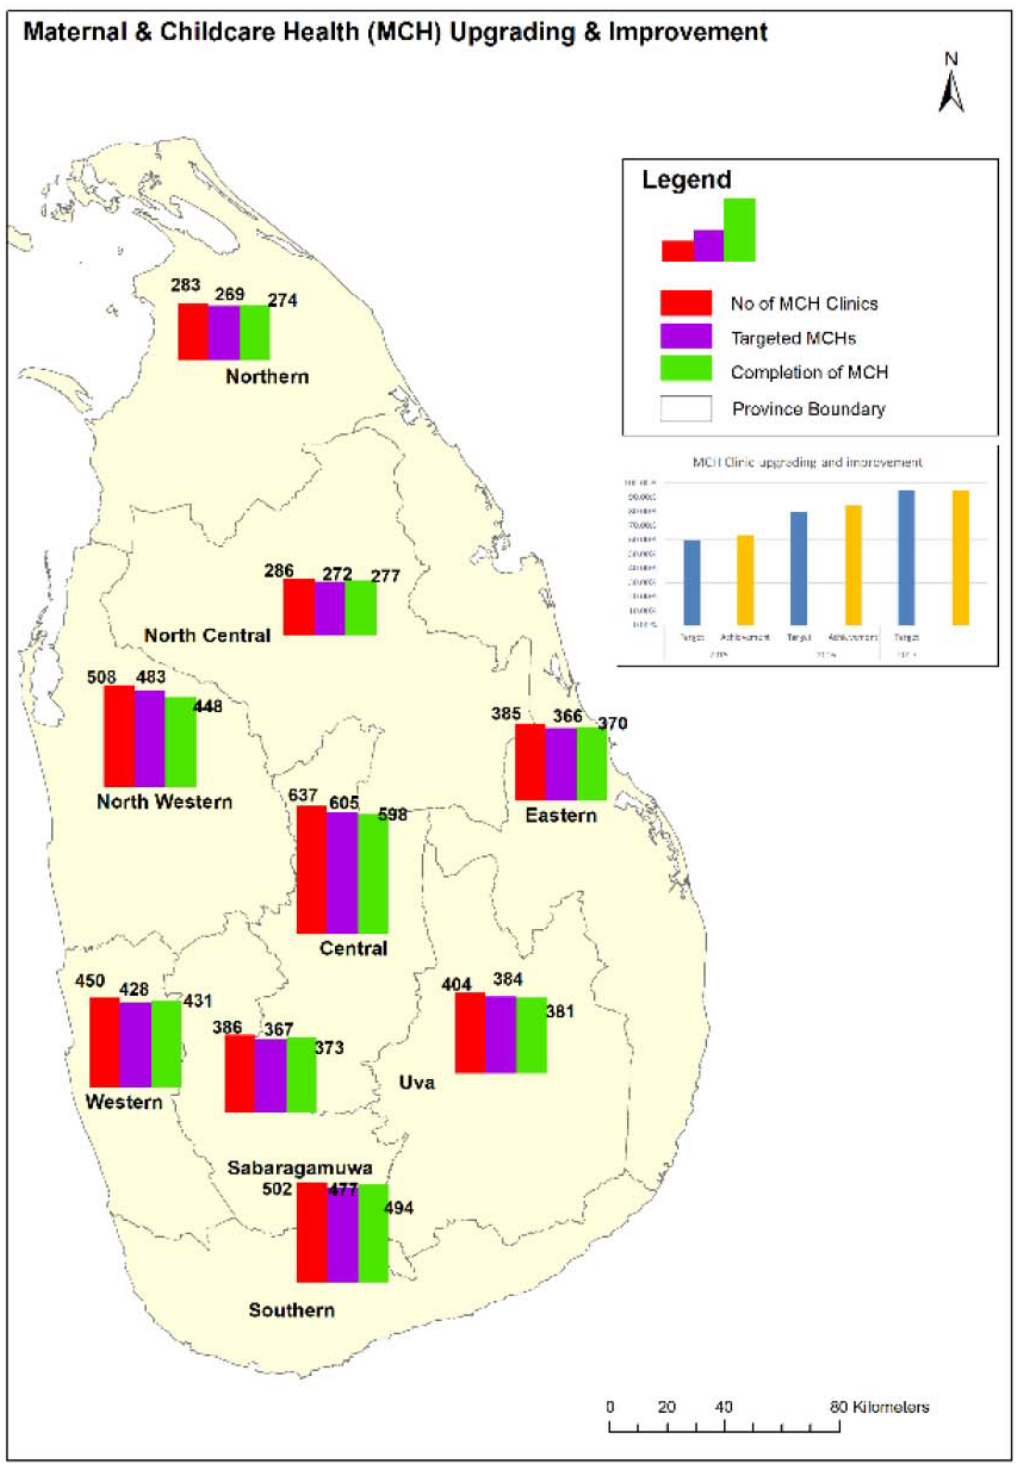

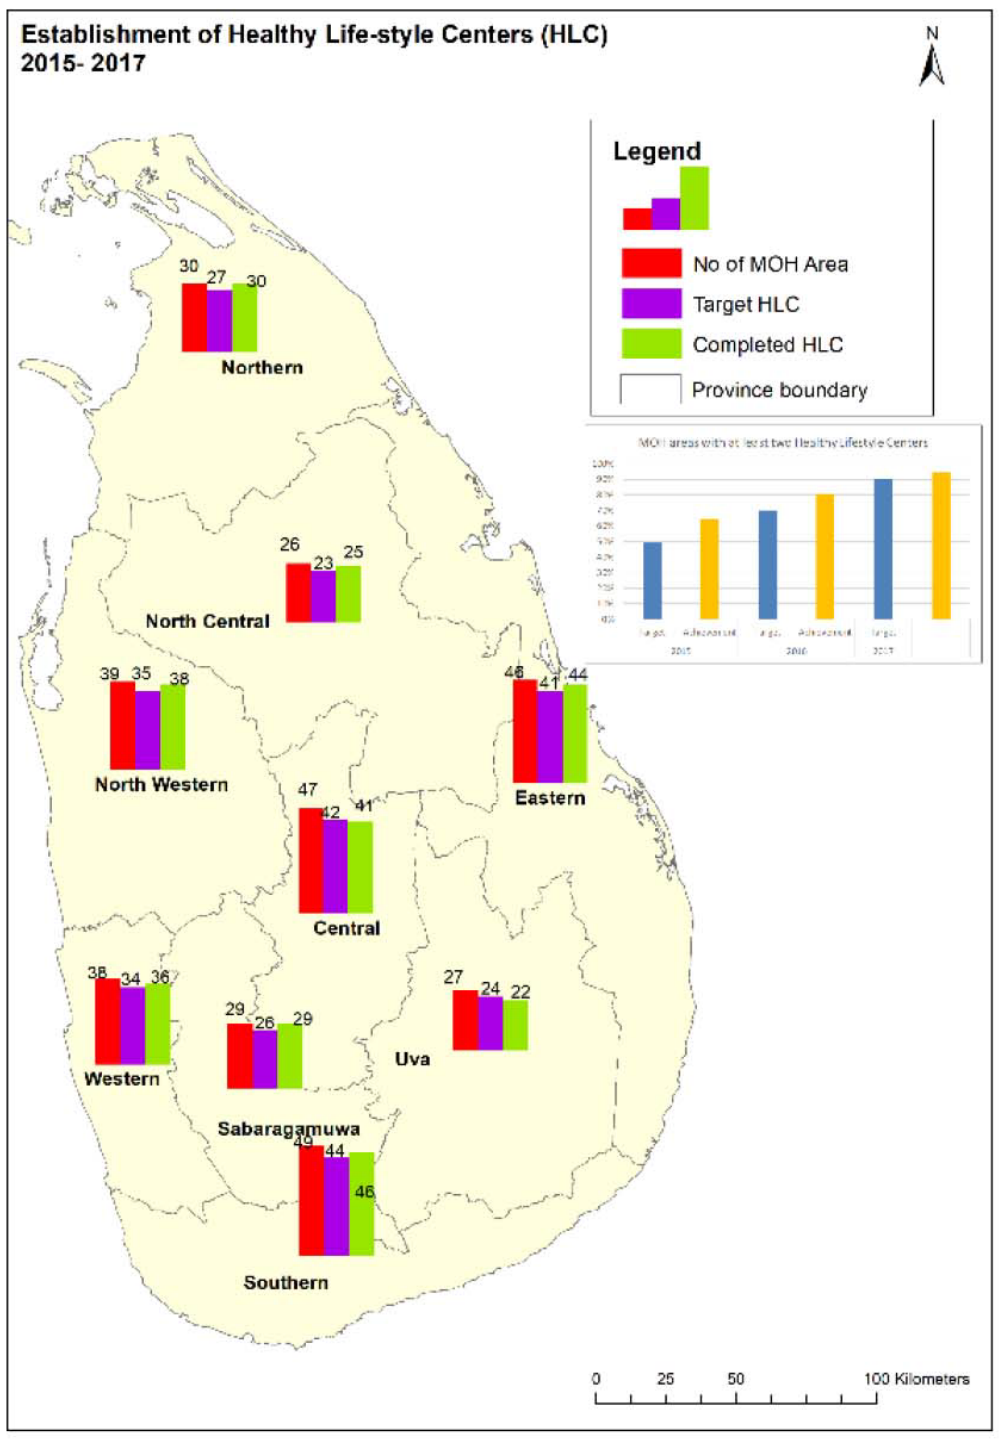

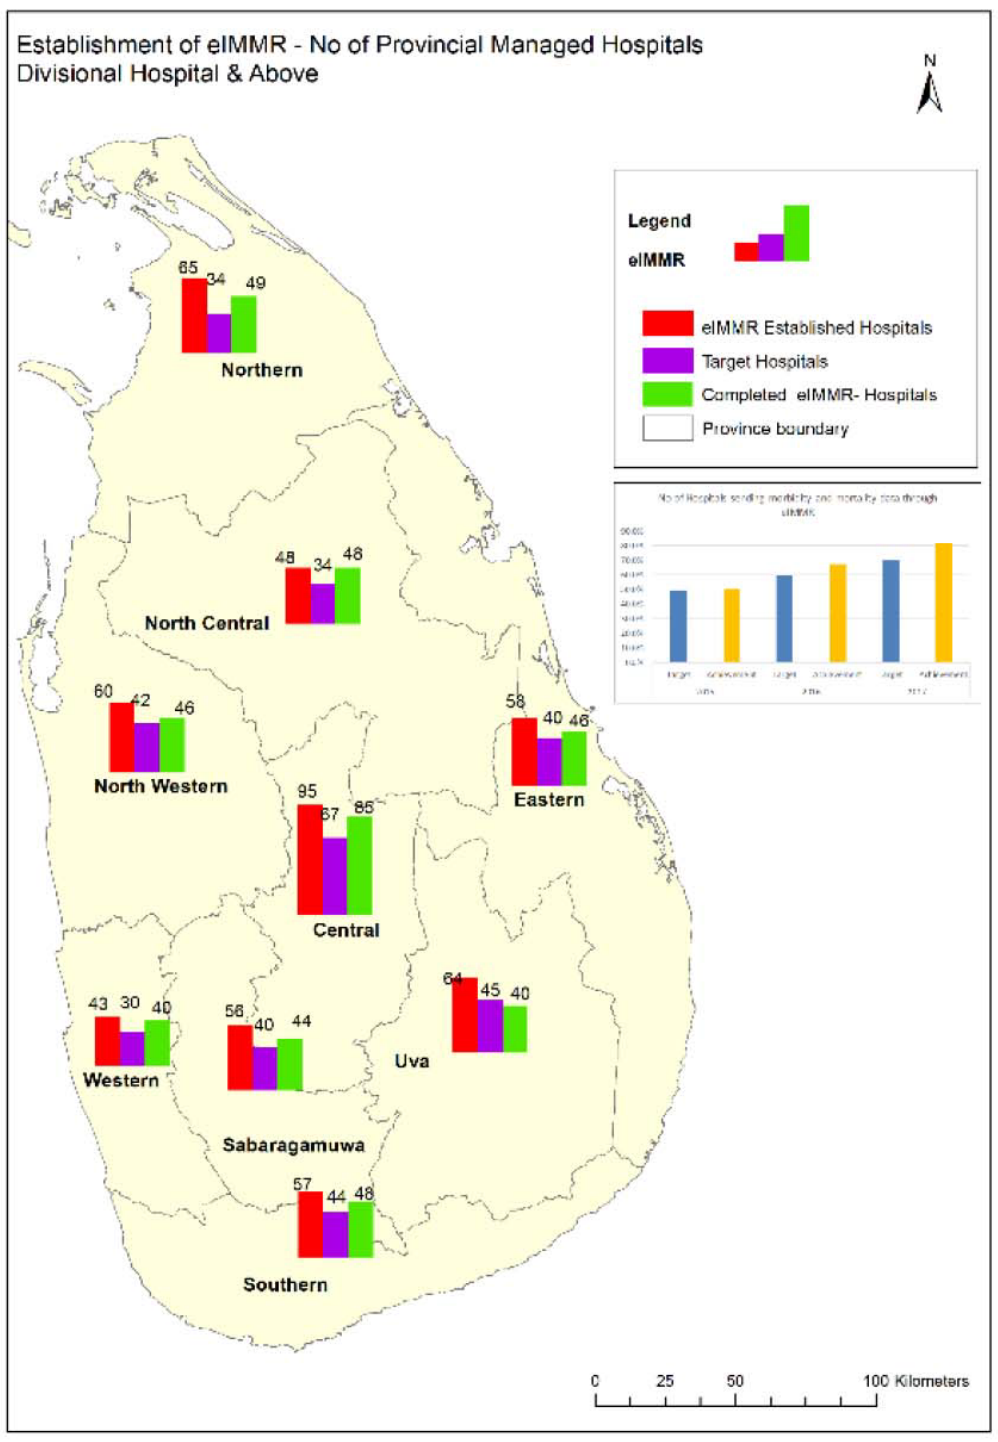

3.2.2.9. வடகிழக்கு உள்ளூராட்சி மன்ற சேவைகளை விருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம (NELSIP)

- செயற்திட்டத்தின் நோக்கம்

வடக்கு கிழக்கு உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் சேவைகளை விருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம் (நெல்சிப்) பிரதான நோக்கம் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படும் சேவைகளை நெகிழ்வுத் தன்மையுடன் மற்றும் பொறுப்புடன் வழங்கக்கூடிய வகையில் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்வது சேவை வசதிகளை வழங்கும் போது சமூக நியாயத்தை உயர்ந்தபட்சம் வழங்கக்கூடிய சேவை வசதி வழங்கல் முறைகள் மற்றும் ஒழுங்குகளை அறிமுகப்படுத்தல் மற்றும் வினைத்திறனை மேம்படுத்தக்கூடியவாறு உரிய உத்தியோகத்தர்களுக்குத் தேவையான அறிவு மற்றும் அனுபவத்தை வழங்குதல்.

- செயற்திட்டத்தின் பெறுபேறுகள்

உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்யும் திட்டத்தின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம் 1190 ஆகும். இதேவேளை 791.2 கிலோ மீற்றர் கிராமிய வீதி, 49.8 கிலோ மீற்றர் கால்வாய்த் தொகுதி, சந்தை அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம் 146, நீர் வழங்கல் செயற்திட்டம் 14, விளையாட்டு மைதானம் மற்றும் சிறுவர் பூங்காக்கள் 74 மற்றும் பல் செயற்பாட்டு மத்திய நிலையங்கள் 36 ஆகும்.

வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களுடன் இணைந்த வாய்க்கால், பாலங்கள் மற்றும் வடிகால் தொகுதிகளை புதிதான நிர்மானித்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்வது போக்குவரத்துத் துறையின் வினைத்திறனை மேம்படுத்த காரணமாக அமைந்துள்ளது. வர்த்தகக் செயற்பாடுகளுக்கான முதலீடுகளை அதிகரிக்க உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சுற்றுலாச் செயற்பாடுகளை விருத்தி செய்ய, பல்வேறுபட்ட சேவை வழங்கலை மேம்படுத்த மற்றும் பொதுவாக மக்களது வாழ்க்கைச் செயற்பாடுகளின் பண்புசார் தரத்தை விருத்தி செய்வதற்கும் இது காரணமாக அமைந்துள்ளது.

நெல்சிப் செயற்திட்டத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட சமூக நிர்வாக, சுற்றாடல் மற்றும் பொருளாதரக் காரணிகள் தொடர்பாக மதிப்பீடு செய்து அறிக்கைகள் மூலம் வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதனால், பயணிக்கும் காலம் குறைவடைதல், வீதி விபத்துக்கள் குறைவடைதல் மற்றும் சொகுசான முறையில் பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் ஏற்படுவது தொடர்பாக பயணாளிகள் பெரும் திருப்தி அடைந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய இடைநிலைப் பயன்களான கீழுள்ள விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. வீதிப் பராமரிப்பு மற்றும் பேணுவதற்கான செலவினம் குறைவடைதல், வர்த்தகச் செயற்பாடுகள் அதிகரித்தல், விவசாயச் செயற்பாடுகள் அதிகரித்தல், காணிகளின் பெறுமதிகள் அதிகரித்தல், கல்வி, தொழில் வாய்ப்புக்களுக்கு, பயிற்சிச் செயற்பாடுகளுக்காக இலகுவில் பயணிக்க முடிதல் மற்றும் உள்ளீடுகளைக் கொள்வனவு செய்தல் மற்றும் உற்பத்திகளைச் சந்தைப்படுத்துவதற்கும் வசதிகள் ஏற்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

காய்வாய்த் தொகுதிகளைப் புதிதாக நிர்மானிப்பதன் மூலம் வீதித் தொகுதியின் பண்புசார் தரம் அதிகரிக்கின்றது. மேலும் வெள்ளப் பெருக்கு அபாயம் குறைவடைவதைப் போன்று நுளம்புகள் பரவதைத் தடுப்பதற்கும், வீதி விபத்துக்களை குறைப்பதற்கும் இது காரணமாக அமைந்துள்ளதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சிறுவர் பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்களை நிர்மானிப்பதன் மூலம் ஆளணியை ஒன்று சேர்த்தல், சந்திப்புக்கள் ஊடாக சமூக ரீதியில் பயன்கள் கிடைப்பதைப் போன்று சமூகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைவதனால் உறவுகள் விருத்தியடைதல், தனிப்பட்ட மற்றும் சமூக அழுத்தங்களைக் குறைக்க முடிகின்றது. சமூக ஒத்துழைப்புக்கள் மற்றும் பாதுகாப்புக்கள் தொடர்பான உணர்வினை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் மனோநிலை உட்பட உடல் தகைமையினையும் விருத்தி செய்யக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் இருப்பதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

குடிநீர் வழங்குதல், சந்தை அபிவிருத்தி, நூலக அபிவிருத்தி போன்றவற்றின் மூலம் குறிப்பிடத்தக்களவு சமூக மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக இனங்காணப்பட்டுள்ளது. (வுாந ஞுழஉயைடஇ ஐளெவவைரவழையெடஇ நுஉழழெஅநவெ ரூ நுஉழழெஅழைஉ ஐஅியஉவ யுளளநளளஅநவெ யவ நேடுளுஜீ – P. 37,38)

உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் பொது மக்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளை இலகுபடுத்தி மிகவும் முறையாக மற்றும் சரியான முறையில் வழங்குவதற்காக நெல்சிப் செயற்திட்டத்தின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள விசேட வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் ஒரு சில முறைகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் பங்கேற்பு அபிவிருத்தித் திட்டங்களை வகுத்தல், செயற்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக அமுல்படுத்துவதற்கு அவ்வவ் செயற்திட்டங்களுக்குரிய பயணாளிகளைக் கொண்ட சமூக கணக்காய்வுக் குழுவை தாபிக்கும் முன்னுரிமைக்கமைய இனங்காணப்பட்ட செயற்திட்ட மதிப்பீடுகள், செயற்திட்ட மதிப்பீட்டுக் குழுவை மாவட்ட மட்டத்தில் தாபித்தல், உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் சேவை வசதிகளை வழங்குவதை இலகுபடுத்தும் வகையில் முன்னிலை அலுவலகங்களைத் தாபித்தல், பொது மக்களின் குறைகளைக் கேட்டு அவற்றிற்குத் தீர்வு வழங்கும் முறைகளையும் சமகாலப்படுத்தல், மாவட்டத்தில் நல்லாட்சி மத்திய நிலையங்களைத் தாபிப்பதும் பிரதானமானதாகும். உள்ளூ ராட்சி மன்றங்களில் கணக்கீட்டுச் செயற்பாடுகளை சமகாலப்படுத்தல், நூலகங்கள் சுயமாகச் செயற்படும் வேலைத்திட்டங்களை இனங்காண்பதும் பிரதான வேலைத்திட்டத்தில் அடங்குகின்றது.

- செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரதேசங்கள்

நெல்சிப் செயற்திட்டம் 2010 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் 2017 இறுதிவரை அமுல்படுத்தப்படவில்லை. இச் செயற்திட்டம் வடமாகணத்தின் மொத்த 05 மாவட்டங்கள் அதாவது யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு, வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களின் சகல உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் (34 உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை) தழுவக்கூடியவாறு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் கிழக்கு மாகாணத்தில் மொத்த 03 மாவட்டங்களான அதாவது திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்களின் சகல உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் (45 உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவங்களைத்) தழுவக்கூடிய வகையில் அமுல்படுத்தப்படும். 2014 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் வட மாகாணம் மற்றும் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு இணைவாக உள்ள மாகாணங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் இச் செயற்திட்டத்திற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. இதற்கமைய வடமத்திய மாகாணத்தில் 12 உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களும், வடமேல் மாகாணத்தில் புத்தளம் மாவட்டத்தில் 07 உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊவா மாகாணத்தில் மொனராகலை மாவட்டத்தில் 03 உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் உட்பட மொத்தமாக 101 உள்ளூராட்சி மன்றங்களைத் தழுவக்கூடிய வகையில் இச் செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது

பிபில குடிநீர் வழங்கல் செயற்திட்டம்

அம்பாறை பஸ்தரிப்பு நிலையம்

உர்காவற்துறைக்கு வழங்கப்பட்ட நெடுந்தாரகை பயணிகள் கப்பல்

மாரவில பொது வர்த்தகக் கட்டடத் தொகுதி

அட்டவணை இலக்கம் 21 - செயற்திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்படும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள்

தொ.இல	மாகாணம்	மாவட்டம்	அமுலிலுள்ள உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை	மொத்த எண்ணி	மாநகர சபை	நகர சபை	பிரதேச சபை
1.	வடக்கு	யாழ்ப்பாணம்	17	17	01	03	13
		கிளிநொச்சி	03	03	-	-	03
		முல்லைத்தீவு	04	04	-	-	04
		வவுனியா	05	05	-	01	04
		மன்னார்	05	05	-	01	04
2.	கிழக்கு	திருகோணமலை	13	13	-	02	11
		மட்டக்களப்பு	12	12	01	02	09
		அம்பாறை	20	20	02	01	17
3.	வடமத்தி	அனுராதபுரம்	19	09	01	-	08
		பொலன்னறுவை	07	03	-	-	03
4.	வடமேல்	புத்தளம்	12	07	-	02	05
5.	ஊவா	மொனராகலை	10	03	-	-	03
மொத்தம			**127**	**101**	**05**	**12**	**84**

நிதி மூலங்கள்

வடக்கு கிழக்கு உள்ளூராட்சி மன்ற சேவைகளை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த முதலீட்டு நிதி ரூபா. 13522.90 மில்லியனாகும். அதில் 66மூ உலக வங்கியின் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் மூலமும், 20மூ அவுஸ்திரேலியா வெளிவிவகார மற்றும் வர்த்தகத் திணைக்களத்தின் உதவியுடனும், 12மூ இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒதுக்கீடுகள் மூலமும், 2மூ பயன்பாட்டுப் பங்களிப்புக்களும் இதில் அடங்குகின்றன. உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு ரீதியில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்நிதி மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் ஊடாக செயற்திட்டப் பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை இலக்கம் 22

நிதி மூலம்	செயற்திட்ட நிதி		மறுசீரமைக்கப்பட்ட செயற்திட்ட நிதி	
	அ.டொலர்	ரூபா. மில்	அ.டொலர்	ரூபா.மில்
சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிதியம் (ஐனுஏ)	50.00	6,175.00	70.00	9,464.44
வெளிவிவகார மற்றும் வர்த்தகத் திணைக்களம் (யுரளயுனை)	20.30	2,537.50	20.30	2,539.50
இலங்கை அரசாங்கம்	34.00	3,740.00	14.35	1,661.55
சமூகப் பங்களிப்பு	2.00	220.00	2.00	220.00
மொத்த நிதி	106.30	12,672.50	107.35	13,665.49

அட்டவணை இலக்கம் 23 - மொத்த நிதி முன்னேற்றம்

வடக்கு - கிழக்கு உள்ளூராட்சி மன்ற சேவையினை விருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று)

உள்ளீடு	மொத்த மதிப்பீடு ரூபா. மில்	செலவினம் ரூபா. மில்
உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்	11,371.49	11,373.96
பொறுப்புக்களை நிறுவனங்களுக்கு வழங்குதல்	57.00	56.93
கொள்ளளவு விருத்தி	1,805.50	1,791.50
மேற்பார்வை மற்றும் மதிப்பீடு	31.50	30.56
செயற்திட்ட முகாமைத்துவம்	400.00	377.58
மொத்தம்	**13,630.53**	**13,630.53**

இதற்கமைய 2017.12.31 ஆம் திகதியன்று செயற்திட்டத்தின் மொத்த நிதி முன்னேற்றம் 99.81%

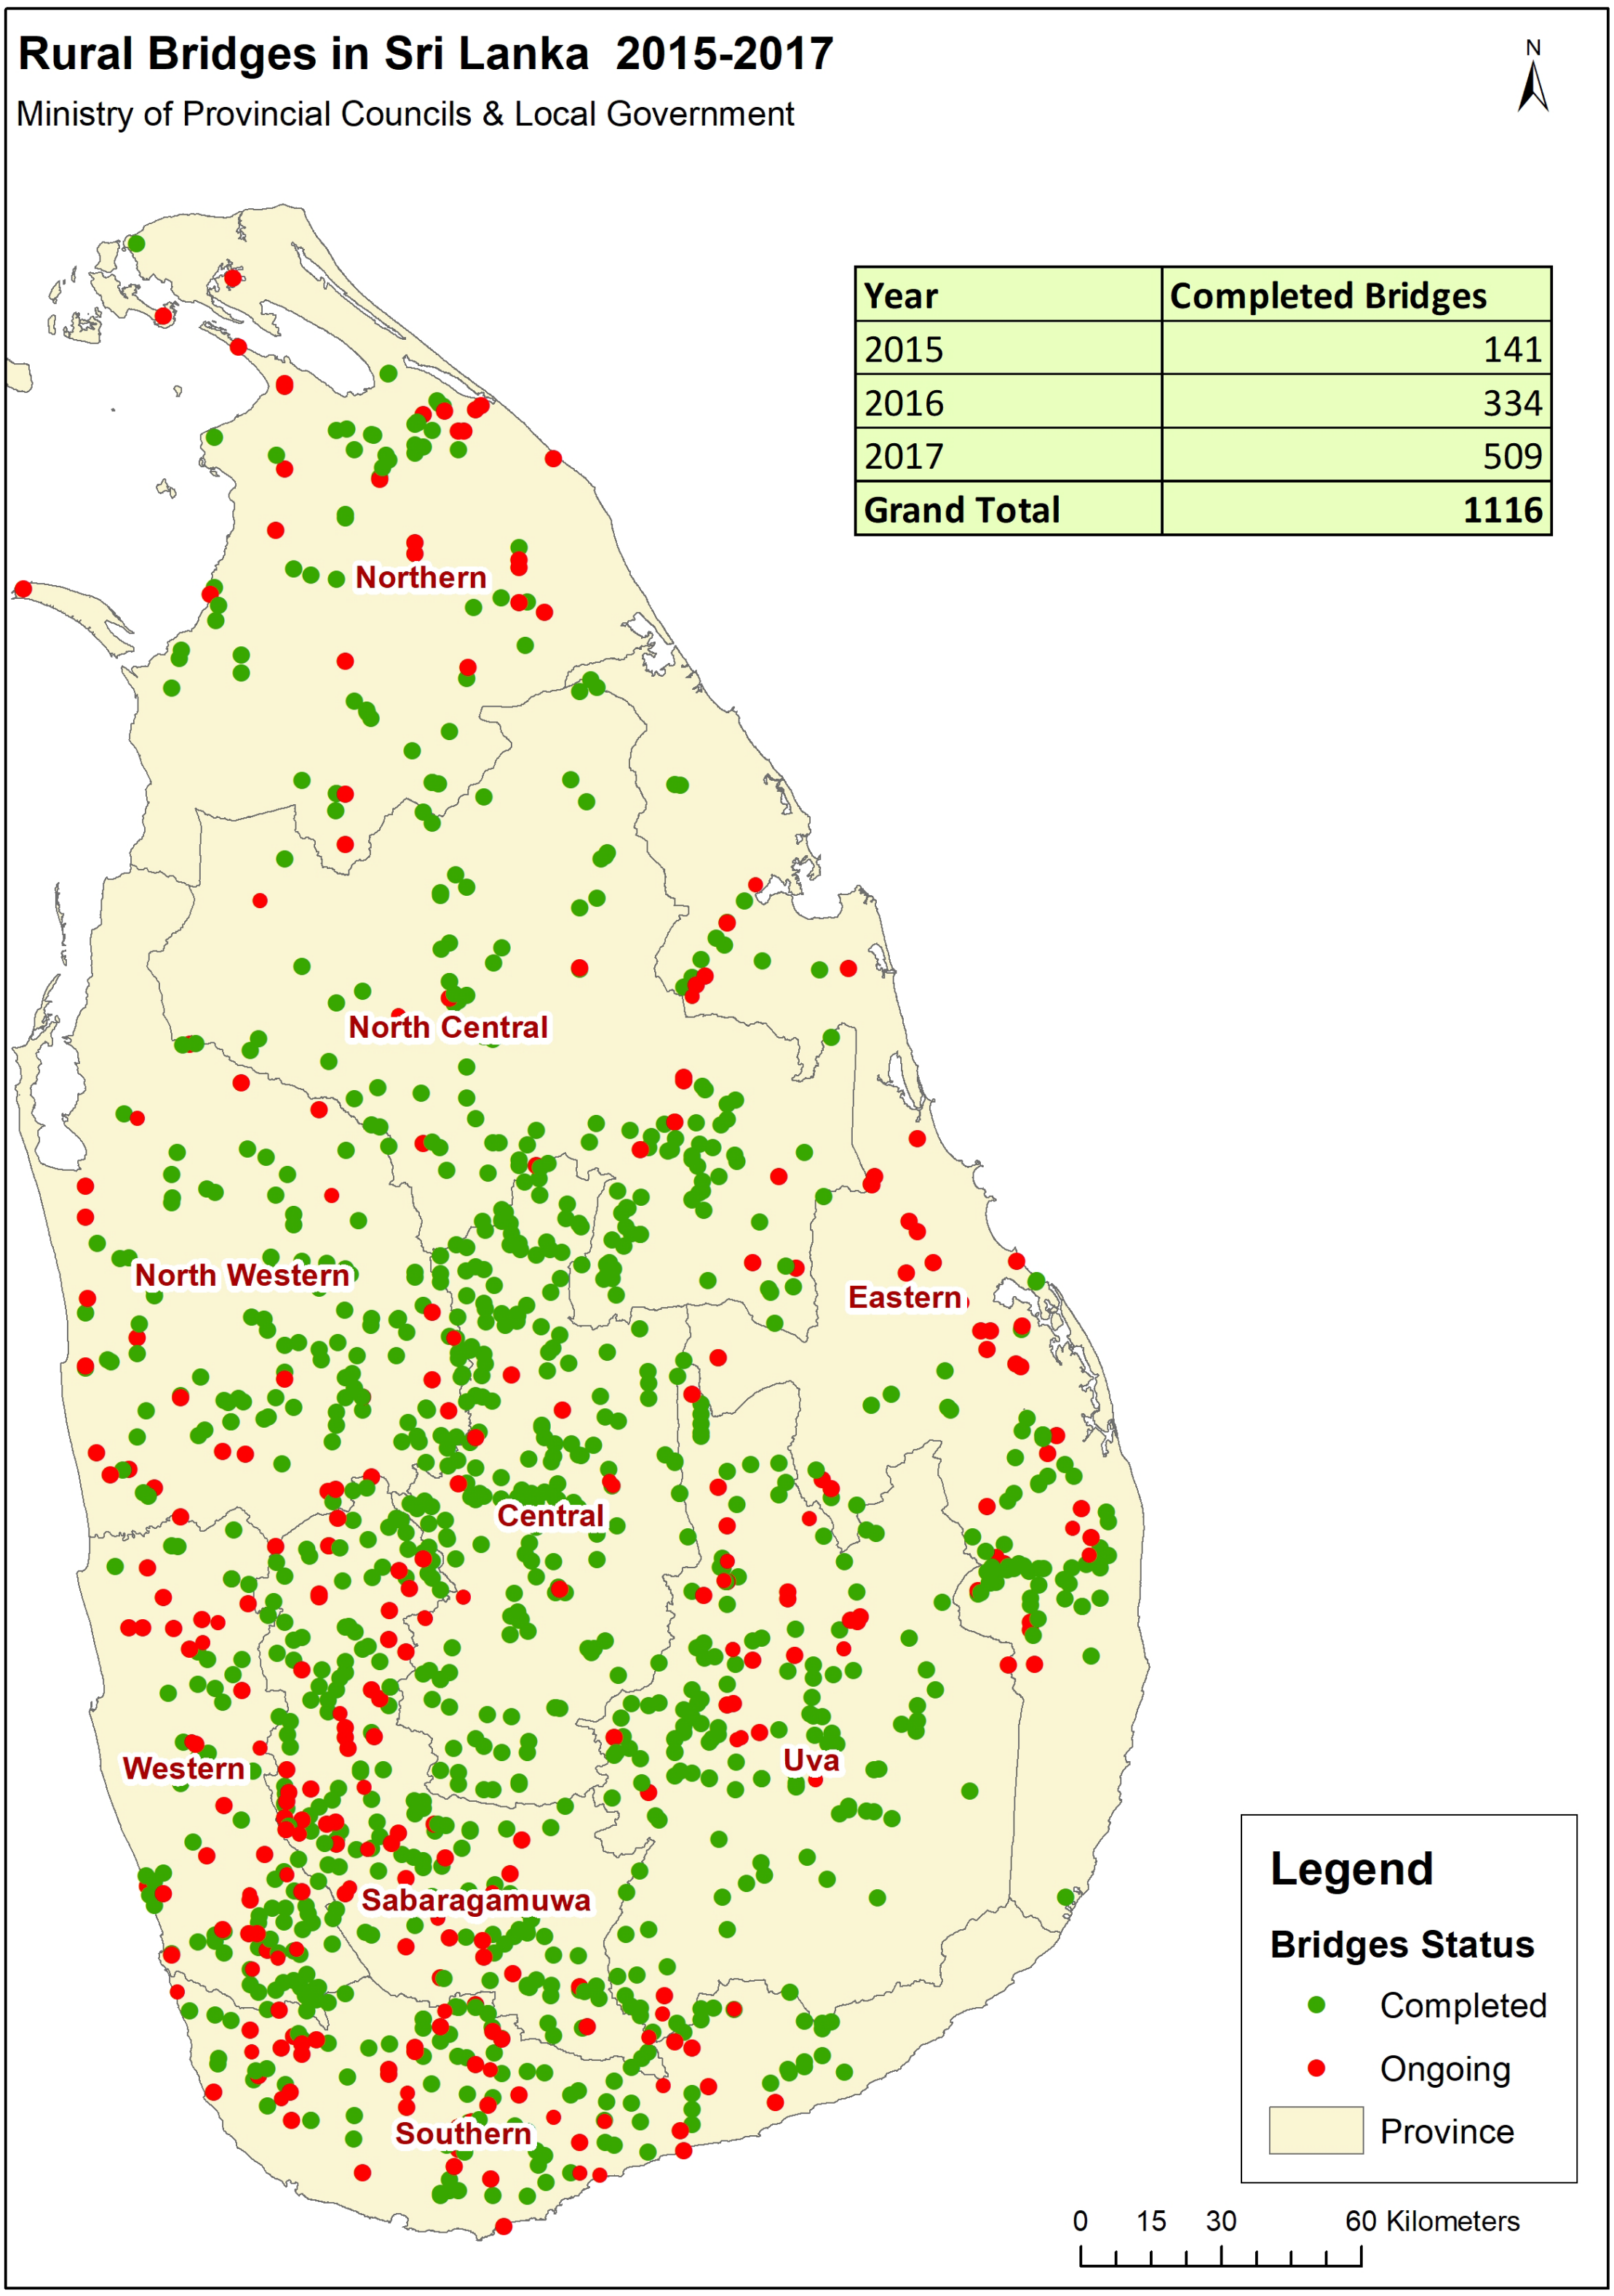

Year	Completed Bridges
2015	141
2016	334
2017	509
Grand Total	**1116**

அட்டவணை இலக்கம் 24 - மாகாணங்களுக்கமைய அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்கள

தொடர். இல	பிரிவு	பௌதீக முன்னேற்றங்கள்					
		கிழக்கு	வடக்கு	வடமத்தி	வடமேல்	ஊவா	மூழு மொத்தம்
01	பிரவேச வீதி	03	326	06	-	03	738
02	ஆயுள்வேத மத்திய நிலையம் / சிகிச்சை மத்திய நிலையம்	02	01	-	-	-	03
03	பாலங்கள் / கட்டுமானங்கள்	10	04	-	-	-	14
04	பஸ்தரிப்பு நிலையங்கள்	02	03	-	-	-	05
05	மயானங்கள் / அடக்கஸ்தலங்கள்	04	04	-	-	-	08
06	சமூக சேவை மண்டபம் / கலாசார மண்டபம் / பல் செயற்பாட்டுக் கட்டடம்	19	10	03	02	01	35
07	சிறுவர் பூங்கா	32	18	04	01	-	55
08	விளையாட்டுத் தளம் / விளையாட்டுத் திடல்	17	03	01	-	-	21
09	கால்வாய்த் தொகுதி	63	11	04	01	-	79
10	மின்சாரத்தை வழங்குதல்	12	-	-	-	-	12
11	நூலக நிர்மானிப்பு	11	03	-	-	01	14
12	வர்த்தக நிலைய நிர்மானிப்பு	64	57	09	04	01	135
13	நீர் விநியோகம்	06	03	04	-	01	14
14	நகரங்களை அழகுபடுத்தல் / கழிவுப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் வாகனங்கள்	04	01	-	-	-	05
15	கால்நடை அறுக்கும் இடம்	-	09	-	-	-	09
16	அலுவலகக் கட்டடம்	25	13	01	02	02	43
	மொத்தம்	**674**	**466**	**32**	**10**	**09**	**1190**

3.2.2.10. அறிவினைக் கேந்திரமாகக் கொண்ட பாடசாலைக் கல்வி முறைமையினை விருத்தி செய்யும் செயற்திட்டங்கள்

நோக்கம்

அறிவினைக் கேந்திரமாகக் கொண்ட பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தியினை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆரம்ப மற்றும் இடைநிலைக் கல்வி தொடர்பிலான பிரவேசங்களும் அதன் பண்புசார் தரத்தை விருத்தி செய்தல்.

கடனுதவி வழங்கும் நிறுவனம்	உலக வங்கி	
செயற்திட்ட செலவினம் (ரூபா. மில்)	13,000.00	
செயற்திட்ட காலம்	2012 - 2017	
அமுல்படுத்தப்படும் பிரதேசம்	நாடு பூராகவும்	
மொத்த பௌதீக முன்னேற்றங்கள்	91%	
மொத்த நிதி முன்னேற்றங்கள் (ரூபா. மில்)	13,123.00	
2017 ஒதுக்கீடு ரூபா. மில்	2730.00	
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று நிதி இலக்கு / முன்னேற்றம்	2730.00	2035.00
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று பௌதீக இலக்கு / முன்னேற்றம்	100%	96%

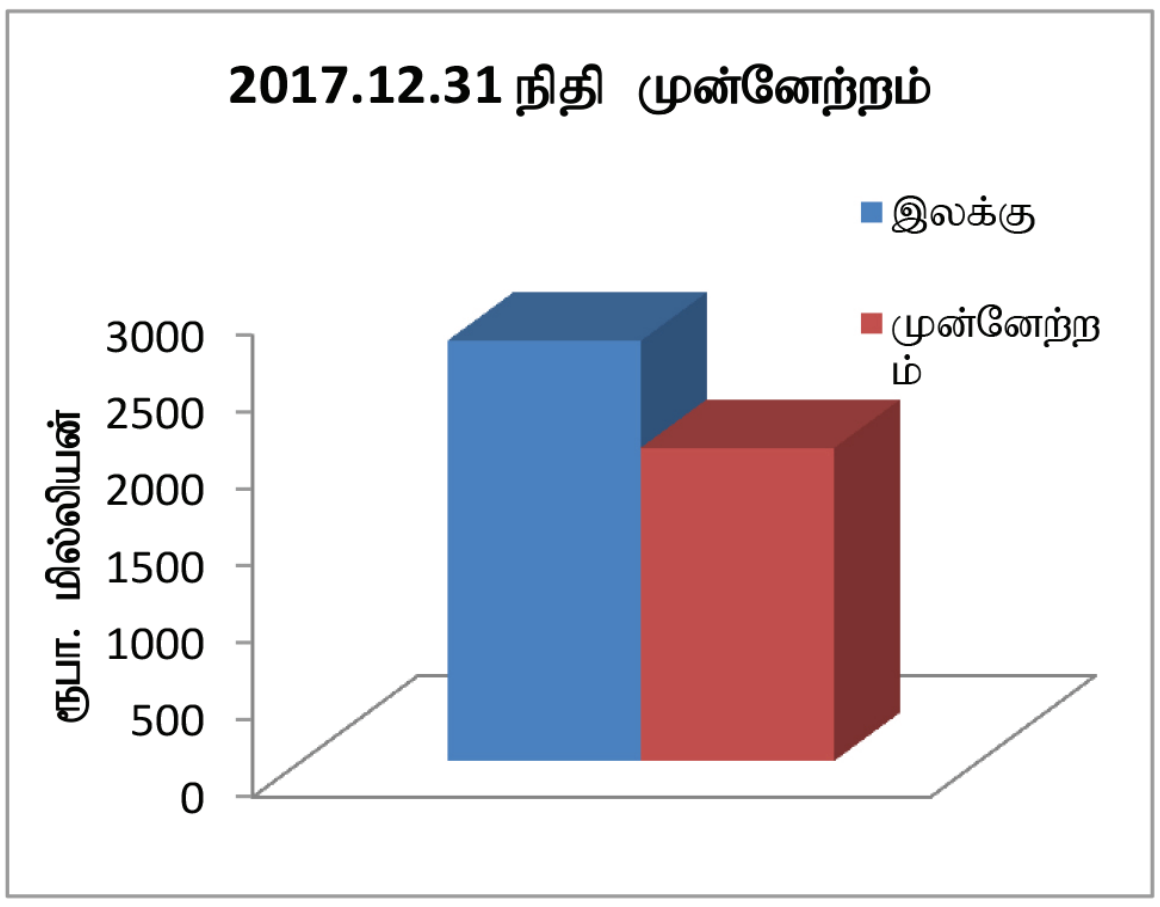

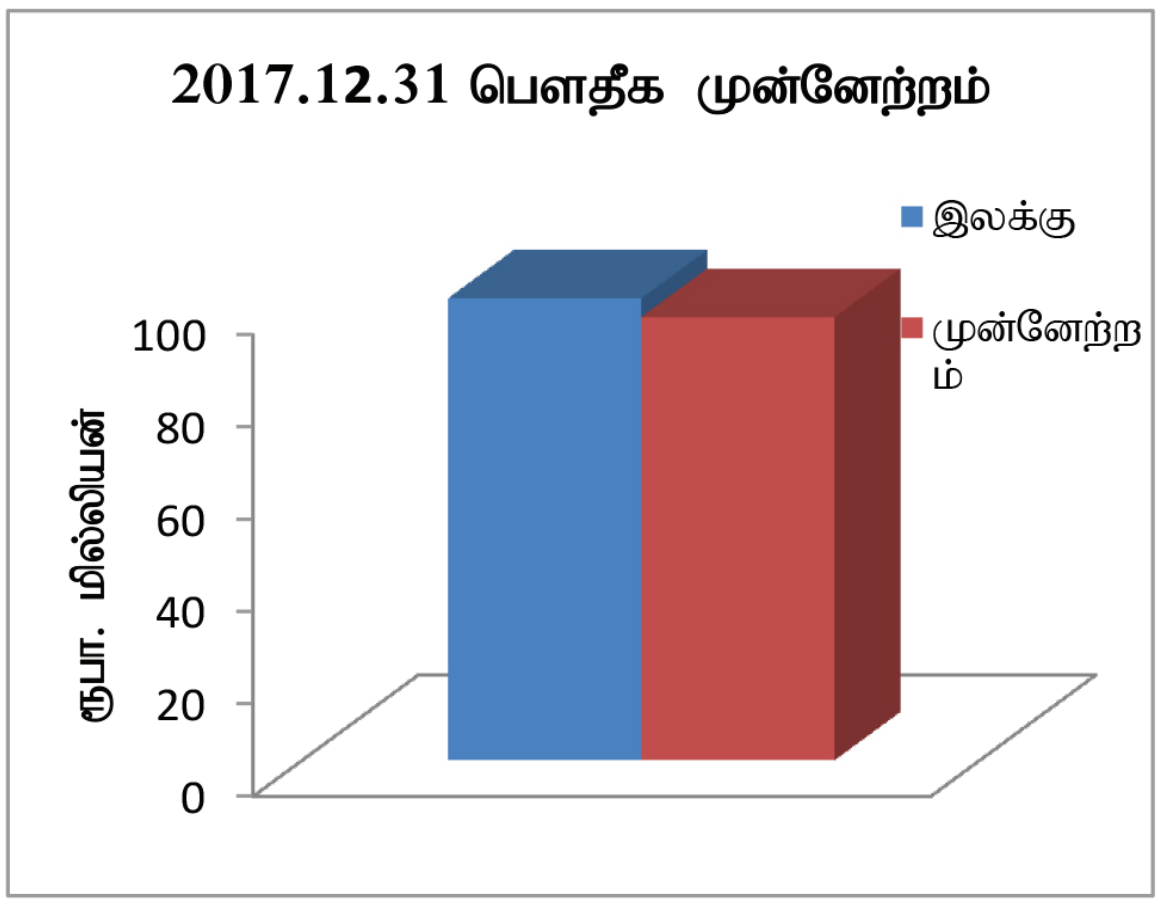

உலக வங்கியின் நிதி உதவியின் கீழ் ரூபா 13,000 மில்லியன் செலவினத்தை மேற்கொண்டு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள இச் செயற்திட்டத்தின் மூலம் சகல மாகாண சபைகளும் தழுவப்படுகின்றன. இச் செயற்திட்டத்தின் நோக்கமாக அமைவது அறிவினை அடிப்படையாகக் கொண்ட பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தியின் அடிப்படையில் ஆரம்ப மற்றும் இடைநிலை கல்வி தொடர்பிலான பிரவேசங்கள் மற்றும் அதன் பண்புசார் தரத்தினை விருத்தி செய்வதாகும். இதன் பௌதீக முன்னேற்றம் 96மூ என்பதுடன் நிதி முன்னேற்றம் 74மூ மாகும்

கல்வி அமைச்சினால் தேசிய மட்டத்தில் இச் செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப்படுவதுடன் மாகாண மட்டத்தில் அமுல்படுத்தப்படுவது மாகாண சபை, மாகாணக் கல்வி அமைச்சு மற்றும் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் ஊடாகவாகும். மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினால் செயற்திட்டத்தின் மாகாண சபைகளுக்குரிய பணிகள் இணைப்புச் செய்யப்படுகின்றன.

- இச் செயற்திட்டத்தின் கீழ் தற்போது 135 தொழில்நுட்ப விஞ்ஞான ஆய்வுகூடங்கள், 721 வகுப்பறைக் கட்டடங்கள், 25 வலயக் கல்வி அலுவலகங்கள் மற்றும் 65 கோட்டக் கல்வி அலுவலகங்களை நிர்மானிக்கும் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.

- 15,936 கணணிகள், ஸ்கேனர், பிரின்டர்ஸ் போன்றன 13083 கணணி உதிர்பாகங்கள், வகுப்பறை கதிரை மேசைகள் 117,795, அலுவலக மேசைகள் மற்றும் கதிரைகள் 18973, அலுவலக உபகரணங்கள் (போட்டோ பிரதி இயந்திரம், பெக்ஸ், மல்டிமீடியா உபகரணங்கள் போன்றன) 3205 கொள்வனவு செய்து விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.

- நிதி முகாமைத்துவம், பெறுகை, சூழல் முகாமைத்துவம், பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட முகாமைத்துவம் பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆசிரியர் அபிவிருத்தி ஆகிய தொனிப்பொருளின் கீழ் மாகாண சபை உத்தியோகத்தர்கள், அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் 4726 பேர்களுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

2017 ஜூன் மாதம் இறுதியில் பூர்த்தி செய்யத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த இச் செயற்திட்டம் 2018 ஜூன் வரை ஒரு வருடத்தினால் நீடிக்கப்பட்டது.

வட மத்திய மாகாணம்

மஹிந்தோதய விஞ்ஞான ஆய்வுகூடக் கட்டடம் - அ/ தீபானி மகா வித்தியாலயம்

மத்திய மாகாணம்

மஹிந்தோதய விஞ்ஞான ஆய்வுகூடக் கட்டடம் - குறுந்துவத்த ரோயல் கல்லூரி

வட மாகாணம்

அலுவலகக் கட்டடம் - மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்

தென் மாகாணம்

பாடசாலைக் கட்டடம் - கா.ஃ. முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி

ஊவா மாகாணம்

பாடசாலைக் கட்டடம் - மொ/ கோங்கஸ் பிட்டிய கனிஷ்ட வித்தியாலயம

கிழக்கு மாகாணம்

திருகோணமலை வடக்கு வலயம் - வலயக் கல்வி அலுவலகக் கட்டடம்

மேல் மாகாணம்

பாடசாலை கட்டடம் - மஹமாய மகளிர் கல்லூரி கொழும்பு

விசேட கல்வி வள மத்திய நிலையக் கட்டடம் - உடுபில கனிஷ்ட கல்லூரி - களணி

வடமேல் மாகாணம்

கட்டடம் - கற்பிட்டி தொகுதி கல்வி அலுவலகம்

சப்ரகமுவ மாகாணம்

கட்டடம் - பலாங்கொடை வலயக் கல்வி அலுவலகம்

3.2.2.11. இரணைமடு நீர்ப்பாசன அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம்

நோக்கம்

நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சூழல் முகாமைத்துவத்திற்காக விருத்தி செய்தல் நீர் மற்றும் நிலத்தின் உற்பத்தித் திறனை நிலையாக விருத்தி செய்தல்.

கடனுதவி வழங்கும் நிறுவனம்	விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச நிதியம் (ஐகுயுனு)	
செயற்திட்ட செலவினம் (ரூபா. மில்)	3,277.44	
செயற்திட்ட காலம்	2012 - 2017	
செயற்திட்ட பிரதேசம்	வட மாகாணத்தின் கிளிநொச்சி மாவட்டம் (நீர்ப்பாசன கிலோ மீற்றர் 390)	
செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் 1. உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் விருத்தி ♦ நீர்பாசனப் புணரமைப்பு ♦ ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் விருத்தி 2. உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் செயற்பாட்டு ஊக்குவிப்பு 3. செயற்திட்ட முகாமைத்துவம்		
மொத்த பௌதீக முன்னேற்றம	99'19]	
மொத்த நிதி முன்னேற்றங்கள் (ரூபா. மில்)	3250.46	
2017 ஒதுக்கீடு ரூபா. மில்	675.00	
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று நிதி இலக்கு/ முன்னேற்றம்	675.00	663'60
2017.12.31 ஆம் திகதியன்று பௌதீக இலக்கு/ முன்னேற்றம்	100%	99'19]

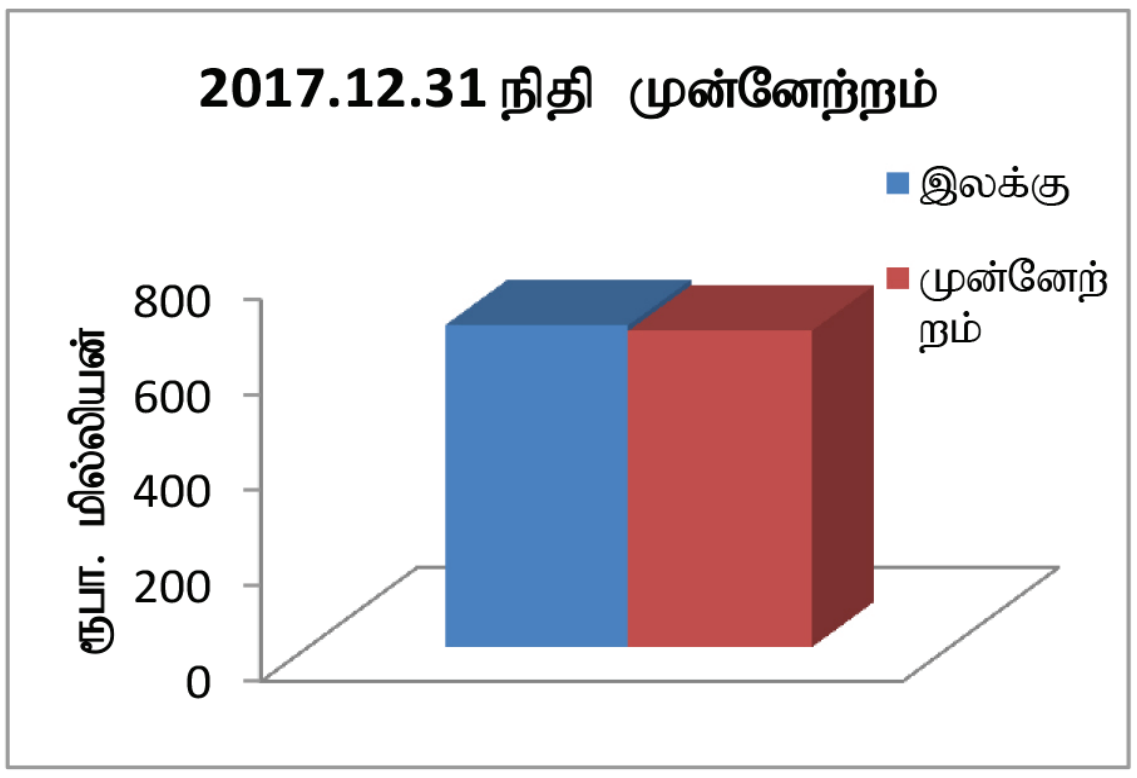

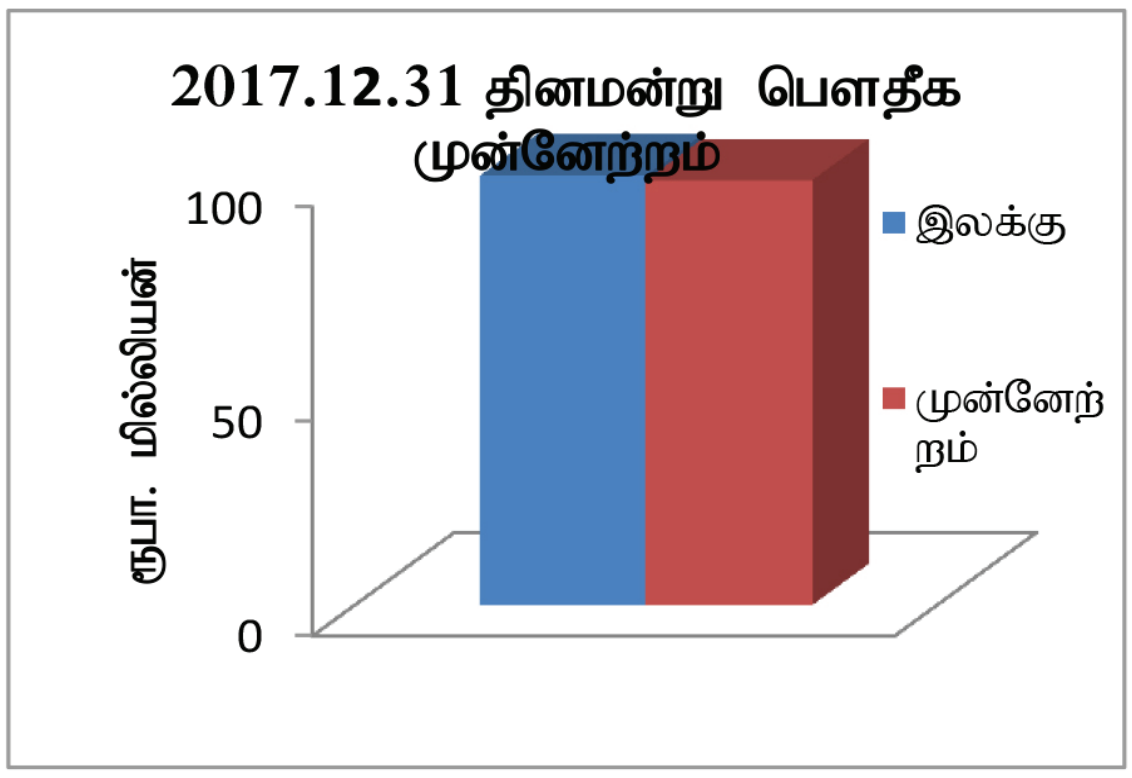

அட்டவணை இலக்கம் 25 - நிதியத்தின் முன்னேற்றம் - இரணைமடு நீர்ப்பாசண அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்

நிதியம்	திரண்ட செலவினம் ரூபா. மில்			2017 ஆம் ஆண்டு ஒதுக்கீடு மற்றும் செலவினம் ரூபா. மில்			
	மொத்த மதிப்பீடு	திரண்ட செலவினம் 2017 டிசம்பர் மாதத்திற்கு	ூ	மொத்த மதிப்பீடு	திரண்ட செலவினம் 2017 டிசம்பர் மாதத்திற்கு	ூ	மொத்த மதிப்பீடு
IFAD	2883.44	2883.44	100	567.79	900.00	567.79	99.9
GOSL	394.00	367.82	93.66	119.57	100.00	118.49	99.09
மொத்தம்	3277.44	3250.46	92.26	687.36	1000.00	985.90	99.78

மூலம் - இரணைமடு நீர்ப்பாசன அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம

வஅட்டவணை இலக்கம் 26 - பௌதீக முன்னேற்றம் - இரணைமடு நீர்ப்பாசன அபிவிருத்திச

வாய்க்கால் தொகுதி புணரமைப்பு	அலகு	இலக்கு	உண்மையான	திரண்ட முன்னேற்றம்	%
கால்வாய் புணரமைப்பு	கி.மீ	401	359	359	100
கட்டமைப்பு (ளுவசரஉவரசநள) நிர்மானிப்பு (வாய்க்கால், பாதுகாப்புக் கட்டுமானம் பாலங்கள், நீர் ஓடைகள் உட்பட)	கி.மீ	70	70	70	100
கட்டட நிர்மானிப்பு	எண்ணிக்கை	426	1950	3000	100

சிறிய அளவு கிணறுகள் 20 / குழாய் நீர்க் கிணறு 60 / 44 கி.மீ வேலி நிர்மானிப்பு	எண்ணிக்கை	05	05	05	100
தானியங்களை உலர்த்துவதற்கான வளாக நிர்மானிப்பு	எண்ணிக்கை	930	66	68	100
நெற் களஞ்சியசாலை நிர்மானிப்பு	எண்ணிக்கை	21	21	21	100
விவசாய வீதிப் புனரமைப்பு (கொங்கிரிக், கிறவல்)	எண்ணிக்கை	06	03	03	100
விவசாய வீதிப் புனரமைப்பு (கொங்கிரிக், கிறவல்)	கி.மீ	150	45	45	100

மூலம் - இரணைமடு நீர்ப்பாசன அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம்

அட்டவணை இலக்கம் 24 - உற்பத்தி மற்றும் சந்தை

செயற்பாடுகள்	அலகு	இலக்கு	முன்னேற்றம்	%
▪ **சமூக நேரடியான செயற்பாடுகள் மற்றும் பயிற்சி வேலைத்திட்டங்கள்**				
விவசாய அமைப்புக்களைப் பலப்படுத்தல்	எண்ணிக்கை	83	83	100
விவசாயிகளுக்குப் பயிற்சியளித்தல்	எண்ணிக்கை	14,000	14,929	100
கூடுதலான நீரை வெளியேற்றும் முறைகள் தொடர்பில் விவசாயிகளுக்குப் பயிற்சி வழங்குதல்	எண்ணிக்கை	1675	1678	100
▪ **உற்பத்தி மற்றும் சந்தை வாய்ப்பு**				
நெல் அல்லாத பயிர் பல்வகை வேலைத்திட்டங்கள்				
திட்டமிடப்பட்ட பயிற்சி வேலைத்திட்டங்கள்	அமர்வு எண்ணிக்கை	460	425	92
குழு தாபித்தல்	குழு எண்ணிக்கை	423	423	100
நெல் அல்லாத பயிர் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்குப் பயிற்சி வழங்குதல்	பயிற்சி எண்ணிக்கை	2220	3688	100

நெல் அல்லாத பயிர் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் பயிர்ச் செய்கைகளை மேற்கொள்ளல்	ஏக்கர் அளவு		1518	
கறவைப்பசு வளர்ப்பு தொடர்பில் விவசாயிகளுக்குப் பயிற்சியளித்தல்	பயிற்சி எண்ணிக்கை	200	200	100
பயன்மிக்க விவசாயப் பயன்பாடுகளுக்காக மாதிரிப் பயிர்ச் செய்கை நிலங்களைத் தாபித்தல்	மாதிரி எண்ணிக்கை	500	631	100
நெல் அல்லாத பயிர் வேலைத்திட்டங்கள் தொடர்பிலான மாதிரி	மாதிரி எண்ணிக்கை	1672	2784	100
விவசாய விற்பனை ஒப்பந்தத்திற்காக விவசாயிகளுக்கு பயிற்சியளித்தல்	பயிற்சி எண்ணிக்கை	350	115	33
சிறு வர்த்தகம் தொடர்பில் விவசாயிகளுக்குப் பயிற்சியளித்தல்	வர்த்தக எண்ணிக்கை	350	98	28
மரக்கறி மற்றும் பழச் செய்கைகளுக்காக பெண்கள் குழுவின் பங்கேற்பினைப் பெற்றுக் கொள்ளல்	குழு எண்ணிக்கை	423	423	100
▪ **தூய நிதி**				
திட்டமிடப்பட்ட வேலைத்திட்டங்கள்	குழு எண்ணிக்கை	80	60	75
தூய நிதிக் குழுவினைத் தாபித்தல் (குழுவின் சேமிப்பு மற்றும் உள்ளகக் கடன்)	குழு எண்ணிக்கை	150	150	100
பயனாளிகளுக்குப் பயிற்சியளித்தல்	பயிற்சி எண்ணிக்கை	750	1889	100
தூய நிதியின் கீழ் நேரடிச் செயற்பாடுகளுக்காக கடன் வழங்குதல்	கடன் புள்ளி விபரம்	200	180	90
▪ விவசாயப் பண்னை அல்லாத செயற்பாடுகள				
கறவைப் பசு வளர்ப்பு தொடர்பில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சியளித்தல்	பயிற்சி பெற்ற புள்ளி விபரங்கள்	200	200	100
பால் உற்பத்தியை விருத்தி செய்வதற்காக பெண்களுக்கு உதவி வழங்குதல்	உதவிகளைப் பெற்ற பெண்கள் எண்ணிக்கை	200	150	75
ஏனைய விவசாயப் பண்னை அல்லாத செயற்பாடுகளுக்காகப் பொருத்தமான உதவிகளை வழங்குதல்	உதவிகளை பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை	300	அமுல் படுத்தப்பட்டுள்ளது	

மூலம் - இரணைமடு நீர்ப்பாசன அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம்

முன்னர் இருந்த நிலைமை

தற்போதைய நிலைமை

முன்னர் இருந்த நிலைமை

தற்போதைய நிலைமை

3.2.2.12. அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் பிரதேசங்களின் கிராமிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம்ள

நோக்கம் வடக்கு, கிழக்கு, வடமத்தி மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் கிராமிய வீதிகள், மத்திய மற்றும் சிறியளவு நீர்ப்பாசனம் உட்பட குடிநீர் வழங்கல் வசதிகள் போன்ற அடிப்படை உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மூலம் இம் மாகாணங்களில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தல் மற்றும் அதன் மூலம் கிராமிய பொருளாதார அபிவிருத்திக்காகப் பங்களிப்பு உட்பட பிரதேச முறன்பாடுகளை மட்டுப்படுத்தல்.	
கடனுதவி வழங்கும் நிறுவனம்	ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவர் (துஜஊயு)
செயற்திட்ட செலவினம்	ரூபா. 12.8 பில்லியன் (ஒரு மாகாணத்திற்கு ரூபா. 3.2 பில்லியன் வீதம்)
செயற்திட்டக் காலம்	2017 தொடக்கம் 2021 வரை
அமுல்படுத்தும் பிரதேசம்	வடக்கு, கிழக்கு, வடமத்தி மற்றும் ஊவா மாகாணம்
செயற்திட்டச் செயற்பாடுகள் உப மொத்தம் - 524 ➢ கிராமிய வீதி புணரமைப்பு - 275 ➢ நீர்ப்பாசன வசதி நிர்மானிப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு - 151 ➢ குடிநீர் வழங்கல் - 98	

2017 ஆம் ஆண்டு செயற்பாடுகள்

- 2017.07.07 கடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடல்.
- செயற்திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவினைத் தாபிப்பதற்காக பணியாளர் சபையினை அங்கீகரித்தல்.
- செயற்திட்ட நிர்மானிப்புக்களுக்காக ஆலோசனை சேவைகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக பெறுகைச் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளல்.
- மாகாண செயற்திட்டங்களை அமுல்படுத்தும் அலகினைத் தாபிப்பதற்காகத் தேவையான பணியாளர் சபையினை அங்கீகரிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்.

3.3. தேசிய திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவ உதவி மத்திய நிலையம்

நோக்கு : சகலருக்கும் மிகுந்த வசதிகொண்ட சூழல்

நோக்கம் : உள்ளூராட்சி மன்ற அதிகாரப் பிரதேசங்களில் திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளல்.

செயற்பாடுப் பணிகள்

- ❖ உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு முறையான மற்றும் பொருத்தமான திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் சட்டங்களை வகுத்தல் மற்றும் ஆலோசனைகளை வழங்குதல்.

- ❖ திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவம் தொடர்பான உரிய தொழில்நுட்ப உதவியினை உள்ளூ ராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு வழங்குதல்.

- ❖ திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்தின் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு அனுபவங்களுக்காக உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை ஊக்குவித்தல்.

- ❖ அரச சார்பற்ற அமைப்புக்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதி உதவிகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு உதவுதல்.

- ❖ உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக கழிவு முகாமைத்துவத்திற்கு தேவையான கட்டடங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.
- ❖ 3சு முறைகளை விருத்தி செய்தல். (சுநனரளநஇ சுநரளநஇ சுநஉலஉடந)

1.9.1.விசேட செயற்திட்டங்கள் - ஜப்பான் தொழில்நுட்ப சேதனப் பசளை இயந்திர உபகரணங்களைத் தாபித்தல்.

- ❖ தற்போது இலங்கையில் தொழிலாளர் ஊழியத்தை பயன்படுத்தி சேதனப் பசளை உற்பத்திகள் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் அம்முறைக்குப் பதிலாக இயந்திர உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி வினைத்திறனுடன் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
- ❖ 2017 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் 09 மாகாணங்களைத் தழுவக்கூடியவாறு இயந்திர உபகரணங்கள் தாபிக்கப்படுகின்றது. இவ் இயந்திர உபகரணங்கள் மூலம் நாளொன்றுக்கு (50) டொன் கழிவுப் பொருட்கள் சேதனப் பசளையாக மாற்றப்படுவதுடன் 50 உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் உக்கக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களுக்காக தீர்வுகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் இதன் உற்பத்தியின் பண்புசார் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக சேதனப் பசளைக்காக சந்தை வாய்ப்பினை அறிமுகப்படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

குண்டசாலை பிரதேச சபை - ஜப்பான் தொழில்நுட்ப சேதனப் பசளை இயந்திரம்

இயந்திர உபகரணங்களை தாபிக்கவுள்ள மாகாணங்கள் மற்றும் இடங்கள்	உக்கக்கூடிய கழிவுப் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள்
மேல் மாகாணம், பேருவள	மெதிரிகிரிய பிரதேச சபை, திம்புலாதகல, வெலிக்கந்த, ஹிங்குரன்கொட, லங்காபுர பிரதேச சபை
வடமத்திய மாகாணம், மெதிரிகிரிய	தம்புள்ள நகர சபை, கெல்லோவள பிரதேச சபை, தம்புள்ள பிரதேச சபை, லக்கல பல்லேகம பிரதேச சபை, நாவுல பிரதேச சபை, கொக்கிராவ பிரதேச சபை, களுகஸ்வாவ பிரதேச சபை
மத்திய மாகாணம், தம்புள்ள, திகம்பதக	கேகாலை நகர சபை, கேகாலை பிரதேச சபை, மாவனல்ல பிரதேச சபை, அறநாயக்கபுர பிரதேச சபை, புளத்கொஹு பிட்டிய பிரதேச சபை, தெஹியோவிட்ட பிரதேச சபை, கலிகமுவ பிரதேச சபை, ருவன்வெல்ல பிரதேச சபை, யட்டியன்தொட்ட பிரதேச சபை. தரணியகல பிரதேச சபை, றம்புக்கன பிரதேச சபை, வறக்காப்பொல பிரதேச சபை
சப்ரகமுவ மாகாணம், கேகாலை	ஹம்பாந்தோட்டை நகர சபை, ஹம்பாந்தோட்டை பிரதேச சபை, அம்பலாந்தோட்ட பிரதேச சபை,
தென் மாகாணம், ஹம்பாந்தோட்டை	இப்பாகமுவ பிரதேச சபை, குருநாகல் பிரதேச சபை, மாவத்துகம பிரதேச சபை, ரிதிகம பிரதேச சபை, வாரியபொல பிரதேச சபை
வடமேல் மாகாணம், இப்பாகமுவ	அட்டாளைச்சேனை பிரதேச சபை, சம்மாந்துறை பிரதேச சபை, அக்கரைப்பற்று நகர சபை, கல்முனை மாநகர சபை, காரைதீவு பிரதேச சபை, நிந்தவூர் பிரதேச சபை

கிழக்கு மாகாணம், அட்டாளைச்சேனை	பதுளை மாநகர சபை, மீஹகிவுல பிரதேச சபை, பதுளை பிரதேச சபை, சொரணாதோட்ட பிரதேச சபை, கந்தகெட்டிய பிரதேச சபை, ஹாலிஎல பிரதேச சபை
ஊவா மாகாணம், பதுளை	வடமாராட்சி பிரதேச சபை, சவகச்சேரி நகர சபை, பருத்தித்துறை நகர சபை, வல்வெட்டித்துறை நகர சபை, சவகச்சேரி பிரதேச சபை, வலிகாமம் (மேற்கு) பிரதேச சபை
வடமாகாணம், வடமாராட்சி தென்மேற்கு	

சகல உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் கழிவுப் பொருட்களை வேறுபடுத்தும் பணிகளை ஆரம்பித்தல்.

❖ கழிவுப் பொருட்களை வேறுபடுத்துவதற்காக நடவடிக்கை எடுப்பது 2017 ஆம் ஆண்டில் சகல உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினதும் கட்டாயத் தேவையாக கருதப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவ்வாறு வேறுபடுத்தப்பட்ட கழிவுப் பொருட்களை சேதனப் பசளையாக மாற்றியமைக்க உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் கொத்தனி முறைமைக்கமைய ஒன்று திரட்டும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. உக்காத கழிவுப் பொருட்களை மீள் சுழற்றி செய்வதற்காக தனியார் துறையினை ஊக்குவித்து அரச மற்றும் தனியார் கூட்டிணைந்த செயற்திட்டம் இதற்கென ஆரம்பிப்பதற்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. உக்காத இருப்பினும் மீள் சுழற்றி செய்ய முடியாத கழிவுப் பொருட்கள் சுத்திகரிப்புத் தளங்களுக்கு அனுப்புவதற்காக சுத்திகரிப்பு தளங்களை நிர்மானிக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

❖ கொழும்பு மற்றும் சன நெரிசல் கொண்ட பிரதேசங்களில் கழிவு முகாமைத்துவம் தொடர்பான செயற்சாதனை அணி மற்றும் செயற்பாட்டுக் குழுவினைத் தாபித்தல்.

❖ பொது மக்களின் முறைப்பாடுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக 1917 என்ற தொலைபேசி ஊடாக தொடர்பு கொள்ளத் தேவையான வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

❖ கிடைக்கும் முறைப்பாடுகளை துரிதகதியில் தீர்ப்பதற்காக முப்படையினர் மற்றும் சுற்றாடல் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களினால் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.

❖ முறையற்ற ரீதியில் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவது தொடர்பில் முறைப்பாடுகளை பெறும் போது அது தொடர்பில் சட்ட ரீதியிலாக செயற்பட சூழல் பொலிசாரினால் நடவடிக்கை எடுத்தல்.

❖ முப்படை உத்தியோகத்தர்களினால் கொழும்பு மற்றும் சன நெரிசல் கொண்ட பிரதேசங்களின் வீதிகள் மற்றும் குறுக்கு வீதிகளில் சட்ட விரோதமாக கழிவுப் பொருட்கள் வெளியேற்றல், வீதியில் காணப்படும் விபத்து அபாய நிலைமைகள் தொடர்பிலும் அறிக்கையினைச் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் அதனைத் திருத்தியமைப்பதற்கு உரிய நிறுவனங்களுக்கு அனுப்புதல.

டெங்கு ஒழிப்பு வேலைத்திட்டம்

நாட்டில் டெங்கு அபாயம் கொண்ட சூழலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நிறுவனங்களை அறிவுறுத்தி தேவையான வேலைத்திட்டங்களை வகுத்தல் மற்றும் அவற்றைத் தொடர்ச்சியாக அமுல்படுத்துவதற்கு உதவுவதன் மூலம் டெங்கு அற்ற சூழலை கட்டியெழுப்ப உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு உதவுதல்.

அட்டவணை இலக்கம் 33 - திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ முன்னேற்றங்கள் (2017.12.31 ஆம் திகதியன்று) தேசிய திண்மக் கழிவு

தொ. இல	செயற்திட்டம்	மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதி (ரூபா)	உண்மையான செலவினம் (ரூபா.)	உண்மையான பௌதீக முன்னேற்றங்கள்
01	ஜப்பான் தொழில்நுட்ப சேதனப் பசளை இயந்திரத்தைத் தாபித்தல்	748,000,000	662,016526	100%
02	சேதனைப் பசளைப் பிரிவு, கழிவுப் பொருள் மீள் சுழற்சி மத்திய நிலையம் மற்றும் உக்காத கழிவுப் பொருள் மீள் சுழற்சி மத்திய நிலையத்தை நிர்மானித்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல்.	235,000,000	118,042,670	100%
03	இயந்திர உபகரணங்களைக் கொள்வனவு செய்தல் மற்றும் விநியோகித்தல் (கழி பவுசர் மற்றும் பொப்கட் இயந்திரம்)	116,000,000	--	50%
04	சேரக்கூடிய இடத்திலேயே கழிவுப் பொருட்களை வேறுபடுத்தல் மற்றும் மனை சேதனப் பசளை உற்பத்தியினை விருத்தி செய்தல் உட்பட அறிவுறுத்தல் வேலைத்திட்டத்தை நடாத்துதல்.	32,0 00,000	35,751,616	100%
05	இலத்திரணியல் ஊடகங்கள் மூலம் அறிவுறுத்தல் வேலைத்திட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சி வேலைத் திட்டங்களை நடாத்துதல்.	25,000,000	16,753,997	100%
06	கழிவு முகாமைத்துவ செயற்பாட்டுப் பிரிவினை அமுல்படுத்தல்	44,000,0000	4,7335,74	100%
	மொத்தம்	**1200,000,000**	**837,298,383**	

ஹம்பாந்தோட்டை மாநகர சபையின் களி சுத்திகரிக்கும் முறைகளை நவீன மயப்படுத்தல்.

உக்காத கழிவு மீள் சுழற்சி மத்திய நிலையத்தை கதிர்காமம் பிரதேசத்தில் தாபித்தல்

North East Local Services Improvement Project (NELSIP) 2015-2017

Ministry of Provincial Councils & Local Government

Year	No of Sub Projects	Total Expenditure (Rs Mn)
2,015	44	479.21
2,016	295	1,921.79
2,017	131	1,068.82
Total	**470**	**3,470**

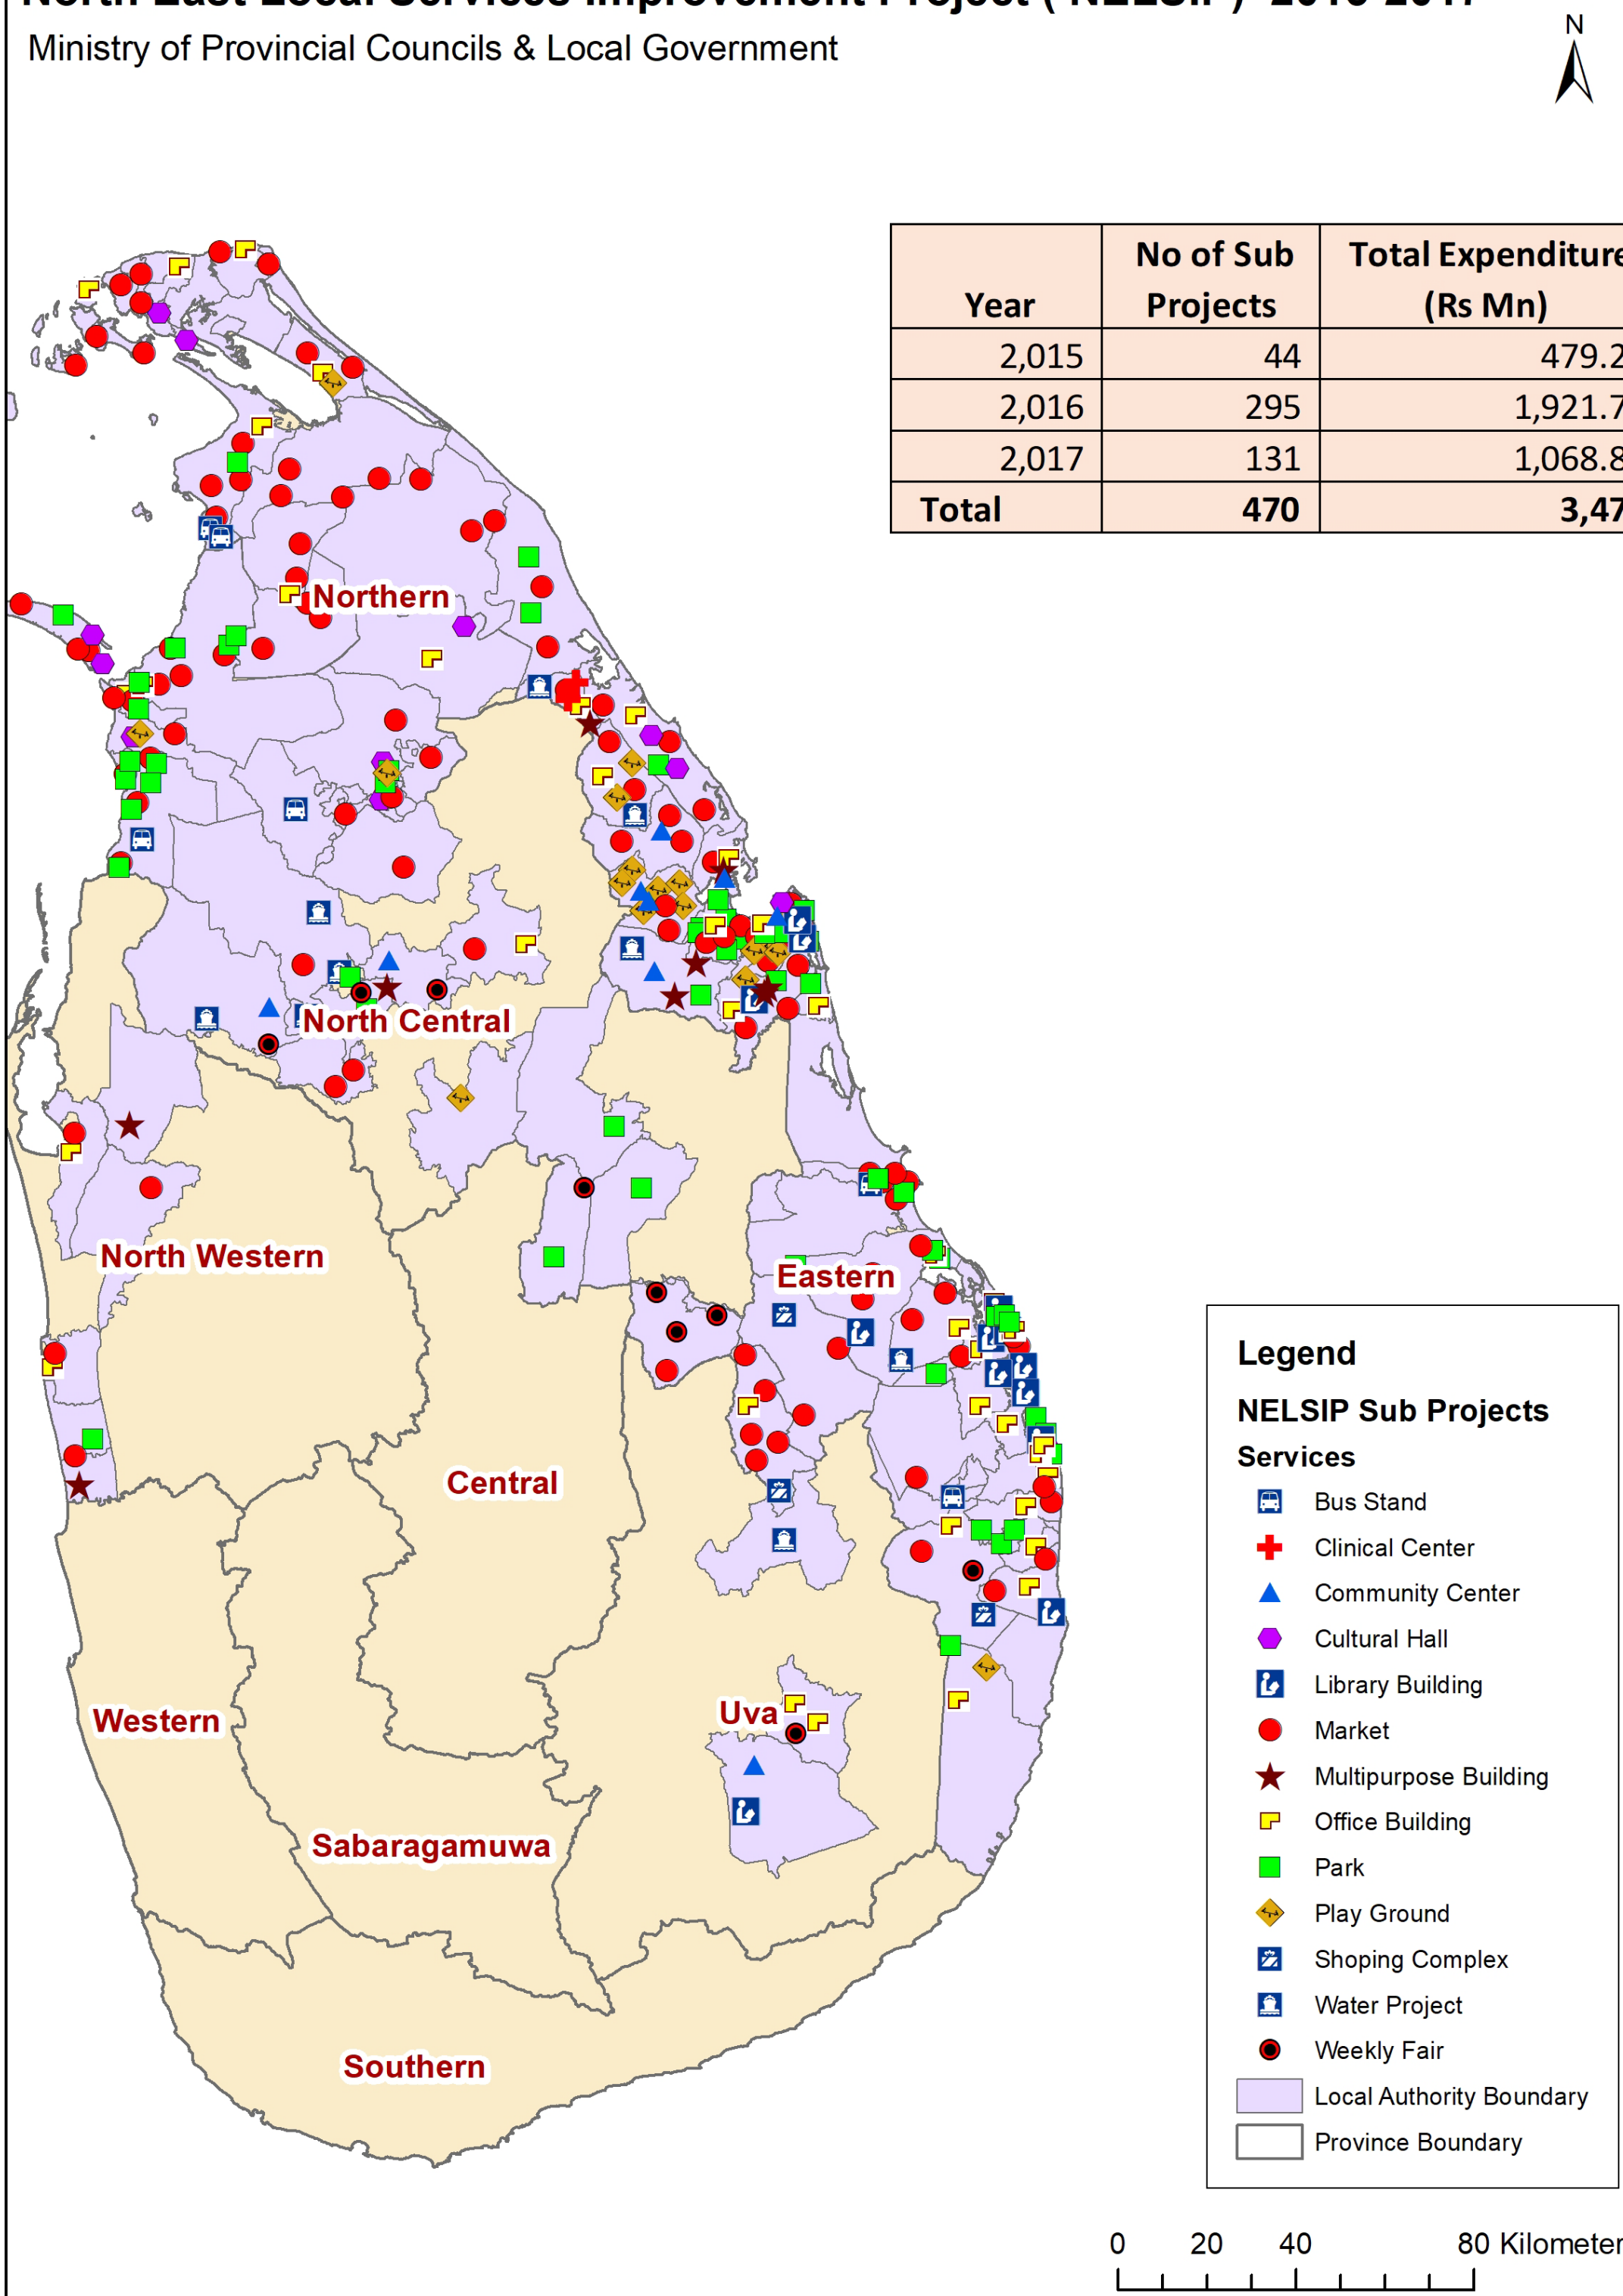

Note: "NELSIP has completed1190 sub projects during the period from 2012 to 2017.

3.4. உள்ளூராட்சி மன்றப் பிரிவு

நோக்கம் :

பிரதேச வளங்கள் மற்றும் சக்திகளை கூட்டாக இணைந்து பிரதேச அடையாளங்களை பாதுகாக்கும் வகையில் சுயபலத்துடன் செயற்படக்கூடிய நிறுவனமாக மாற்றியமைக்கும் அபிலாசையுடன் அபிவிருத்தி இலக்குகளை எட்டி தமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்களை வெற்றிகரமாக அமுல்படுத்தும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை உருவாக்குவதற்காகத் தேவையான தேசிய மட்டத்திலான மேற்பார்வைப் பணிகளை முன்னெடுத்தல்.

மூல உபாயத் திட்டங்கள் :

01. சிறந்த நிருவாக மூல அம்சங்களுக்கமைய அவ்வவ் மாகாணங்களில் காணப்படும் மானிட வள மூலதனம் மற்றும் சூழல் வளங்களை உற்பத்தித்திறன் மிக்கதாக பயன்படுத்தி வருமான வகைகளை உரிய முறையில் பலப்படுத்தல்.

02. வெளி குடிவரவு விகிதாசாரம் ஒப்பீட்டு ரீதியில் உயரிய மட்டத்தில் காணப்படும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் அதனை மட்டுப்படுத்துவதற்கு பொருத்தமான கொள்கைகள் மற்றும் நீண்ட கால வேலைத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தல்.

03. இலங்கையின் மொத்த சமூக, பொருளாதார அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின் பாதுகாப்பு கருதி அவ்வவ் மாகாணங்களில் காணப்படும் மானிட வளத்தின் பயன்பாட்டினை உறுதிப்படுத்தல்.

3.1.1. 2017 ஆம் ஆண்டுக்காக உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் முன்னணி அலுவலக முறைமையினை அமுல்படுத்தல்.

உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் சேவைகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக வருகை தரும் பொது மக்களுக்கு தேவையான வரிப் பணக் கொடுப்பனவு, தேவையான மாதிரிப் படிவங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளல் போன்ற முன்னணி சேவைகளை வழங்கும் இப்பணிகளை வினைத்திறனுடன் வழங்கும் நோக்குடன் 106 உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் முன்னணி வேலைத்திட்டங்களை ஆரம்பிக்கும் வேலைத்திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

இதற்கமைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் முன்னணி அலுவலகங்களைத் தாபிப்பதற்காக மற்றும் அதனைப் பயன்படுத்துவதற்காக கணணி இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்களைப் போன்று அவற்றுக்குத் தேவையான அலுவலகத் தளபாட உபகரணங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக நிதி ஒதுக்கீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இம்முன்னணி அலுவலகங்களைத் தாபிப்பதன் மூலம் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் அறவிடப்படும் பல்வேறுபட்ட வரிக் கொடுப்பனவுகள், பல்வகைக்கூலிக் கொடுப்பனவுகள், பல்வேறுபட்ட அனுமதிப்பத்திரங்களை வழங்குதல் மற்றும் வீதி வரைபடச் சான்றிதழ், தீர்வைச் சான்றிதழ்கள் போன்ற சான்றிதழ்களை வழங்குதல் ஆகிய உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் இடம்பெறும் பணிகளை துரிதகதியில் மேற்கொள்ளல்.

முன்னணி அலுவலகங்களைத் தாபிப்பதற்காக நிதி வழங்கும் செயற்பாடுகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டவாறு அமைகின்றன.

	மாகாணம்	மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை	அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி ரூபா. மில்லியன்
1	மேற்கு	21	13.48
2	மத்தி	10	6.87
3	தெற்கு	05	3,69
4	வடமேல்	13	8.41
5	சப்ரகமுவ	13	8.56
6	ஊவா	06	4.44
7	வடக்கு	03	2.25
8	கிழக்கு	35	23'72
	மொத்தம்	**106**	**71.42**

ஏற்கனவே தாபிக்கப்பட்ட ஒருசில முன்னணி அலுவலகங்களின் புகைப்படங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

புதிய உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களைத் தாபித்தல் மற்றும் அமுலில் உள்ள உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான ஒப்பளவுகளை தீர்மானித்தல்.
இலங்கையில் புதிய உள்ளூராட்சி மன்றங்களைத் தாபிப்பது தொடர்பில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறைகள் அல்லாத கொள்கைகள் இன்மையினால் புதிதாக உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களைத் தாபிப்பதைப் போன்று காணப்படும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை தரமுயர்த்தும் செயற்பாடுகள் முறையாக இடம்பெறுவதில்லை என மேற்பார்வை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கமைய புதிய உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களைத் தாபித்தல் மற்றும் காணப்படும் உள்ளூ ராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை தரமுயர்த்துவதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறைகளை வகுக்கும் நோக்குடன் அதற்குரியதான தேசிய ஒப்பளவு முறைமையினைப் பரிந்துரை செய்யும் வகையில் கௌரவ அமைச்சரினால் 2016.05.25 ஆம் திகதி 12 பேர்களைக் கொண்ட புத்திஜீவிகள் குழு நியமிக்கப்பட்டது.

உரிய சகல துறைகளையும் தழுவக்கூடியவாறு உத்தியோகத்தர்களை கொண்ட மாகாண / மாவட்ட மட்டத்தில் குழுவினைத் தாபிப்பதற்கும் இனங்காணப்பட்ட ஒப்பளவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு விஞ்ஞான முறையைப் பின்பற்றி உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களைக் கூட்டிணைத்தல் மற்றும் தரமுயர்த்தும் பணிகளுக்குரியதாக அம்மாகாண குழுவினால்

பரிந்துரைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளல் ஆகிய விடயங்களை உள்ளடக்கிய புத்திஜீவிகள் குழுவின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளை அமுல்படுத்துவதற்காக 2017.07.25 ஆம் திகதி அமைச்சரவையின் அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.

இதற்கமைய அமைச்சிற்குக் கிடைக்கப்பெற்ற கோரிக்கை / யோசனைகள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டவாறு அவ்வவ் பிரதம செயலாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன.

தரமுயர்த்துவதற்காக மற்றும் கூட்டிணைப்பதற்காக கிடைக்கப் பெற்றிருந்த யோசனைகள்

தொடர் இல	மாகாணம்	தரமுயர்த்தல் மற்றும் கூட்டிணைப்பதற்காக கிடைக்கப் பெற்றுள்ள யோசனைகள்
01	மேல் மாகாணம்	13
02	மத்திய மாகாணம்	06
03	தென் மாகாணம்	09
04	வடமேல் மாகாணம்	15
05	ஊவா மாகாணம்	06
06	சப்ரகமுவ மாகாணம்	03
07	வடமத்திய மாகாணம்	05
08	கிழக்கு மாகாணம்	17
09	வட மாகாணம்	08
	மொத்தம்	82

இதற்கமைய மாகாணக் குழுவினால் கிடைக்கும் பரிந்துரைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கூட்டிணைத்தல் ∴ தரமுயர்த்துவதற்கான செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஏற்கனவே 5 மாகாணங்களிலிருந்து பரிந்துரைகள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.

இதற்கமைய மத்திய மாகாணக் குழுவின் பரிந்துரைக்கமைய காணப்பட்ட அம்பகமுவ பிரதேச சபையின் எல்லையினை மறுசீரமைத்து நோர்வூட் பிரதேச சபை மற்றும் மஸ்கெலிய பிரதேச சபை ஆகிய இரண்டு பிரதேச சபைகளும் காணப்பட்ட நுவரேலியா பிரதேச சபையின் எல்லையினை மறுசீரமைத்து கொட்டகல பிரதேச சபை மற்றும் அக்கரப்பத்தன பிரதேச சபையாக புதிதாக இரண்டு பிரதேச சபைகளாக புதிய 04 பிரதேச சபைகள் தாபிக்கப்பட்டன.

இதற்கு மேலதிகமாக தமன்கடுவ பிரதேச சபையைப் பிரித்து பொலன்னறுவை மாநகர சபையுடன் கூட்டிணைத்து எஞ்சிய தமன்கடுவ பிரதேச சபை எல்லையை பொலன்னறுவை பிரதேச சபையாக பெயர் மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குதல்.

2017 ஆம் ஆண்டில் மே, ஜீன் மாதங்களில் நாட்டில் நிலவிய சீரற்ற காலநிலை காரணமாக தெற்கு, மேற்கு மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களில் பாதிக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக தேவையான உதவிகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டன.

மேலும் அனர்த்தங்களினால் சேதமடையாத பிரதேசத்திற்குரிய உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் இயந்திர உபகரணங்கள், அனர்த்தத்திற்குட்பட்ட அண்மித்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழமை நிலைமைக்கு மாற்றியமைப்பதற்காக அவ் அதிகாரப் பிரதேசங்களுக்கு ஈடுபடுத்துவதற்குத் தேவையான இணைப்புப் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன

விஞ்ஞான ரீதியிலான பின்னணிக்கமைய பின்னடைந்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை இனங்காணுதல்.

அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டுப் பணிகளுக்காக இவ் அமைச்சில் ஒதுக்கீடுகளை மேற்கொள்ளும் போது பின்னடைந்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுவதுடன் இதன்போது சரியாக பின்னடைவுகளை இனங்காண்பது மிக முக்கியமானதாகும். இதற்காக இதுவரையில் பின்பற்றப்பட்ட செயற்பாடுகளாக அமைவது அவ்வவ் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் வருடாந்த வருமானம் (வழங்கல்களைத் தவிர) தொடராக அணி திரட்டி வருடாந்த வருமானத்தை 10 மில்லியன் ரூபாவை விடக் குறைந்த நிறுவனங்கள் பின்னடைந்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களாக கருதி அபிவிருத்திக்கு உதவிகளை வழங்குவதாகும். இதற்கமைய புத்திஜீவிகள் குழுவினால் வகுக்கப்பட்ட ஒப்பளவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு புள்ளிகளை வழங்கி உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் புள்ளித் தொடருக்கமைய முன்னுரிமைக்குட்படுத்துவதன் ஊடாக பின்னடைந்த 100 உள்ளூராட்சி மன்றங்களை இனங்கண்டு அபிவிருத்தி செய்ய உதவிகளை வழங்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.

இதன் போது கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்ட ஒப்பளவுகள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

i'	பிரவேசம்	xi.	அனர்த்த அபாயம்
ii'	நகர மயமாக்கல்	xii.	மாகாணத்தின் நிலைமைகள்
iii'	வறுமை	xiii.	வேலையில்லாப் பிரச்சினை
iv'	கல்வி	xiv.	சுகாதாரம்
v'	வீதி	xv.	நீர் வழங்கல்
vi'	மின்சாரம்	xvi.	நூலகம்
vii'	அரச வழங்கல்	xvii.	வெளி நிதியம்
viii'	ஈட்டப்பட்ட வருமானம்	xviii.	பிரதான பணியாளர் சபை
ix'	வெற்றிடங்கள்	xix.	நிதி முகாமைத்துவம்
x'	அலுவலக உபகரணங்கள்	xx.	அலுவலகக் கட்டடம்

மேற்கூறப்பட்ட ஒப்பளவுகளுக்கமைய மாகாண மட்டத்தில் பின்னடைந்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களாக இனங்காணப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டவாறு அமைகின்றன.

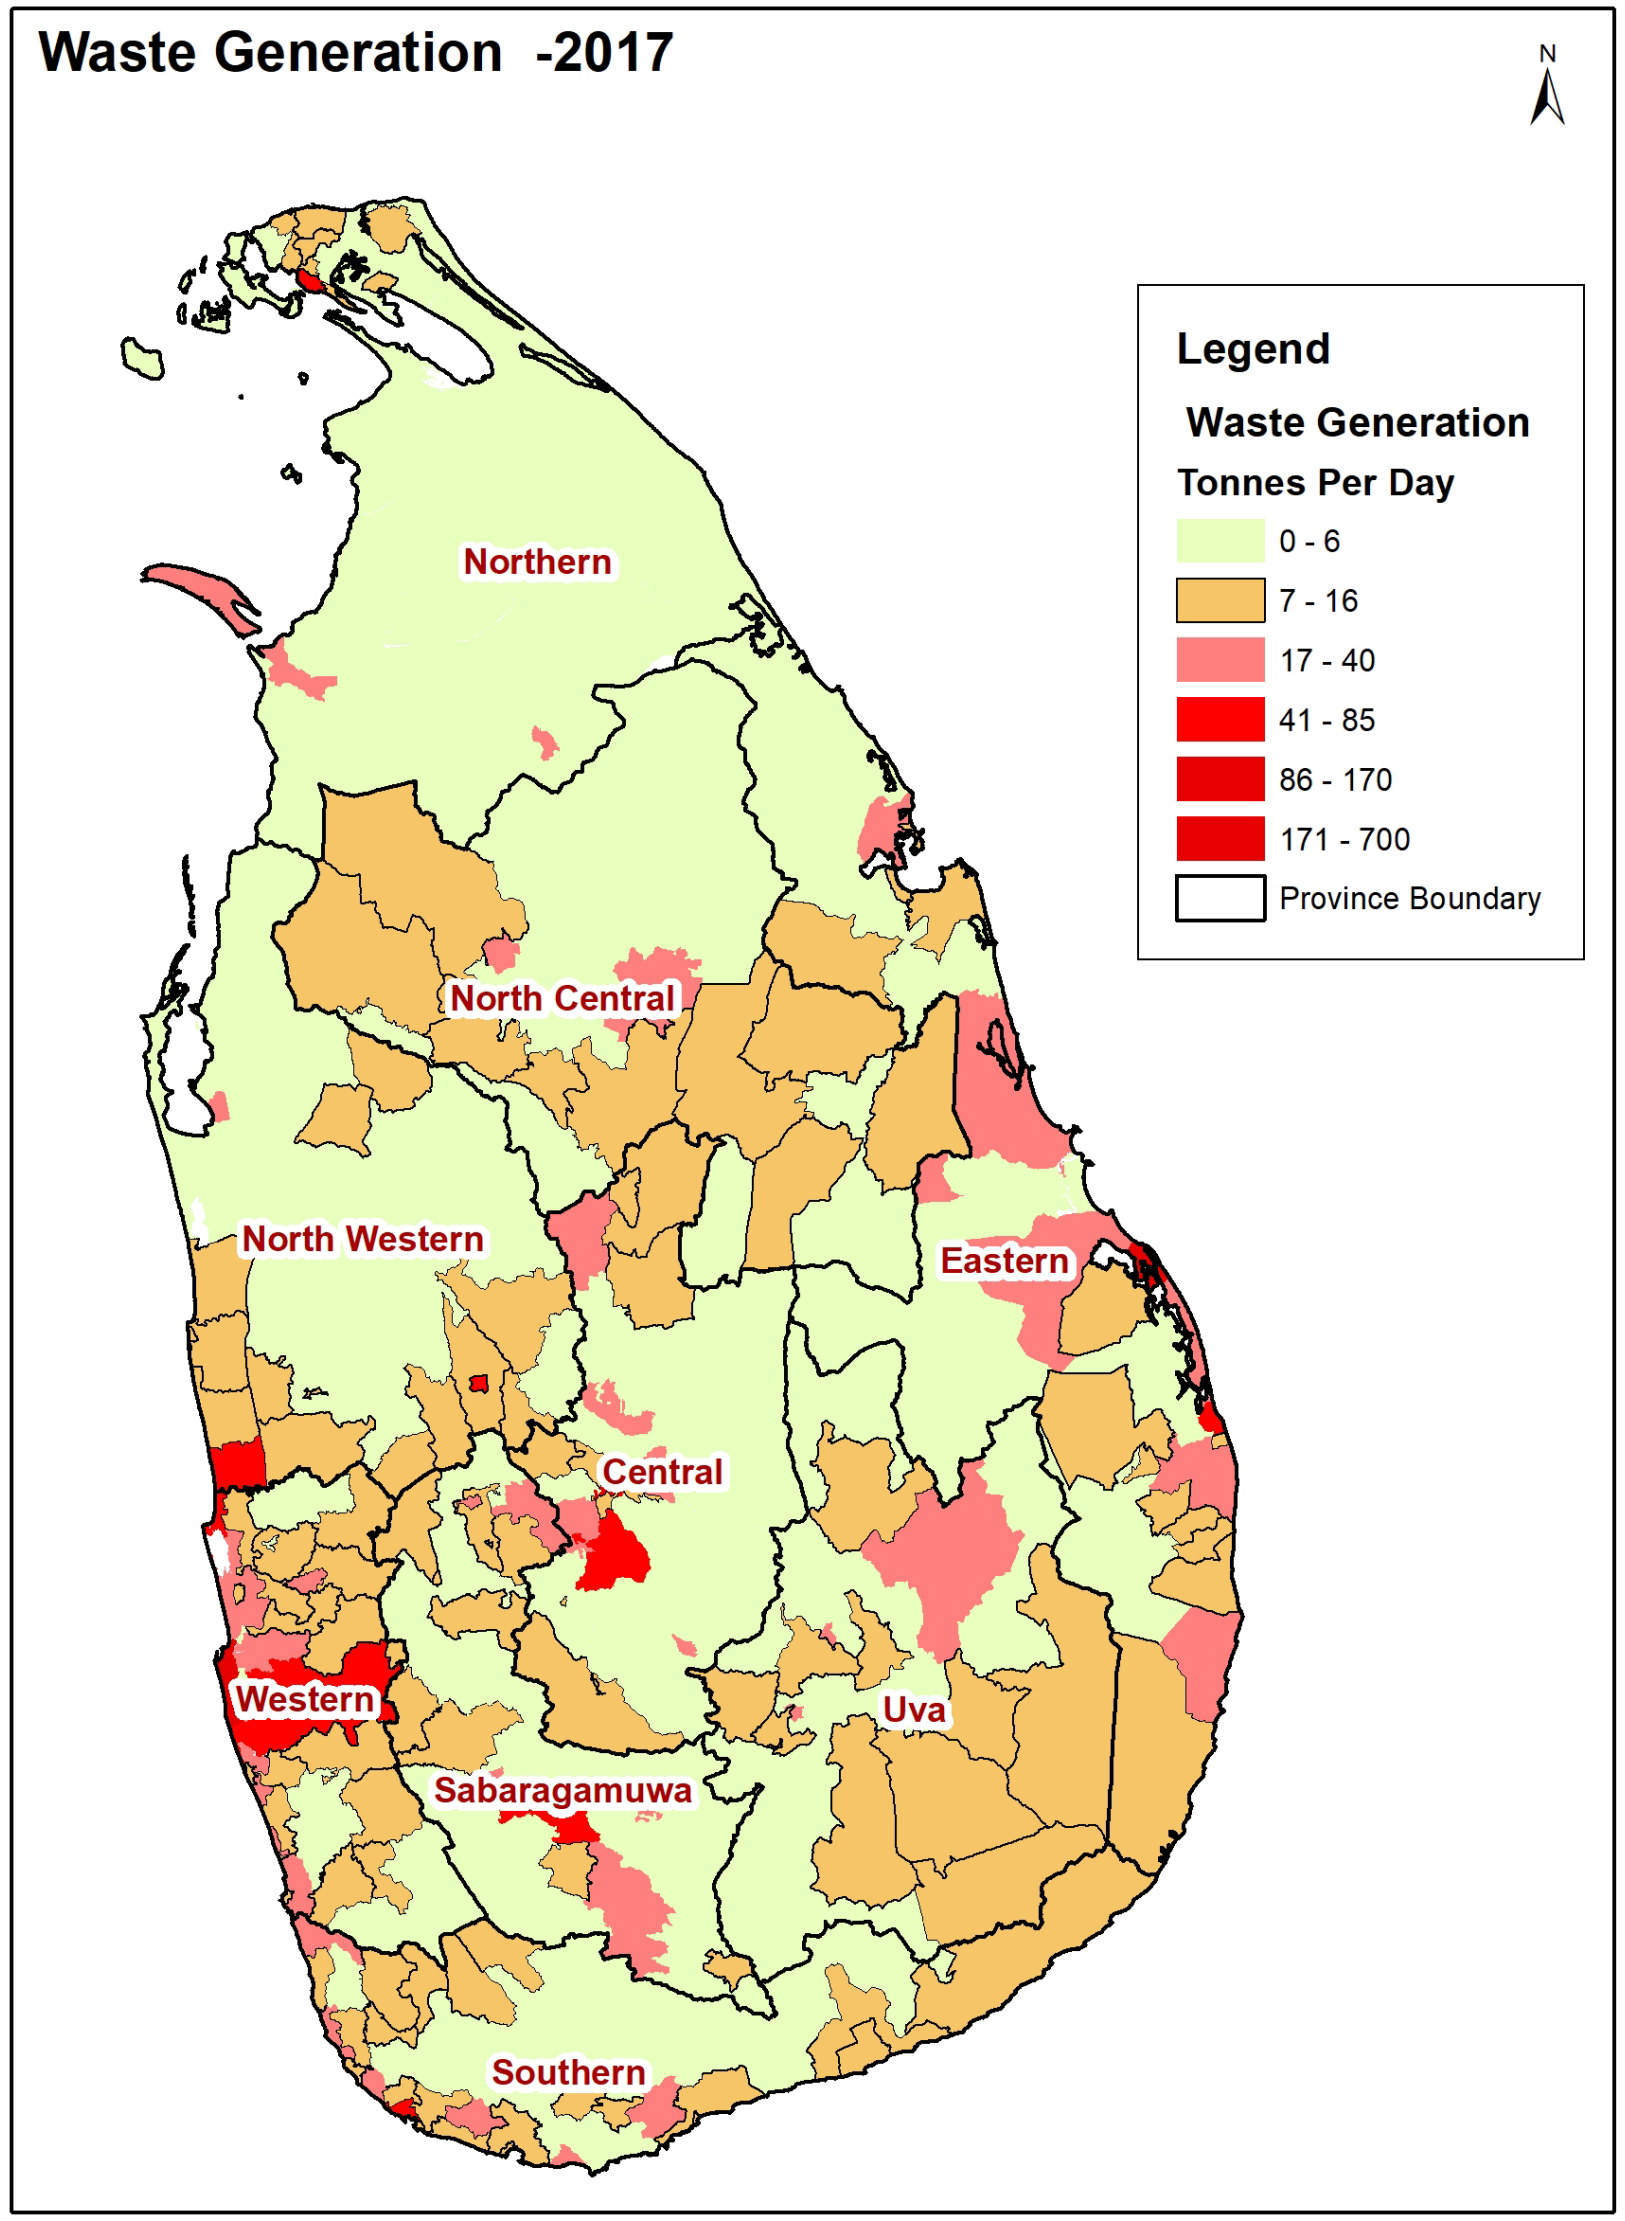
Waste Generation -2017
N
Legend
Waste Generation
Tonnes Per Day
0 - 6
7 - 16
17 - 40
41 - 85
86 - 170
171 - 700
Province Boundary
Northern
North Central
North Western
Eastern
Central
Western
Uva
Sabaragamuwa
Southern

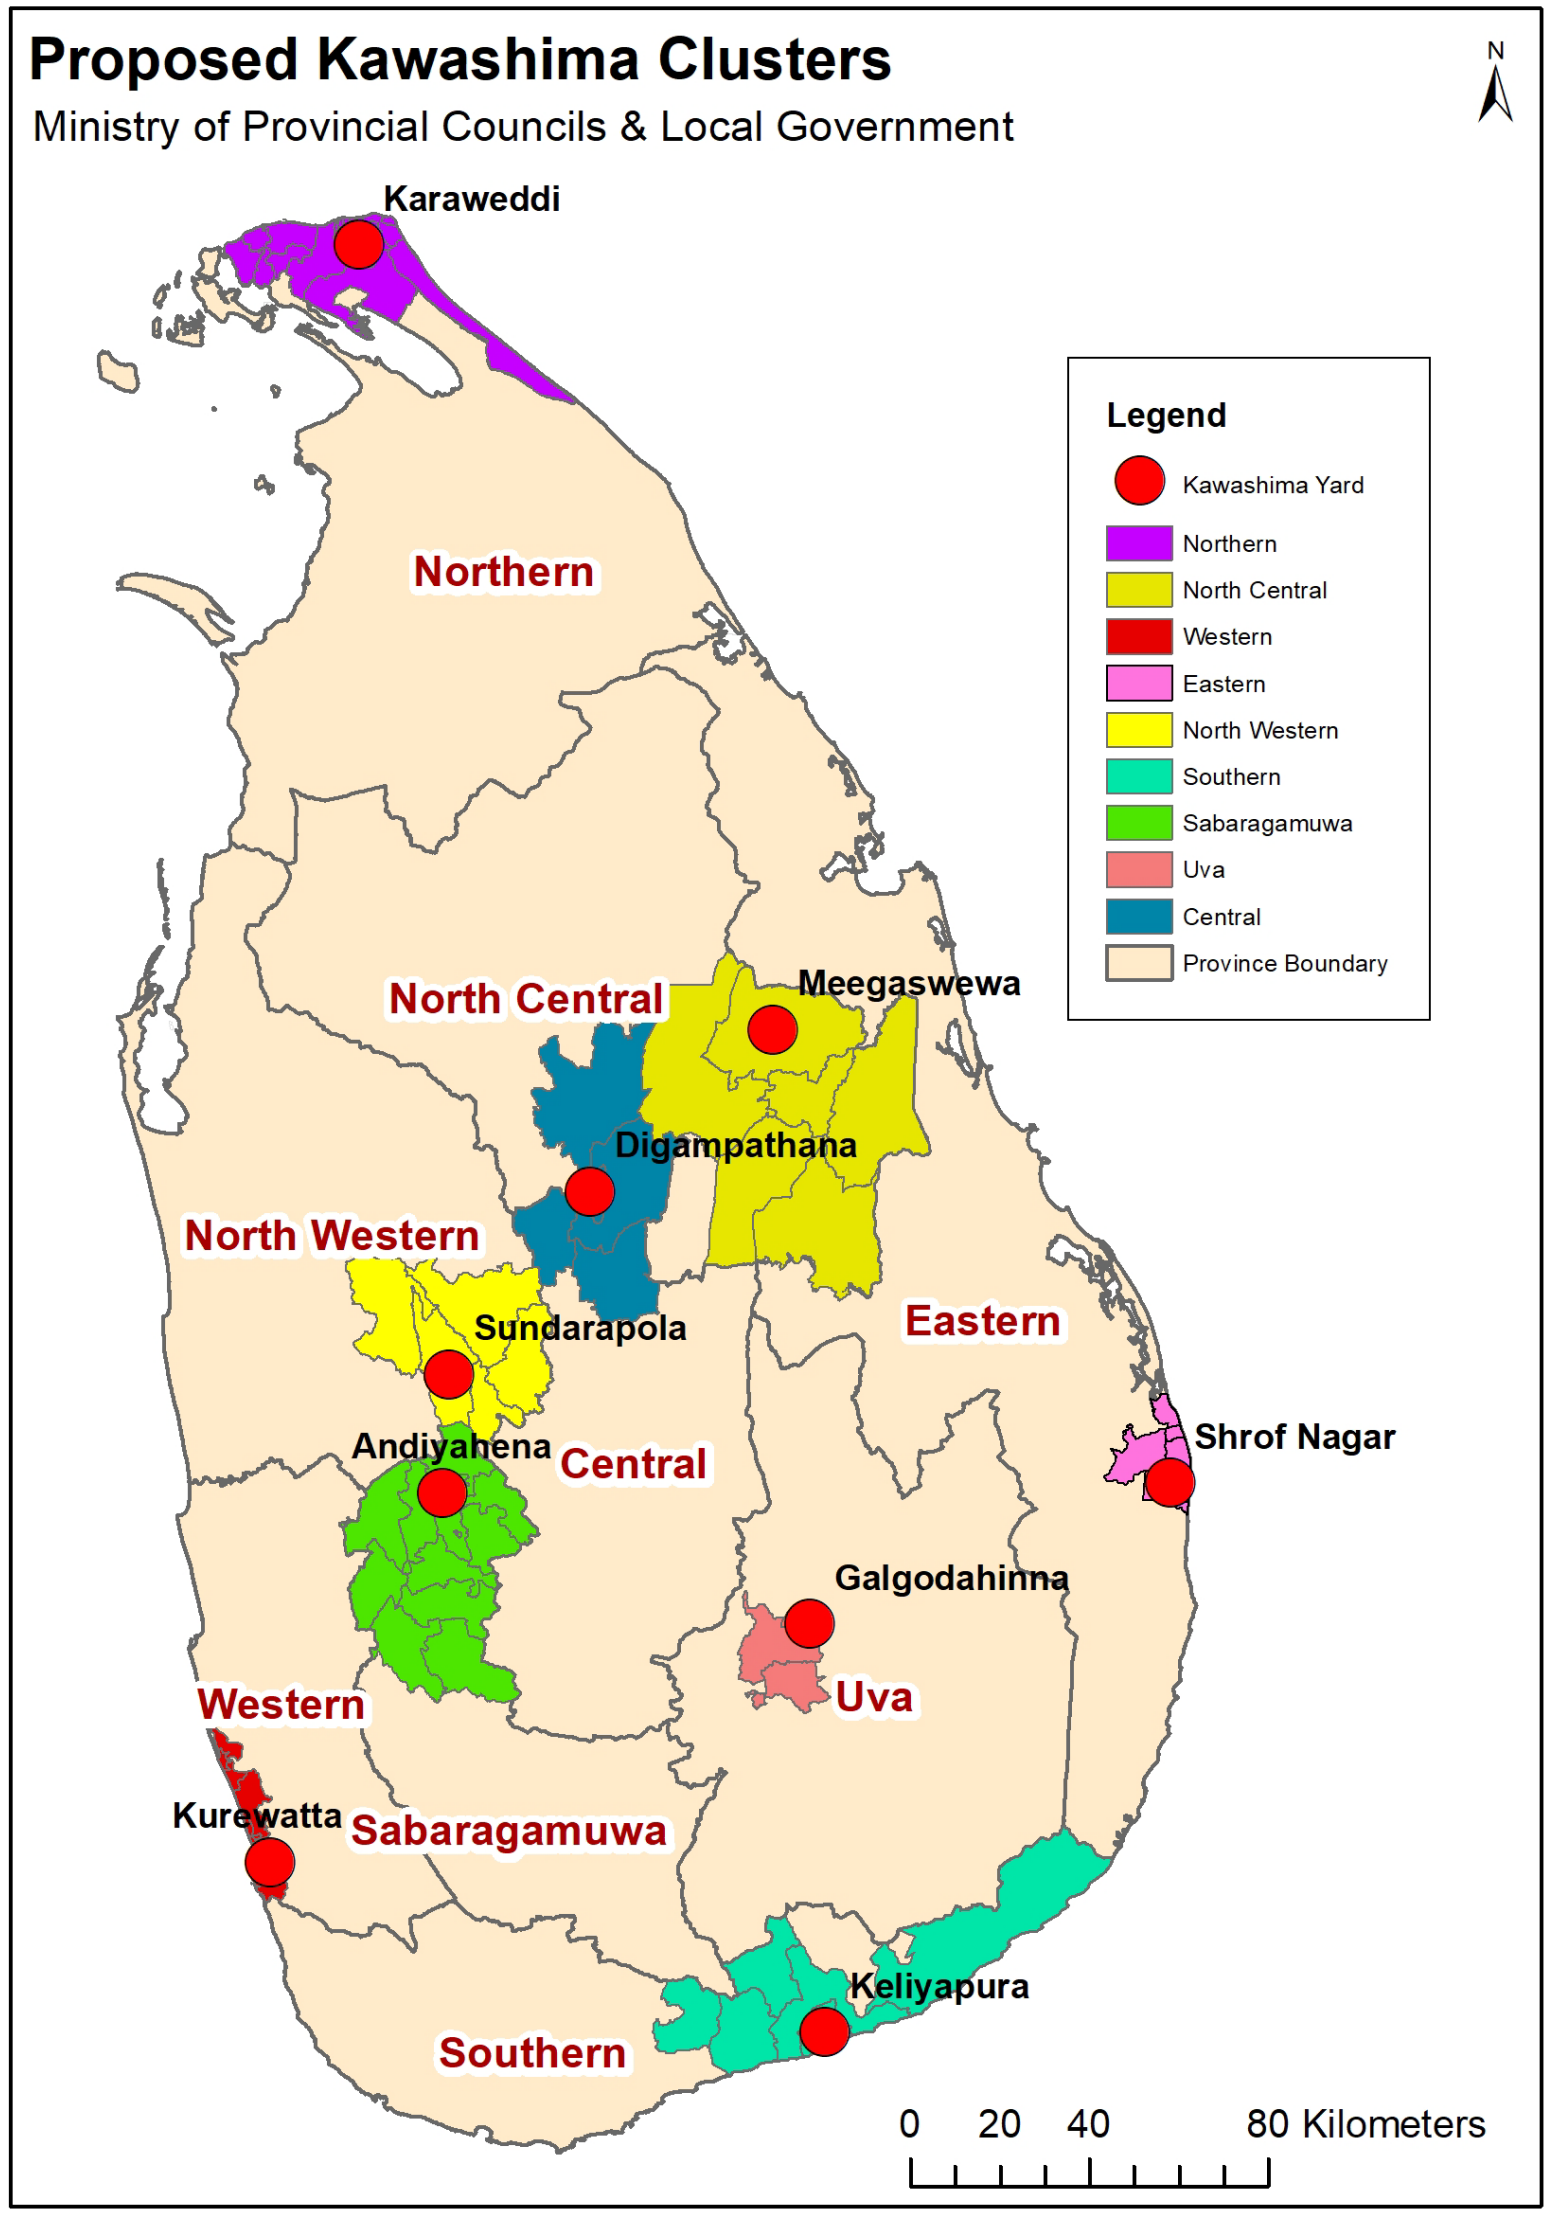
Proposed Kawashima Clusters
Ministry of Provincial Councils & Local Government
N
Legend
Kawashima Yard
Northern
North Central
Western
Eastern
North Western
Southern
Sabaragamuwa
Uva
Central
Province Boundary
Karaweddi
Northern
North Central
Meegaswewa
Digampathana
North Western
Sundarapola
Eastern
Andiyahena
Central
Shrof Nagar
Galgodahinna
Uva
Western
Kurewatta
Sabaragamuwa
Keliyapura
Southern
0 20 40 80 Kilometers

தொடர். இல	மாகாணம்	மொத்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை	பின்னடைந்த உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை
01	மேல் மாகாணம்	48	08
02	வடமேல் மாகாணம்	33	10
03	மத்திய மாகாணம்	43	04
04	ஊவா மாகாணம்	28	04
05	சப்ரகமுவ மாகாணம்	29	05
06	தென் மாகாணம்	49	13
07	வடமத்திய மாகாணம்	26	15
08	வட மாகாணம்	34	09
09	கிழக்கு மாகாணம்	45	32
	மொத்தம்	**335**	**100**

பொது மக்கள் முறைப்பாடுகளை விசாரனை செய்தல்

இலங்கையில் 09 மாகாணங்களில் அமைந்துள்ள உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் பொது மக்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள் தொடர்பில் அதிர்ப்தி அடையும் பொது மக்கள், சிவில் அமைப்புக்களினால் இவ் அமைச்சிற்கு நாளாந்தம் முறைப்பாடுகள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்படும் பொது மக்கள் முறைப்பாடுகள், (எழுத்து மூலம் ∴ வாய் மூலம்) உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு இணைப்பு செய்து தாபிக்கப்பட்டுள்ள முறைப்பாட்டு விசாரனைக் குழுவினால் ஆராய்ந்து உரியவாறு மாகாணப் பிரதம செயலாளர் ∴ உள்ளூராட்சி மன்ற ஆணையாளர் ∴ உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் பொறுப்பாளர்களுக்கு அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.

2017 ஆம் ஆண்டில் டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை அவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்கை 1805 ஆகும்.

அமைச்சரவைத் தீர்மானங்கள் தொடர்பில் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளல்

I. உள்ளூராட்சி விடயத்திற்குப் பொறுப்பான உரிய கொள்கைகளுக்கமைய தீர்மானங்களை எட்டுவதற்காக உள்ளூராட்சி நிர்வாகப் பிரிவனால் அமைச்சரவைக்கு யோசனைகள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு 2017 ஆம் ஆண்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்களின் எண்ணிக்கை 04 ஆகும். இவ் விஞ்ஞாபனங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் வாக்காளர் பிரிவு எல்லையினை நிர்மானிப்பதற்குரிய குழு நியமிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களைத் தாபித்தல் மற்றும் காணப்படும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை தரமுயர்த்துவதற்காக புதிய முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவதற் குரியதாகும்.

II. மேலதிகமாக ஏனைய அமைச்சர்களினால் உள்ளூராட்சி மன்ற விடயத்திற்குரியதாக சமர்ப்பிக்கப்படும் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்திற்காக சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு அவ்வவ் மாகாணங்களிலிருந்து தேவையான தகவல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளைப் பெற்று மேற்பார்வைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு 2017 ஆம் ஆண்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேற்பார்வைகளின் எண்ணிக்கை 10 ஆகும்.

III. இதற்கு மேலதிகமாக கிடைக்கும் அமைச்சரவைத் தீர்மானங்கள் மாகாண பிரதம செயலாளருக்கு அனுப்பவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொது மக்களினால் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் பிரச்சினைகள்

- பாராளுமன்றக் கேள்வி

  மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சர்களினால் பதில் எதிர்பார்ப்புடன் சமர்ப்பிக்கப்படும் பிரச்சினைகள் உரிய மாகாணத்தின் பிரதம செயலாளர்களுக்கு அனுப்பி அம்மாகாணங்களிலிருந்து பெற்றுக் கொண்ட மேற்பார்வைக்கமைய பதிலைத் தயாரித்து பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது. அவ்வாறு 2017 ஆம் ஆண்டுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பாராளுமன்றக் கேள்விகளின் எண்ணிக்கை 23 ஆகும்.

  இதற்கு மேலதிகமாக பாராளுமன்றம் ஒத்திவைக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பதில் எதிர்பார்ப்புடன் சமர்ப்பிக்கப்படும் பிரச்சினைகளுக்காக துரிதகதியில் பதில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக உரிய மாகாணத்திற்குள் பிரச்சினைகள் சமர்ப்பித்து ஒரு தினம் அல்லது இரண்டு தினங்களுக்குள் பரிந்துரைகளைப் பெற்று அதற்கமைவாக பதிலைத் தயாரித்து சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு கிடைக்கப் பெற்ற பிரச்சினைகளின் எண்ணிக்கை 03 ஆகும்.

- பொது மக்கள் மனு செயற்குழு சபை

I. உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் தமது தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சிலர் அல்லது குழுக்களினால் பொதுமக்கள் மனு செயற்குழு சபை மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படும் மனுவிற்காக உள்ளூராட்சி மன்ற ஆணையாளர்களிடம் தகவல்களை பெற்றுக் கொண்டு அந்நபர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கக்கூடிய வகையில் தலையீட்டாளராகச் செயற்படுகின்றது.

II. உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் சேவையாற்றும் ஒரு சில உத்தியோகத்தர்களினால் நிறுவன மட்டத்தில் தீர்க்கப்படாத நிருவாகப் பிரச்சினைகளை பொது மக்கள் மனு செயற்குழுவிற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படும் சந்தர்ப்பங்களும் காணப்படுகின்றன. அவ்வாறு சமர்ப்பிப்பதற்காக தீர்வுகளை வழங்குவதற்கும் உரிய உள்ளூராட்சி ஆணையாளர்களினால் தகவல்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளைப் பெற்று தலையீட்டாளராகச் செயற்படவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அவ்வாறு 2017 ஆம் ஆண்டில் பொது மக்கள் மனு செயற்குழு சபையினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்களின் எண்ணிக்கை 46 ஆகும்.

- பொது முகாமைத்துவ மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வை செயற்குழு சபை

பாராளுமன்றத்தில் அரச முகாமைத்துவ மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வை செயற்குழு சபைக்காக சமர்ப்பிக்கப்படும் பொது மக்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் தீர்வுகளை வழங்குவதற்கு உரிய மாகாண பிரதம செயலாளர்களின் இணைப்புடன் பெறும் மேற்பார்வை மற்றும் பரிந்துரைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

அவ்வாறு 2017 ஆம் ஆண்டுக்குள் பொது முகாமைத்துவ மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வை செயற்குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் பிரச்சினைகளின் எண்ணிக்கை 29 ஆகும்.

உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் அறிவிடப்படும் வரி

உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் அறவிடப்படும் வரி மற்றும் அனுமதிப்பத்திரங்களை விதிக்கும் போது முறன்பாடுகள் காணப்படுவதினால் பொதுமக்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் சிரமங்களை தவிர்ப்பதற்காக வரி மற்றும் அனுமதிப் பத்திரக் கட்டணத்தை விதிப்பது நிலையியற் சபை ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கமைய முன்னெடுத்தல் மற்றும் அவ் ஒழுங்கு விதிமுறைகளை மறுசீரமைப்பதற்குத் தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அது தொடர்பில் செயற்படவும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் அறவிடப்படும் வரி மற்றும் அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணத்தை மேற்பார்வை செய்வதற்காக அமைச்சரவைத் தீர்மானங்களுக்கமைய குழு நியமிக்கப்பட்டதுடன் அக் குழுவினால் வரி மற்றும் அனுமதிக் கட்டணம் தொடர்பில் முறையான செயற்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கமைய முன்னெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டாக்காலி நாய்கள் மற்றும் அதனால் பொது மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை தவிர்ப்பதற்காக இதுவரையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள்

கட்டாக்காலி நாய்களினால் பொது மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை தவிர்ப்பதற்காக பொருத்தமான செயற்பாட்டு முறைகளை வகுக்கும் வகையில் அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்திற்கமைய தேசிய செயற்பாட்டுக் குழு தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு, சுகாதாரப் போசாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்தியத்துறை அமைச்சு, கிராமிய விவகார அமைச்சு ஆகிய அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களில் இக்குழு அடங்கியுள்ளது. இக்குழுவின் அறிக்கையின் பரிந்துரைகளுக்கமைய கட்டாக்காலி நாய்களின் அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்தல், விசர் நாய்க் கடி நோயினை மட்டுப்படுத்தல், போதிய இடங்களில் நாய்கள் மக்களை கடித்தல் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்தலுக்காக பல செயற்பாடுகளை வகுத்தல் உட்பட சுகாதாரப் போசாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்தியத்துறை அமைச்சு தற்போது பிரதேச மட்டத்தில் அமுல்படுத்தும் நாய்கள் அதிகரிப்பதைக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் மருந்து ஊசி ஏற்றும் வேலைத்திட்டங்கள் கிராமியப் பொருளாதார அமைச்சிற்கு மாகாண மட்டத்தில் அமுல்படுத்தல் ஆகிய விடயங்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டன. இதற்கமைய ஏற்கனவே கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்ட செயற்பாடுகள் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

01. இதற்கமைய நாய்களுக்கு மருந்து ஊசி ஏற்றல் மற்றும் வளர்ச்சியினை கட்டுப்படுத்துவதற்காக வேலைத்திட்டங்கள் மாகாண மட்டத்தில் ஏற்கனவே அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் மாவட்டத்திற்கு ஒன்று வீதம் நாய்களைக் காக்கும் மத்திய நிலையங்கள் அரச சார்பற்ற அமைப்புக்கள் மற்றும் வர்த்தக சமூகத்தின் நிதி ஒத்துழைப்புடன் தாபிக்கப்பட்டு தெருக்களில் உள்ள நாய்களில் அத்தடுப்பு மத்திய நிலையங்களுக்கு அனுப்புவதற்காக செயற்பாடுகளையும் வகுக்க கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

02. 2018.04.01 ஆம் திகதி தொடக்கம் மேற்கூறப்பட்ட வேலைத்திட்டங்களை முழுமையாக சுகாதாரப் போசாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்தியதுறை அமைச்சிலிருந்து அகற்றி கிராமிய பொருளாதாரம் தொடர்பான அமைச்சின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களம் உட்பட சகல மாகாண சபைகளின் கீழ் விசேட வேலைத்திட்டமாக அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

03. எதிர்வரும் ஆண்டு தொடக்கம் இவ் வேலைத்திட்டத்திற்காகத் தேவையான ஒதுக்கீடுகள் நேரடியாக கிராமியப் பொருளாதாரம் தொடர்பான அமைச்சு மற்றும் மாகாண சபைக்கு ஒதுக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

04. I. இதற்கு மேலதிகமாக விசர் நாய்க் கடி நோய் தொடர்பிலான கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் நாய்களைப் பதிவு செய்யும் கட்டளைச் சட்டத்தை கூட்டிணைப்பதற்காக அமைச்சரவை அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளதுடன் அதற்கமைய மறுசீரமைக்கப்பட்ட சட்ட வரைபு சட்ட வரைஞருக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

II. நாய்களை பொது இடங்களில் இட்டுச் செல்பவருக்கு எதிராக தண்டனை வழங்கும் முறைகளும் தற்போது சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள சட்ட வரைபில் உள்ளடக்க நடவடிக்கை எடுத்தல் (25000 ரூபா தண்டப்பணம் அல்லது 06 மாத கால சிறைத்தண்டனையினை வழங்குதல்)

05. I. கால் நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களத்திற்குப் புதிதாக 60 கால்நடை வைத்தியர்களை சேர்த்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் அவ்வாறு சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்ட புதிய கால்நடை வைத்தியர்களுக்கு அவ்வவ் உள்ளூராட்சி மன்ற பிரதேசங்களிலுள்ள நாய்களின் வளர்ச்சியினைக் கட்டுப்படுத்தல் உட்பட விசர் நாய்க் கடி நோயினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் முழுமையான அதிகாரங்களை வழங்குத் தீர்மானித்தல்.

II. தற்போது சுகாதார அமைச்சின் கீழ் சேவையாற்றும் மருந்து ஊசி ஏற்றுனர்கள் மற்றும் உரிய ஏனைய உத்தியோகத்தர்களின் தொழில் பெயர் மற்றும் சம்பளத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாது கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் திணைக்களத்தில் சேவையில் ஈடுபடுத்தத் தீர்மானித்தல்.

III. நாய்களுக்கு மருந்து ஊசி ஏற்றல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வேலைத்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்காகத் தொடர்ந்து பணியாளர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கான கோரிக்கையினை முகாமைத்துவ சேவைத் திணைக்களத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல்.

3.5. மாகாண சபைப் பிரிவு

நோக்கம்

மாகாண சபைகளின் செயற்பாடுகளுக்கு வசதிகளை வழங்குதல், மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாகாண சபைகளுக்கிடையே இணைப்புக்கள் உட்பட மாகாண சபைகளின் மானிட வளத்தை விருத்தி செய்து உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வினைத்திறன்மிக்க மாகாண சபை நிருவாக முறையினை ஏற்படுத்தல்.

உபாயத் திட்டங்கள்

1. நல்லாட்சி மூல அம்சங்களுக்கமைய அவ்வவ் மாகாணங்களில் காணப்படும் மானிட மூலதனம் மற்றும் சூழல் வளத்தினை பயன்மிக்கதாக பயன்படுத்தி மாகாண வருமான வகைகளை பலப்படுத்தல்.
2. வெளிக் குடியேற்றங்களின் விகிதாசாரம் ஒப்பீட்டு அடிப்படையில் உயரிய மட்டத்தில் காணப்படும் மாகாண சபைகளில் அவ் விகிதாசாரத்தை கட்டுப்படுத்த பொருத்தமான கொள்கைகள் மற்றும் நீண்ட கால வேலைத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தல்.

3. இலங்கையில் முழுமையான சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக அவ்வவ் மாகாணங்களில் காணப்படும் மானிட வளத்தின் பயன்பாட்டினை உறுதிப்படுத்தல்.

அட்டவணை 3 - மாகாண சபைப் பிரிவின் முன்னேற்றங்கள் - 2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில்

தொடர் இல	யோசனைகள்	உப செயற்பாடுகள்
01	காணி சுவிகரிப்பு (மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக)	காணி சுவிகரிப்புக்குரியதாக சகல மாகாண மட்டங்களிலிருந்து 353 கோரிக்கைகள் இவ் அமைச்சிற்கு முதலமைச்சர்களின் பரிந்துரையுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
		அக் கோரிக்கைகளில் 202 குறைபாடுகளுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளமையினால் உரிய மாகாணங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. இதில் 27 கோரிக்கைகள் தொடர்பில் இதுவரையில் குறைபாடுகள் தயாரித்து அனுப்பப்படவில்லை என்பதினால் அது தொடர்பில் வினவி உரிய மாகாண பிரதம செயலாளர்களுக்கு நினைவு கூறல் கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

		பிரதம செயலாளரின் பரிந்துரையுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைக் கடித ஆவணங்கள் 126 இரண்டாவது வாசகத்தின் கட்டளைகளை விடுப்பது தொடக்கம் எதிர்கால செயற்பாடுகளுக்காக காணி அமைச்சிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
		1964 இலக்கம் 28 கொண்ட காணி சுவிகரிப்பு சட்டத்தில் 04 வது பிரிவிற்கமைய எதிர்ப்புக்களை பரிசீலனை செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக மாகாண பிரதம செயலாளரின் பரிந்துரையுடன் 12 உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
		38(அ) இடைக்கால ஒழுங்கு விதிகளின் கீழ் பொறுப்பேற்பதற்குரியதாக காணி அமைச்சிற்கு 08 பரிந்துரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன
		கோரிக்கைகளில் 05 காணி சுவிகரிக்கும் பணிகளை கைவிடல் / பொறுப்பளிப்பதற்காக இவ் அமைச்சின் கௌரவ அமைச்சரின் பரிந்துரையுடன் காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சின் கௌரவ அமைச்சருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
02	பொது நிருவாகச் சுற்றறிக்கை 06/2006 இற்கமைய மாகாண அரச சேவைக்குரிய பதவிகளுக்காக சேவைப் பிரமாணக் குறிப்பினை வகுத்தல்	06/2006 சுற்றறிக்கைக்கமைய தயாரித்து பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்ட மாகாண சேவை பிரமாணக் குறிப்பு தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகளுக்கான செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. தொழில்நுட்ப சேவை வருமான பரிசோதகர் சேவை கைத்தறி ஆலோசகர் வருமான சேவை விவசாய ஆலோசகர்

		தேசிய சம்பளம் மற்றும் ஊழியர் எண்ணிக்கை ஆணைக்குழுவினால் அனுப்பப்பட்ட விளையாட்டு உத்தியோகத்தர், விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர் மற்றும் தலைமையக விளையாட்டு பதவிகளுக்குரிய ஆட்சேர்ப்பு ஒழுங்கு விதிமுறைகள் சகல மாகாண சபைகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன் சப்ரகமுவ, வடமேல் மற்றும் தெற்கு ஆகிய மாகாணங்களிலிருந்து மறுசீரமைப்புக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. சகல மாகாணங்களிலி ருந்தும் விபரங்கள் பெறப்பட்டதன் பின்னர் தேசிய சம்பளம் மற்றும் ஊழியர் எண்ணிக்கை ஆணைக்குழுவிற்கு அனுப்பப்படவுள்ளது.
	உள்ளூராட்சி முகாமைத்துவ சேவையினைத் தாபித்தல்	பொது நிருவாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயலாளரின் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்ட குழு மூலம் ஏற்கனவே குழு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. குழு அறிக்கையை அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிப்ப தற்காக அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
03	மாகாண சபையில் பதவி வகிப்பவர் மற்றும் உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளக்கூடிய தகவல் களை சமகாலப்படுத்தல்	தகவல் கையேடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு அமைச்சின் சகல பிரிவுகளுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
04	மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்குரிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம்	I. மாகாண சபைக்குரியதான பிரச்சினைகள் தொடர்பில் 09 அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. II. ஏனைய அமைச்சுக்கள் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்களுக்காக 14 மேற்பார்வைகள் அமைச்சரவை அலுவலகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. III. அமைச்சரவைத் தீர்மானங்கள் 34 தொடர்பாக பிரதம செயலாளர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
05	பாராளுமன்றக் கேள்வி	20 பாராளுமன்றக் கேள்விகளுக்கான பதில் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

06	பொது மக்கள் மகஜர் I. பாராளுமன்ற பொது மக்கள் முறைப்பாடு செயற்பாட்டு சபைக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறையீடுகள	20 மனுக்களுக்கு தேவையான செயற்பாடுகளுக்காக உரிய மாகாண சபைகளுக்கு சமா்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. பொது மக்கள் மனு செயற்குழு சபையினால் அனுப்பப்பட்டுள்ள பொது மக்கள் மனுக்களுக்குரியதாக 16 அறிக்கைகள் தொடா்பில் இவ் அமைச்சின் பரிந்துரை பொது மக்கள் மனு தொடா்பான செயற்குழு சபைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
07	மாகாண சபைகளுக்காக வாகனங்களைக் கொள்வனவு செய்தல் மற்றும் நாடு தழுவிய சேவையில் ஓய்வூதிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு வரிச் சலுகையுடன் வாகனங்களை இறக்குமதி செய்யும் அனுமதிப் பத்திரங்களை வெளியிடல் i. பொதுநிர்வாகச் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 22/99 இற்குரியதாக பரிந்துரைகள் வழங்குதல். ii. தேசிய வரவு செலவுச் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 1∴2016 இற்கமைய மாகாண சபைகளுக்காக வாகனங் களை கொள்வனவு செய்தல். iii. முதலாவது வட மாகாண சபையின் உறுப்பினா்களுக்கு வரிச்சலுகை கொண்ட வாகன இறக்குமதி அனுமதிப் பத்திரங்களை வழங்குதல	கிடைக்கப்பெற்ற 40 விண்ணப்பப்படிவங்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டு வா்த்தக மற்றும் முதலீட்டு கொள்கைத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. செலவின நிர்வாகக் குழுவின் அங்கீகாரத்திற்காக 23 விண்ணப்பப்படிவங்கள் சமா்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. வரிச் சலுகையுடன் வாகன அனுமதிப்பத்திரம் 38 வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

08	புதிய பதவிகளை உருவாக் குதல	மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக பதவிகளை உருவாக்குவதற்கு முகாமைத்துவ சேவை சுற்றறிக்கை 3.'.2014 இற்கமைய கிடைக்கப் பெற்றுள்ள 752 கோரிக்கைகள் பரிந்துரை செய்து முகாமைத்துவ சேவைத்திணைக் களத்திற்கு எதிர்வரும் செயற்பாடுகளுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 601 பதவிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக முகாமைத்துவ சேவைத் திணைக்களத்தினால் உரிய மாகாண சபைக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
09	வெளிநாட்டு தொண்டர் ஊழியர்களுக்காக வீசா வழங்குதல்.'. காலத்தை நீடித்தல்	வெளிநாட்டு வளத் திணைக்களத்தினால் தொண்டர் ஊழியர்களுக்கு வீசா வழங்குவதற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ள 21 கோரிக்கைகளுக்கு இணக்கத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக மாகாணங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மாகாணங்கள் மூலம் இணக்கங்கள் பெறப்பட்டுள்ள 14 வீசா கோரிக்கைகள் வெளிநாட்டு வளத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
10	மாகாணங்களுக்கிடையிலான விடய இணைப்பு மாநாடு	மாகாண பிரதம செயலாளர்கள் மற்றும் உரிய நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளின் பிரதிநிதித்துவத்துடன் 04 கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன.
11	மாகாண சபையில் பதவி வகிப்போரின் வரப்பிரசாதக் கொடுப்பனவு வசதிகள்	மாகாண சபைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவி வகிப்போருக்கான கொடுப்பனவு மற்றும் வரப்பிரசாதங்கள் தொடர்பிலான ஒரே வகையான ஒழுங்குகளை வகுப்பதற்காக மாகாண சபைகளிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ள தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகுக்கப்பட்ட சுற்றறிக்கை வரைவிற்கு ஜனாதிபதி செயலகம் மற்றும் நிதி ஆணைக்குழுவின் மேற்பார்வை பெறப்பட்டது.
12	அரசியல் காரணங்களுக்கமைய பல்வேறுபட்ட பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டோருக்காக நிவாரணங்களை வழங்குதல்.	பொதுநிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சிற்கு அனுப்பப்பட்ட 245 மேன்முறையீடுகளில் 200 மேன்முறையீடுக ளுக்காக பரிந்துரைகளை அமுல் படுத்துவதற்கு உரிய முன்னேற்றங்கள் பொது நிருவாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சிற்கு அறிக்கைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.
13		

14	பொது மக்கள் முறைப்பாடு மற்றும் மனு		பிரதமர் அலுவலகம், ஜனாதிபதி செயலகம், ஏனைய அமைச்சுக்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது மக்களினால் அனுப்பப்பட்டுள்ள 52 முறைப்பாடுகளுக்குத் தேவையான செயற் பாடுகளுக்காக உரிய நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
	I.	மழை மற்றும் காலநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக உணவு உற்பத்திகளை திட்டமிடல்.	ஜனாதிபதி செயலகத்திலிருந்து உரிய செயற் திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கீடுகள் மேற்கொள்ளப் பட்ட கடிதம் கிடைக்கப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து நிதி ஒழுங்குக் கோவைகளுக்கமைய உரிய செலவினங்களை மேற்கொண்டு கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ள பற்றுச் சீட்டினை அனுப்புமாறு உரிய மாகாணங்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன் மாகாணங்களிலிருந்து கிடைக்கும் பற்றுச் சீட்டுக்களை பரிசோதனை செய்து கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
	II.	நிலையான பாடசாலை அபிவிருத்தி தேசிய வேலைத்திட்டம்	வடமேல் மாகாண சபைக்கு ரூபா. 16இ037இ005.62, சப்ரகமுவ மாகாண சபைக்கு ரூபா 1இ235இ520.03 மற்றும் தென் மாகாண சபைக்கு ரூபா 463இ725.00 கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
	III.	பிள்ளைகளைக் காக்கும் தேசிய வேலைத்திட்டம்	ரூபா 684இ410 நிதி மத்திய மாகாண சபைக்கு கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
	IV.	தேசிய உணவு உற்பத்திப் புரட்சி	மத்திய மாகாண சபைக்கு ரூபா 4இ097இ365.65 மற்றும் கிழக்கு மாகாண சபைக்கு ரூபா. 2இ999இ187.62 கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப் பட்டுள்ளது.
	V.	சூழல் பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்	வட மாகாண சபைக்கு ரூபா 2இ500இ000 வடமேல் மாகாண சபைக்கு ரூபா 2இ470இ000 மற்றும் வடமத்திய மாகாண சபைக்கு ரூபா 1இ178இ750 கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப் பட்டுள்ளது.
	VI.	கிராம சக்தி வேலைத்திட்டம்	ரூபா 176இ767.50 நிதி வடமேல் மாகாண சபைக்கு கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
	VII.	நீர்ப்பாசன திட்டங்களை அபிவிருத்தி செய்தல்	ரூபா 5இ000இ000 நிதி வடமேல் மாகாண சபைக்கு கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மூலம் : மாகாண சபைப் பிரிவு

3.1. சட்டப் பிரிவு

அறிமுகம்

நாட்டின் மொத்தச் சனத்தொகையின் பொது எதிர்பார்ப்பினை எட்டக்கூடிய வகையில் உற்பத்திறன், வினைத்திறன்மிக்க மக்கள் மயமான பிரதேச நிருவாகத்தை இலங்கையில் முன்னெடுப்பதனை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் சமமான நிலைமைகளை கொண்ட நிலையான மானிட அபிவிருத்தியினை எட்டுவதற்காகவும் வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் ஆலோசனைகளை வழங்கும் வகையில் அமைச்சின் சட்டப்பிரிவு தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

செயற்பாட்டுப் பணிகள்

01. உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் மாகாண சபைகளுக்குரிய சட்டங்களை சமகாலத் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு அந்நிறுவனங்களுடன் இணைப்புச் செய்து சமகாலப்படுத்தல்.
02. உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் மாகாண சபைத்துறைக்குரிய புதிய சட்டங்களை அமுல்படுத்தல்.
03. உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் மாகாண சபைகளுக்குரிய சட்ட ரீதியிலான பிரச்சினைகளுக்காக சட்டமா அதிபரின் உதவியுடன் தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்குதல்.
04. உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் மாகாண சபைத் துறைக்குரிய நீதிச் செயற்பாடுகளின போது சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்துடன் இணைப்பினை மேற்கொண்டு தேவையான சட்ட ரீதியிலான பணிகளை மேற்கொள்ளல்.
05. மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றத் துறைக்குரியதான கொள்கைப் பிரகடனங்கள், துணைச் சட்டங்களை வகுப்பதற்கு உரிய சட்ட ரீதியிலான உதவியினை வழங்குதல்.

செயற்சாதனை

1. தற்போது சுமார் 7 தசாப்பதங்களுக்கு முன்னர் நகர சபை கட்டளைச் சட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதன் பின்னர் விதிக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற பிரதான கட்டளைச் சட்டத்தில் இறுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதேச சபைச் சட்டமும் பாராளுமன்றத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு தற்போது 3 தசாப்பத்திற்கு மேற்பட்ட காலம் கடந்துள்ளது. எனவே இச்சட்டங்களில் காணப்படும் காலாவதியான செயற்பாடுகள் கட்டளைச் சட்ட்திதன் மூலம் பொது மக்களுக்கு வழங்கும் சேவைகளை உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வினைத்திறனை பாதுகாப்பது தொடர்பில் பாரிய அழுத்தங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இக்கட்டளைச் சட்டடத்தை மறுசீரமைக்கும் தேவை 1999 உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான ஜனாதிபதி பரிசோதனை ஆய்வுக் குழுவின் அறிக்கை மூலமும் இனங்காணப்பட்டிருந்த போதிலும் இதுவரையில் அது தொடர்பில் தேவையான மறுசீரமைப்புக்களை மேற்கொள்ளத் தவறியுள்ளது. எனவே இச்சட்ட மறுசீரமைப்பின் அத்தியாவசிய தேவையினை கருத்திற் கொண்டு தற்போதைய மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற கௌரவ அமைச்சரினால் அதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழு மூலம் உரிய சட்ட மறுசீரமைப்புத் தொடர்பில் இதுவரையில் அமைச்சு முன்னெடுத்திருந்த சகல விடயங்களையும் ஆய்விற்குட்படுத்தி அதற்குரியதான சமகால யோசனை கௌரவ அமைச்சருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் ஆண்டில் இச்சட்டத்தை மறுசீரமைக்கும் பணிகளை பூர்த்தி செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

உள்ளூர் அரசாங்கக் கட்டணங்கள் திருத்தத்திற்கான முன்மொழிவுகளை தயாரித்தல் பற்றிய குழு.



உள்ளூர் அரசாங்கத்தின் பிரதான சட்டத்தை திருத்துவதற்கான குழு அறிக்கை

2. உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் 25மூ கட்டாயமாக மகளிர் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காகத் தேவையான சட்டத்தை வகுத்தல் மற்றும் அரசியலில் பெண்களை வலுவூட்டும் வகையில் தேவையான செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் சட்டத்தை மறுசீரமைக்கும் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. இது 2017 இலக்கம் 16 கொண்ட உள்ளூராட்சி மன்ற வாக்கெடுப்பு (மறுசீரமைப்பு) சட்டமாக 2017 ஆகஸ்ட் மாதம் 31 ஆம் திகதி இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் வர்த்தமாணி அறிவித்தலில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அமைச்சின் இணையத்தளத்திலும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

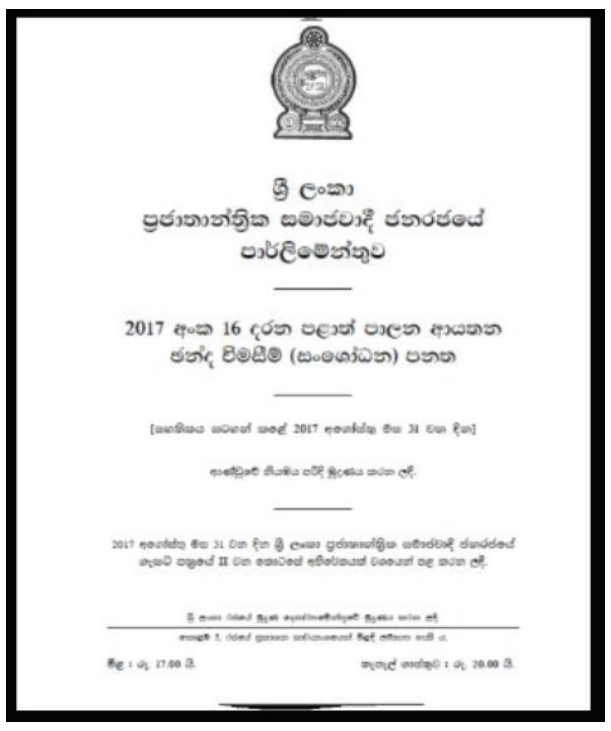
ශ්‍රී ලංකා
ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලිමේන්තුව

2017 අංක 16 දරන පළාත් පාලන ආයතන
ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත

2017 ஆம் இலக்கம் 16

புதிய தேர்தல் முறை மற்றும் அதில் மகளிர் கோட்டா முறை தொடர்பில் பெண்களை அறிவுறுத்தல்.

3. மாகாண சபையில் 25மூ மகளிர் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக தேவையான சட்டங்களை வகுப்பதற்கான பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் மாகாண சபை தேர்தல் முறையில் மாற்றங்களை மேற்கொண்டு மாகாண சபை தேர்தல் சட்டமும் மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2017 இலக்கம் 17 கொண்ட மாகாண சபைத் தேர்தல் வாக்கெடுப்பு (மறுசீரமைப்பு) சட்டமாக 2017 செப்ரெம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதி இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் வர்த்தமாணி அறிவித்தல் மூலம் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அமைச்சின் இணையத்தளத்திலும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.

4. 4. மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்கான வரைபில் ஒழுக்கு விழுமிய முறைமை அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின் அதிமேன்ம தங்கிய ஜனாபதியின் கட்டளைக்கமைய மாகாண சபைகளின் அங்கீகாரத்திற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

5. கட்டாக்காலி நாய்களினால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை தடுப்பதற்காக காணப்படும் தடைகளை இனங்கண்டு அதற்கான சட்டங்களை வகுக்கும் செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்து பின்னூட்டல்களுக்காக மாகாண சபை பிரதம செயலாளர்களின் பங்கேற்புடன் செயற்பாட்டுக் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெண் அமைச்சு கௌரவத்துடன் கலந்துரையாடலில் உள்ளது. மாகாண சபைகளுக்குள் பெண் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஒதுக்கீட்டில் அமைச்சர் அமைச்சர்

6. 6. நீதிமன்றத் தண்டப்பணம் மற்றும் காணி பொறுப்பளிப்பிற்கமைய அறவிடப்படும் முத்திரைக் கட்டணம் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு கிடைப்பதனை முறைப்படுத்தல் மற்றும் துரிதப்படுத்துவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட சட்ட வரைவு சட்டமா அதிபரின் உறுதியினை பெற்றுக் கொள்ளவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்டகாலமாக உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரிக்கைகளை கருத்திற் கொண்டு கௌரவ அமைச்சரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இம்மறுசீரமைப்புக்கள் மூலம் எதிர்காலத்தில் உள்ளூ ராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் முத்திரைக் கட்டணம் மற்றும் நீதி மன்ற தண்டப்பணம் தொடர்பிலான பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக தெளிவான தீர்வு வழங்கப்படவுள்ளது.

7. தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு நலன்புரி வசதிகளை வழங்கும் நோக்குடன் தோட்டக் குடியேற்றங்களுக்காகத் தேவையான பொதுப் பயன்பாட்டு சேவைகளுக்கு பிரதேச சபை நிதியத்தை பயன்படுத்துவதற்கான இயலுமைகளை வழங்கும் வகையில் 1987 இலக்கம் 15 கொண்ட பிரதேச சபைச் சட்டத்தை மறுசீரமைக்க சட்ட வரைவினை தயாரிக்க மாகாண சபைகளில் கருத்துக்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.



2017 ஆம் இலக்கம் 17

8. 8. உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களைத் தாபிப்பதற்காக பொருத்தமான ஒப்பளவுகளை இனங்காண்பதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் உள்ளூராட்சி மன்றங்களைத் தாபிப்பது மற்றும் தரமுயர்த்துவது தொடர்பில மிகுந்த தூர நோக்கு மற்றும் முறையான செயற்பாடுகளை வகுப்பதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.

உள்ளூர் ஆளுநர்களின் அரசியலமைப்பின் அடிப்படைகளை அடையாளம் காண்பதற்கு நியமிக்கப்பட்டது

புதிய உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவன வாக்கெடுப்புச் சட்டத்தின் மறுசீரமைப்புகளுக்கமைய உள்ளூராடசி மன்ற நிறுவன உறுப்பினர் எண்ணிக்கை தொடர்பில் வர்த்தமாணி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2017 நவம்பர் மாதம் 22 ஆம் திகதி இலக்கம் 2043.:.56 மற்றும் 2043/57 கொண்ட இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தல்.

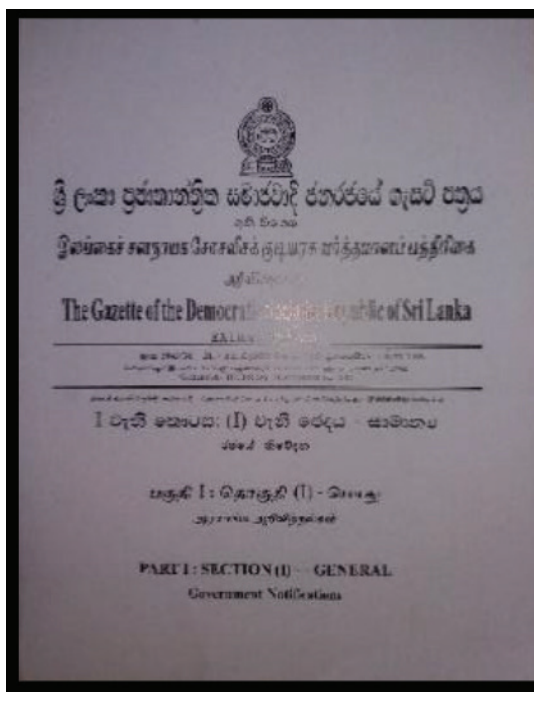

2043/56

2043/57

பிராந்திய தூதர்

3.6. நிர்வாகப் பிரிவு

நோக்கம்

அமைச்சின் மானிட வள முகாமைத்துவம், மானிட வள அபிவிருத்தி மற்றும் பௌதீக வள முகாமைத்துவம் நிர்வாகப் பிரிவின் பிரதான பணிகளாகும். கீழ்க் குறிப்பிட்ட செயற்பாடுகள் மூலம் அப்பணிகள் 2017 ஆம் ஆண்டு பூராகவும் திருப்திகரமான மட்டத்தை எட்டியுள்ளன.

	பணிகள்	மேற்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படைச் செயற்பாடுகள்
1	மானிட வள முகாமைத்துவம்	தனிப்பட்ட கோவைகளைப் பேணல்
		விடுமுறை ஆவணங்களைப் பேணல்
		உள்ளக வெளி இடமாற்றங்களை அமுல்படுத்தல்
		உத்தியோகத்தர்களை ஓய்வுறுத்தும் பணிகள்
		தேவையற்ற பதவிகளை நீக்குதல் மற்றும் புதிய பதவிகளை உருவாக்குதல்
		அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர் சபையின் வெற்றிடங்களை நிரப்புதல்
2	மானிட வள அபிவிருத்தி	வினைத்திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறன்மிக்க சேவையினை வழங்கவதற்காக பயிற்சி தேவைகளை இனங்காணுதல்
		உள்நாட்டு பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களை அமுல்படுத்தல்
		வெளிநாட்டு பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களின் இணைப்புப் பணிகள்
3	பாராளுமன்ற செயற்பாட்டு இணைப்புப் பணிகள்	60 அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்கள் 2017 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்தல்
		இவ் அமைச்சிற்குரிய பாராளுமன்ற 68 கேள்விகளுக்காகப் பதிலளித்தல்
		41 அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்களுக்காக கௌரவ அமைச்சரின் மேற்பார்வையினை வழங்குதல்.
4	முறைமை அபிவிருத்தி	அவ்வவ் பிரிவுகளுக்காக உரிய பணிகளை இனங்காணுதல்
		பணியினை ஆய்விற்குட்படுத்துவதன் மூலம் பணியாளர் சபை மீளாய்வு
5	தகவல்களை அறிந்து கொள்ளும் சட்டத்தை அமுல்படுத்தல்	தகவல் உத்தியோகத்தர்களை நியமித்தல்
		சட்டம் தொடர்பில் அறிவுறுத்தும் வேலைத்திட்டங்களை நடாத்துதல்
		அவ்வவ் பிரிவுகள் மூலம் வெளியிடப்பட்ட தகவல்களை சேகரித்தல்
		தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய செயற்பாட்டு ஒழுங்கு விதிமுறைகள் தொடர்பில் அமைச்சின் இணையத்தளத்தை வெளியிடல்

6	உற்பத்தித்திறன் மிக்க சிந்தனையினை அமுல்படுத்தல்	5ளு யோசனை தொடர்பில் அறிவுறுத்தல் வேலைத்திட்டங்களை நடாத்துதல்
		உற்பத்தித்தின்மிக்க செயற்பாட்டுக் குழுவை நியமித்தல்
		அவ்வவ் பிரிவுகளுக்காக தரச்சுற்றுக்களை தாபித்தல்
		தரச்சுற்றுக்கள் மூலம் புதிய செயற்திட்ட யோசனைகளை சமர்ப்பித்தல் மற்றும் அமுல்படுத்தல்
		டெங்கு ஒழிப்புக்காக சகல பிரிவுகளுடன் இணைந்து சிரமதானங்களை நடாத்துவதன் மூலம் அமைச்சின் வெளிச் சூழலை சுத்தப்படுத்தல்
		தேசிய உணவு உற்பத்திப் புரட்சியின் கீழ் அமைச்சு வளாகத்தில் விவசாய செய்கைச் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளல் மற்றும் பசுமையான இடத்தை தோற்றுவித்தல்.
7	பௌதீக வள முகாமைத்துவம்	கட்டடம் / கண்டலம சுற்றுலா பங்களா / இயந்திர உபகரணம் / வாகனப் பராமரிப்பு ♦ அமைச்சின் தளத் திட்டங்களை வகுத்தல். ♦ மேலதிக செயலாளர் (உள்ளூராட்சி மன்ற மற்றும் மாகாண சபை) கட்டடத்தில் மூன்றாவது மாடியினை புதிதாக நிர்மானித்தல். ♦ செயற்திட்டப் பிரிவிற்காக கட்டடத்தை புதிதாக நிர்மானித்தல். ♦ அபிவிருத்திப் பிரிவின் புனரமைப்பு ♦ வாகனத் தரிப்பிடத்திற்கான பிரிவினை நிர்மானித்தல். ♦ புத்தகம் கட்டும் அறையினை புனரமைத்தல். ♦ அமைச்சரின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தை முழுமையாக புனரமைத்தல் ♦ இராஜாங்க அமைச்சு அலுவலகத்தைப் புணரமைத்து வர்ணம் பூசுதல். ♦ கண்டலம சுற்றுலா பங்களாவில் குளியலறையை புனரமைத்தல். நிதி முகாமைத்துவம் வெளிச்சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் தொடர்புபட்ட கடமைகள்

இவ் அமைச்சின் பணியாளர் சபை தொடர்பான சுருக்கமான குறிப்பு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 3 .

மட்டம்	ஊழியர் எண்ணிக்கை		மொத்தம்
	பெண்	ஆண்	
1. சிரேஷ்ட மட்டம்	11	16	27
2. மூன்றாம் நிலைமட்டம்	03	01	04
3. இடைநிலை மட்டம்	107	25	132
4. ஆரம்ப மட்டம்	05	68	73
மொத்தம்	126	110	236

2017 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் செலவாகியுள்ள நிதி கீழ்க் குறிப்பிட்டவாறு அமைகின்றது.

தொட. இல	பணிகள்	தேறிய ஒதுக்கீடு (ரூபா.மி)	செலவிடப்பட்ட நிதி (ரூபா.மி)	நிதி முன்னேற்றம்	பௌதீக முன்னேற்றம்
01.	கட்டட பராமரிப்பு (புதிய நிர்மானிப்பு மற்றும் புணரமைப்புப் பணிகள்)	34.3	31.8	93	90
02.	இயந்திர உபகரணப் பராமரிப்பு	3.3	2.5	76	90
03.	வாகனப் பராமரிப்பு	24.1	22.5	93	95
04.	பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களை அமுல்படுத்தல்	2.5	0.7	30	50

தேசிய உணவு உற்பத்தி புரட்சியின் கீழ் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளத்தை பயன்படுத்தி அமைச்சின் வளாகத்தில் பயிர் செய்கையினை மேற்கொள்ளல் மற்றும் நீலப் பசுமையான வளாகத்தை கட்டியெழுப்புதல்.

2017 ஆம் ஆண்டில் நிர்மானிக்கப்பட்ட புதிய கட்டடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட புணரமைப்புப் பணிகள்

பயிற்சி வேலைத்திட்டத்தை அமுல்படுத்தல் மற்றும் புலமைப்பரிசில் வழங்குதல்.

3.7. செலவின ஆய்வுப் பிரிவு

ஆய்வுப் பிரிவு மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் (மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றம்) இன் கீழ் தாபிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2017 செப்ரெம்பர் மாதம் தொடக்கம் கணக்குப் பிரிவு பிரதம நிதி உத்தியோகத்தரின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் நிதி செயற்சாதனை தொடர்பான தகவல்களை சேகரித்தல், அறிக்கை தயாரித்தல் மற்றும் தேசிய மட்டத்தின் நிறுவனங்களுக்கு அத்தகவல்களை வெளியிடல் போன்றன இப்பிரிவின் பிரதான பணிகளாக அமைகின்றன. மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக வசதிகளை வகுக்கும் போதும் அந்நிறுவனம் தொடர்பில் கொள்கைகளை வகுக்கும் போது இத்தகவல்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் மிக்கதாகும்.

செலவினப் பிரிவின் செயற்பாடுகள்

1. மாகாண சபை நிதிச் செயற்சாதனை அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்.

   மத்திய அரசாங்கத்தின் நிதி வழங்கல், மாகாண சபை மதிப்பீடு, வருமானம், செலவினம் மற்றும் பணியாளர் சபைத் தகவல்களை சேகரித்து மாகாண மற்றும் நிதிச் செயற்சாதனை தொடர்பில் மாதாந்த மற்றும் காலாண்டு அடிப்படையில் அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

2. உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் நிதிச் செயற்சாதனை அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்.

   உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் மதிப்பீடு, வருமானம், செலவினம், பணியாளர் சபைத் தகவல்கள் மற்றும் பொது வசதிகள் தொடர்பில் தகவல்களைச் சேகரித்து உள்ளூராட்சி மன்ற நிதிச் செயற்சாதனை தொடர்பில் அரையாண்டு மற்றும் வருடாந்த அடிப்படையில் அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

3. தேசிய மட்டத்தில் நிறுவனங்களுக்கு தகவல்களை வழங்குதல்.

   எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் தொலைபேசி செயற்பாடுகளுக்காகவும் தேசிய மட்டத்தில் கொள்கைத் தீர்மானங்களை எட்டுவதற்கு தேவையான தகவல்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் இலங்கை மத்திய வங்கி, பொதுத் திறைசேரி, நிதி ஆணைக்குழு சபை மற்றும் குடிசன புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் நிதிச் செயற்சாதனை தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

4. உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் மிகைக்கட்டண நிலைமைகள் தொடர்பில் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளல்.

   கணக்காய்வாளரினால் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் நிதிச் செயற்பாடுகளை ஆய்விற்குட்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து அந்நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு விதிக்கப்படும் மிகைக்கட்டணம் தொடர்பில் உரிய உத்தியோகத்தர்களினால் உள்ளூராட்சி சட்டத்திற்கமைய இவ் அமைச்சிற்கு ஒதுக்கப்படும்

மேன்முறையீட்டினை கருத்திற் கொள்வது தொடர்பில் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்வது இதன் கீழ் இடம்பெறுகின்றன.

2017 செயற்சாதனைகள்

- 2017 ஆம் ஆண்டில், 2016 நவம்பர், டிசம்பர் மற்றும் 2017 ஜனவரி தொடக்கம் நவம்பர் வரை மாகாண சபை நிதிச் செயற்சாதனை மாதாந்த அறிக்கையை தயாரித்து பூர்த்தி செய்துள்ளதுடன், மாகாண சபை நிதிச் செயற்சாதனை 2016 நன்காவது காலாண்டு அறிக்கை மற்றும் 2017 முதலாவது, இரண்டாவது மற்றும் 3 வது காலாண்டு அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கும் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.

- 2017 ஆம் ஆண்டில் 2016 ஆம் ஆண்டுக்குரியதாக உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவங்களின் செயற்சாதனை அறிக்கையினைத் தயாரிக்கும் பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.

- மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் நிதிச் செயற்சாதனை அறிக்கை தற்போது இலங்கை மத்திய வங்கி, பொதுத் திறைசேரி, நிதி ஆணைக்குழு சபை மற்றும் குடிசனப் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

- 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவன உறுப்பினர்கள் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களினால் மிகைக் கட்டண மேன்முறையீடுகள் 19 சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதில் 5 மேன்முறையீடுகளின் செயற்பாடுகள் 2017 ஆம் ஆண்டில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏனைய மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்துவதற்காக தேவையான மேற்பார்வைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை கோர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2018.01.01 ஆம் திகதி தொடக்கம் மிகைக் கட்டண மேன்முறையீடு விடய உள்ளகக் கணக்காய்வு பிரிவிற்கு பொறுப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.

- மாகாண சபையினால் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள 2015,2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுக்குரிய கட்டுநிதி விடுவிப்பு, வருமானங்கள் மற்றும் செலவினங்கள் தொடர்பிலான அறிக்கை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனத்தினால் வருடாந்தம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வருமான செலவினம் தொடர்பிலான தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கை கீழ்வே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வுப் பிரிவினால் தயாரிக்கப்படும் மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிதிச் செயற்சாதனை அறிக்கை

3.8. உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு

அறிமுகம்

சிறந்த அரச நிதி முகாமைத்துவத்திற்காக உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவிற்குரிய செயற்பாடுகள் தீவிரமாக வலியுறுத்தப்படும் இந்த யுகத்தில் வெற்றிகரமாக உள்ளகக் கணக்காய்வு பரிசோதனைகளை திட்டமிடுவதற்காக அத்தியாவசிய கணக்காய்வு வேலைத்திட்டங்களை வகுப்பது இதன் நோக்கமாகும்.

இவ்வாறு வகுக்கும் போது 2018 ஆம் ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு, செயற்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் புதிய யோசனைகள் கருத்திற் கொள்ளப்பட்டதுடன் இதற்காக நி.ஓ. 134 (2) இற்கமைய கணக்காய்வாளரின் ஆலோசனை பெறப்பட்டுள்ளது.

செயற்பாடுகள்

பிரதான கணக்கு வழங்கும் உத்தியோகத்தர், கணக்கு வழங்கும் உத்தியோகத்தருக்கு வழங்கப்படும் அரச வள வினைத்திறன், உற்பத்தித்திறன், சிக்கனமாக பயன்படுத்தி அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்களை உரிய காலத்திற்குள் நேரத்திற்குள்ளும் பூர்த்தி செய்யும் பொறுப்பினை உரியவாறு நிறைவேற்றுவதற்காக உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவின் உதவிகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய முறைகள் நிதிஒழுங்குக் கோவை 133(1) (அ)(ஐஐ) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு திணைக்களத்திற்குப் பணிக்கப்படும் அல்லது திணைக்களத்தினால் பொறுப்பேற்கப்பட்ட அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்கள் உட்பட வேலைத்திட்டங்களை நிவர்த்தி செய்து இதன் போது பெற்றுள்ள முன்னேற்றங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்கு கணக்கு வழங்கும் உத்தியோகத்தருக்கு மற்றும் முன்னேற்றங்களை ஆய்விற்குட்படுத்தும் குழுவிற்கு உதவுதல்.

இதற்கமைய மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவிற்குப் பொறுப்பளிக்கப்படும் பணிகளாக அமைவது சகல பிரிவுகள், செயற்திட்டங்கள் மற்றும் இணைந்த நிறுவனங்களின் அரச வளங்களின் வினைத்திறன், உற்பத்தித்திறன், சிக்கனமாக பயன்படுத்தி அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்களை உரிய நேரத்திற்கு பூர்த்தி செய்யும் பொறுப்பினை உரியவாறு நிறைவேற்றுவதற்காக கணக்காய்வுப் பிரிவிற்கு உதவுவதாகும்.

2017 ஆம் ஆண்டில் செயற்பாடுகள்

1. முகாமைத்துவக் கணக்காய்வுப் பிரிவு னுஆயு.ீ.2009(1) மற்றும் 2009.06.09 ஆம் திகதிய சுற்றறிக்கையில் இணைப்பு 3 இற்கமைய அமைச்சின் அடிப்படை அறிக்கையினை தயாரித்து 2017.01.30 ஆம் திகதி முகாமைத்துவ கணக்காய்வுத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

2. முகாமைத்துவக் கணக்காய்வு னுஆயு.ீ.2009(1) மற்றும் 2009.06.09 ஆம் திகதிய சுற்றறிக்கையின் 7 வது வாசகத்திற்கமைய இணைப்பு 2 இற்கமைய அமைச்சின் 2017 ஆம் ஆண்டின் கணக்காய்வுத் திட்டங்களை வகுத்து 2017.02.06 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அமைச்சின் செயற்பாட்டுத் திட்டங்களை மீள மறுசீரமைத்து வகுக்கப்படுவதினால் மீண்டும் இம்மறுசீரமைப்பின் செயற்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கமைய

அமைச்சின் கணக்காய்வுத் திட்டங்களை வகுத்து 2017.04.26 ஆம் திகதி செயலாளரின் அங்கீகாரத்திற்கு சமர்ப்பித்து 2017.04.28 ஆம் திகதி முகாமைத்துவக் கணக்காய்வுத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

3. 2017 ஆம் ஆண்டுக்காக கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் 4 குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.

4. இலங்கை பாராளுமன்றம், அரச கணக்கு தொடர்பான செயற்குழு சபையின் மேற்பார்வையின் கீழுள்ள நிறுவனங்களின் நிதிச் செயற்சாதனைகள் தொடர்பான மதிப்பீடுகளுக்காக வகுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் முகாமைத்துவ முறைமைக்கு தகவல்களை கோருவதற்காக சகல மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் பொறுப்பாளர்களை அழைத்து 2017.10.27 ஆம் திகதி கூட்டம் நடாத்தி உரிய மறுசீரமைப்புக்களை உள்ளடக்கிய அறிக்கையினைத் தயாரித்து 2017.10.31 ஆம் திகதி அரச கணக்கு செயற்குழு சபைக்கு அனுப்புதல்.

5. அரச கணக்கு தொடர்பான செயற்குழு சபையினால் பாராளுமன்றத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் மாகாண சபை, உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் மற்றும் நிலையியற் சபை நிறுவனங்களின் நிதிச் செயற்சாதனை மதிப்பீட்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட மாதிரிப் படிவம் 04 பிரதான வியூகங்களின் கீழ் மறுசீரமைத்து உரிய அறிக்கையினைத் தயாரித்து அரச கணக்கு செயற்குழு சபைக்கு 2017.11.24 ஆம் திகதி அனுப்புதல்.

6. உள்ளக நிருவாக முறை தொடர்பில் உள்ளகக் கணக்காய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் போது கீழ்க் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் தெரியவந்தன. இது உள்ளக நிருவாக முறையில் காணப்படும் பின்னடைவுகள் தொடர்பில் உயரிய முகாமைத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பில் 2017.12.24 ஆம் திகதி அறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

7. மாகாண மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் அனுப்பப்பட்ட தகவல்கள் அரச கணக்கு செயற்கழு சபைக்கு அனுப்புதல்.

கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்ட தகவல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடர் இல	தகவல் அனுப்பப்பட்ட மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்ள்	அரச கணக்கு செயற்குழு சபைக் கூட்டங்களை நடாத்துவதற்குரிய தினங்கள்
01	தென் மாகாண சபை	2017.0125
02	மத்திய மகாண சபை	2017.02.23
03	கொழும்பு மாநகர சபை	2017.03.10
04	மேல் மாகாண சபை - சுகாதார அமைச்சு டெங்கு தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல்	2017.03.08
05	வடமத்திய மாகாண சபை	2017.03.23
06	ஊவா மாகாண சபை	2017.03.23
07	கிழக்கு மாகாண சபை	2017.04.05
08	களுத்துறை பிரதேச சபை	2017.07.27
09	மாநகர சபை கொழும்பு, தெஹிவளை, கல்கிசை, நுகேகொட, காலி, மாத்தறை, ஹம்பாந்தோட்டை	2017.04.06
10	பாணந்துறை நகர சபை	2017.07.04
11	தென் மாகாண சபை	2017.11.07
12	வடமாகாண சபை	2017.09.07
13	ஏறாவூர் நகர சபை மற்றும் காத்தான்குடி நகர சபை	2017.09.19
14	கொழும்பு மாநகர சபை	2017.10.20

08. அரச கணக்காய்வுப் பிரிவினால் அமைச்சிற்கு ∴ அதனுடன் இணைந்த நிறுவனங்களுக்கு மற்றும் வெளிநாட்டு செயற்திட்டங்கள் தொடர்பிலான கணக்காய்வுகளுக்கு வழங்கப்படும் பதிலை அரச கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பித்தல்.

அரச கணக்காய்வுப் பிரிவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கணக்காய்வுளுக்குரியதாக தகவல்களைச் சமர்ப்பித்தல்.

தொடர் இல	நிறுவனங்கள்	பெற்ற கணக்காய்வுகளின் எண்ணிக்கை
01	அமைச்சுக்கள்	06
02	உள்ளூராட்சி மன்றம் தொடர்பான இலங்கை நிறுவனம்	03
03	உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம்	01
04	புறநெகும செயற்திட்டம்	31

05	கொழும்பு பெரும்பாக கழிவுநீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டம்	01
06	2 வது சுகாதாரப் பிரிவு அபிவிருத்திச் செயற்திட்டம்	02

09. 2017 ஆம் ஆண்டில் உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பரிவினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வுப் பணிகள்

தொ. இல	கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட நிறுவனம்	கணக்காய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட காலம்	கணக்காய்வு சமா்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி
01	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம்	2017.01.01-2017.01.28	2017.01.30
02	மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு 2016-ஐஐஐ காலாண்டு	2017.03.01-2017.03.28	2017.03.28
03	மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு 2016-ஐஏ காலாண்டு	2017.04.01-2017.06.16	2017.06.16
04	மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு 2017-1 காலாண்டு	2017.06.16-2017.08.08	2017.08.08
05	கொழும்பு பெரும்பாக கழிவு நீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டம் - 2015	2017.07.01-2017.08.09	2017.08.09
06	கொழும்பு பெரும்பாக கழிவு நீர் முகாமைத்துவச் செயற்திட்டம் - 2016	2017.07.01-2017.08.29	2017.08.29
07	உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம் - 2016	2017.08.01-2017.09.30	2017.10.24.
08	வடகிழக்கு உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனச் சேவைகளை விருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம் (நேடுீளு)	2017.11.10-2017.12.11	2017.12.11
09	மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சு 2017 ஐஐ காலண்டு	2017.09.01-2017.12.15	2018.01.06
10	சுயவிபரக் கோவை பரிசோதனை	2017.12.15-2017.12.31	2018.01.05

10. அமைச்சு மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனம் தொடா்பிலான இலங்கை நிறுவனம், உள்நாட்டு கடன் உட்பட அபிவிருத்தி நிதிய செயற்திட்டங்களின் வங்கி இணக்கக் கணக்காய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன

11. அமைச்சின் மற்றும் மாகாண சபைகளுக்காக / உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவங்களில் உள்ளக நிருவாகத்தை முறைப்படுத்துவதற்காக தற்போது உள்ளக சுற்றறிக்கைகள் 04 வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

i. 01/2017
ii. 02/2017
iii. 03/2017
iv. 04/2017

12. மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்குரியதாக அரச கணக்கு செயற்குழு சபையின் பரிந்துரைகளை அமுல்படுத்தல் மற்றும் கோரப்பட்ட அறிக்கை, சமர்ப்பித்தல் தற்போது 06 அறிக்கைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

i. 2016.10.04 ஆம் திகதி இடம்பெற்ற சப்ரகமுவ மாகாண சபை, அரச கணக்கு செயற்குழு சபைக் கூட்டத்தின் 09 வது விடயத்திற்குரியதாக கடந்த 05 ஆண்டுகளுக்குள் மாகாண சபையில் நடாத்தப்பட்ட கணக்கு செயற்குழு சபை எண்ணிக்கை மற்றும் பரிசோதனை செய்த கணக்கு எண்ணிக்கையினை உள்ளடக்கிய அறிக்கை.

ii. 2016 இலக்கம் 21 கொண்ட தனியார் வர்த்தக நிறுவனத்தினை பதிவு செய்யும் சட்டத்திற்கமைய அவ்வவ் மாகாண சபைகளினால் கடந்த 05 ஆண்டுகளுக்குள் சேகரிக்கப்பட்ட நிதியளவு மற்றும் அவை வைப்பிலிடப்பட்டுள்ள முறைகள் தொடர்பான அறிக்கை.

iii. வடமத்திய மாகாண சபை 2010இ 2011இ 2012இ 2013 மற்றும் 2014 ஆண்டுகளுக்காக கணக்காய்வாளர் அறிக்கை மற்றும் தற்போதைய செயற்சாதனையைப் பரிசோதனை செய்தல் தொடர்பான அறிக்கை.

iv. 2017.03.10 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட அரச கணக்கு செயற்குழு சபையின் 97 வது கூட்டத்தில் மத்திய மாகாண சபையின் செயற்சாதனை குறிப்பு தொடர்பான அறிக்கை.

v. 2017.04.05 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட அரச கணக்கு செயற்குழு சபையின் 107 வது கூட்டத்தின் கிழக்கு மாகாண சபையின் செயற்சாதனை குறிப்பு தொடர்பான அறிக்கை.

vi. 2017.03.23 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட அரச கணக்கு செயற்குழு சபையின் 21 வது கூட்டத்தின் ஊவா மாகாண சபையின் செயற்சாதனை குறிப்பு தொடர்பான அறிக்கை.

13. 2017 ஆம் ஆண்டில் உள்ளகக் கணக்காய்வுத் திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக இரண்டு விசேட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

i. கோட்டை நகர சபையின் மோசடிகள் தொடர்பில் கணக்காய்வாளர் அறிக்கை மூலம் வெளியிடப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் மற்றும் மக்களுக்கான பொறுப்புக்களை கைவிடுதல் தொடர்பில் அறிவுறுத்தல் உட்பட அதற்குரிய விசாரனை அறிக்கை 2017.09.27 ஆம் திகதி அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

ii. அமைச்சின் சாரதிகளின் மேலதிக நேரக் கொடுப்பனவு மற்றும் பிரயாணச் செலவினக் கொடுப்பனவிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கடமை தொடர்பில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அறிக்கை 2017.10.04 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

3.10. உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகம்

அறிமுகம்

1999 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற மறுசீரமைப்பு தொடர்பான ஆராய்ச்சி ஆணைக்குழு சபை அறிக்கையில் இலங்கையின் உள்ளூராட்சி மன்றத் துறையின் மேம்பாட்டிற்காக முன்னெடுக்க வேண்டிய பல செயற்பாடுகள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தன. இதில் ஒரு பரிந்துரையாக அமைவது உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் மானிட அபிவிருத்திக்காக தேசிய மட்டத்தில் உள்ளூராட்சி மன்றப் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தைத் தாபிப்பது தொடர்பான தேவையாகும். இது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தி மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூ ராட்சி மன்ற அமைச்சினால் 1999 ஆம் ஆண்டில் உள்ளூராட்சி மன்றம் தொடர்பான இலங்கை நிறுவகம் தாபிக்கப்பட்டது. இதற்கமைய உள்ளூராட்சி மன்றம் தொடர்பிலான இலங்கை நிறுவகம் 1999 இலக்கம் 31 கொண்ட பாராளுமன்ற சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந் நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டு நிருவாகம் மற்றும் முகாமைத்துவதத்திற்காக உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் மாகாண சபை அமைச்சின் செயலாளர் உட்பட உத்தியோகபூர்வ அதிகாரத்தின் மூலம் நியமனம் பெறும் 08 அங்கத்தவர்கள் உட்பட அமைச்சின் கௌரவ அமைச்சரினால் நியமிக்கப்படும் 05 உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கிய பணிப்பாளர் சபை நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதம நிறைவேற்று உத்தியோகத்தரான பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் நிறுவனத்தின் பொறுப்பளிக்கப்பட்டுள்ள பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டுப் பணிகள்

மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றத் துறையின் மக்கள் பிரதிகள் உட்பட உத்தியோகத்தர்களுக்காக பயிற்சிகளை நடாத்துதல் மற்றும் அத்துறையில் ஆராய்ச்சிகளை நடாத்துவது நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பிரதான பணியாகும். இதற்கு மேலதிகமாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில் உள்ளூராட்சி மன்றத்துடன் தொடர்புபட்ட நிறுவனங்களுடன் தொடர்பாடலை கட்டியெழுப்பி உள்ளூராட்சி மன்ற ஆளுகையினை போகிப்பது நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பணிகளாகும்.

இதற்கமைய இந்நிறுவனம் கீழக் குறிப்பிடப்பட்ட பணிகளை அமுல்படுத்துகின்றது.

- தேசிய/ பிரதேச மட்டத்தில் பயிற்சிச் செயலமர்வு
- சர்வதேச/ தேசிய மட்டத்தில் கருத்தரங்கு
- பிரயோக அமர்வு
- டிப்ளோமா பாடநெறி
- சான்றிதழ் பத்திரப் பாடநெறி
- ஆராய்ச்சிகள்
- ஆலோசனை சேவை வழங்கல்
- துண்டுப்பிரசுரங்கள், கையேடுகளை வெளியிடல்
- மூன்று மாத உள்ளூராட்சி மன்ற பத்திரிகை உள்ளடக்கிய சஞ்சிகையினை வெளியிடல்.

மேற்கூறப்பட்ட பணிகளை அமுல்படுத்துவதற்காக உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகம் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்ட பிரிவுகளை கொண்டமைந்துள்ளன.

- பொறியியல் பிரிவு
- பொது முகாமைத்துவ மற்றும் மானிட வள அபிவிருத்திப் பிரிவு
- நிதி முகாமைத்துவப் பிரிவு
- பௌதீக திட்டமிடல் பிரிவு
- சட்டப் பிரிவு
- ஆராய்ச்சிப் பிரிவு
- கற்கைப் பிரிவு
- தாபன கொள்ளளவு அபிவிருத்திப் பிரிவு

கடந்த ஆண்டில் முழு நாட்டையும் தழுவக்கூடிய வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பயிற்சி தேவைகளின் ஆய்விற்கமைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பயிற்சி வேலைத்திட்டங்கள் சகல மாவட்டங்களுக்காகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

2017 ஆம் ஆண்டில் மானிட வள அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள்

பொறியியல் பிரிவு

இல	செயலமர்வின் பெயர்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலமர்வு எண்ணி / காலம்	நடாத்தப்பட்ட செயலமர்வுகளின் எண்ணிக்கை	சமூகமளிப்பு பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
01	சுகாதார மற்றும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு பணி வேலைத்திட்டம்	09	10	417
02	கனரக வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திர உபகரணப் பராமரிப்பு	09	08	357
03	இலத்திரனியல். வயரிங், அலுமினியம் தொடர்பான அறிவு மற்றும் திறமை	09	10	443
04	சூழல் சட்டங்கள் மற்றும் சட்டங்கள் தொடர்பிலான அறிவு உட்பட திறமை விருத்தி	03	03	97

கற்கைப் பிரிவு

இல	செயலமர்வின் பெயர்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலமர்வு எண்ணி / காலம்	நடாத்தப்பட்ட செயலமர்வுகளின் எண்ணிக்கை	சமூகமளிப்பு பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
01	உள்ளூராட்சி மன்ற முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி மற்றும் பயிற்சி பிரிவின் இணைப்பு செயலமர்வு (1 நாள்)	04	ශූන	சகல உள்ளூ ராட்சி மன்ற ஆணையாளர்கள் மற்றும் பிரதி பிரதான செயலாளர் பயிற்சி

02	மாகாண இணைப்பு உத்தியோகத்தர்களுக்கான செயலமர்வு (1 நாள்)	04	04	சகல மாகாண இணைப்பு உத்தியோகத்தர்கள்
03	உள்ளூராட்சி மன்றம் தொடர்பான உயர் டிப்ளோமா பாடநெறி 15/16	மாதங்கள 18	03	60
04	உள்ளூராட்சி மன்றம் தொடர்பான உயர் டிப்ளோமா பாடநெறி 16/17	மாதங்கள 18	01	65
05	மாகாண நிருவாகப் பத்திரிகை - சிங்களம் / தமிழ்	வலயங்கள் 04	01	சகல உள்ளூ ராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள்
06	பிரதேச மட்டத்தில் பயிற்சி வேலைத்திட்டங்கள்	35	வலயங்கள் 04	2474
07	பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் வேலைத்திட்டம்	04	45	142
08	வெளியீட்டுப் பிரிவு	-	04	

பொது முகாமைத்துவ மற்றும் மானிட வள அபிவிருத்திப் பிரிவு

இல	செயலமர்வின் பெயர்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலமர்வு எண்ணி ∴ காலம்	நடாத்தப்பட்ட செயலமர்வுகளின் எண்ணிக்கை	சமூகமளிப்பு பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
01	சேவை உற்பத்தித் திறனை விருத்தி செய்வதற்கான சிந்தனை ரீதியிலான மாற்றங்கள் ஊடாக ஊழியர் ஊக்குவிப்பு	09	13	588
02	கனிஷ்ட பணியாளர் சபைக்காக உற்பத்தித்திறன் பொது மக்கள் இணைப்பினை ஏற்படுத்துவதற்காக தொடர்புசாதன திறைமை விருத்தி	09	11	563
03	அலுவலக முகாமைத்துவம் தொடர்பான செயலமர்வு	09	12	522

நிதி முகாமைத்துவப் பிரிவு

இல	செயலமர்வின் பெயர்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலமர்வு எண்ணி / காலம்	நடாத்தப்பட்ட செயலமர்வுகளின் எண்ணிக்கை	சமூகமளிப்பு பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
01	அரச துறையின் கணக்குகளில் அளவிற்கமைய உள்ளூ ராட்சி நிறுவனங்களின் நிதி வெளிப்பாடுகளை தயாரித்தல்	09	10	513
02	சம்பள முகாமைத்துவம்	09	10	456

சட்டப் பிரிவு

இல	செயலமர்வின் பெயர்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலமர்வு எண்ணி / காலம்	நடாத்தப்பட்ட செயலமர்வுகளின் எண்ணிக்கை	சமூகமளிப்பு பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
01	நீதி மன்றச் செயற்பாடுகள்	09	09	448
02	இடைக்கால பிரமாணக் குறிப்பினை வகுத்தல் மற்றும் அமுல்படுத்தல்	09	09	426
03	உள்ளூராட்சி ஆளுகைச் சட்டம்	09	09	424
04	உள்ளூராட்சி மன்ற சட்டத்தரணிகளுக்காக பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்குப் பயிற்சியளித்தல்	01	01	20

ஆராய்ச்சிப் பிரிவு

தொ. இல	செயலமர்வின் பெயர்	சமூகமளித்த பயிற்றுவிப்பாளர்களின் எண்ணிக்கை
01	இலங்கையில் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் வரி மற்றும் வரிப்பண விதிப்பு உட்பட அறவீட்டு முறைகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி கற்கை	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
02	மாகாண சபைப் பட்டியலில் 21 வது விடயத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி வருமானத்தை ஈட்டுவதற்காக மாகாண சபைகளின் பங்களிப்புக்கள் தொடர்பிலான ஆராய்ச்சி கற்கை	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
03	உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகத்தினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட பயிற்சி செயலமர்வு தொடர்பான மதிப்பீடு	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
04	உள்ளூராட்சி மன்ற சஞ்சிகை (சிங்களம்)	பணிகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.
05	மாதிரி உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள்	ஹோமாகம பிரதேச சபை

கணணிப் பிரிவு

இல	செயலமர்வின் பெயர்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலமர்வு எண்ணி / காலம்	நடாத்தப்பட்ட செயலமர்வுகளின் எண்ணிக்கை	சமூகமளிப்பு பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
01	கணணி வலையப்பின் மூலம் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் வினைத்திறனை விருத்தி செய்தல்	09	09	370
02	சமூக இணையத்தளங்கள் தொடர்பாக பொது மக்களை அறிவுறுத்தல்	09	09	417
03	சைபர் சட்டம் மற்றும் தகவல் பாதுகாப்பு தொடர்பில் அறிவுறுத்துவது தொடர்பான செயலமர்வு	09	10	362

பௌதீக திட்டமிடல் பிரிவு

இல	செயலமர்வின் பெயர்	எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயலமர்வு எண்ணி / காலம்	நடாத்தப்பட்ட செயலமர்வுகளின் எண்ணிக்கை	சமூகமளிப்பு பயிற்சியாளர்களின் எண்ணிக்கை
01	நகர திட்டமிலுக்குரிய சட்டங்கள் மற்றும் கோவைகள்	09	07	343
02	மதிப்பீடுகள் மற்றும் வரி விதிப்பு தொடர்பான பயிற்சி செயலர்வு	09	09	384
03	அனர்த்த முகாமைத்துவம் தொடர்பான பயிற்சி செயலமர்வு	09	07	340

பிரதேச பயிற்சி செயலமர்வு

அவ்வவ் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற திணைக்களங்களினால் விசேடமாக விடுக்கப்படும் கோரிக்கைகளுக்கமைய 45 பயிற்சி வேலைத்திட்டங்கள் கீழ்க் குறிப்பிடப்பட்டவாறு மாகாண மட்டத்தில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டன.

மாகாணம்	நிறுவனம்	வேலைத்திட்டங்கள் தொடர்பான
மேல் மாகாணம்	உள்ளூராட்சி மன்றத் திணைக்களம்	05
மத்திய மாகாணம்	உள்ளூராட்சி மன்றத் திணைக்களம்	11
மத்திய மாகாணம்	மாகாண சபை	01
வடமேல் மாகாணம்	உள்ளூராட்சி மன்றத் திணைக்களம்	10
வடமேல் மாகாணம்	மாகாண சபை	05
தென் மாகாணம்	உள்ளூராட்சி மன்றத் திணைக்களம்	05
வடமத்திய மாகாணம்	உள்ளூராட்சி மன்றத் திணைக்களம்	03
ஊவா மாகாணம்	உள்ளூராட்சி மன்றத் திணைக்களம்	03
சப்ரகமுவ மாகாணம்	உள்ளூராட்சி மன்றத் திணைக்களம்	02

நிறுவனத்தினால் 2017 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்

- சமூகப் பங்கேற்பு மாதிரியை கட்டியெழுப்புவது தொடர்பில் 5 நாள் பயிற்சி செயலமர்வு - ஸ்பேஸ் செயற்திட்டம்

மாகாணம்	செயலமர்வு எண்ணிக்கை	பங்கேற்பு
ஊவா	04	180
மத்திய	04	200
வடக்கு - தமிழ் மொழி	04	170

- உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பன உயர் சான்றிதழ் பத்திர பாடநெறி - நெல்சிப் செயற்திட்டம்

மாகாணம்	பங்கேற்பு
ஊவா, வடமேல், வடமத்தி மற்றும் மத்தி	54
கிழக்கு - தழிம் மொழி	45
வடக்கு - தமிழ் மொழி	04

- நாடு பூராகவும் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள இலங்கையின் மகளிர் அரசியல் பங்கேற்பினை விருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம்.

2017 ஆம் ஆண்டின் பயணத் திசைகள்

வருடாந்த டிப்ளோமா சான்றிதழ் வழங்கும் விழா - 2017

உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகத்தினால் வருடாந்தம் சான்றிதழ்களை வழங்கும் நிகழ்வு மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் கௌரவ பைசர் முஸ்தபா, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் சம்பத் அமரதுங்க மற்றும் மாகாண சபைகள் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் செயலாளர் கமல் பத்மசிறி ஆகியோரின் தலைமையில் கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் 2017 ஒக்டோபர் மாதம் 03 ஆம் திகதி நடைபெற்றது. இதன் போது எமது நிறுவனத்தின் 11 சான்றிதழ் பாடநெறிகளைத் தொடர்ந்த 380 பயற்றுவிப்பாளர்களுக்காக சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. அதன் விசேட காட்சிகள் கீழ்வே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

உள்ளூராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகத்தினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட பயிற்சி

2017 ஜூலை 22 மற்றும் 23 ஆகிய இரு தினங்களில் தென் மாகாணத்தில் நடாத்தப்பட்ட இடைக்கால யாப்பு வகுக்கும் வேலைத்திட்டம்

2016 ஆகஸ்ட் மாதம் 16 மற்றும் 17 ஆகிய இரு தினங்கள் ஊவா மாகாணத்தில் நடாத்தப்பட்ட கணணி வலையமைப்பு வேலைத்திட்டம்

පළාත් පාලන පුවත් පත

2017 ஆகஸ்ட் மாதம் 21 ஆம் திகதி சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் நடாத்தப்பட்ட சைபர் சட்டம் மற்றும் வலையமைப்பு பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டம்

பொது முகாமைத்துவப் பிரிவினால் 2017 செப்ரெம்பர் மாதம் 7 மற்றும் 8 ஆகிய இரு தினங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் நடாத்தப்பட்ட வேலைத்திட்டங்கள்

3.11. உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம்

11 உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம்

3.11.1. அறிமுகம்

உள்நாட்டுக் கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம் 1916 இலக்கம் 22 கொண்ட கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் தற்போது மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் கீழ் அரசாங்கத்தின் நிலையியற் சபை நிறுனமாகச் செயற்படுகின்றது. இந்நிதியம் தற்போது உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் நீண்ட கால வருமானத்தை ஈட்டல் மற்றும் அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகளுக்காக நிதி உதவியினை வழங்கும் பிரதான அரச நிறுவனமாக செயற்படுகின்றது.

நோக்கு

உள்ளூராட்சி மன்ற அதிகாரப் பிரதேசங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக நிதி வசதிகளை வழங்கும் பிரதான நிதி நிறுவனத்தினால் நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்குப் பங்களிப்பு செய்தல்.

பணிக்கூற்று

பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்காக அத்தியாவசிய அடிப்படை வசதிகளை வழங்குவதற்குத் தேவையான நீண்ட கால நிதி வசதிகளை வழங்கும் நீடித்த நிலையான மற்றும் சுயாதீன நிறுவனமாக மாற்றிமைத்தல்.

3.11.2 நிதியத்தின் பிரதான பணிகள்

இலங்கையில் தாபிக்கப்பட்டுள்ள 24 மாநகர சபைகள், 41 நகர சபைகள் மற்றும் 276 பிரதேச சபைகள் உட்பட சகல 341 உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக தேவையான நீண்டகால நிதி வசதிகள் சலுகை வட்டியின் கீழ் வழங்கவது நிதியத்தின் அடிப்படை பணியாகும

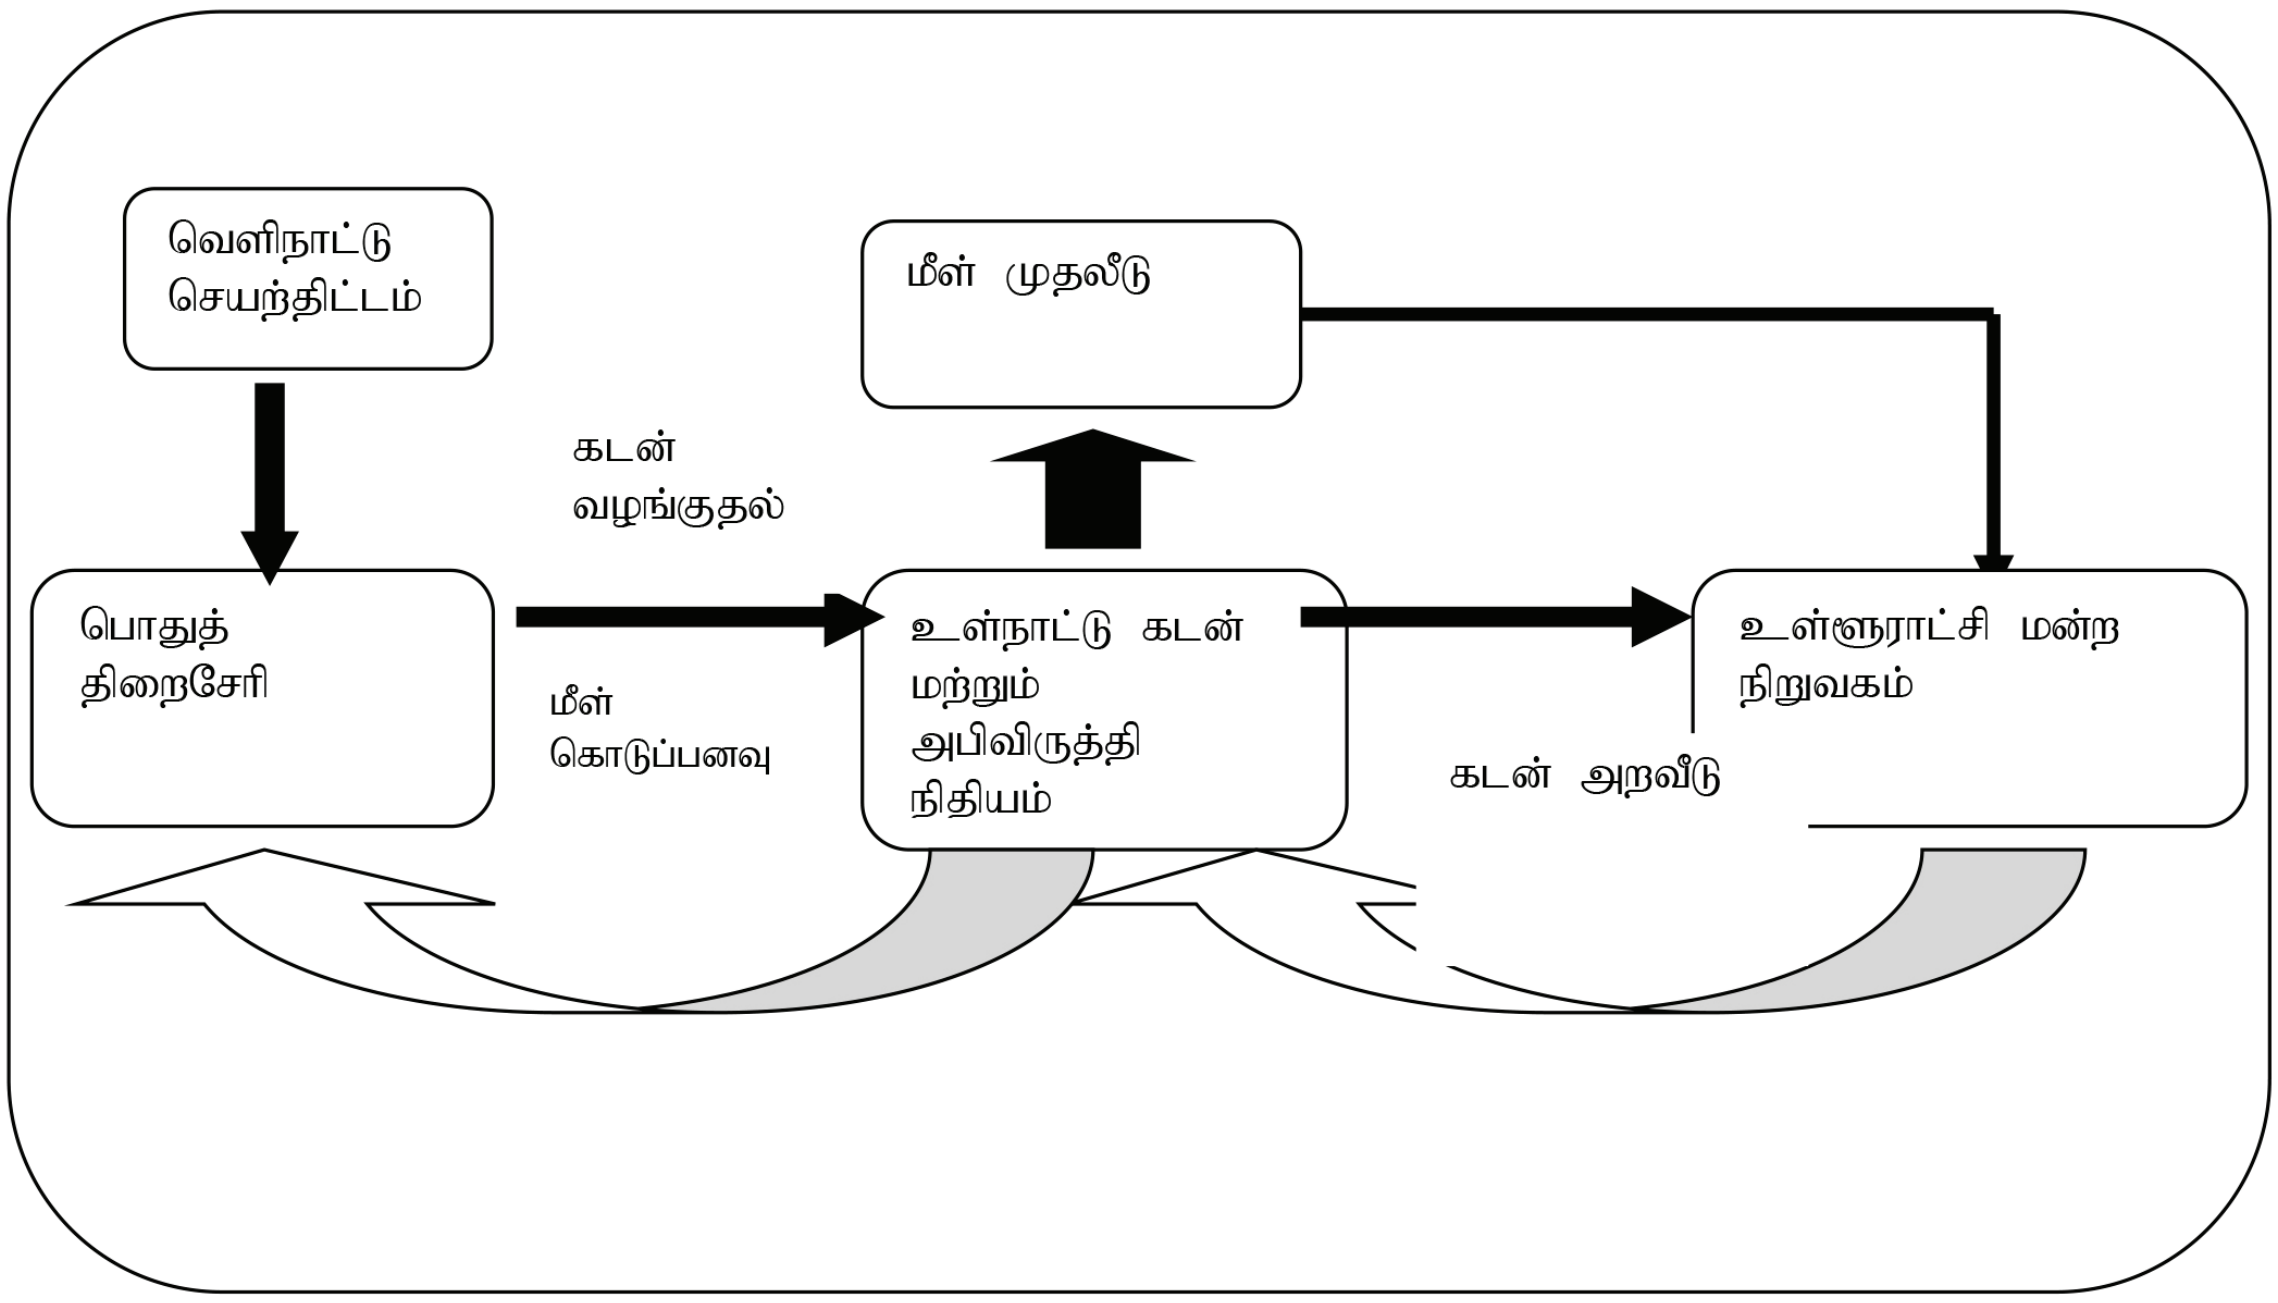

பொதுத் திறைசேரியின் நிதியத்திற்கு வழங்கப்படும் ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் கடன், உள்ளூ ராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் கோரிக்கைகளுக்கமைய இணங்கிய வட்டி விகிதாசாரத்தின் கீழ் நீண்டகால கடனாக வழங்கப்படுவதுடன் கடனை மீள அறவிடும் போது குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதாசாரம் வருமானமாக நிதியத்தில் தோக்கி வைக்கப்படுகின்றது. அது மீண்டும் மீண்டும் கடன் வழங்க மற்றும் முதலீடுகள் மூலம் நிதியத்தை பலப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இச் செயற்பாடுகள் காரணமாக சுய வருமானத்தை ஈட்டும் நிறுவனமாக உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம் 2010 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் பொதுத் திறைசேரியில் ஒதுக்கீடுகளை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை.

3.11.3. அரசாங்கத்தின் வெளிநாட்டு கடன் செயற்திட்டங்களுக்குரியதாக கடன் அறவீட்டு செயற்பாட்டுப் பணிகள்

உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதிய கடன் அறவீட்டு முகவராக உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்யும் செயற்திட்டம் (டுபுஜஜீ) , நகர அபிவிருத்தி மற்றும் குறைந்த வருமான வீடமைப்புச் செயற்திட்டம் (ருனுடுஜரீ), பல்லாண்டு பயிர் அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் (ீஊனுீ) ஆகிய செயற்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இச் செயற்திட்டம் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதி உதவியுடன் பொதுத்திறைசேரியுடன் அரச நிறுவனத்தின் இணைப்புடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியம் இவற்றின் கடனை அறவிடும் செயற்பாட்டு இயந்திரமாக செயற்படுவதற்கு இணங்கிய விகிதாசாரம் சேவைக்கட்டணமாக அறிவிடலுக்கமைய நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

3.11.4. 2017 ஆம் ஆண்டின் செயற்சாதனைகள்

3.11.4.1. கடன் அங்கீகரித்தல் மற்றும் விடுவித்தல்

2017 ஆம் ஆண்டில் கடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்

	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள்		மாகாணம்	செயற்திட்டம்	அங்கீகரிக்கப் பட்ட கடன் நிதி ரூபா.
1	நுவரெலியா	பி.ச	மத்தி	அலுவலக மற்றும் வர்த்தகக் கட்டடத் தொகுதி நிர்மானிப்பு	40,000,000
2	காரைதீவு	பி.ச	கிழக்கு	சமூக சேவை மண்டபக் கட்டடத்திற்காக கட்டுமான நிர்மானிப்பு	2,000,000
3	நிகவரெட்டிய	பி.ச	வடமேல்	மயான நிர்மானிப்பு	5,660,000
4	தெஹிவளை கல்கிசை	மா.ந.ச	மேற்கு	பிரதான அலுவலகக் கட்டடத்திற்காக சூரிய சக்தி வளத் தொகுதியினை பொருத்துதல்	9,500,000
5	ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர கோட்டை	மா.ந.ச	மேற்கு	ஜனஜய சிட்டி வர்த்தகக் கட்டடத் தொகுதி நிர்மானிப்பு	300,000,000
6	பசறை	பி.ச	ஊவா	வர்த்தகக் கட்டடத் தொகுதி நிர்மானிப்பு	40,000,000
7	பிங்கிரிய	பி.ச	வடமேல்	பெக்கோ இயந்திரக் கொள்வனவு	7,000,000
8	கல்முனை	மா.ந.ச	கிழக்கு	டுநுனு விளம்பரப் பலகை	4,000,000
9	ஹங்குரன்கெத்த	பி.ச	மத்தி	பொதுச் சந்தைக்காக காணி கொள்வனவு	6,000,000
10	மஹரகம	ந.ச	மேற்கு	இரண்டு டிப்பர் வண்டிகள், சிங்கில் கப் வண்டி மற்றும் முச்சக்கரவண்டி கொள்வனவு	10,000,000
11	கந்தேகெட்டிய	பி.ச	ஊவா	வாராந்த சந்தையில் அமைந்துள்ள கட்டட அபிவிருத்தி	3,600,000
12	குருநாகல்	பி.ச	வடமேல்	துஊடீ இயந்திரக் கொள்வனவு	19,000,000
13	மண்முனைப்பற்று	பி.ச	கிழக்கு	டிப்பர் இயந்திரக் கொள்வனவு	4,400,000

14	நாவிதன்வெளி	பி.ச	கிழக்கு	சடலங்களை கொண்டு செல்லும் வாகனக் கொள்வனவு	1,120,000
15	ரம்புக்களை	பி.ச	சப்ரகமுவ	வாராந்த சந்தை அமைந்துள்ள வளாகத்தில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி	14,308,000
16	கேகாலை	பி.ச	சப்ரகமுவ	பொதுச் சந்தை நிர்மானிப்பு	15,000,000
17	கொத்மலை	பி.ச	மத்தி	ரம்பொட தியல்லையில் அமைந்துள்ள வளாகத்திலுள்ள சுற்றுலா பார்வையாளர் மண்டபத்தை நவீனமயப்படுத்தல்	4,800,000
18	சாவகச்சேரி	ெ	கிழக்கு	கம்பெக் லோடர் மற்றும் பெக்கோ இயந்திரக் கொள்வனவு	6,000,000
19	ஜ-எல	ந.ச	மேற்கு	தெரு விளக்கு பராமரிப்பு வண்டி கொள்வனவு	6,000,000
20	தெஹிவளை, கல்கிசை	ந.ச	மேற்கு	தீயணைப்பு படைச் செயற்பாடுகளுக்காக நீர்வவுசர் கொள்வனவு	8,000,000
21	கம்பஹா	மா.ந.ச	மேற்கு	நூலகக் கட்டட நிர்மானிப்பு	151,000,000
22	கஸ்பாவ	ந.ச	மேற்கு	கழிவு முகாமைத்துவத்திற்காக 2 டிப்பர் வண்டிகள் கொள்வனவு	8,800,000
				மொத்தம்	**666,188,000**

2017 ஆம் ஆண்டில் கடன் நிதி வழங்கப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்

	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்கள்		மாகாணம்	செயற்திட்டம்	வழங்கப்பட்ட கடன் நிதி ரூபா.
1	மண்முனைத் தெற்கு எருவில் பற்று	பி.ச	கிழக்கு	பெக்கோ இயந்திரக் கொள்வனவு	9,200,000
2	நீர்கொழும்பு	மா.ந.க	மேற்கு	நூலகக் கட்டட நிர்மானிப்பு	22,148,000
3	பகத்தகேவாகட்ட	பி.ச	மத்தி	மயான நிர்மானிப்பு	5,100,000
4	கோரளைப்பற்று மேற்கு	பி.ச	கிழக்கு	எக்ஸ்கவேட்டர் இயந்திரக் கொள்வனவு	8,760,000
5	ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர கோட்டை	மா.ந.க	மேற்கு	ஜனஜய சிட்டி வர்த்தக கட்டட நிர்மானிப்பு	300,000,000
6	நிகரவெட்டிய	பி.ச	வடமேல்	மயான நிர்மானிப்பு	5,660,000
7	மஹரகம	ந.ச	மேற்கு	இரண்டு டிப்பர் வண்டிகள், சிங்கிள் கப் வண்டி மற்றும் முச்சக்கரவண்டி கொள்வனவு	10,000,000
8	பசறை	பி.ச	ஊவா	வர்த்தகக் கட்டடத் தொகுதி நிர்மானிப்பு	22,779,000
9	மதவாச்சி	பி.ச	வடமத்தி	வர்த்தகக் கட்டடத் தொகுதி நிர்மானிப்பு	12,000,000
10	ஹிங்குரன்கெத்த	பி.ச	மத்தி	பொதுச் சந்தைக்காக காணி கொள்வனவு	6,000,000
11	மகவ	பி.ச	மேற்கு	மயான நிர்மானிப்பு	1,830,000
				மொத்தம்	403,477,000

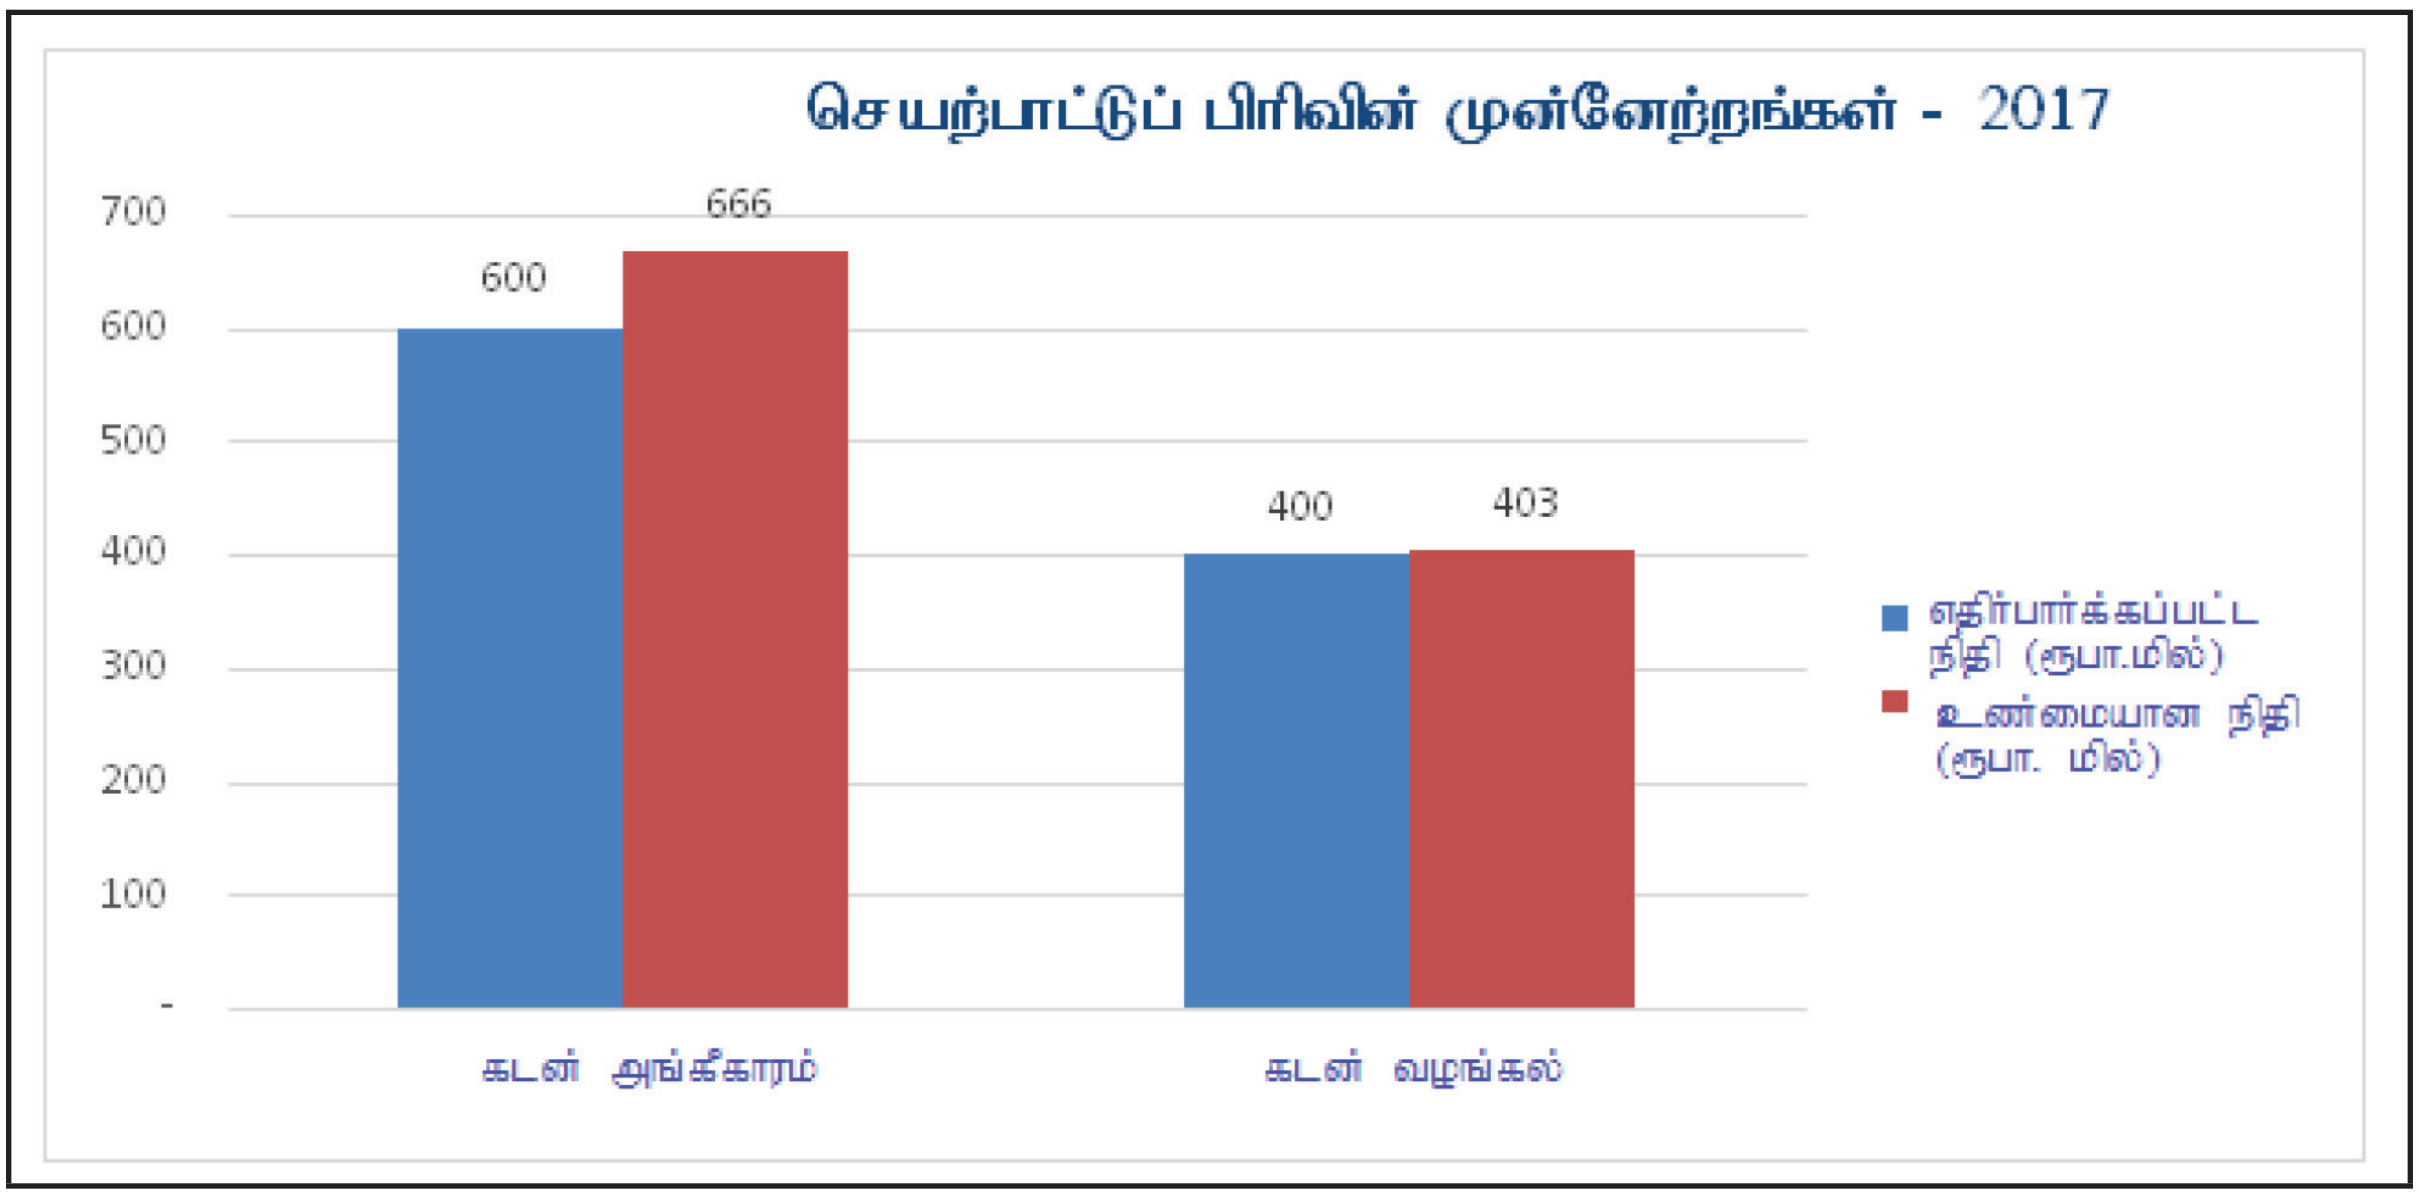

3.11.4.2 கடன் அறவீடு

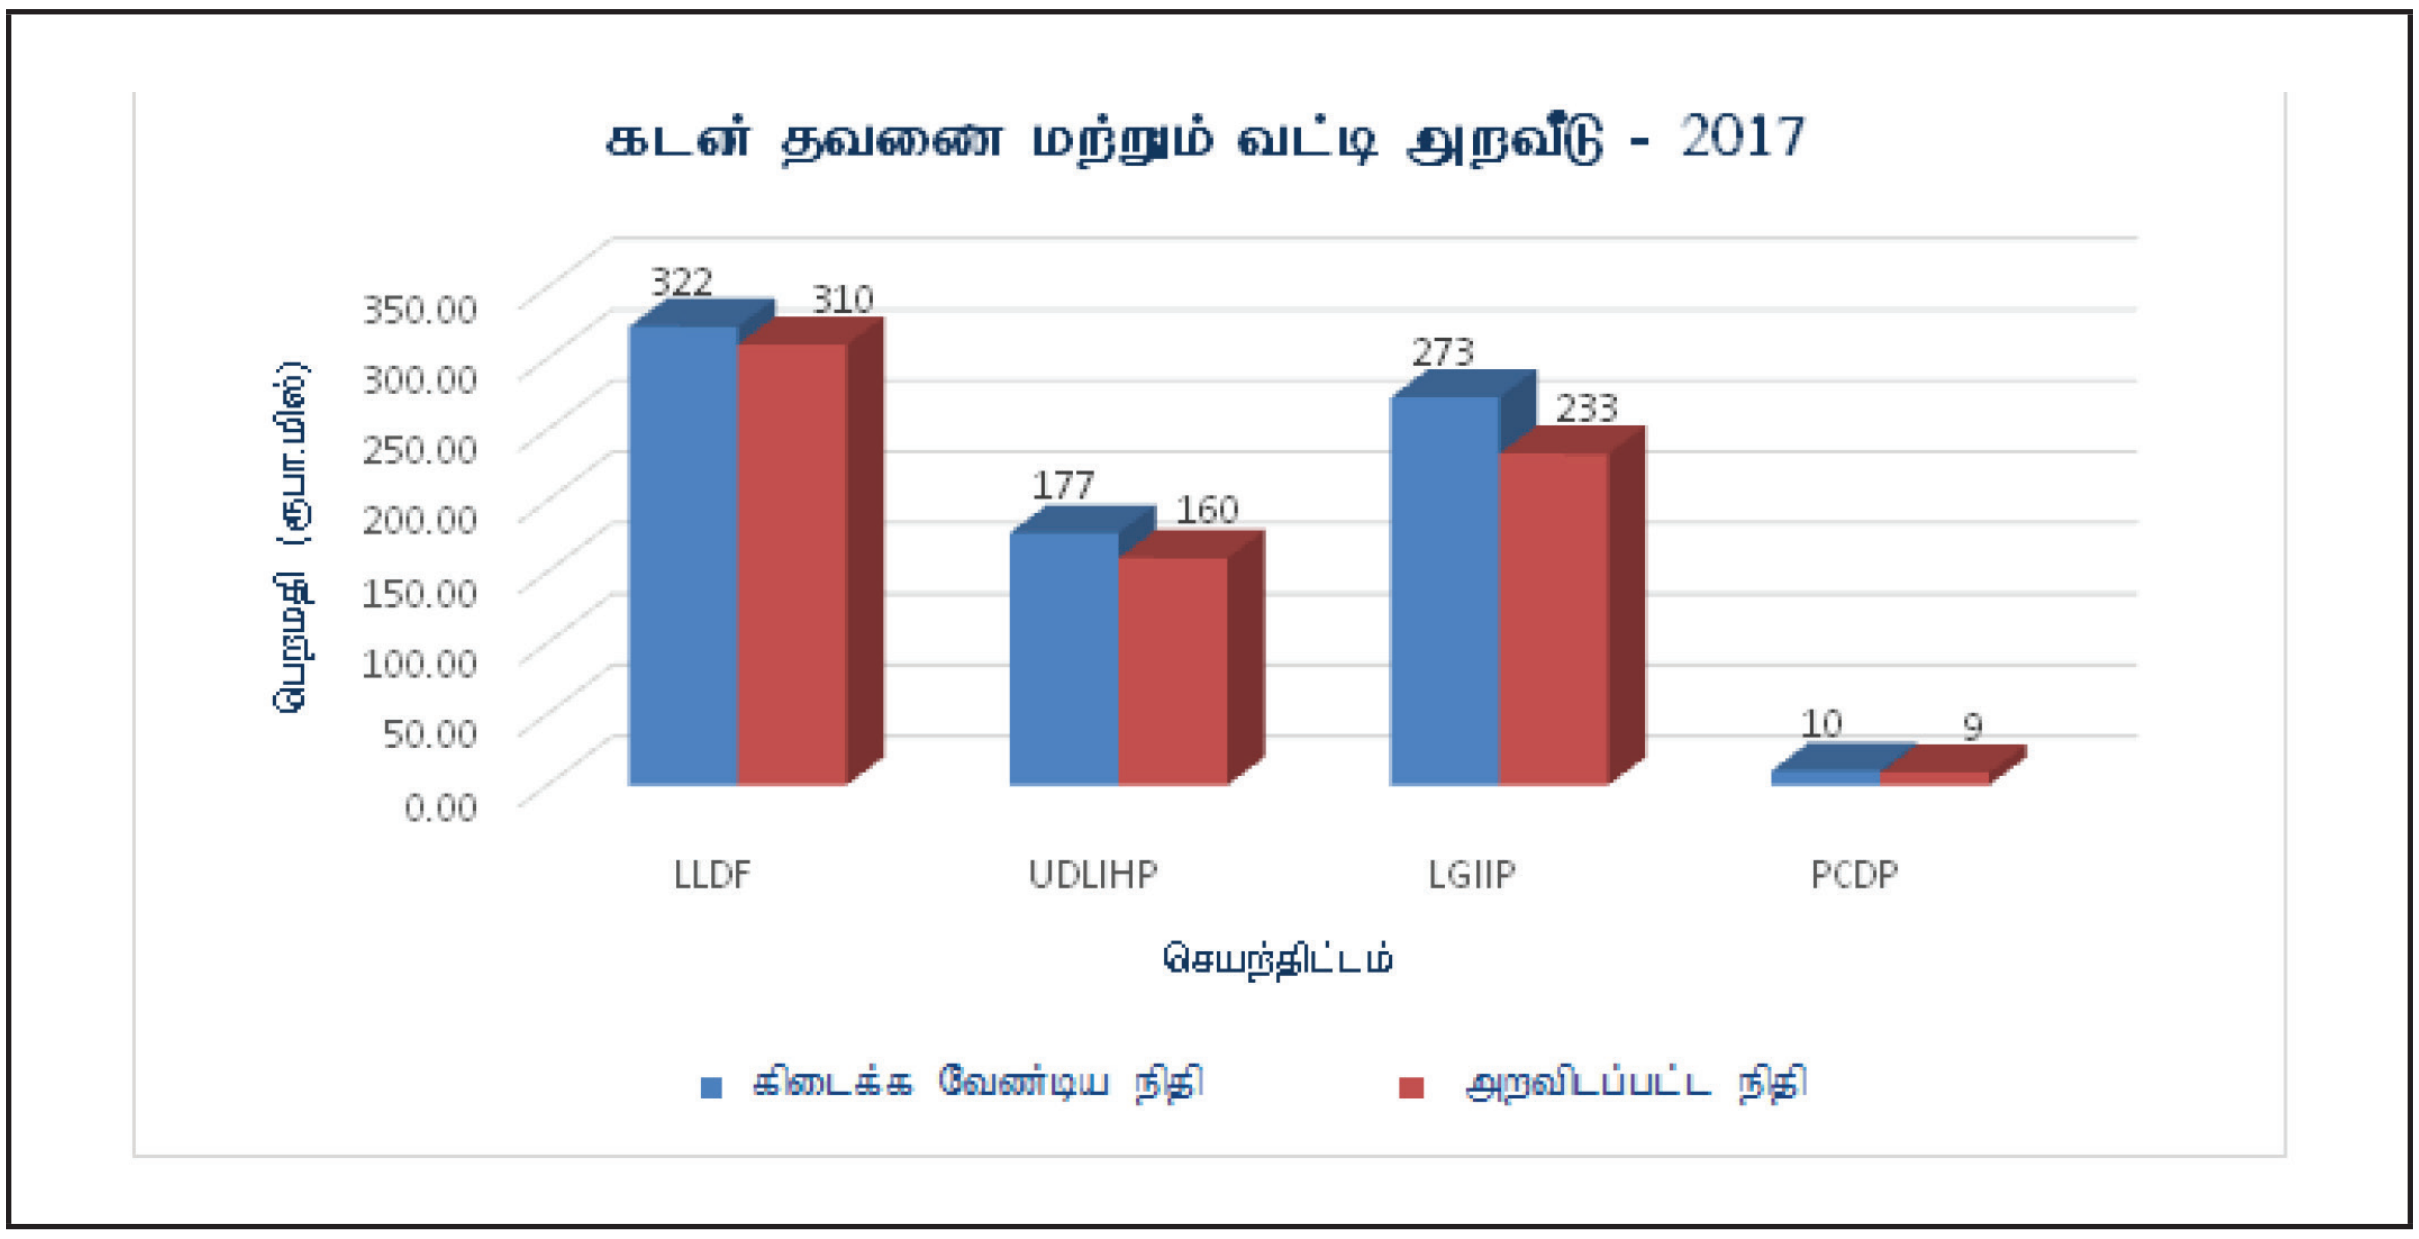

3.11.4.3 பிரச்சார வேலைத்திட்டங்கள்

உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியத்தின் சந்தைப்படுத்தல் பிரச்சார மத்திய நிலையமாக மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் பங்கேற்புடன் “கடன் சந்தை” யோசனை 2017 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுடன் ஆண்டுக்குள் 03 கடன் சந்தைகள் வடக்கு, ஊவா மற்றும் சப்ரகமுவ ஆகிய மாகாணங்களில் வெற்றிகரமான நடாத்தப்பட்டன.

3.11.4.4 கடன் அறவீட்டுக்காக பொதுத் திறைசேரியின் கொடுப்பனவு

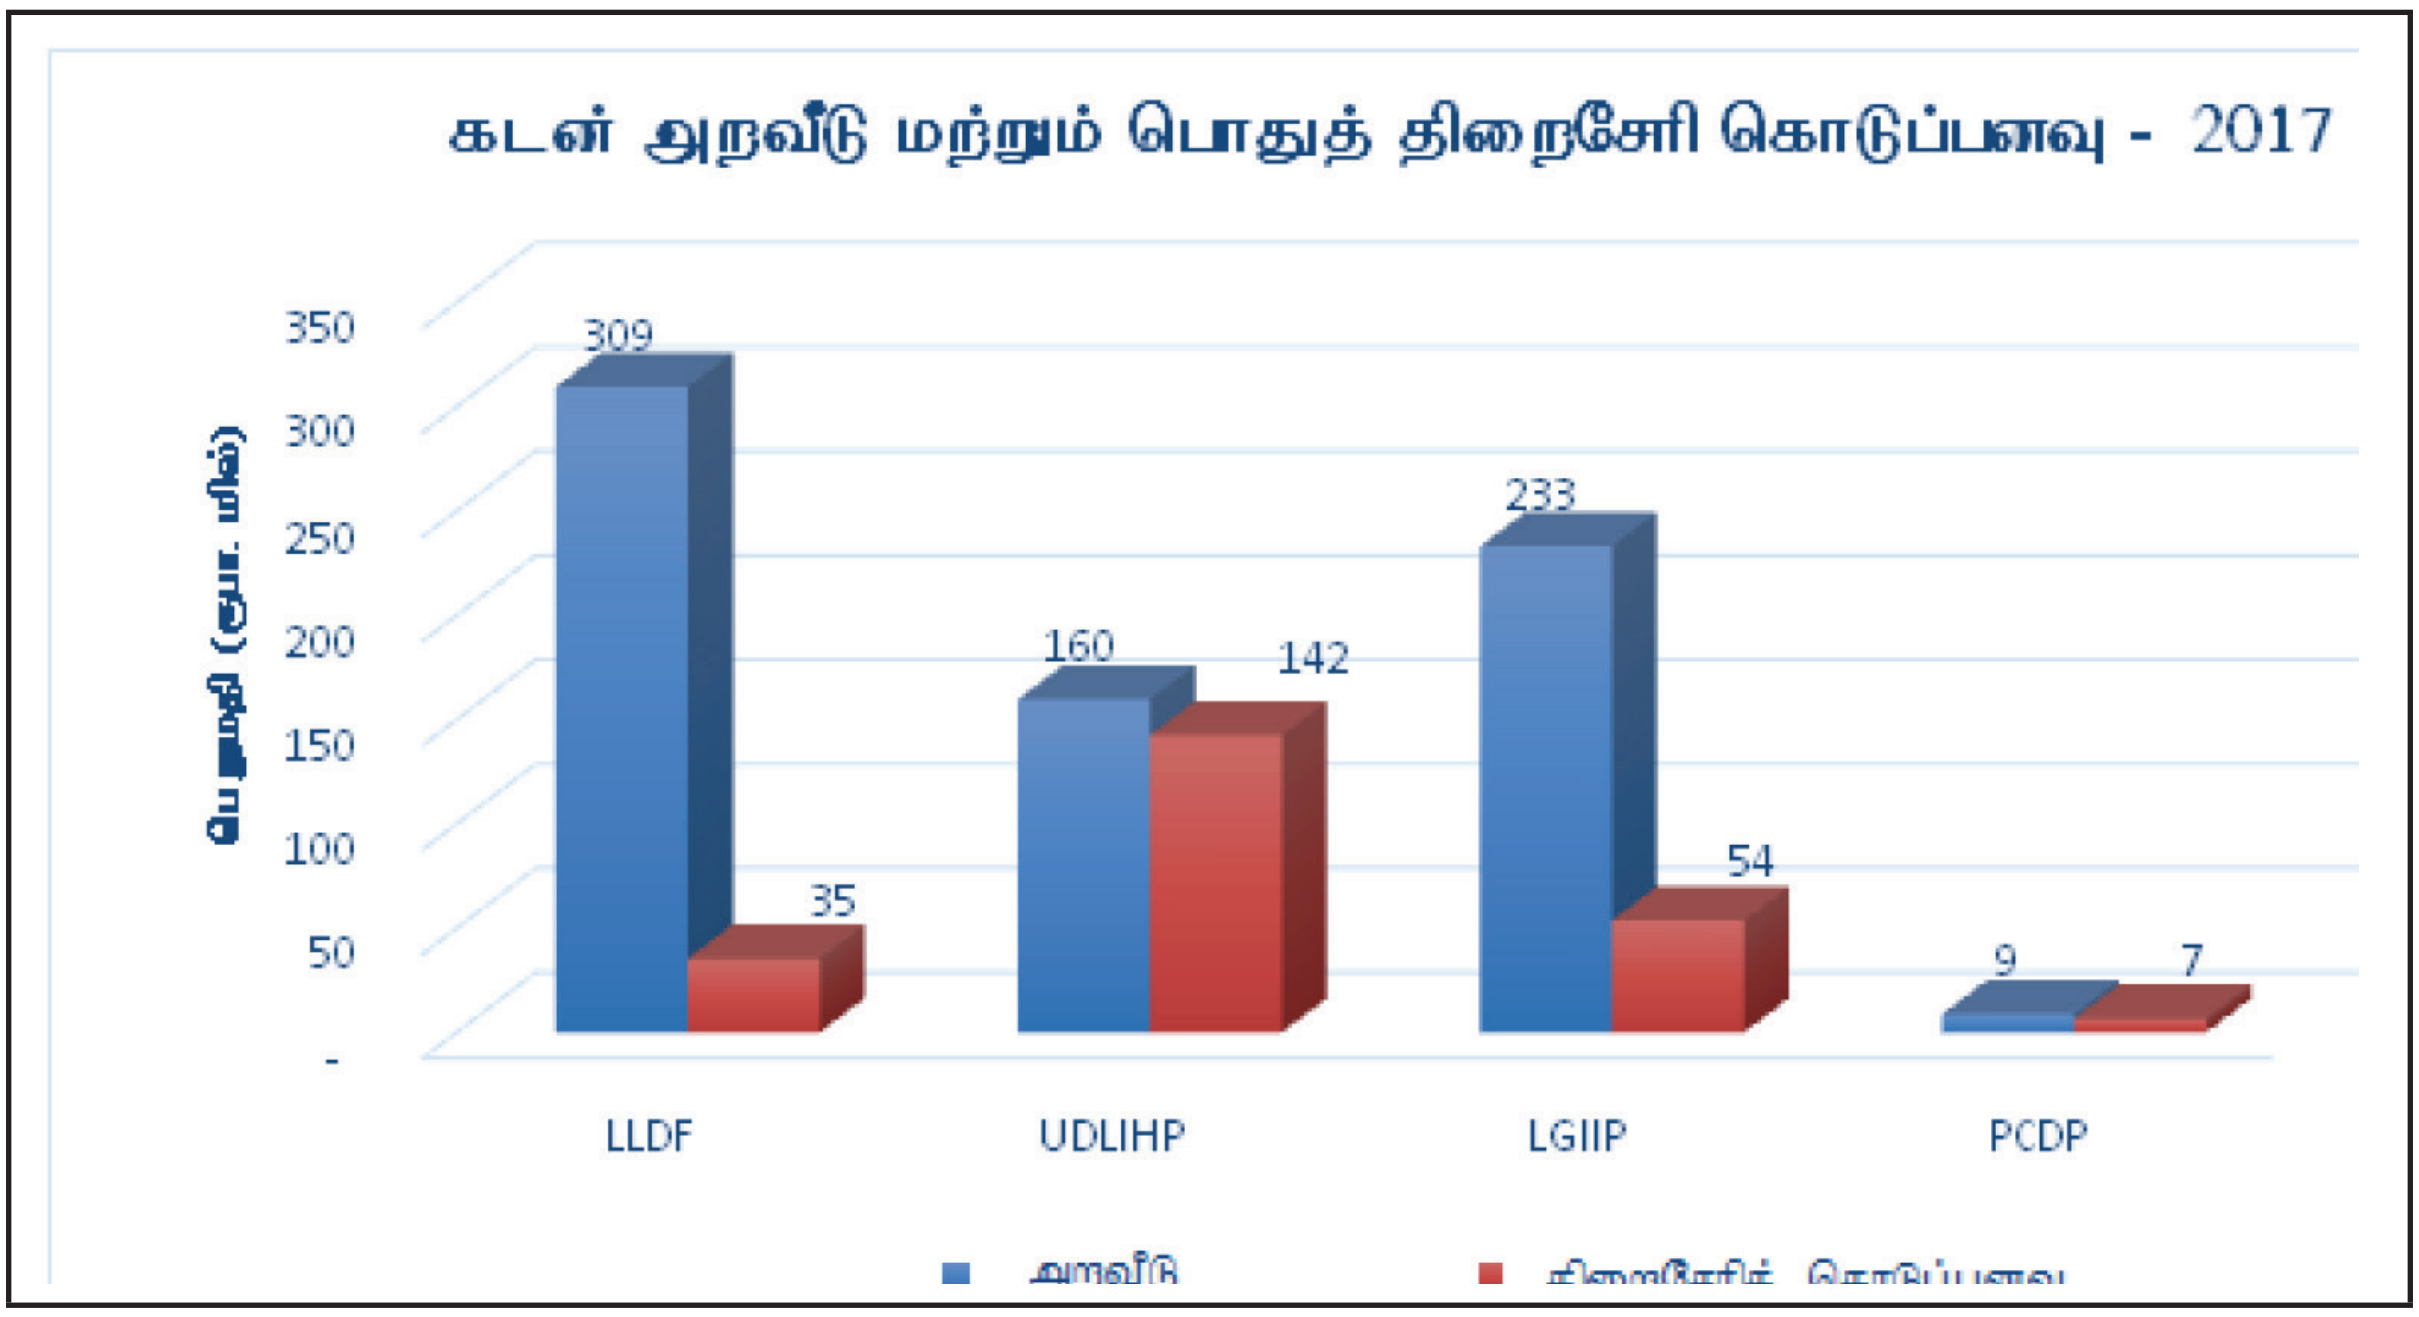

உள்நாட்டு கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியத்திலிருந்து அறவிடப்படாத கடன் நிலுவையினை அறிவிடுவதற்காக சட்ட உத்தியோகத்தர் ஒருவரின் உதவி பெறப்பட்டதுடன் இதன் பயனாக அறவிடாத கடன் நிலுவை குறிப்பிடத்தக்க அளவினால் குறைக்க நிதியத்திற்கு முடிந்தது.

2017.01.01 ஆம் திகதியன்று அறவிடாத கடன் நிலுவைகளின் மொத்தம்- ரூபா. 541இ851இ537
2017.12.31 ஆம் திகிதயன்று அறவிட முடிந்த மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட
கடன் நிலுவைகளின் மொத்தம் - ரூபா. 213இ682இ385
அறவிட முடிந்த அறவிடா கடன் நிலுவை விகிதாசாரமாக - 39%

3.11.4.6 நிதியத்தினால் கடன் நிதியாக்க செயற்திட்டம்

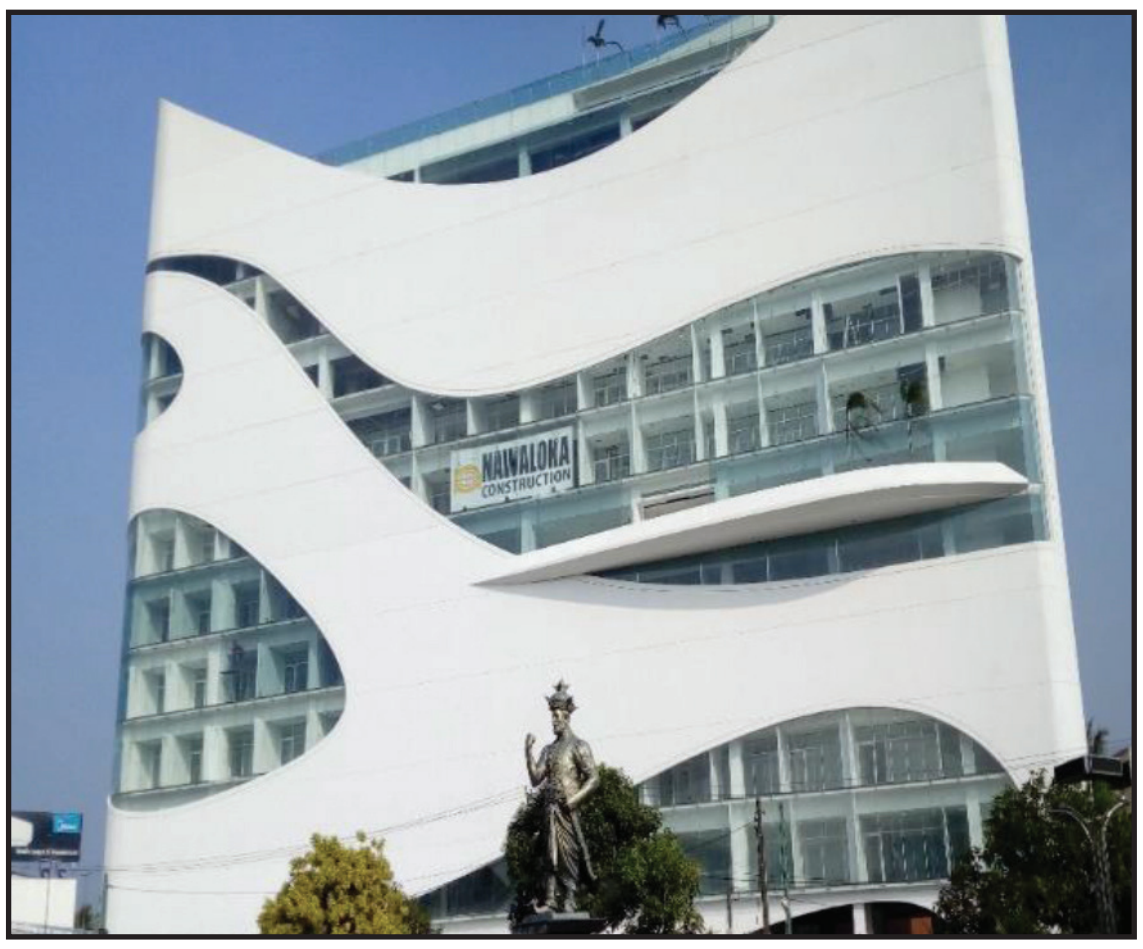

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர கோட்டை மாநகர சபை - ஜனஜய சிட்டி செயற்திட்டம்
(வழங்கப்பட்ட கடன் நிதி ரூபா. 300 மில்லியன்)

ரிதிகம பிரதேச சபை - ரிதிகம மயானம்
(வழங்கப்பட்ட கடன் நிதி ரூபா. 6.5 மில்லியன்)

பிரதம நிறைவேற்று உத்தியோகத்தர்	:-	திரு சுமித் அமரசிறி
அலுவலக முகவரி	:-	இல 24யுஇ வோட் பிளேஸ், கொழும்பு 07
தொலைபேசி இல	:-	+94 112687514
பெக்ஸ் இல	:-	+94 112691261
இலத்திரணியல் முகவரி	:-	டடனக1916ளூபஅயடை.உழஅ
இணையத்தளம்	:-	றறற.டடனக.பழஎ.டம

4. அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் - 2017

2017 ஆம் ஆண்டு இந்த அமைச்சின் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 52 அமைச்சரவைக் கடிதங்களின் முன்னேற்றம் இந்த பிரிவின் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

4.1 மாகாண சபைப் பிரிவு

தொடர் இல	விஞ்ஞாபன இலக்கம்	விடயங்கள்	அமைச்சரவைத் தீர்மானத் திகதி	அமைச்சரவைத் தீர்மானம்	முன்னேற்றங்கள்
01.	CP/2017/19	காணி மறுசீரமைப்பு ஆணைக்குழுவிற்குரிய தேசிய கால்நடை வள அபிவிருத்தி சபையின் கீழ் காணப்படும் காணியின் ஒரு பகுதி சிலாபம் நகர சபை, சிலாபம் பிரதேச சபை மற்றும் ஆராச்சிகட்டுவ பிரதேச சபையினால் அமுல்படுத்தப்படும் ஒருங்கிணைந்த திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவ செயற்திட்டத்திற்காக விடுவிப்பதற்கான கோரிக்கை	2017.08.02	விஞ்ஞாபனத்தில் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஆரம்ப வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 2, 3 மற்றும் 4 வது பரிந்துரைகளுக்காக அங்கீகாரத்தை வழங்குதல். இச் செயற்திட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கு முன்னர் சமூக மற்றும் சூழல் அளுத்தங்களை மதிப்பீட்டுக்குட்படுத்துமாறு வடமேல் மாகாண சபைக்கு அறிவித்தல்	2017.08.17 ஆம் திகதி தேவையான செயற்பாடுகளுக்காக வடமேல் மாகாணத்தின் பிரதம செயலாளருக்க அனுப்பப் பட்டுள்ளது
02.	CP/2017/20	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களின் விசேட கனிஷ்ட ஊழியர் பதவிக்காக குறைந்தபட்ச கல்வித் தகைமையினை தளர்த்துதல்	2017.07.26	பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இலக்கம் 36/2013 ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கமைய தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளல்	சகல மாகாண பிரதம செயலாளர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
03.	CP/2017/29	திண்மக் கழிவு முகாமைத்துவத்திற்காக உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு பொருத்தமான காணியினை வழங்குதல்.	2017.09.15	கூட்டிணைந்த அரமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தை தயாரித்தல்	கூட்டிணைந்த அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் 2018.02.16 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப் பட்டள்ளது.

04.	CP/2017/50	உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக முகாமைத்துவ செவையினைத் தாபித்தல			அமைச்சரவைத் தீர்மானம் இது வரையில் கிடைக்கவில்லை

4.2 கணக்குப் பிரிவு

தொ. இல	விஞ்ஞாபன இலக்கம்	விடயங்கள்	அமைச்சரவை தீர்மானத் திகதி	அமைச்சரவைத் தீர்மானம்	முன்னேற்றங்கள்
01.	CP/2017/32	வருடாந்த அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் 2015 ளுடுஜடுபு	2017.11.01	அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தின் பிரதி இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.	
02.	CP/2017/47	அரச கணக்குத் தரத்திற்கமைய உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்காக பொதுக் கணக்கு முறையினை வகுத்தல்	2018.0105	அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தின் பிரதி இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய உரிய செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

4.3 திண்மக் கழிவுப் பிரிவு

தொ. இல	விஞ்ஞாபன இலக்கம்	விடயங்கள்	அமைச்சரவை தீர்மானத் திகதி	அமைச்சரவைத் தீர்மானம்	முன்னேற்றங்கள்
01	CP$2017$04	மாகாண மட்டத்தில் குவசிமா சேதனப் பசளை இயந்திரத்தை தாபித்தல்	2017.04.04	பொருளாதாரம் விவகார தொடர்பான அமைச்சரவை உப குழு சபையின் மேற்பார்வைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	மேற்பார்வை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

02	8/2017	கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் இடங்களில் யானைகள் நடமாட்டத்தை தடுப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுத்தல் (நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் வனவள அமைச்சுடன் கூட்டிணைந்த அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம்)	2017.06.07	விஞ்ஞானபத்தின் இறுதி வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 1,2,3 யோசனைகளுக்காக அங்கீகாரத்தை வழங்குதல். விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின் வேலியை நிர்மானிப்பதற்கு தேவையான செலவினம் 2017 ஆம் ஆண்டுக்காக வனவள அமைச்சிற்கு ஒதுக்கி வரவு செலவு ஒதுக்கீட்டின் மூலம் முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளுமாறு வனவள அமைச்சின் செயலாளருக்கு பணித்தல்.	குவசிமா இயந்திரம் தாபிக்கப்பட்ட இடங்களில் யானைகளுக்கான மின்வேலி நிர்மானிக்க நடவடிக்கை எடுத்தல்
03	CP/2017/11	கொழும்பு மாநகர சபையின் கழிவு வெளியேற்றுவதற்காக சுத்திகரிப்பு பசளை கழிவு தேக்கி வைக்கும் நிலையத்தை நிர்மானித்தல்	2017.05.03	யோசனைக்காக அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.	செயற்திட்டம் அமுல்படுத்தப் படவில்லை
04	CP/2017/12	கொழும்பு மற்றும் சன நெரிசல் கொண்ட பிரதேசங்களில் நகரங்களை அழகுபடுத்தி முறையாக முன்னெடுப்பதற்காக செயற்சாதனை அணி மற்றும் செயற்பாட்டு அலுவலத்தை தாபித்தல்.	2017.05.03	அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.	செயற்பாட்டு அலுவலகம் தாபிக்கப் பட்டுள்ளது.
05	CP/2017/14	மாகாண மட்டத்தில் குவசிமா சேதனப் பசளை இயந்திரத்தை தாபித்தல்	2017.05.23	பெறுகைக் குழுவிற்கு உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.	உரிய குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

06	CP/2017/17	அனர்த்த அபாயத்தை கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்வதற்காக உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு உதவியினை வழங்குதல் (மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சும் கூட்டாக இணைந்து அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம்)	2017.07.19	(இது தொடர்பில் எதிர்காலச் செயற்பாடுகளுக்காக உள்ளூராட்சி மன்ற பிரிவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	
07	CP/2017/18	மாகாண மட்டத்தில் குவசிமா சேதனப் பசளை இயந்திரத்தை தாபித்தல்	2017.07.19	சகல யோசனைகளுக்காகவும் அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.	குவசிமா இயந்திரத்தை தாபிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
08	CP/2017/21	கொழும்பு மாநகர சபையின் கழிவு நீர் வெளியேற்றுவதற்காக சுத்திகரிப்பு கழிவு தேக்கி வைக்கும் நிறுவனத்தை தாபித்தல் (அமைச்சரவைக் குறிப்பு)			
09	CP/2017/26	கொழும்பு மற்றும் சனநெரிசல் கொண்ட பிரதேசங்களில் முறையற்ற ரீதியில் திண்மக் கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றுவதை தடுத்தல் மற்றும் டெங்கு நோய் பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்காக முன்னெடுக்க வேண்டிய செயற்பாடுகள்	2017.07.26	அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைத் தீர்மானங்களை அமுல்படுத்தல் மற்றும் பின்னூட்டல்களுக்காக உற்பத்தித் திறன்மிக்க முறைகளை தாபிக்கும் வகையில் பொருத்தமான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்	செயற்பாட்டு அலுவலகத்தினால் உரிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

10	CP/2017/31	கொழும்பு மற்றும் சனநெரிசல் கொண்ட பிரதேசங்களில் கழிவுப் பொருட்களை கொண்டு செல்லும் வாகனங்களுக்காக பீளு மென்பொருளை பயன்படுத்தல் மற்றும் கழிவு வெளியேற்றும் இடங்களுக்காக கம்பியுடன் இலத்திரணியல் மேற்பார்வைக் கமரா ஊஊவுஏ பயன்படுத்தல்	2017.09.13	விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள யோசனைகள் தொடர்பில் நிதி மற்றும் தகவல் ஊடகத் துறை அமைச்சருடன் கலந்துரையாடி இணங்கும் விடயங்கள் தொடர்பில் கருத்திற் கொள்ளல்	கலந்துரையாடல் மட்டத்தில் உள்ளது.
11	CP/2017/36	கழிவு முகாமைத்துவத்திற்காக சுத்திகரிப்பு கழகங்களை நிர்மானித்தல் மற்றும் ஜப்பான் தொழில்நுட்ப குவசிமா சேதனப் பசளை இயந்திரத்தை தாபித்தல்			
12	CP/2017/42	கொழும்பு மற்றும் சனநெரிசல் கொண்ட பிரதேசங்களில் கழிவுப் பொருட்களை கொண்டு செல்லும் வாகனங்களுக்காக பீளு மென்பொருளை பயன்படுத்தல் மற்றும் கழிவு வெளியேற்றும் இடங்களுக்காக கம்பியுடன் இலத்திரணியல் மேற்பார்வைக் கமரா ஊஊவுஏ பயன்படுத்தல்			

4.4 சட்டப் பிரிவு

தொ. இல	விஞ்ஞாபன இலக்கம்	விடயங்கள்	அமைச்சரவை தீர்மானத் திகதி	அமைச்சரவைத் தீர்மானம்	முன்னேற்றங்கள்
01	CP/2017/01	உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் சட்ட வரைபினை ஆய்விற்குட்படுத்துவத்ற்காக அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை உப குழு சபையின் இடைக்கால அறிக்கை	2017-06-28	விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிட்ட யோசனைகளை அமுல்படுத்துவதற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

02	CP/2017/02	மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்காக ஒழுக்க விழுமிய முறைமைத் தொகுதி 2017.03.31	2017-05-02	அதிமேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதியின் மேற்பார்வைகளில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. விடயங்களை கருத்திற் கொண்டு அதற்கமைய அமுல்படுத்தப்பட்ட மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றச் செயலாளருக்கு பணிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற் கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
03	CP/2017/07	1901 இலக்கம் 25 கொண்ட நாய்களை பதிவு செய்யும் கட்டளைச் சட்டம் (417 வது அதிகாரம்) மறுசீரமைப்பு - கட்டாக்காலி நாய்கள் காரணமாக பொது மக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்ப்பதற்காக முறைகளை வகுத்தல	2017-03-21	யாப்பு மறுசீரமைப்பு வரைபினைத் தயாரிக்க சட்ட வரைஞருக்கு ஆலோசனை வழங்கல் மற்றும் தயாரிக்கப்படும் சட்ட வரைவு கௌரவ அமைச்சரினால் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மாநகர சபை உட்பட மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சரின் மேற்பார்வைகளில் உத்தேசிக்கப்பட்டவாறு வீதிகளிலுள்ள மாடுகளில் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களைத் தடுப்பதற்காக உரிய சட்டங்களை மறுசீரமைக்கும் வகையில் துரித நடவடிக்கை எடுத்தல்.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

04	CP/2017/09	உள்ளூராட்சி மன்ற கட்டளைச் தேர்தல் சட்டம் (262 வது அதிகாரம்) மறுசீரமைப்பு	2017-05-16	சட்ட வரைவினை வர்த்தமாணி அறிவித்தல் வெளியிடுவதற்கு அங்கீகரிக்கும் வகையில் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தல், தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் யோசனைகளை உள்ளடக்கி மேலதிக மறுசீரமைப்பினை தயாரிக்குமாறு சட்ட வரைஞருக்கு ஆலோசனைகள் வழங்குதல்	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
05	CP/2017/15	உள்ளூரட்சி மன்ற நிறுவனங்களினால் அறவிடப்படும் வரி அனுமதிக் கட்டணங்கள் மற்றும் ஏனைய கட்டணங்கள் தொடர்பில் எழுந்துள்ள பொது மக்கள் எதிர்ப்புக்கள் காரணமாக அவற்றை மேற்பார்வை செய்யும் முறையினை வகுத்தல்	2017-10-10	அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தின் இறுதி வாசகத்தில குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 1,2 மற்றும் 3 பரிந்துரைகளுக்காக அங்கீாரம் வழங்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
06	CP/2017/28	ஆரம்பப் பள்ளி கல்வியின் மூலம் நல்லிணக்கம் மற்றும் சமூக ஒற்றுமையினை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூக விழுமியம் மற்றும் மானிட அறிவு, பெறுமதிகளை விருத்தி செய்யக்கூடிய வேலைத்திட்டம்	2017-08-01	விஞ்ஞாபனத்தின் இறுதி வாசகத்தில் 1 மற்றும் 2 யோசனைகளுக்காக அங்கீாரம் வழங்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

07	CP/2017/30	தோட்ட மக்களின் நலன்புரிக்காக உள்ளூராட்சி மன்றச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல்	2017-09-26	பிரதேச சபை மறுசீரமைப்புச் சட்ட வரைவு அரச வர்த்தமாணி அறிவித்தலில் பிரசுரித்தல் மற்றும் அரசியல் யாப்பின் 15 வது வாசகத்திற்கமைய மாகாண சபைகளின் கருத்துக்களை பெற்றுக் கொள்ள அச்சட்ட வரைவினை மாகாண சபைகளுக்கு சமர்ப்பித்தல் மற்றும் அங்கீகாரத்திற்காக பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
08	CP/2017/33	மாநகர சபைக் கட்டளைச் சட்டம், நகர சபை கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் பிரதேச சபைச் சட்டத்தை மறுசீரமைக்கும் யோசனைகள்	2017-08-29	மறுசீரமைப்பு யாப்பினை தயாரிக்குமாறு சட்ட வரைஞருக்கு ஆலோசனை வழங்குதல்	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
09	CP/2017/34	மாநகர சபைக் கட்டளைச் சட்டம் நகர சபைக் கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் பிரதேச சபைச் சட்ட்ததை மறுசீரமைக்கும் வரைவு	2017-08-29	விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள யோசனைகளை அமுல்படுத்த அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
10	CP/2017/35	அமுலில் உள்ள மாகாண சபை தேர்தல் முறையினை மறுசீரமைத்தல்	2017-09-06	விஞ்ஞானபத்தின் இறுதி வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 04 பரிந்துரைகளுக்காக அங்கீகாரம் வழங்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
11	CP/2017/38	புதுக்குடியிருப்பு மற்றும் கரையோரப் பற்று பிரதேச வேட்புமனுவை மீளக் கோரல்	2017-09-26	அரசாங்க வர்த்தமானி அறிவித்தலில் பிரசுரித்தல் மற்றும் அங்கீகாரத்திறகாக பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

12	CP/2017/39	ஆரம்பப் பள்ளி கல்வியின் மூலம் நல்லிணக்கம் மற்றும் சமூக ஒற்றுமையினை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூக விழுமியம் மற்றும் மானிட அறிவு, பெறுமதிகளை விருத்தி செய்யக்கூடிய வேலைத்திட்டம்	2017-10-03	உத்தியோகத்தர் குழுவினை நியமித்து அதன் ஏற்பட்டாளராக உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சின் செயலாளரை பெயரிட்ட குழுவின் பரிந்துரையினை கருத்திற் கொள்ளும் வகையில் 3 வாரத்திற்குள் கௌரவ அமைச்சரினால் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
13	CP/2017/41	உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலின் வாக்கெடுப்புச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல்	2017-10-12	யாப்பு மறுசீரமைப்பினை தயாரிக்குமாறு சட்ட வரைஞருக்கு ஆலோசனை வழங்குதல் மற்றும் அச்சட்ட வரைவினை அங்கீகாரத்திற்காக பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
14	CP/2017/46	புதிய தேர்தல் முறை மற்றும் அதன் மூலும் பெண்கள் பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பில் பொது மக்கள் மற்றும் சிவில் அமைப்புக்களை அறிவுறுத்தும் வேலைத்திட்டம்	2017-10-27	விஞ்ஞாபனத்தின் 3 வது வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள (I,II மற்றும் III யோசனைகளுக்காக அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
15	CP/2017/49	ஆரம்பப் பள்ளி கல்வியின் மூலம் நல்லிணக்கம் மற்றும் சமூக ஒற்றுமையினை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூக விழுமியம் மற்றும் மானிட அறிவு, பெறுமதிகளை விருத்தி செய்யக்கூடிய வேலைத்திட்டம்		இது தொடர்பில் அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் சிறுவர் மற்றும் மகளிர் விவகார அமைச்சினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

16	CP/2017/51	உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலின் வக்கெடுப்புச் சட்டத்தை மறுசீரமைத்தல்	2017-10-24	அரச வர்த்தமாணி அறிவித்தலில் பிரசுரித்தல் மற்றும் அங்கீகாரத்திற்காக பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
17	CP/2017/56	ஆரம்பப் பள்ளி கல்வியின் மூலம் நல்லிணக்கம் மற்றும் சமூக ஒற்றுமையினை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூக விழுமியம் மற்றும் மானிட அறிவு, பெறுமதிகளை விருத்தி செய்யக்கூடிய வேலைத்திட்டம்			

4.5 நிருவாகப் பிரிவு

தொ. இல	விஞ்ஞாபன இலக்கம்	விடயங்கள்	அமைச்சரவை தீர்மானத் திகதி	அமைச்சரவைத் தீர்மானம்	முன்னேற்றங்கள்
01	CP$2017$45	அமைச்சரவைக் குறிப்பு - கௌரவ மாகாண மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சருக்காக அமைச்சு ஆலோசகர் ஒருவரை நியமித்தல்	2017.11.08	கௌரவ மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூ ராட்சி மன்ற அமைச்சரின் ஆலோசகராக திரு. பி. கொடித்துவக்க அவர்களை நியமித்தல்	100%
02	CP$2017$54	உள்நாட்டுக் கடன் மற்றும் அபிவிருத்தி நிதியத்திற்காக பணிப்பாளர் / பிரதம நிறைவேற்று உத்தியோகத்தர் ஒருவரின் ஒப்பந்த சேவைக் காலத்தை நீடித்தல்	தீர்மானம் இது வரையில் கிடைக்கவில்லை			

03	CP$2017$59	கடற்தொழில் மற்றும் நீரியல் வள அமைச்சினால் கெல்லயன் மீன் பிடிப்பதை தடுத்தல்	தீர்மானம் இது வரையில் கிடைக்கவில்லை

4.6 அபிவிருத்திப் பிரிவு

தொ. இல	விஞ்ஞாபன இலக்கம்	விடயங்கள்	அமைச்சரவை தீர்மானத் திகதி	அமைச்சரவைத் தீர்மானம்	முன்னேற்றங்கள்
01	CP/2017/27	வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் மண்சரிவினால் அனர்த்தத்திற்குட்படும் சமூகத்திற்கு நிவாரணம் வழங்குங்குவதற்காக அனர்த்தத்திற்குட்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் உள்ளூ ராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை வழங்குதல	(i) முதலில் விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகள் தொடர்பில் நிதி மற்றும் தகவல் ஊடகத் துறை அமைச்சருடன் கலந்துரையாடுதல் மற்றும் (II) மேற்கூறப்பட்ட ஐ இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கலந்துரயையாடியதன் பின்னர் இணங்கிய விடயங்களை கருத்திற் கொள்ளும் வகையில் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்தல்	

02	CP/2017/44	கொழும்பு 07 மலலசேகர மாவத்தை இலக்கம் 14 கொண்ட இடத்தில் அமைந்துள்ள உள்ளூ ராட்சி ஆளுகை தொடர்பான இலங்கை நிறுவகத்தின் (ஸ்ரீஎல்ஜிஎல்) புதிய அலுலகக் கட்டடத் தொகுதியினை நிர்மானிக்கும் பணிகளை மீள ஆரம்பிப்பது தொடர்பிலான அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம்			

4.7 உள்ளூராட்சி மன்றப் பிரிவு

தொ. இல	விஞ்ஞாபன இலக்கம்	விடயங்கள்	அமைச்சரவை தீர்மானத் திகதி	அமைச்சரவைத் தீர்மானம்	முன்னேற்றங்கள்
01	CP/2017/22	புதிய உள்ளூ ராட்சி மன்றங்கள தாபித்தல் மற்றும் அமுலிலுள்ள உள்ளூராட்சி மன்றங்களை தரமுயர்த்தல	2017.07.25	புதிய உள்ளூராட்சி மன்றங்களை தாபித்தல் மற்றும் காணப்படும் உள்ளூ ராட்சி மன்ற நிறுவனங்களை தரத்தை உயர்த்துவதற்காக ஒப்பளவுகள் மூலம் மதிப்பீட்டுக்குட்படுத்தும் செயற்பாடுகள் கொண்ட முறையான செயற்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக அமைச்சரவை அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.	நுவரெலியா மாவட்டம் இம்முறையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தாபிக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்காக மாகாண பிரதம செயலாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அதற்கமைய நுவரெலியா மாவட்ட பிரதம செயலாளரின் பரிந்துரைக்கமைய காணப்பட்ட அம்பகமுவ பிரதேச சபையின் எல்லையினை மறுசீரமைத்து ♦ அம்பகமுவ பிரசே சபை ♦ மஸ்கெலிய பிரதேச சபை ♦ நோர்வூட் பிரதேச சபை ஆகிய புதிய 03 பிரதேச சபைகள் காணப்பட்ட நுவரெலியபா பிரதேச சபையின் எல்லையினை மறுசீரமைத்து ♦ நுவரெலிய பிரதேச சபை ♦ கொட்டகல பிரதேச சபை ♦ அக்கரப்பதன பிரதேச என 03 பிரதேச சபைக் தாபிக்கப்பட்டன. - இலக்கம் 57.'.2043) திகதிய 2017.15.02 ஆம் திகதி அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தல்

02	CP/2017/40	உள்ளூராட்சி மன்ற எல்லை நிர்னயிக்கும் மேன்முறையீட்டு ஆய்வு குழு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைபாடுகளை திருத்தியமைத்தல	09.26.2017	உள்ளூராட்சி மன்ற எல்லை நிர்னய மேன்முறையீட்டின் விசாரனை குழுவின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைபாடுகளை திருத்தியமைப்பதற்காக	குழுவின் பரிந்துரைகளுக்கமைய அதிமேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களின் கையொப்பதுடன் இலக்கம் 51⁄.2047, 2017.02.02 ஆம் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தல் மற்றும் விடயத்திற்குப் பொறுப்பான கௌரவ அமைச்சரின் ஒப்பத்துடன் இலக்கம் 52⁄.2047 கொண்ட 2017.12.02 ஆம் திகதி அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தலில் பிரசுரிக்கப்பட்டுளளது
03	CP/2017/43	உள்ளூராட்சி மன்ற எல்லை நிர்னய மேன்முறையீட்டு ஆய்வுக் குழுவின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறைபாடுகளை திருத்தியமைத்தல் (இரு பிரதிநிதிகளை நியமித்தல்)	06.10.2017	உள்ளூராட்சி மன்ற எல்லை நிர்னய மேன்முறையீட்டு விசாரனை குழுவின் அறிக்கையில் குறிப்பிபடப்பட்டுள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக இரு பிரதிநிதிகளை கொணட் குழுவை நியமிப்பதற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.	இரு பிரதிநிதிகள் நியமிக்கப்பட்டனர்.

04	CP/2017/60	உள்ளூ ராட்சி மன்றத் தேர்தல் வட்டார முறையினை நிர்னயிக்கும் போது மகர பிரதேச சபையின் வட்டார எல்லையினை நியமிப்பது தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள	2018.01.03	இப்பிரச்சினை சமயத் தலைவர்கள் மூலம் வினவி தீர்க்க வேண்டும் என்பதினால் அமைச்சரவைக்கு மீண்டும் அறிக்கைப்படுத்துமாறு இந்த தீர்மானம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதை போன்று உரியவாறு கருத்திற் கொள்வதற்கும் பொறுப்பாளர்களுக்கு இத்தீர்மானத்தை அறிவிக்க தீர்மானிப்பட்டது.	குழுவின் பரிந்துரைகளுக்கமைய கௌரவ விடயத்திற்குப் பொறுப்பான அமைச்சரின் ஒப்பத்துடன் 34.:.2052 மற்றும் 2018.01.05 ஆம் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமாணி அறிவித்தலில் வெளியிடப்பட்ட அக்பார் என மாற்றி வட்டாரம் "டவுன் பெயர்" "1.வேரமுல்ல ஏ" என மறுசீரமைக்கப் பட்டது.
05	CP/2017/53	பொதுநலவாய சபை உள்ளூராட்சி மன்ற அமைப்பின் பொதுச் சபைக் கூட்டம் மற்றும் கருத்தரங்கு 2019 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் நடாத்துவது தொடர்பான யோசனை	16.11.2016	▪ பொதுநலவாய சபையின் 2019 உள்ளூ ராட்சி மன்றக் கூட்டமைப்பின் பொதுச் சபைக் கூட்டத்தை இலங்கையில் நடாத்துவதற்கான யோசனை மோல்டாவினால் 2017 மாநாட்டில் சமர்ப்பிக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது. அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தில் 2 குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எதிர்வரும் மாதங்களுக்குள் அறிமுகப்படுத்த எதிர்பார்க்கும் வேலைத்திட்டங்களுக்குரிய செயற்பாட்டுத் திட்டஙக்ள், கருத்திற் கொள்வதற்காக அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு ஆலோசனை வழங்குதல	முன்னெடுக்க வேண்டிய செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்துவது தொடர்பில் அடிப்படை பேச்சு வார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.

06	CP/2017/48	இலங்கையில் உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களில் சகோதர நகர மற்றும் நட்புறவு நகர சிந்தனையின் கீழ் வெளிநாட்டு இராட்சியங்களை உள்ளூராட்சி மன்ற நிறுவனங்களுடன் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளல்			அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்தை தயாரித்து வெளிவிவகார அமைச்சிற்கு அனுப்பி மேற்பார்வை கோரப்பட்டுள்ளது.

4.8. செயற்திட்டப் பிரிவு

අනු අංකය	සංදේශ අංකය	කාරණය	කැබිනට් තීරණ දිනය	කැබිනට් තීරණය	ප්‍රගතිය
01	CP/2017/03	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் நிதி வழங்கப்படும் கொழும்பு பெரும்பாக குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி யோசனை வேலைத்திட்டம் - ஒப்பந்த பெயர் : கொழும்பு மாநகர சபையின் கிருளப்பனை கழிவு நீர் ஊட்டல் பிரதேசத்திற்காக புதிய கழிவு நீர் தொகுதி, கழிவு நீர்ப் பம்பி மற்றும் பிரதான குழாய்களை பொருத்துதல் - ஒப்பந்த இலக்கம் - GCWWMIP- /01/ICB/උදරනි/01/2015	2017-03-22	1. பெறுகை மேன்முறையீட்டு சபையினால் குறைந்த பட்ச மற்றும் முழுமையான விலை மனுக்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கேள்வி மனுவாக டுயசளநப ரூ வுழரடிசழ டுஅைவைநன கம்பனியினை பரிந்துரை செய்வதற்கு எதிராக சமர்ப்பித்த பரிந்துரையினை இரத்துச் செய்கிறேன். 2. பெறுகை மேன்முறையீட்டு சபையினால் துஏ ழுக டுவுனு ீசழதநஉவீஎவ) டுவன யனெ ீசயவாடிய ஐனெரளவசநைள விலைமனு தாரருடன் விலை மனுக்கள் கோருமாறு அமைச்சின் செயலாளருக்கு அறிவிக்க சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பரிந்துரையினை இரத்துச் செய்கிறேன். 3. ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் இணைப்பு இலக்கம் 6 இன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள இணக்கப் பாடுகளுக்கமைய கொழும்பு பெரும்பாக நீர்வழங்கல் மற்றும் கழிவு முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி முதலீட்டு வேலைத்திட்டம் - செயற்திட்டம் 03 இன் கீழ் கொழும்பு மாநகர சபைக் கிருளப்பனை கழிவுநீர் ஊட்டல் பிரதேசத்திற்காக புதிய கழிவு நீர் தொகுதி குழாய்களை நிர்மானிக்கும் ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக குறைந்த பட்ச விலையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கேள்வி டுயசளநப ரூ வுழரடிசழ டுஅைவைநன கம்பனிக்குரிய ஏயுவு வரிகளுக்குட்பட்டு இலங்கை ரூபா 7இ015இ919இ086.00 இற்கு வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்க்கிறேன்.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது

02	CP/2017/05	இலங்கையில் தற்போது காணப்படும் சம்பிரதாய மின் விளக்குக்கு பதிலாக வினைத்திறன் மிக்க (LED) மின் குமிழ்களை பொருத்தும் செயற்திட்டம	2017-03-22	1. சகல உள்ளூராட்சி மன்றங்களையம் தழுவக்கூடிய வகையில் கொரியன் டெலிகொம் நிறுவனத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப யோசனைக்கமைய தெருவிளக்குளை ஒளியூட்டுவதற்காக மிகவும் பொருத்தமான யோசனையாக ஏற்றுக் கொள்வதற்கும். கொரியன் டெலிகொம் நிறுவனம் சமர்ப்பித்துள்ள நிதி யோசனைகளை திறந்து மதிப்பீட்டு பரிந்துரை அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்தல்.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது
03	CP/2017/06	கிராமியப் பாலச் செயற்திட்டம் - கட்டம் 2 - அந்நிய செலாவணித் தளம்பலுக்கமைய எழுந்த சேமிப்புக்கள் மூலமான ஒப்பந்த வகைகள்	2017-03-29	மேற்கூறப்பட்ட விடயங்களைக் கருத்திற் கொண்டு ஏற்றுமதி கடன் வசதிகளின பெறுமதியான 128,600,000 அ.டொலரை தாண்டாத வகையில் 2014 மே மாதம் 06 ஆம் திகதி கைச்சாத்திடப்பட்ட ஒப்பந்த உடன்படிக்கையில் இணங்கிய விலை மனுக்களுக்கமைய செலவானி விகிதாசாரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளமையினால் கடன் நிதியின் நிலுவையினைப் பயன்படுத்தி 63 மேலதிக பாலங்களுக்கு பெறுகை மற்றும் நிர்மானங்களுக்காக மேலதிகமாக 03 மாத காலத்தை செயற்திட்டத்தின் கடன் உடன்படிக்கை மற்றும் நிர்மான உடன்படிக்கையினை 2018.03.08 ஆம் திகதி வரை நீடிப்பதற்கும் அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்க்கிறேன்.	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது

04	CP/2017/08	இலங்கையில் தற்போது காணப்படும் சம்பிரதாய மின் விளக்குக்கு பதிலாக வினைத்திறன் மிக்க (LED) மின் குமிழ்களை பொருத்தும் செயற்திட்டம்	2017-03-29	1. சகல உள்ளூராட்சி மன்றங்களையம் தழுவக்கூடிய வகையில் கொரியன் டெலிகொம் நிறுவனத்தினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப யோசனைக்கமைய தெருவிளக்குளை ஒளியூட்டுவதற்காக மிகவும் பொருத்தமான யோசனையாக ஏற்றுக் கொள்வதற்கும். 2. கொரியன் டெலிகொம் நிறுவனம் சமர்ப்பித்துள்ள நிதி யோசனைகளை திறந்து மதிப்பீட்டு பரிந்துரை அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பித்தல	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது

05	CP/2017/55	கொழும்பு பெரும்பாக கழிவு முகாமைத்துவச் செயற்திட்டங்களின் நிதி உதவி - ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி கடன் உடன்படிக்கையின் கால எல்லையை நீடிக்கும் கோரிக்கை	2018-01-03	தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள கழிவு நீர் போக்குவரத்து முறைமையினை நவீன மயப்படுத்தல் மற்றும் கழிவு நீர் பம்பியினை நவீன மயப்படுத்தும் ஒப்பந்தங்கள் 2 இல் பணிகளுக்காக கடன் உடன்படிக்கையின் கால 2019 மார்ச் 31 ஆம் திகதி வரை நீடித்தல்	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது
06	CP/2017/57	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதி அனுசரனையின் கீழ் உத்தேச இடைநிலை நகர நிலையான அபிவிருத்தி செய்றத்திட்டத்திற்கு தொழில்நுட்ப உதவியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக 5 மில்லியன் அ.டொலர் கடன் வசதியினை பெற்றுக் கொள்ளல்.	2018-01-10	1. உத்தேச இடைநிலை நகர நிலையான அபிவிருத்திச் செயற்திட்டத்தின் அடிப்படை பணியின் கீழ் உப செயற்திட்டத்தை திட்டமிடல், அடிப்படை பெறுகை மற்றும் முறையான நிருவாக முறையினை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஆலோசனை சேவை பெறுகைக்காக பயன்படுத்துவதற்கு, 5 மில்லியன் அ.டொலர் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு கடன் வசதியினை ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மூலம் பெற்றுக் கொள்ளல். 2. மேற்கூறப்பட்ட பணிகளை அமுல்படுத்துவதற்காக அமைச்சரவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெறுகைக்குழுவை நியமித்தல். 3. உரிய தரப்பினர்களின் ஆலோசனையுடன் செயற்திட்டத்தை வகுத்தல், திட்டமிடல், பெறுகை மற்றும் அமுல்படுத்தும் பணிகளை மாகாண சபை மற்றும் உள்ளூ ராட்சி மன்ற அமைச்சிற்குப் பொறுப்பளித்தல	அமைச்சரவைத் தீர்மானத்திற்கமைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது

Ministry of Provincial Councils and Local Government
No. 330, Union Place, Colombo 02

Performance - 2017

Content

Executive Summary		3
1.	Organizational Background of the Ministry of Provincial Councils and Local Government	4
	1.1. Vision and Mission	4
	1.2. Scope and Functions	5
	1.3. Policies and Strategies	6
	1.4. Divisions and affiliated Institutions	7
2.	Performance Summary -2017	8
	2.1. Financial Summary	8
	2.2. Physical Performance	10
	2.3. Physical Progress at a Glance	10
3.	Performance of Divisions and Affiliated Institutions	15
	3.1. Development Division	15
	3.1.1. Local Funded Projects	16
	3.2. Projects & Planning Division	33
	3.2.1. Major Activities	33
	3.2.2. Foreign Funded Projects	34
	3.3 National Solid Waste Management Support Centre	74
	3.4. Local Government Division	78
	3.5. Provincial Councils Division	85
	3.6. Legal Division	90
	3.7. Administrative Division	94
	3.8. Expenditure & Monitoring Division	98
	3.9. Internal Audit Division	100
	3.10. Sri Lanka Institute of Local Governance	104
4.	Cabinet Memoranda	118

Executive Summary

As per the scope of the Ministry of Provincial Councils and Local Government, This report is a comprehensive summary of the local and foreign funded projects and programmes, formulated policies, guidelines and amended statutes under each division at the end of the reviewed year 2017.

Accordingly, total financial value of all the projects and programmes implemented in 2107 was Rs. 44,814 Mn and these projects were dedicated to improve the services and infrastructure of the Local Government Sector. Further, among the amended statutes Pradeshiya Sabha Act, Urban Councils Act and Municipal Councils Act are outstanding. These statutes have made the ground for the implementation of significant policies within the Local Government Sector.

Strong leadership of the Hon. Minister of Provincial Councils and Local Government, guidance of Secretary to the Ministry and the contribution of the Additional Secretaries and the staff resulted in high level investment and timely policy framework in the Provincial Councils and Local Government Sector that makes an impressive investment towards the economic, social and cultural growth of the country.

1

Organizational Background of the Ministry

1.1. Vision and Mission

Vision

A Provincial and Local Government System which is effective, collaborative, innovative and accountable and provides high quality services in the communities.

Mission

- Formulate policies to develop the provincial and local government system.
- Enhance the capacity of provincial and local government to exercise their powers and provide services, and
- Ensure public interests and reflected in the provincial and local government system.
- Work for the betterment of all communities through partnerships with provincial councils, local governments and other organizations.

1.2.Scope and the Functions

As per the subjects and functions of the new Ministries published by the extraordinary gazette dated 30.09.2015 of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, subjects and functions come under the Ministry of Provincial Councils and Local Government are undermentioned.

- Formulation, Monitoring and Evaluation of policies, programmes and projects related to subjects of Provincial Councils & Local Government, Sri Lanka Institute of Local Governance and Local Loans and Development Fund.

- Regulation of the activities of Provincial Councils.

- Training of members, officers and employees of Provincial Councils.

- Government functions related to Local Authorities

- Provide loan facilities for Local Authorities to develop public amenities.

- Training of members, officers and employees of Local Authorities

- Conduct researches on every facet of the administration of Provincial Councils and Local Authorities.

- All the other affairs related to the subjects assigned to Sri Lanka Institute of Local Governance and Local Loans and Development Fund.

- Supervision of the said institutions.

1.3. Policy and Strategies

Policy:

Reduce the inter-regional disparities and improving provincial contribution to GDP while ensuring self-sustained Provinces.

Strategies:

1. Strengthening the Provincial revenue base in each Province while using available human capital and environmental resources effectively applying Good Governance

2. Formulate and introduce an appropriate policies and long run programs to minimize The out-migration of the Provinces which have relatively higher rate of out migration.

3. Ensuring the utility of available human resources in each province for overall socioeconomic development process of the country.

4. Empowering the values and capabilities of local communities to mobilize the resources available in the Provinces by increasing people's participation for community

5. Integrating disaster risk reduction and adaptation measures into local development Activities while ensuring sustainable usage of natural resources in each Province.

6. To ensure efficient and effective Provincial and Local Government Administrative System through human resources development and upgrading the LAs on scientific basis

1.4. Divisions and Affiliated Institutions of the Ministry

01. Office of the Hon. Minister of Provincial Councils and Local Government
02. Secretary's Office of the Ministry
    - I. Local Government Reforms Unit
    - II. Local Government Complaints & Information Unit
03. Provincial Council Division
04. Local Government Division
05. Development Division
06. Projects & Planning Division
    - I. Project Management Unit
    - II. Planning Unit
    - III. IT Unit
07. Legal Division
08. Finance Division
09. Expenditure Monitoring Division
10. Internal Audit Division
11. National Solid Waste Management Support Centre
    - I. Dengue Alleviation Unit
12. Media Unit
13. Sri Lanka Institute of Local Governance
14. Local Loan and Development Fund

2

Performance Outlines

2.1 Financial Performance

Table No 1- Financial Summary

Programme	Estimate for 2017 (Rs.)	Expenditure as at 31.12.2017
Recurrent Expenditure		
Personal Emoluments	133,550,000	125,649,199
Other Recurrent Expenditure	1,766,363,000	301,323,583
Total	**1,899,913,000**	**426,972,782**
Capital Expenditure **Rehabilitation and Improvement**	**39,400,000**	**35,803,590**
Buildings & Structures	33,300,000	30,948,003
Plant, Machinery and Equipment	800,000	99,498
Vehicles	5,300,000	4,756,089
Acquisition of Capital Assets	**46,500,000**	**46,455,428**
Vehicles	42,000,000	42,000,000
Furniture and Office equipment	2,860,000	2,836,958
Machinery	1,640,000	1,618,470
Other Capital Expenditure	7,926,920,000	4,727,895,847
Local Projects	6,408,083,000	1,849,588,458
Foreign Funded Projects	21,532,180,000	12,248,231,866
Total	**35,867,183,000**	**18,825,716,171**
Grand Total	**37,852,996,000**	**19,334,947,971**

Source: Finance Division

As at 31.12.2017, total financial progress of the Ministry is 51%

2.2 Physical Performance

13 foreign funded projects, 8 programmes and projects with local grants were implemented in 2017. Physical progress of all these project and programmes at 31.12.2017 are tabulated below.

No	Description	Physical Progress (%)
01	Local Projects and Programmes	63
02	Foreign funded projects	90
03	Total physical progress of the Ministry	77

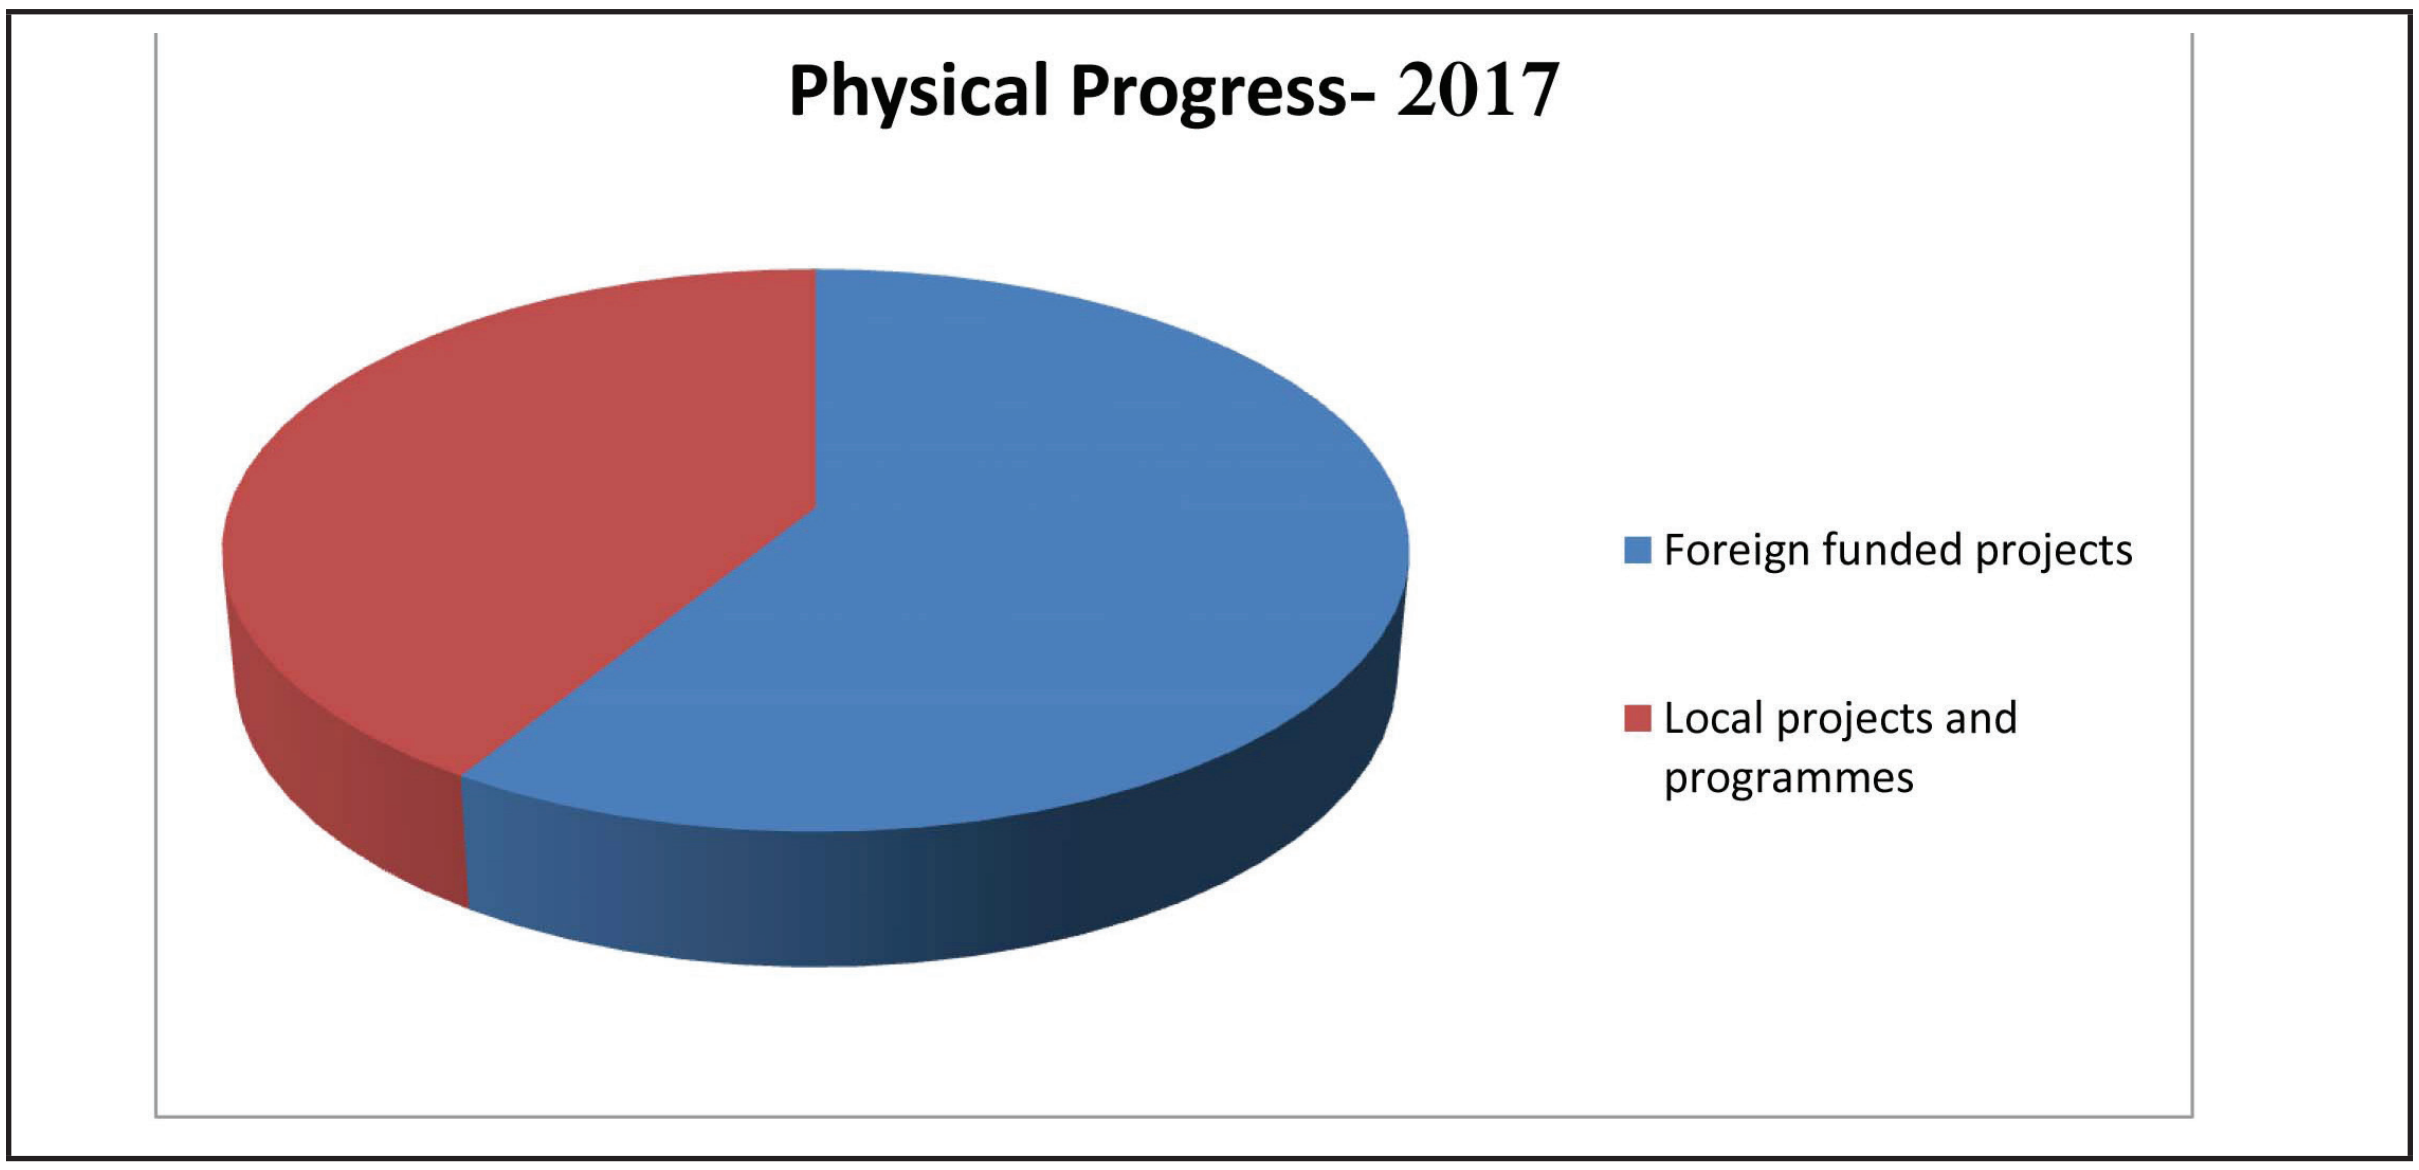

2.3. Physical Progress at a Glance

Table 2 - Physical Progress

	Development Activity / Sector	Output
Development of Provincial / Rural Roads and Bridges		
01	iLength of the improved provincial roads	10Km
02	Number of constructed and rehabilitated rural roads (tar, concrete, gravel) Number of bridges / culverts constructed under rural roads Number of side walls constructed under rural roads	1608
03	Number of constructed rural bridges (6m – 30m)	349
Development of Irrigation (Iranamadu – Kilinochchi)		
01	Distance of the completed main irrigation canals	30Km
02	Distance of the other completed irrigation canals	466 Km
03	Number of bridges / culverts constructed across irrigation canals	15
04	Increasing the height of the main dam of Iranamadu reservoir	100% completed
05	and repairs	
06	Rehabilitation of the spillway gates and spills of Iranamadu reservoir	
07	Construction of the Rip Rap Protection of Iranamadu reservoir	
Rehabilitation of the Waste Water Drainage Systems (Administrative area of Colombo Municipal Council)		
01	Rehabilitation of the four major drains that waste water is released to the sea (U1,U3,T34,T36)	100%
02	Distance that laying of waste water lines is completed (M26)	1423m
03	Distance that clearing of waste water system and quality survey of waste water drainage system has been completed CCTV	125 Km

Improvement of Infrastructure facilities of Local Authorities		
01	Number of constructed / developed weekly fairs	96
02	Number of constructed / developed weekly fairs and trade business establishments	38
03	Number of constructed / developed tourist attractive places	17
04	Number of constructed bus stands / vehicle parks	30
05	Number of constructed libraries	53
06	Number of constructed Ayurvedic medical centres and medical centres	11
07	Number of constructed relaxation centres public toilets	106
08	Number of constructed day care centres	08
09	Number of constructed public buildings	07
10	Number of constructed water projects	88
11	Number of constructed crematoriums	17
12	Number of constructed parks / play grounds	62
13	Number of constructed Cultural centres	
14	Number of constructed office buildings	20
15	Number of constructed drainage systems	53
16	Number of constructed front offices (within 101 Local Authorities)	101
Development infrastructure in Education		
01	Number of School Laboratories Buildings Constructed	135
02	Number of constructed / renovated Zonal Education office buildings	27
03	Number of constructed / renovated Divisional Education office buildings	68
04	Number of Students attended to special training programs	11484
05	Number of Students attended to Informal education programs	12051

06	Number of Schools conducted Health and Nutrition related training programs	6837
07	Number of School conducted social coherent programs	6382
08	Other training programs conducted	8785
Health Sector Improvement		
01	Number of Hospital which is used Computerized database	196
02	Establishment of Emergency Treatment Units and improvement of existing Emergency Treatment Units	191
03	Improvement of maternal emergency treatment units	450
04	Number of Public Awareness progrms Conducted	9996
05	Number of Health Lifestyle Centres Established	127
06	Number of Quality Management Circles established	38
07	Number of Renovation of drug stores	35
Formalization of Solid Waste Management		
01	Numbers of Compost Yards constructed	11
02	Numbers of Composed Yards improved	23
03	Number of BobCat machines distributed among Local Authorities.	09
04	Number of Compost Bins distributed among Local Authorities.	4000
05	Numbers of Gully Bowser distributed among Local Authorities	09
06	Number of Kawasima machines distributed among Local Authorities	09
07	Number of Night Soil Treatment Plants constructed	04

Reforms of the Legislation of Provincial Councils and Local Government		
01	Adoption of the act on confirming 25% female representation for Local Governance at the parliament.	completed
02	Formulation of a code of conduct for the members of Provincial Councils.	completed
03	Appointment of a committee to amend the statutes of Urban Councils, Municipal Councils, Prsdeshiya Sabhas and taking measures to make timely proposals for the relevant amendments	completed
04	Amendment of Local Authority Election Ordinance	completed
05	Amendment of Provincial Councils Election	completed
06	Taking measures to amend Pradeshiya Sabha Act to benefit welfare of estate workers.	99% completed
07	Amendment of Provincial Councils Act to formalize and expedite the flow of tax; that is levied as court fine and stamp duties on transfer of lands to Local Authorities.	80% completed
Activities of National Delimitation Committee		
01	Review Committee on Delimitation appointed to review the complaints / proposals / appeals submitted by the general public on the accuracy of the boundaries of wards in the gazette published based on the National Delimitation Committee report, completed its works and submitted the report and the Gazette Extra Ordinary No. 2006/44 was issued on 17.02.2017.	Completed
	In consideration of the requests made by various organizations and mainly the Elections Commission on the printing errors, spelling mistakes, punctuation errors, boundaries, names and numbers of the Gazette (1928/26) published based on the National Delimitation Committee Report and the Gazette No. (2006/44) published based on the Review Committee on Delimitation of Wards in Local Authorities , the committee appointed in this regard submitted its report on 20.11.2017.	Completed
	The Extra Ordinary Gazette No. 2047/51 with the signature of HE the President and the Extra Ordinary Gazette No. 2047/52 with the signature of Hon Minister f Provincial Councils and Local Government were issued on 02.12.2017	Completed

	Name of the Ward in the Division No. 31 of No. 16 Mahara Pradeshiya Sabha in the Gazette published by the Review Committee on Delimitation of Wards in Local Authorities was “Akbar Town” and It was amended as “Enderamulla” and submitted the committee report on 23.12.2017. (Extra Ordinary on this Gazette No.2052/34 was issued on 05.01.2018.	Completed
Development of Ministry’s Human Resource		
01	Number of officers referred for foreign capacity building training programmes	27
02	Number of officers referred for local capacity building training programmes	289
Conduct of training progammes for the members/ officers Local Authorities (Sri Lanka Institute of Local Governance (SLILG)		
01	Number of trainings including Diploma for officers (Technical Officers, work supervisors and other non-technical staff) supervisors and other non-technical staff)	222
Grant of Loans for Local Authorities on concessionary basis (Local Loan and Development Fund (LLDF)		
01	Amount of 22 Loans granted for the development projects of Local Authorities)	Rs. 666 Mn
02	Amount of 13 Loans released for the development projects of Local Authorities	Rs. 403 Mn

3

Performance of the Divisions and Affiliated Institutes

3.1. Development Division

Objective

To contribute in minimizing inter provincial disparities by planning and execution of the development programmes implemented by this Ministry utilizing the local funds in order to improve infrastructure beneficial for the communities of the Local Authority areas.

Strategies

1. To ensure the utilization of human resources of each province to contribute the entire socio-economic development procedure of the country.

2. To ensure human resource development an effective and efficient Provincial Council and Local Authority Administrative System through upgrading of Local Authorities on a scientific basis.

3. To plan and introduce appropriate policies and long term programmes to minimize the migration level where it is relatively at a high rate.

4. To ensure the sustainability of natural resources in each province while cooperating the measures to be taken at the disaster situations with the regional level development activities.

5. To mobilize the provincial resources through the improvement of community contribution for community development activities of the grass root level and empower the values and skills of rural community.

	Amount (Rs. Mn.)	Percentage
Total Provisions allocated for 2017.	12,069.00	100%
Expenditure (as at 31.12.2017)	5,994.13	50%

3.1.1. Projects Implemented under Local Funds

01. National Programme on Strengthening Pradeshiya Sabhas -2017

Programme on Strengthening Pradeshiya Sabhas - 2017
Approved Projects (As at 31.12.2017)

Serial No	Province	Number of Institutes	Number of Projects	Number of Completed Projects	Approved Amount
1	North Western Province	6	41	12	75,559,799.65
2	North Central Province	16	46	35	248,889,122.55
3	Western Province	4	35	21	53,671,172.51
4	Southern Province	12	61	40	126,259,878.68
5	Central Province	9	37	29	104,001,281.90
6	Uva Province	15	89	57	120,203,395.41
7	Eastern Province	17	71	51	238,378,227.42
8	Sabaragamuwa Province	12	70	51	116,472,611.89
9	Northern Province	7	26	15	135,546,026.99
	Total	**98**	**476**	**311**	**1,218,981,517.00**

Stage 1
"Financial provision of Rs. 20 Mn is granted to each selected Pradeshiya Sabha under this stage"

Stage 2
"Financial provision of Rs. 10 Mn is granted to each selected Pradeshiya Sabha under this stage"

Objective
To maintain / rehabilitate the community infrastructure of relevant administrative areas enabling to fulfil the public needs changing with the urbanization, to promote self-generative income rate of Local Authorities and to enhance the quality and productivity of the public service delivered by those institutions..

Major Activities	Maintenance , renovation rehabilitation and improvement of Community Infrastructure Facilities
Implementing Area	Stage 1- 53 Pradeshiya Sabhas with annual self-generative income below Rs. 10 Mn. Stage 2- 72 Pradeshiya Sabhas with annual income from 10 Mn to 20 Mn (below Rs. 20 Mn.)
Provisions allocated for the year 2017	Rs. 1446.00 Mn
Approved project value (Rs.)	Rs.1218.98 Mn
Expenditure as at (31.12.2017)	Rs..113.61 Mn.

Key areas implemented under this programme are as follows.

- Improvement Maintenance of Community Water Projects
- Improvement and maintenance of market facilities.
- Improvement and maintenance of the places of tourist attraction
- Improvement and maintenance of general sanitary facilities
- Other repairs and maintenance recognized within the Local Authority Areas.

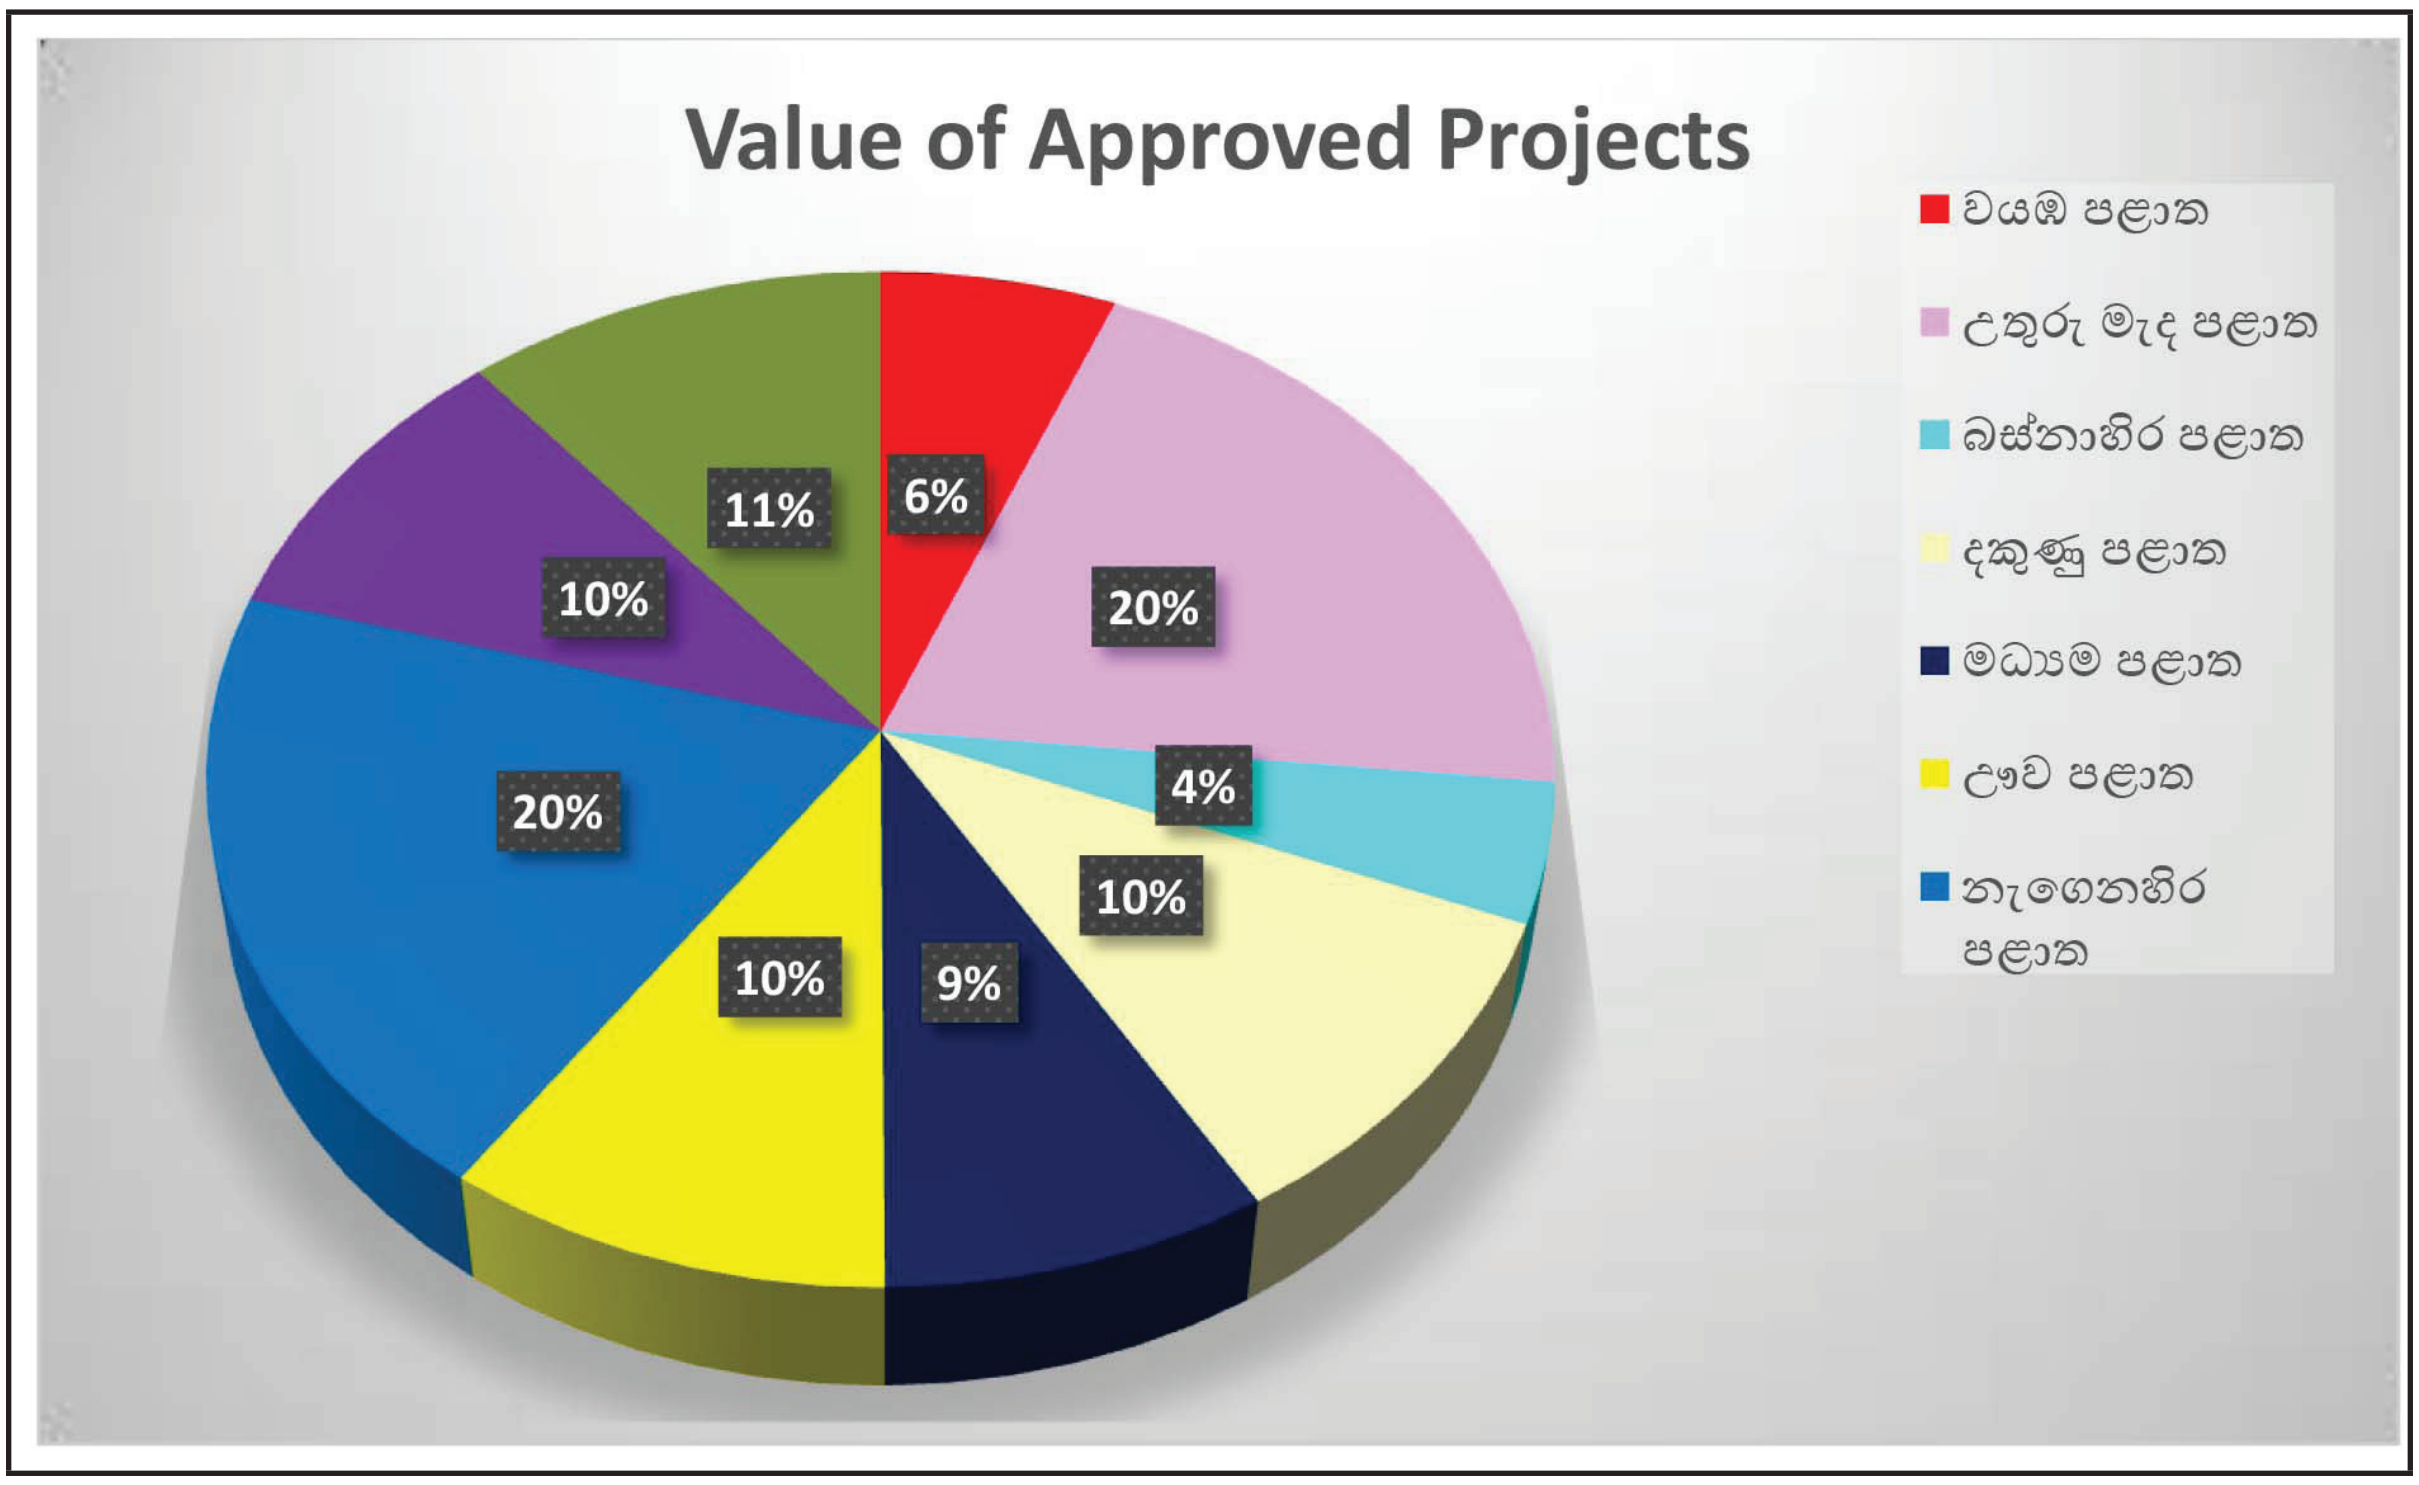

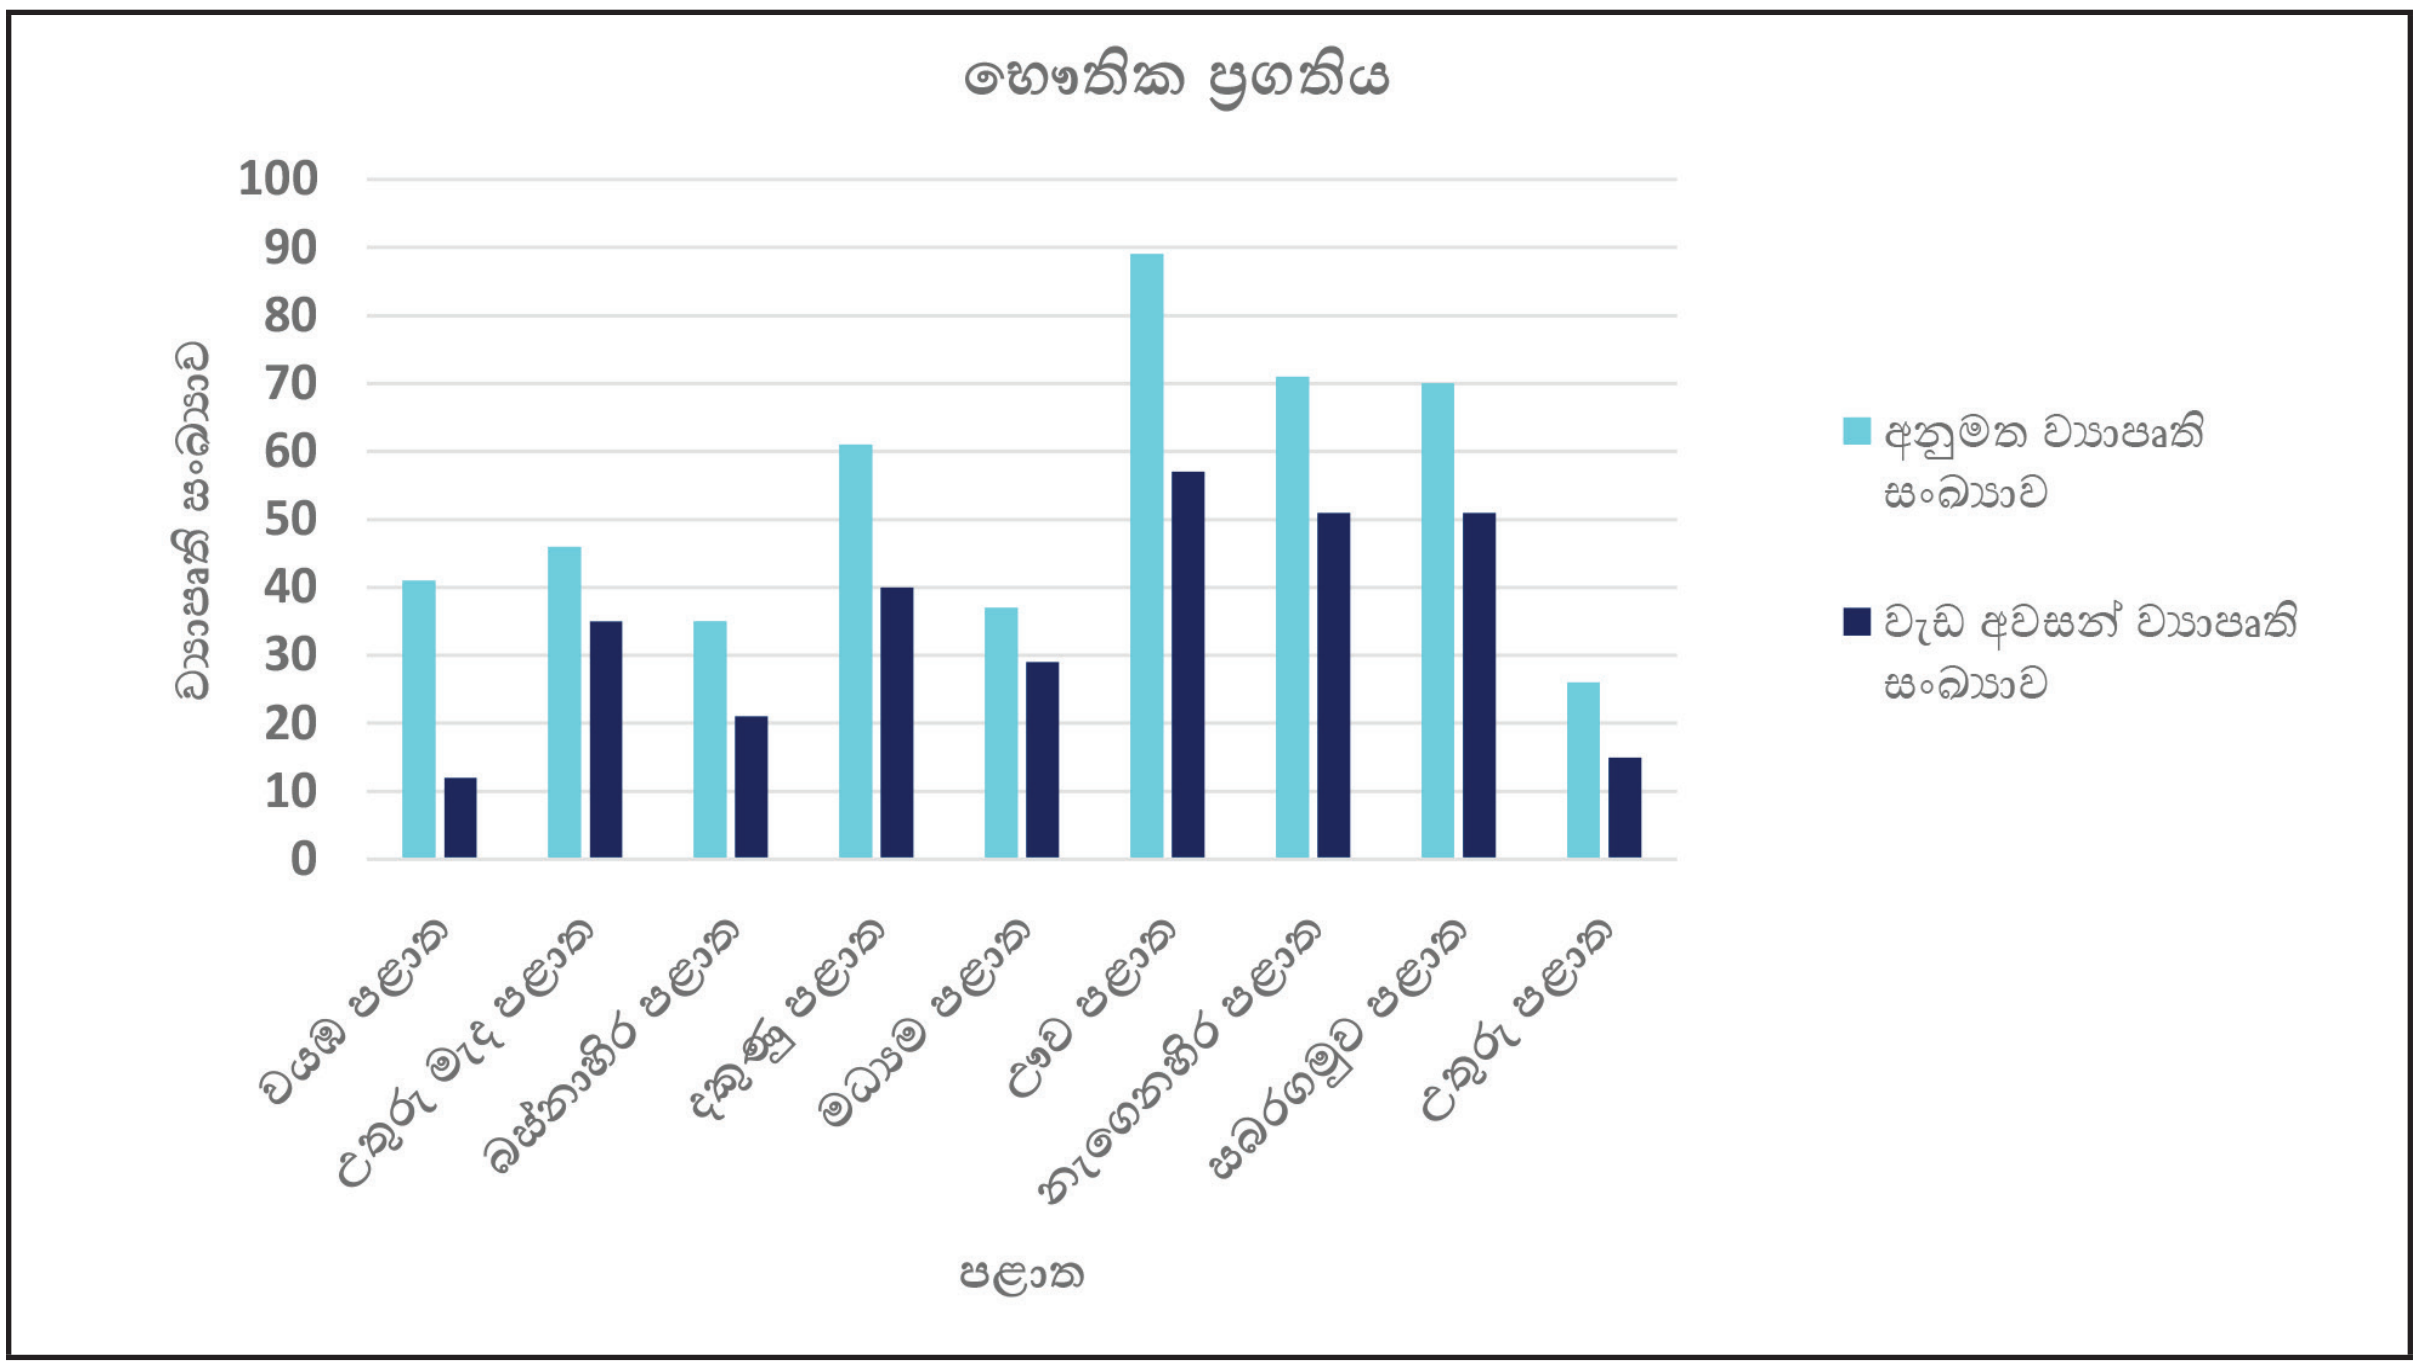

Construction of Padaviya Pradeshiya Sabha Building

2. Capital Programme on Development of Community Infrastructure of Local Authorities - 2017

Objective

To establish and improve essential community infrastructure within the Local Authority areas to fulfil public utilities change with urbanization, to improve self-generative income levels of Local Authorities and to enhance the standard and productivity of services delivered to the public.

Major areas of implementing this project under this programme are under mentioned.
- Implementing community based water projects
- Development of Market facilities
- Development of tourist attractive places

Implementing Area	Administrative Areas of all Local Authorities (Municipal Councils, Urban Councils and Pradeshiya Sabhas)
Provisions allocated for the year 2017	Rs. 1350.00 Mn
Approved Project Value	Rs. 937.12 Mn.
Expenditure	Rs. 734.86 Mn

Capital Programme on Uplifting Community based Infrastructure Facilities of Local Authorities

Approved Projects (As at 31.12.2017)

Serial No.	Province	Number of Local Authorities	Number of approved projects	Number of Completed Projects	Approved Project Value (Rs.)
1	Western Province	7	16	13	57,586,330.31
2	North Central Province	6	41	5	111,624,018.93
3	Western Province	21	280	141	391,706,910.92
4	Southern Province	10	55	4	69,180,478.85
5	Central Province	10	116	85	63,828,850.01
6	Uva Province	5	33	1	25,678,626.73
7	Eastern Province	9	25	14	104,189,410.87
8	Sabaragamuwa Province	12	106	70	68,671,811.68
9	Northern Province	10	22	16	44,659,187.50

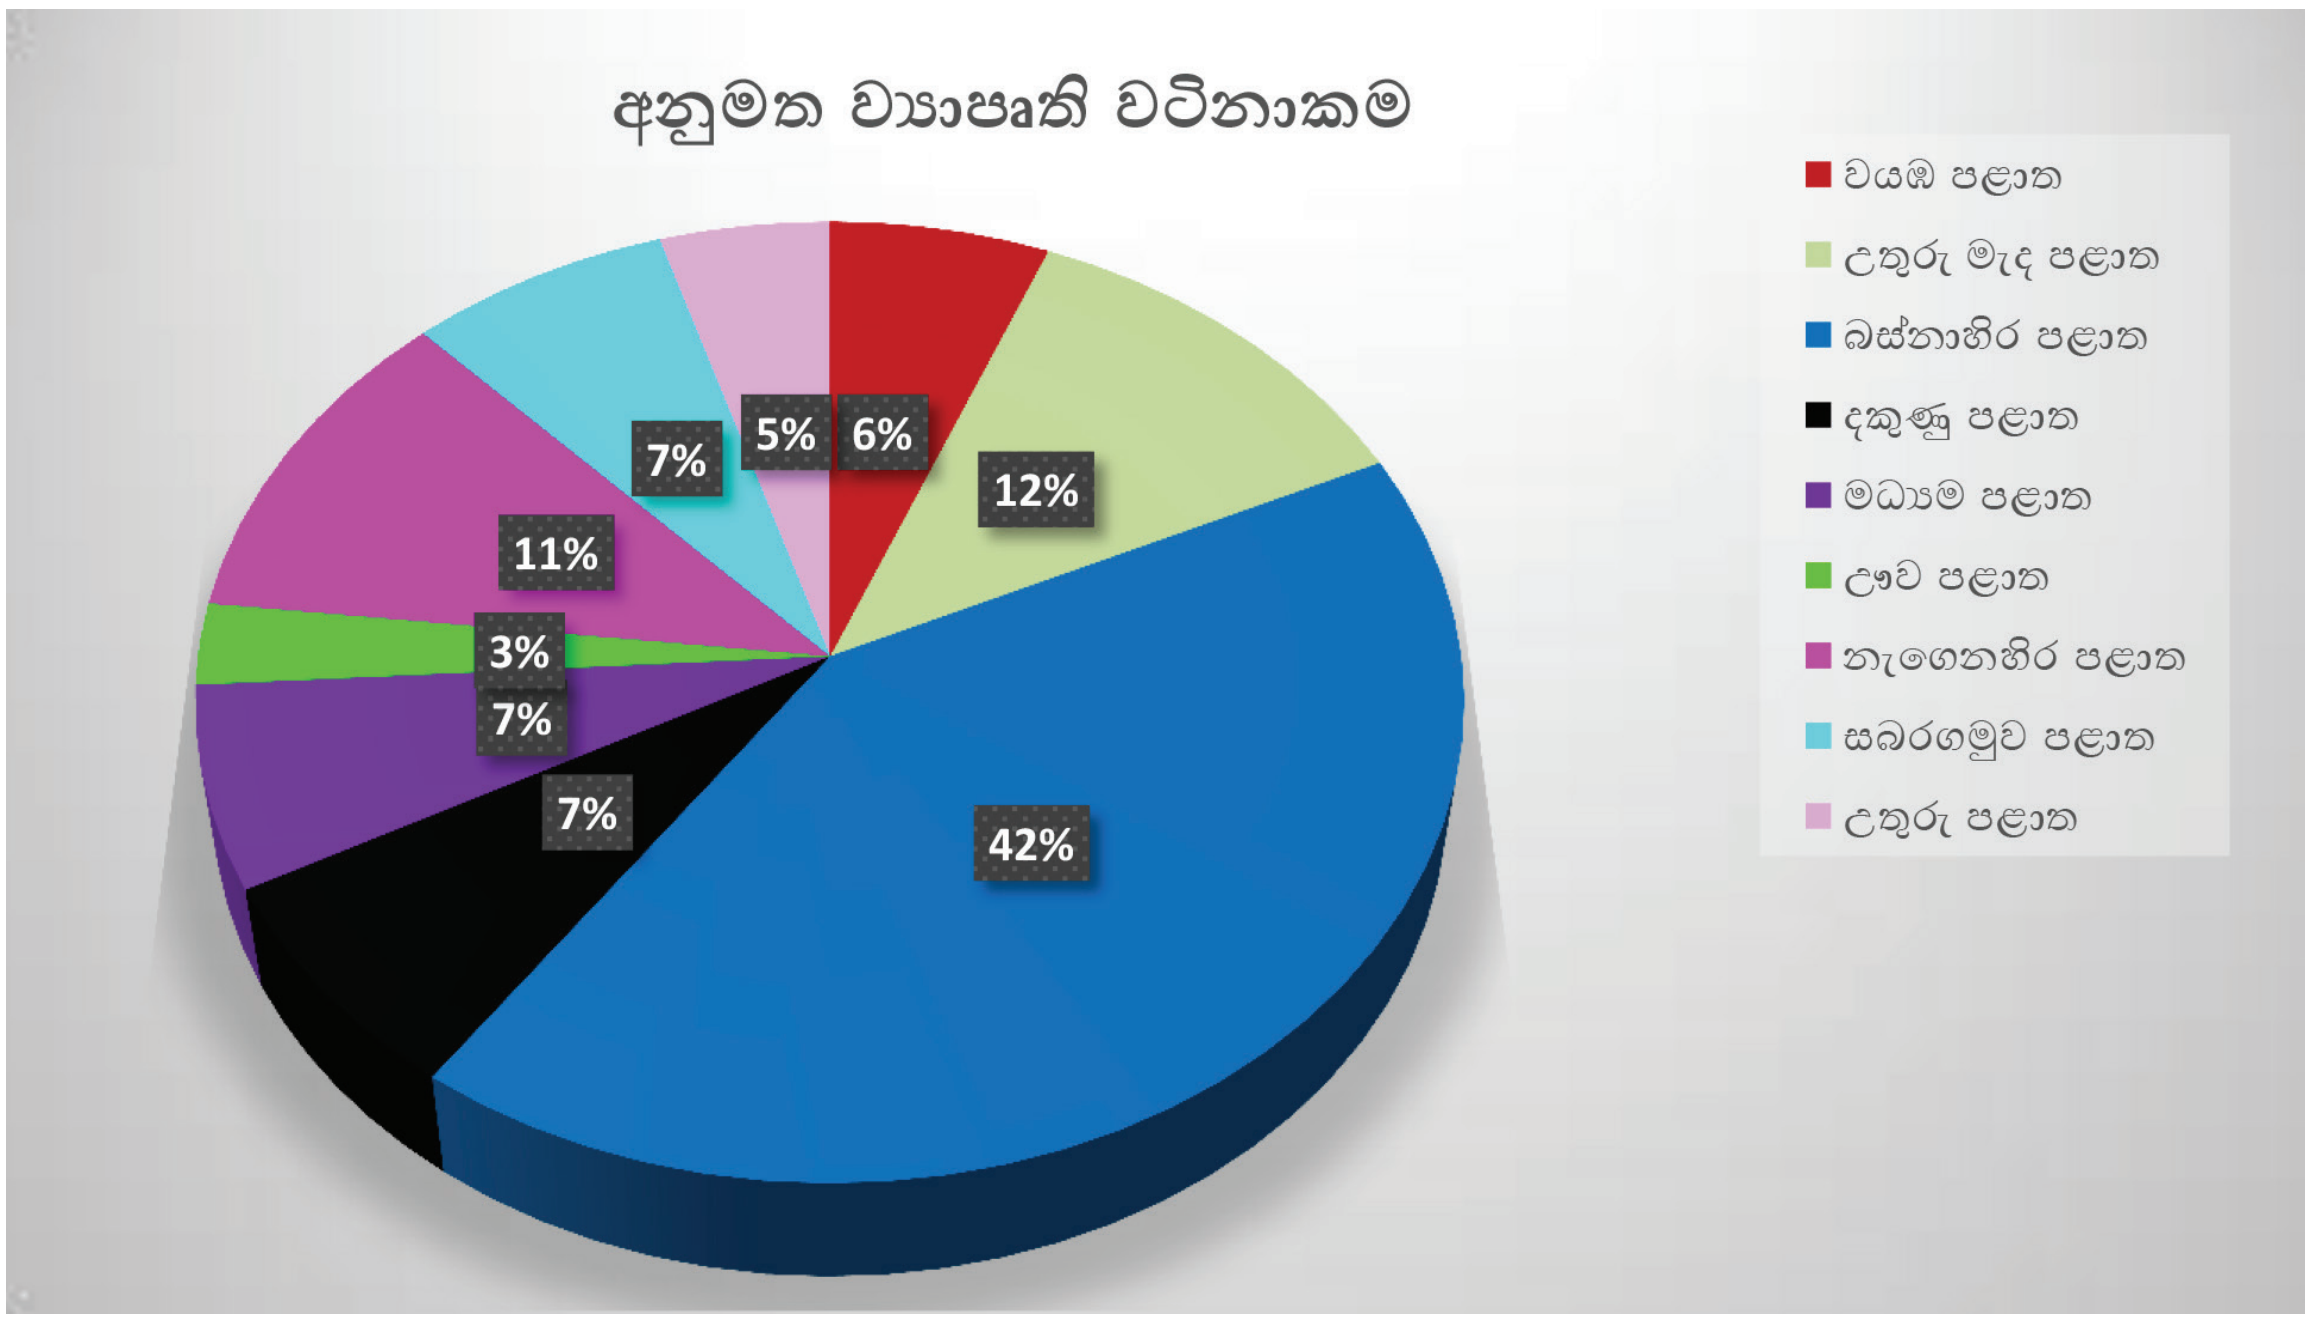
අනුමත ව්‍යාපෘති වටිනාකම
වයඹ පළාත
උතුරු මැද පළාත
බස්නාහිර පළාත
දකුණු පළාත
මධ්‍යම පළාත
ඌව පළාත
නැගෙනහිර පළාත
සබරගමුව පළාත
උතුරු පළාත
6%
12%
42%
7%
7%
3%
11%
7%
5%

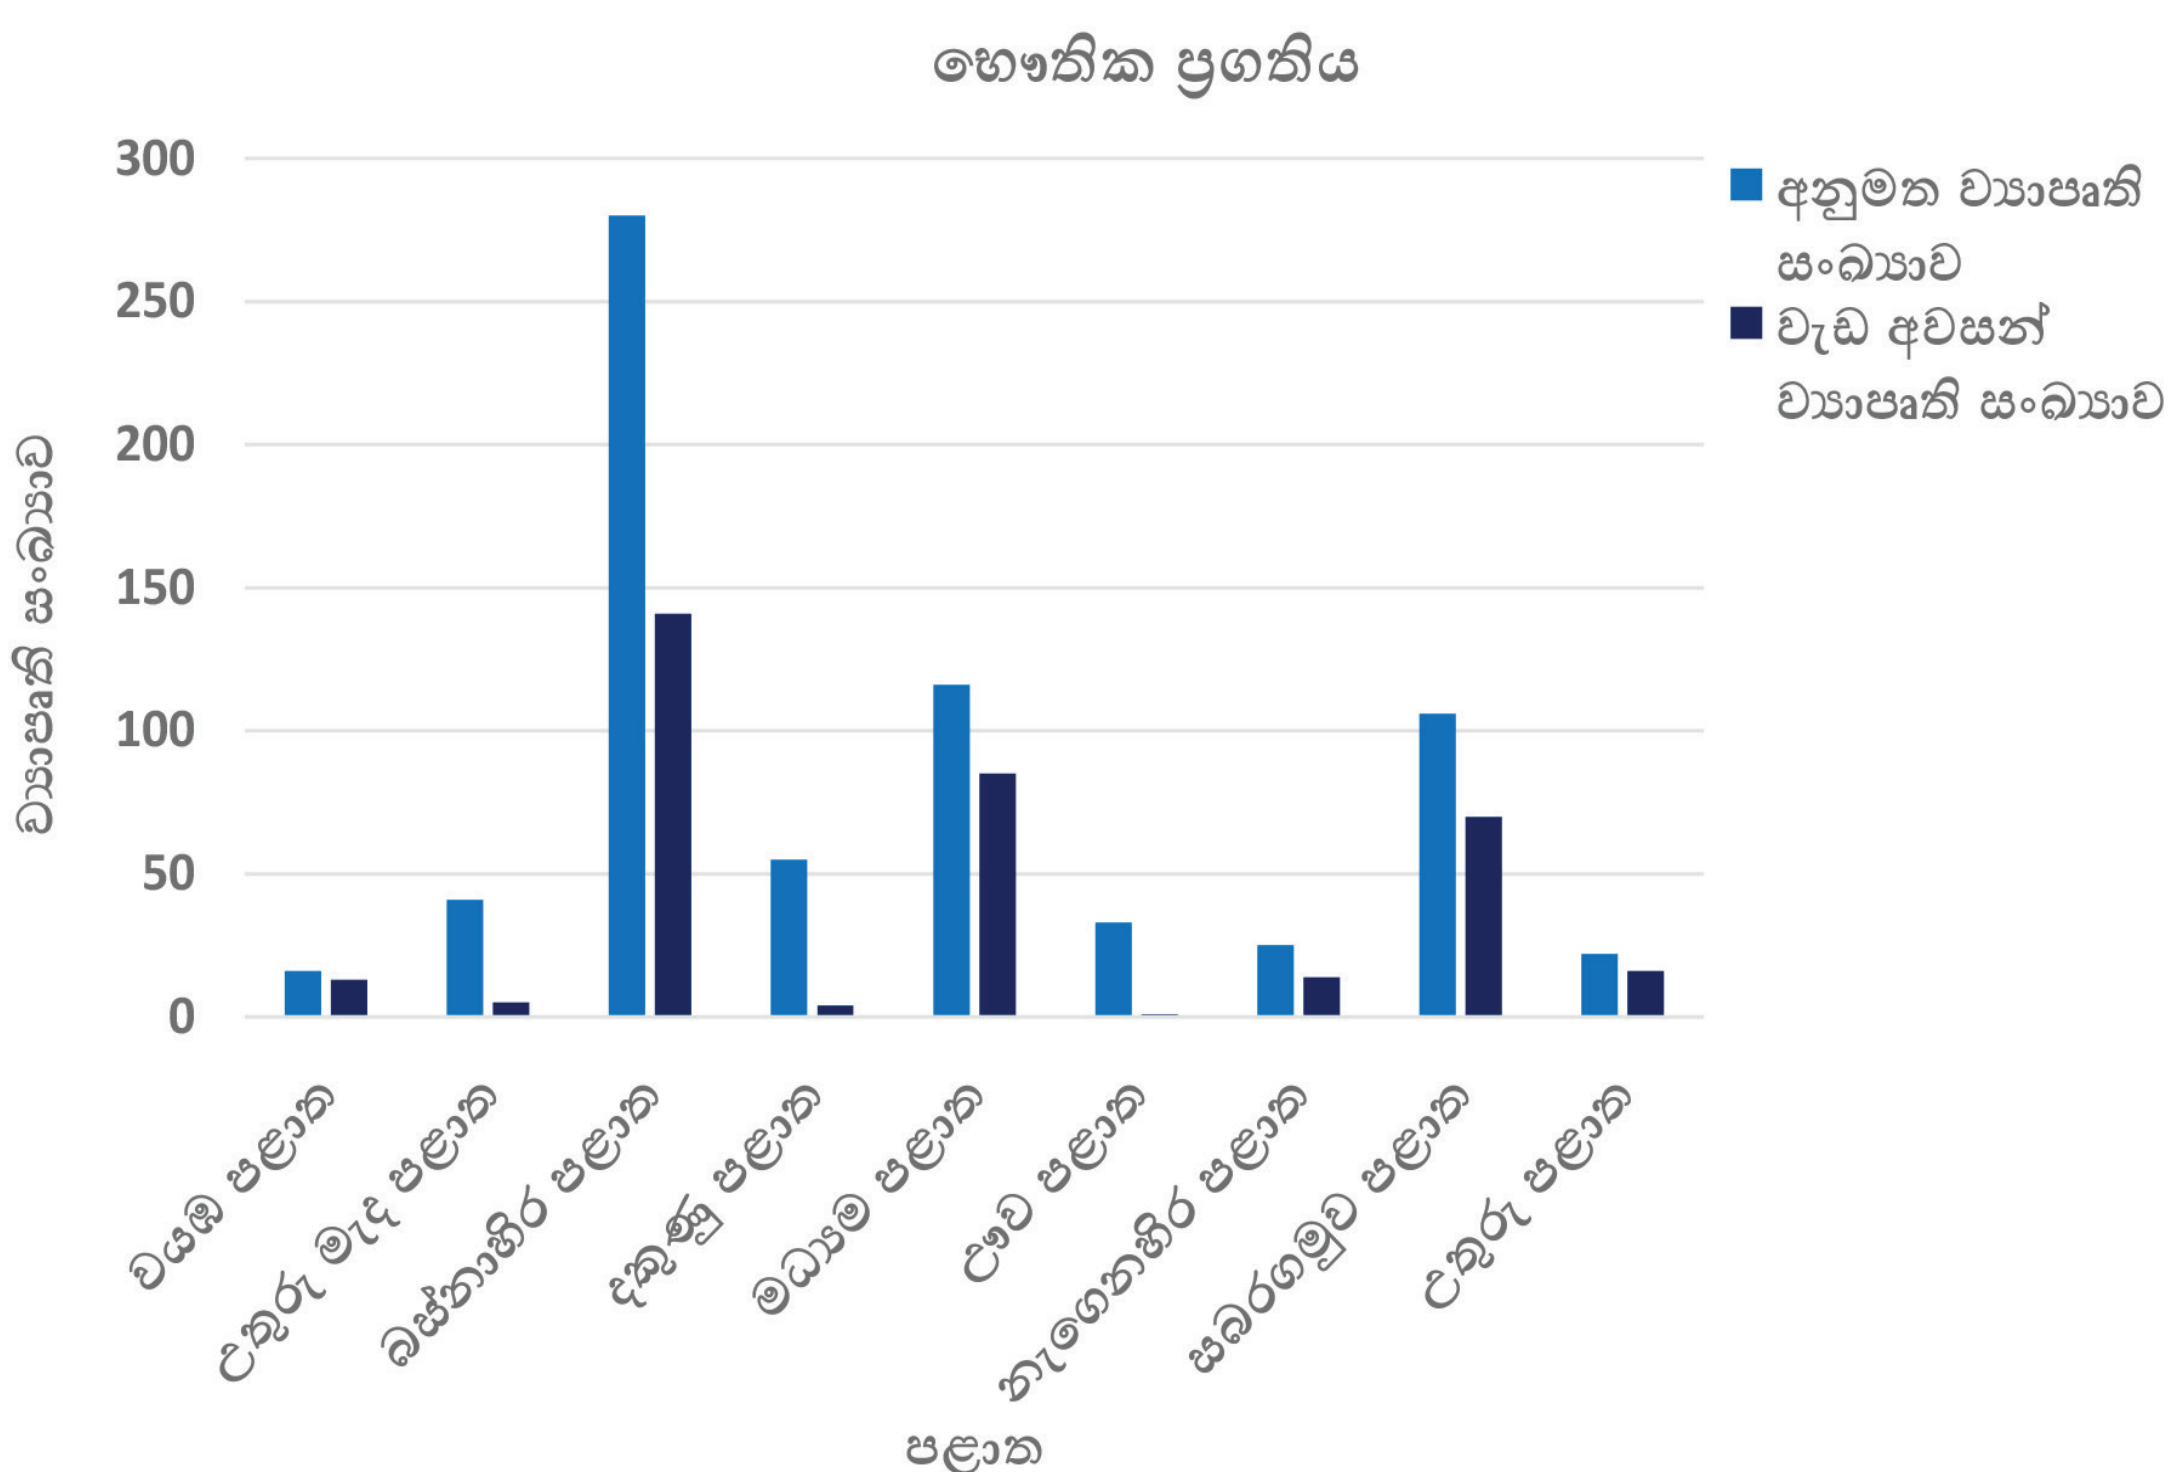
භෞතික ප්‍රගතිය
300
250
200
150
100
50
0
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
වයඹ පළාත
උතුරු මැද පළාත
බස්නාහිර පළාත
දකුණු පළාත
මධ්‍යම පළාත
ඌව පළාත
නැගෙනහිර පළාත
සබරගමුව පළාත
උතුරු පළාත
පළාත

3. Programme on Development of 100 Km Roads in Rural Areas -2017

Objective

Objective of this programme is to uplift the rural economy through the provision of essential road infrastructure facilities to meet transport and travelling facilities efficiently and thereby directly contribute for the economic development of the country.

This project will result in the growth of the agriculture and the products of small and medium scale industries within the rural areas through the revival of rural economy with the regular economic development of the country. It is essential to have an improved system of rural roads to for the transportation of the products of rural communities. Accordingly, this programme will pay special attention to the development of rural roads. It would make efficient the transport needs of the general public.

Major Activities	Development of 1000 Km of rural roads
Implementing Areas	All Local Authorities (Municipal Councils, Urban Councils and Pradeshiya Sabhas)
Allocation for the year 2017	Rs. 2025 Mn.
Approved Amount	Rs.2088.00 Mn
Expenditure (As at 31.12.2017)	Rs. 307.88 Mn.

Methods of developing roads under this programme:

- Laying Concrete
- Laying interlocks
- Make roads with asphalt, tar and bitumen and laying carpets

Programme on Development of 100 Km Roads in Rural Areas -2017
Approved Projects (As at 31.12.2017)

Serial No	Province	Number of Local Authorities	Number of Project	Completed Projects	Approved Project Value
1	Western Province	24	110	110	248,897,904.35
2	North Central Province	25	66	51	146,200,490.66
3	Western Province	32	497	415	551,696,881.25

4	Southern Province	33	188	170	304,956,911.57
5	Central Province	24	118	64	139,675,227.18
6	Uva Province	12	121	112	116,551,090.65
7	Eastern Province	29	110	96	282,449,310.88
8	Sabaragamuwa Province	9	20	19	94,207,446.45
9	Northern Province	34	34	34	204,243,385.29
	Total	**222**	**1264**	**1071**	**2,088,878,648.28**

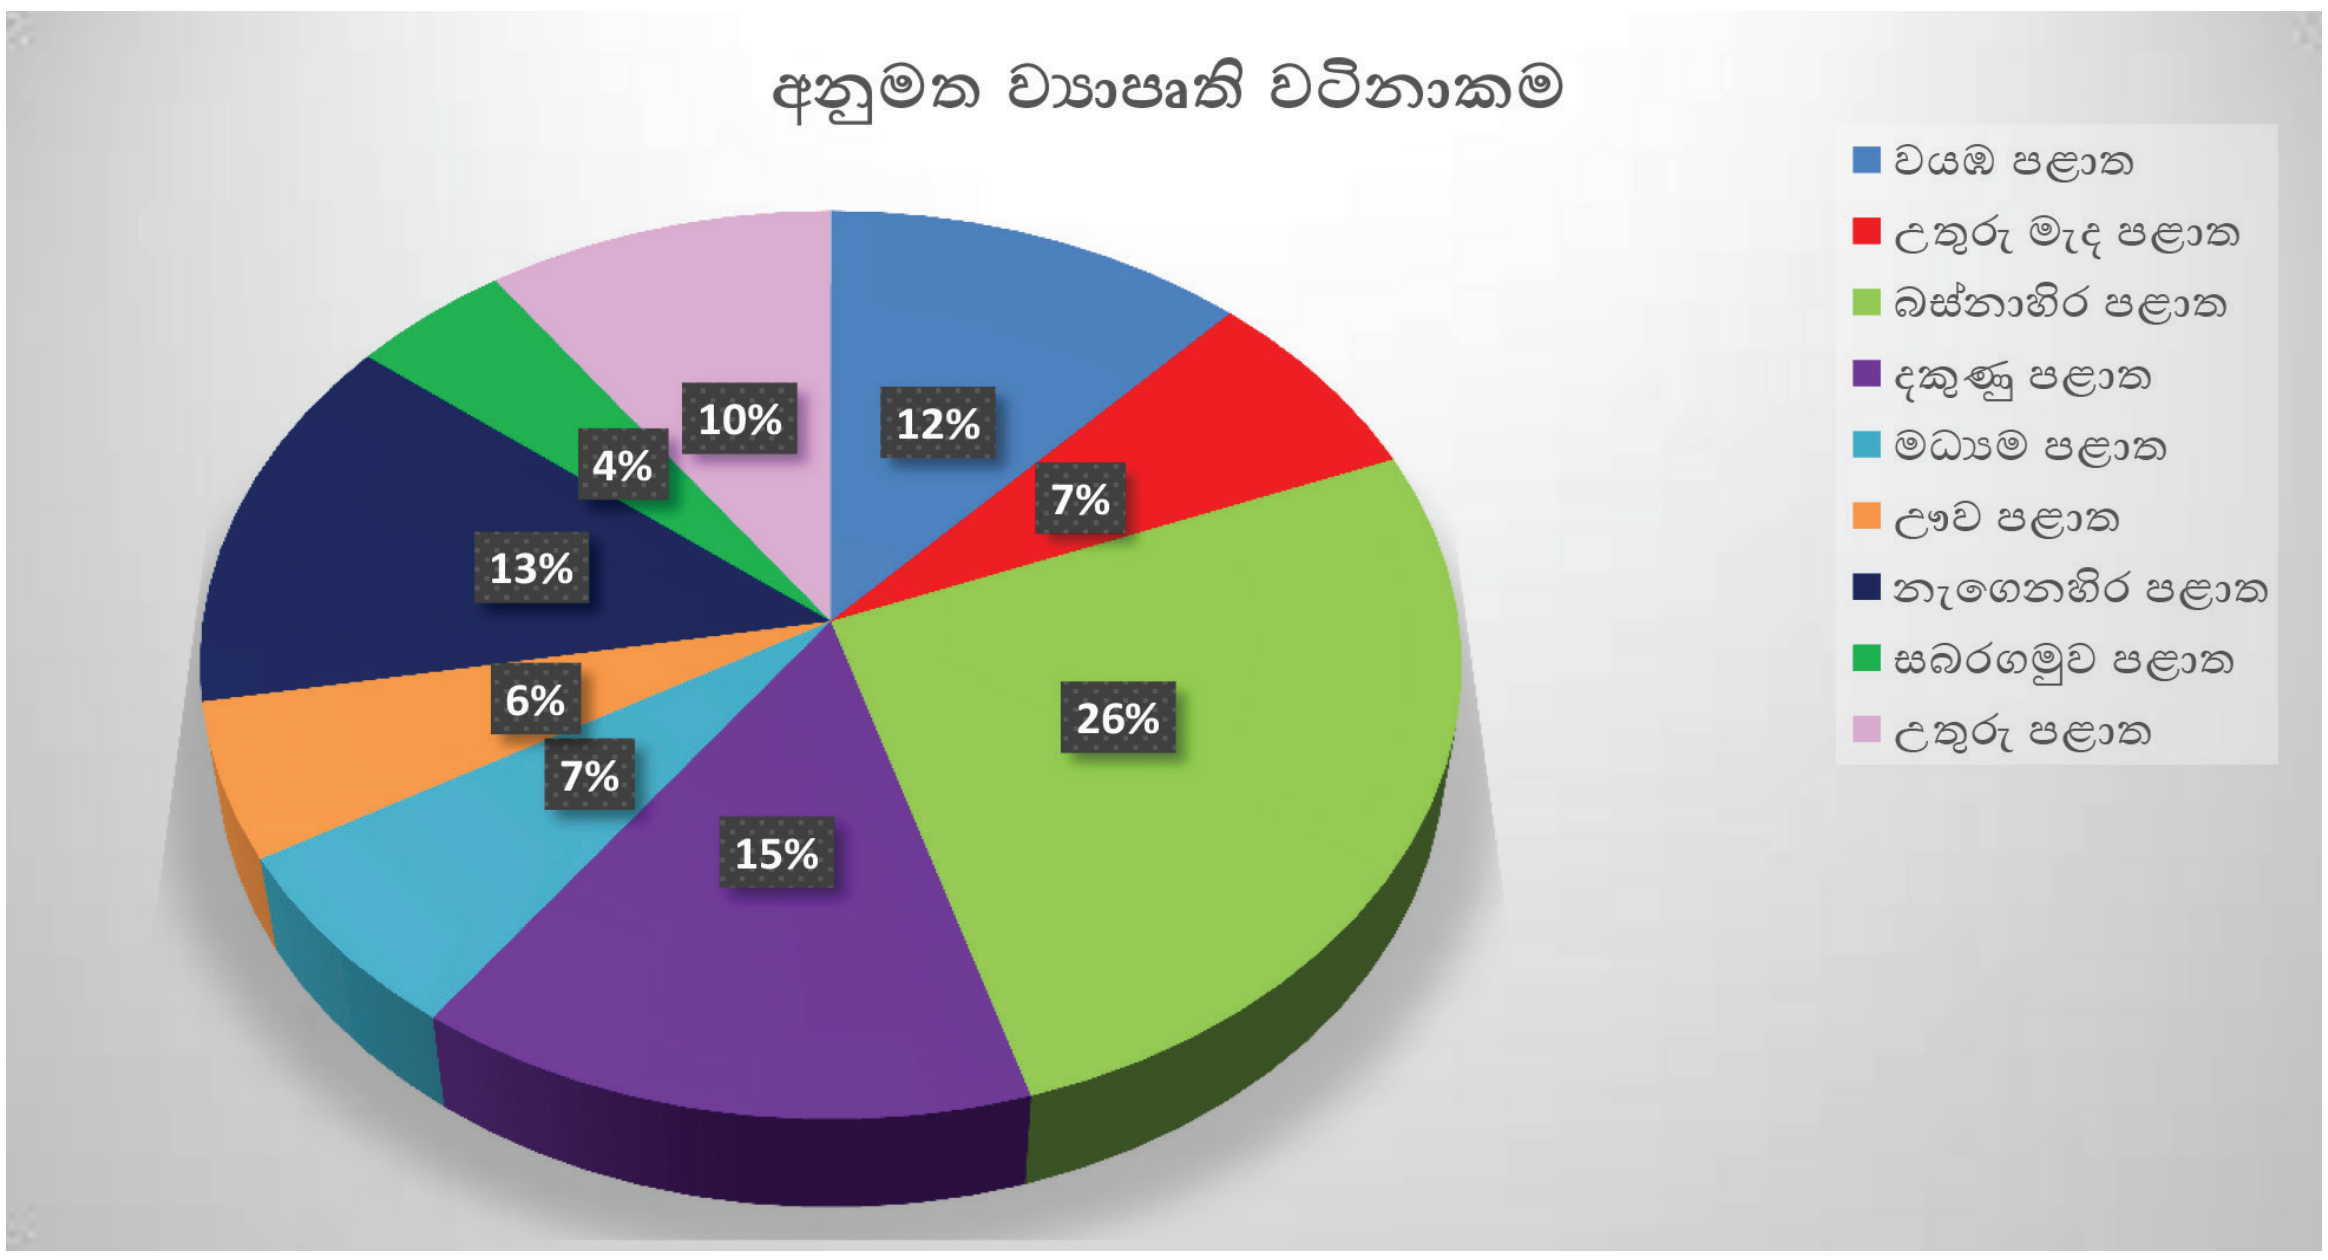

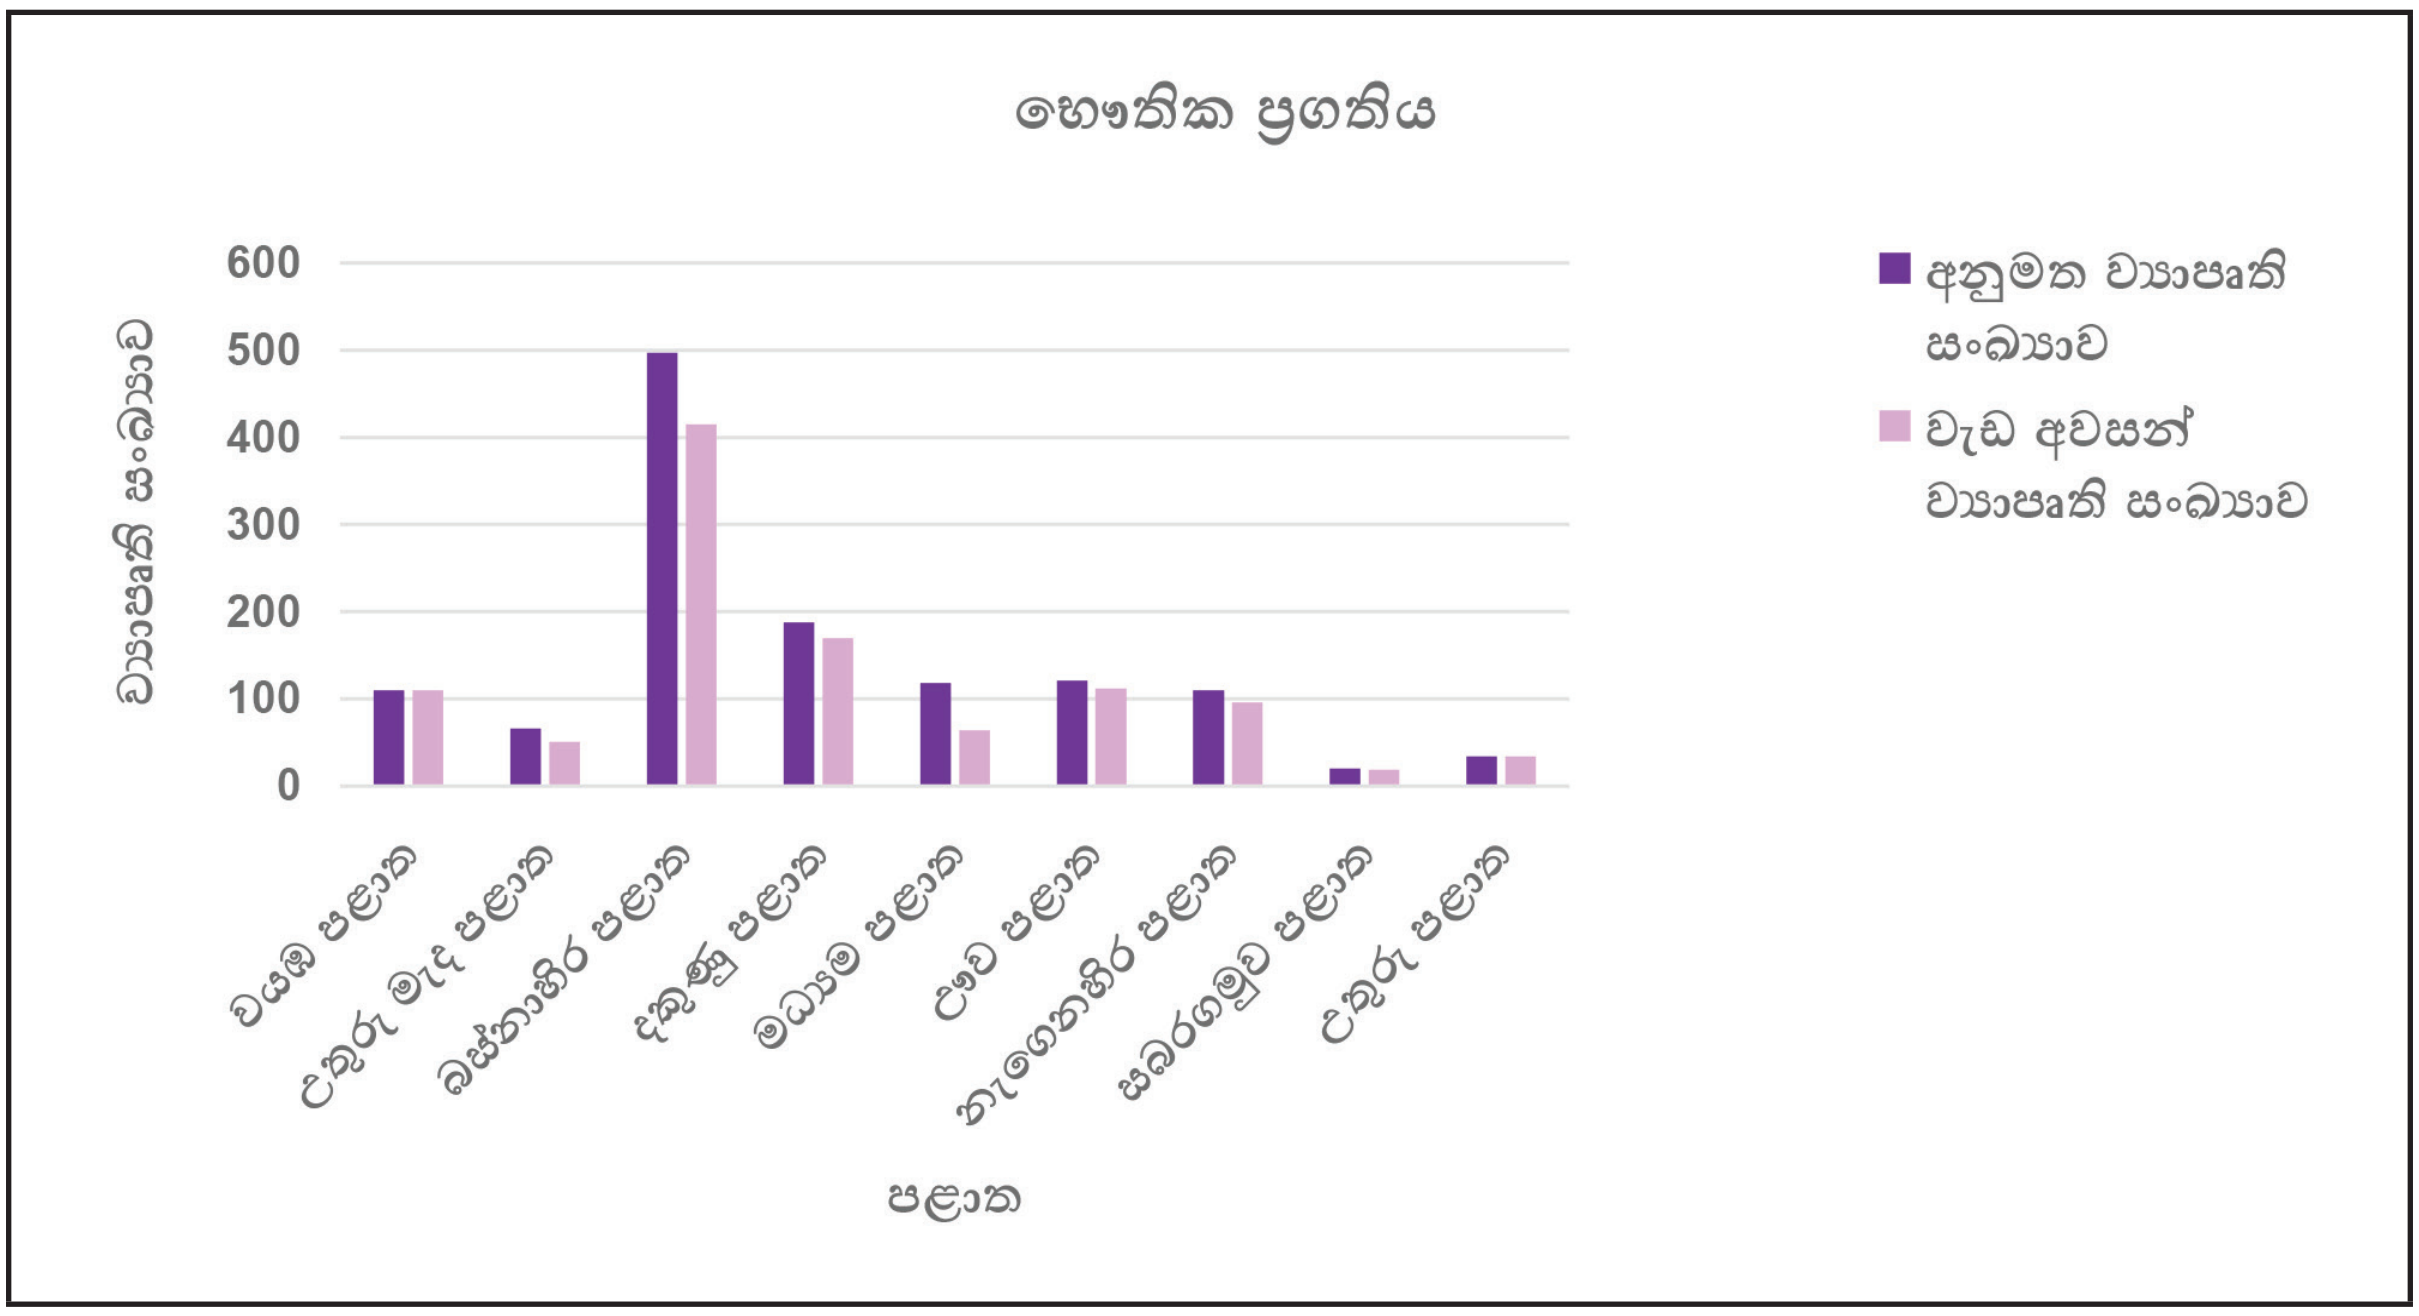
භෞතික ප්‍රගතිය
ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
600
500
400
300
200
100
0
වයඹ පළාත
උතුරු මැද පළාත
බස්නාහිර පළාත
දකුණු පළාත
මධ්‍යම පළාත
ඌව පළාත
නැගෙනහිර පළාත
සබරගමුව පළාත
උතුරු පළාත
පළාත
අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව

4. Programme on Supporting to Backward Local Authorities - 2017

Objective

The main objective of this programme is to provide assistance for the less income generative Local Authorities by the promotion of their self-generative income levels and improving relevant infrastructure.

Major Activities	Number of selected less income generative Local Authorities 13
Implementing Areas	Rs. 90.00 Mn
Allocation for the year 2017	Rs. 101.29 Mn.
Approved Amount	Rs. 7.26 Mn.

Project Area implemented under this programme.
- Implementation of community water projects
- Improvement of market facilities
- Improvement of the places of tourist attraction

Supply of drinking water, and development of market facilities and infrastructure required for local and foreign tourists and pilgrims paving the way for self-generative income growth of Local Authorities.

Programme on Developing Backward Local Authorities – 2017
Approved Projects (As at 31.12.2017)

Serial No	**Province**	Number of Local Authorities	Number of Project	Completed Projects	Approved Project Value
1	Western Province	2	2	2	17,825,560.00
2	North Central Province	3	3	3	25,331,132.89
3	Western Province	1	1	1	10,800,000.00
4	Southern Province	ෙ	ෙ	ෙ	ෙ
5	Central Province	1	1	1	1,685,000.00
6	Uva Province	2	2	2	11,650,917.00
7	Eastern Province	2	2	2	21,921,322.25
8	Sabaragamuwa Province	1	1	1	7,083,043.91
9	Northern Province	1	1	1	5,000,000.00
	Total	13	13	13	**101,296,976.05**

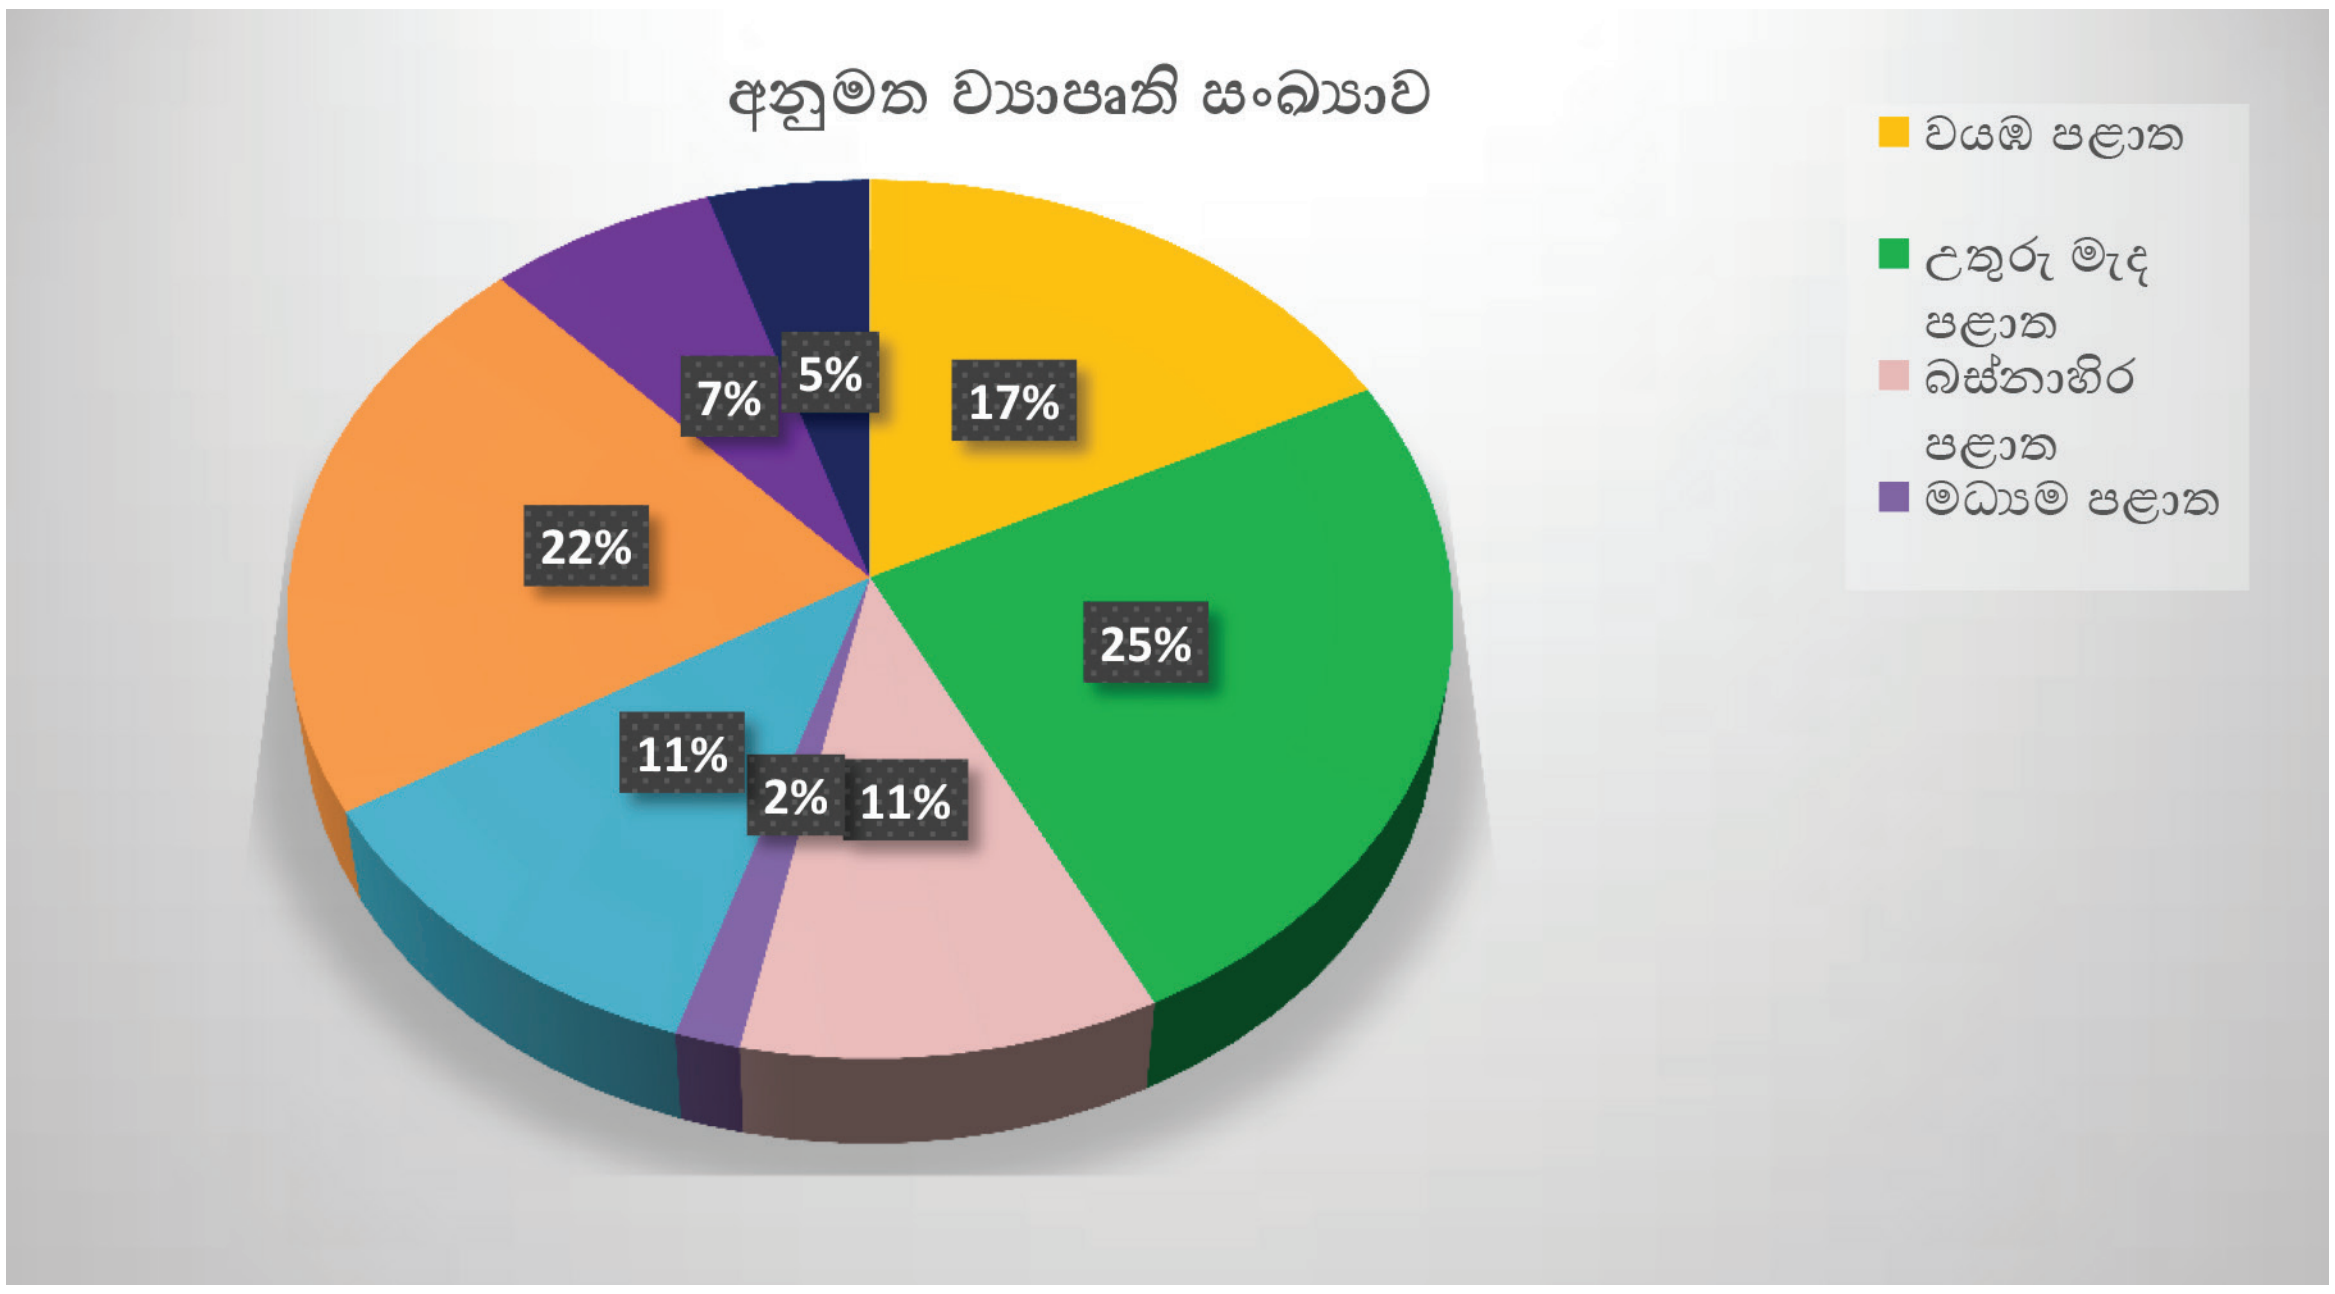

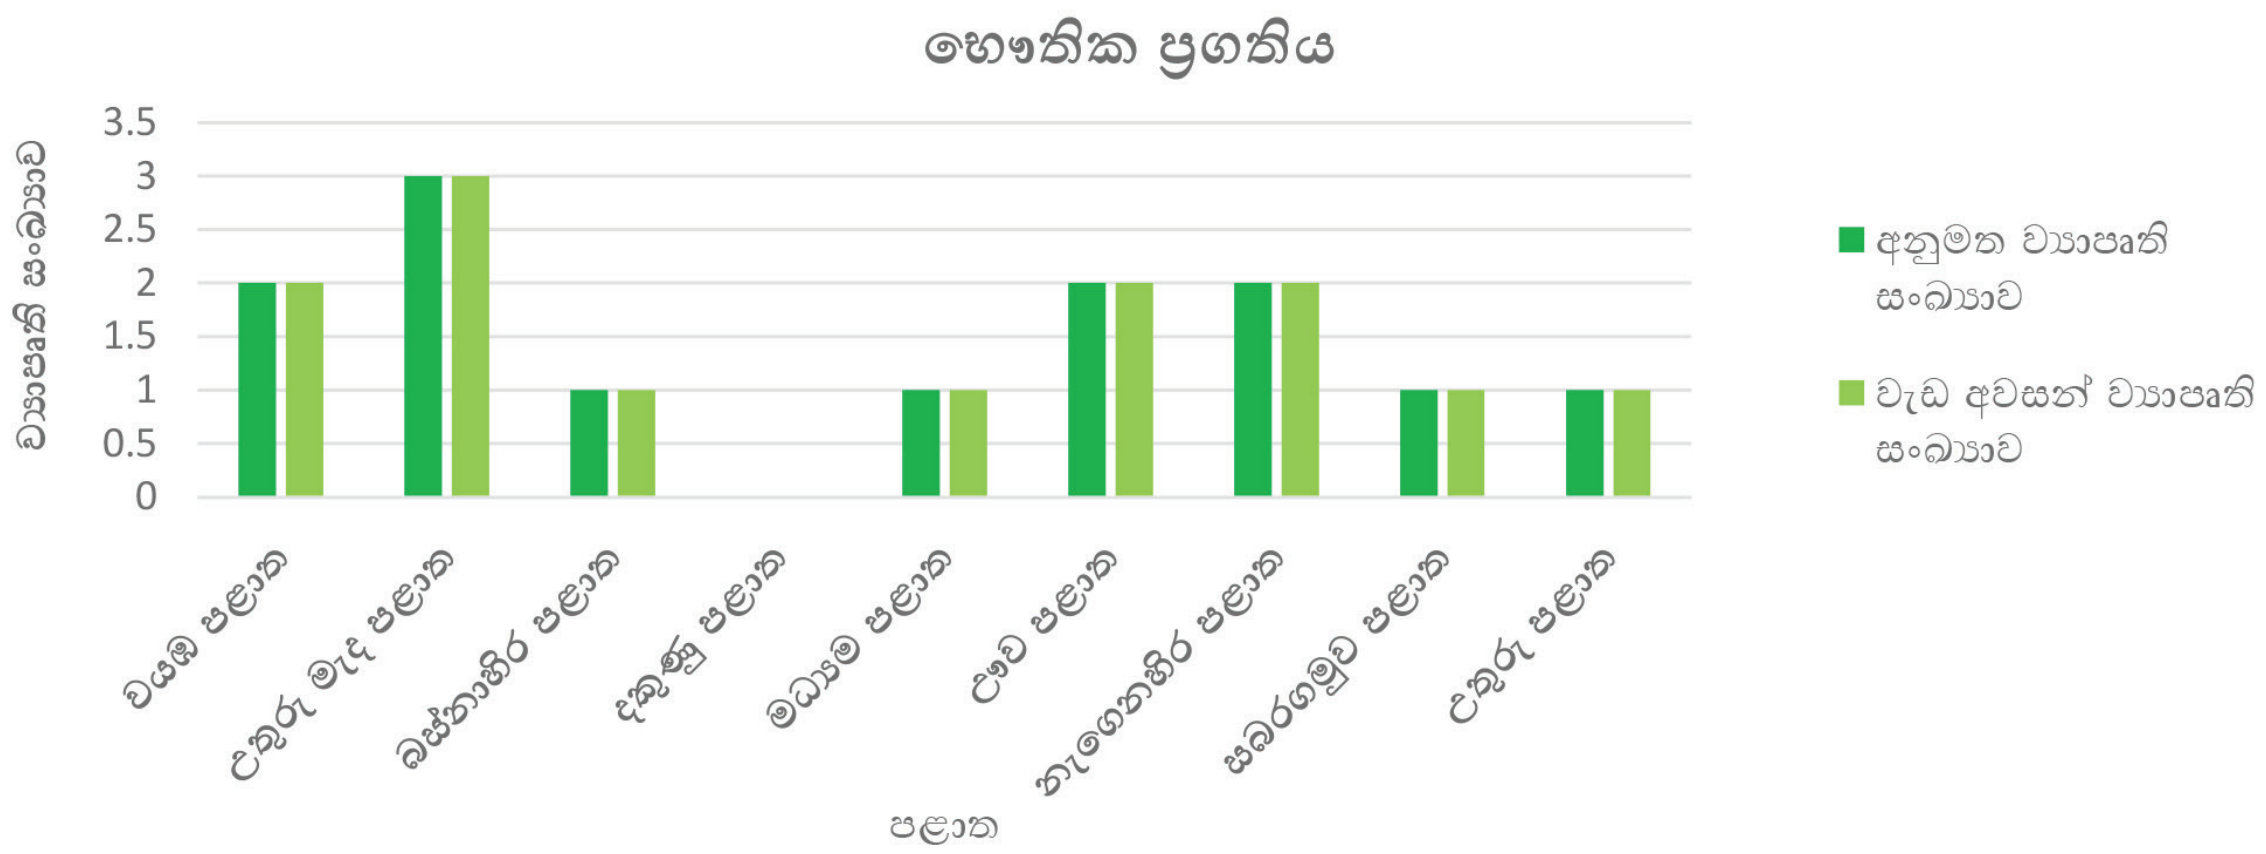

5. Prgramme on Improvement of Libraries 2017

Introduction:

Measures were taken to provide hardware, software and training to upgrade libraries in order to provide a reader centered high standard service utilizing computer inputs consistent to integrated and international standards under the Library Automation Project commenced in 2016 with the expertise technical assistance of the Open University of Sri Lanka aiming to get the uses of information technology for the efficiency of the information technology.

It was planned to connect the existing 30 libraries of the Local Authorities and the libraries to be automated in future as a network of e-libraries under the Library Development Programme of 2017 based on the experience obtained at the implementation of this project. This is being implemented with the expertise technical knowledge of the Open University of Sri Lanka.

Objectives:

1. To establish a centralized e - library as a unit that connects the automated libraries and libraries to be automated in future of Local Authorities.
2. To maintain as a model library with the features of modern improved libraries that has ability to provide efficient services that as appropriate to the 21st century.
3. To establish a public e-resource system in order to obtain assistance for economic, scientific and technical development.
4. To provide training opportunities related to technology of libraries for the professionals concerned.
5. To provide opportunities for the researchers of Libraries and Modern Technology to explore tendencies of modern technology and practices
6. To establish technologies and methods required for the management of the centre.

Expected Results:

1. To see the real status of a modern library and an e-library (parties such as general public, Librarians of Public Libraries and the Administrative Officers of Libraries)
2. To build a faith to serve for libraries with new technology through the practical training and experience within new library environment.
3. To have opportunity to read local e-books through internet as per the needs of librarians and general public
4. To have research opportunities for practitioners and scholars of library information systems to explore the movement of information within the modern technological environment.

Major Activities	1. To complete the balance procurement activities of the Library automation programme. 2. To establish public e-libraries: • To establish infrastructure for a modern e-library. (Repair and renovation of buildings) • To obtain technical expertise knowledge of the Open University of Sri Lanka
Place of Implementation	Public Library, Colombo
Provisions allocated for 2017	Rs. 20.0 Mn.
Expenditure (As at 31.12.2017)	Rs. 4.7 Mn (Expenditure for balance of procurement Rs. 4.7 Mn

Estimate for the construction of proposed e- library was Rs. 15.3 Mn. and even though the project was scheduled to be completed in 2017 it was delayed due to the delay in procurement activities and decided to implement in 2018.

Serial No	Province	District	Local Authority	Libraries
	Western	Colombo	Colombo Municipal Council	Kotahena Public Library
2			Colombo Municipal Council	Public Library of Maharagama Municipal Council
3			Seethawaka Pradeshiya Sabha	Seethawaka Public Library
4			Kotikawatta Pradeshiya Sabha	Sirimavo Bandaranaike Public Library OF Kotikawatta Pradeshiya Sabha
5			Colombo Municipal Council	Kirulapona Public Library
6			Colombo Municipal Council	Public Library of Maradana
7			Boralesgamuwa Urban Council	V.H. Perera Public Library of Boralesgamuwa Urban Council
8		Kalutara	Panadura Urban Council	Migettuwatte Gunananda Public Library
9		Gampaha	Muwangoda Pradeshiya Sabha	Minuwangoda Public Library

10	Sabaragamuwa	Ratnapura	Eheliyagoda Pradeshiya Sabha	Eheliyagoda Public Library
11		Kegalle	Kegalle Urban Council	Kegalle Public Library
12	North Western	Kurunegala	Mawathagama Pradeshiya Sabha	Mawathagama Public Library
13		Puttalam	Anamaduwa Pradeshiya Sabha	Public Library of Anamaduwa Pradeshiya Sabha
14			Puttalam Urban Council	Public Library of Puttalam Urban Council
15	Southern	Galle	Galle Municipal Council	Richard Pathirana Public Library
16		Hambantota	Beliattta Pradeshiya Sabha	Beliatta Public Library
17			Thangalle Urban Council	Thangalle Public Library
18		Matara	Weligama Urban Council	Public Library of Weligama Urban Council
19	North Central	Anuradhapura	Kekirawa Pradeshiya Sabha	Public Library of Kekirawa Pradeshiya Sabha
20			Anuradhapura Municipal Council	Anuradhapura Public Library
21		Polonnaruwa	Thamankaduwa Pradeshiya Sabha	BuddhiMandapaya Public Library of Thamankaduwa Pradeshiya Sabha
22			Hingurakgoda Pradeshiya Sabha	Bandaranaike Public Library
23	Central	Matale	Wilgamuwa Pradeshiya Sabha	Wilgamuwa Public Library
24		Kandy	Nawalapitiya Urban Council	Nawalapitiya Public Library
25			Akurana Pradeshiya Sabha	Akurana Public Library
26			Gampola Urban Council	Gampola Public Library
27		Nuwaraeliya	Nuwaraeliya Municipal Council	Public Library of Nuwaraeliya Municipal Council

28	Uva	Badulla	BadullaMunicipal Council	Public Library of Badulla Municipal Council
29		Monaragala	Monaragala Pradeshiya Sabha	Public Library of Monaragala Pradeshiya Sabha
30			Wellawaya Pradeshiya Sabha	Wellawaya Public Library
31	Northern	Vavuniya	Vavuniya South Pradeshiya Sabha	Public Library of Vavuniya South Pradehiya Sabha
32		Mannar	Mannar Pradeshiya Sabha	Talaimannar Public Library
33		Kilinochchi	Karachchi Pradeshiya Sabha	Public Library of Karachchi Pradeshiya Sabha
34		Mullaitivu	Manthai East Pradeshiya Sabha	Public Library of Manthai East Pradeshiya Sabha
35		Jaffna	Chawakachcheri Urban Council	Chavakachcheri Public Library of Chavakachcheri Pradeshiya Sabha
36			Nallur Pradeshiya Sabha	Public Library of Nallur Pradeshiya Sabha
37	East	Trincomalee	Muttur Pradeshiya Sabha	Muttur Public Library
38		Batticaloa	Manmunai Pradeshiya Sabha	Kaluwanchikudy Public Library
39		Ampara	Ampara Urban Council	Public Library of Ampara Urban Council
40			Kalmunai Municipal Council	Kalmunai Public Library

6.Rennovation of Elders' Home – Mirigama

A salient feature that could be seen in India, Bangaladesh, Pakisthan, Nepal and Sri Lanka is the tendency of increasing the percentage of elderly population. Presently, the elderly population in Sri Lanka is 12.47% out of the total population and it is envisages that this number may increase up to 24.8% by 2041. As the inattentiveness and inequalities towards the aged population is constantly increasing they have to face a number of challenges. Among them the number of adults who are to be accommodated in elders' homes is increasing daily and the necessity of preserving their mental and physical health and respect and self-satisfaction has become a requisite. Five government elders' homes are functioning in Sri Lanka and Mirigama elders' home is the largest elders' home in the Western Province and this has been established in memorial of late Mr. D.S. Senanayaka. This Elders' Home is governed by the Social Services Department of Western Province and it provides accommodation facility for 265 elders.

However, dilapidation of some buildings in this Elders' Home and unsatisfactory water supply and toilet facility have caused difficulties in providing a high quality of service to the elders. In consideration of these difficulties General Treasury made arrangements to grant provisions to the Ministry of Provincial Councils and to renovate this building. Accordingly, implementation of the project was handed over to the Department of Social Services.

Objective

To improve infrastructure of Mirigama Elders' Home to carry out its activities at a standard level.

Major Activities	i. Reconstruction of the Elders' Home ii. Construction of the water tank iii. Renovating toilets of Gothami 'B' block
Provisions allocated for 2017	Rs. 21.8 Mn
Expenditure in 2017 (as at 31.12.2017)	Rs.8.63 Mn
Physical Progress	100%

Improvement of Water Drainage Systems in the Eastern Province

Outbreak of diseases such as Dengue Epidemic could be commonly seen during rainy season and floods due to the blocked drain system caused by high urbanization and increase of population density.

Provisions of Rs. 100 Mn. was allocated in 2017 to develop rain water drainage system to minimize this condition.

District	**Local Authority**
Batticaloa	Batticaloa Municipal Council
	Eravur Urban Council
	Kaththankudy Urban Council
Ampara	Kalmunai Municipal Council
	Akkaraipattu Municipal Council
	Pothuvil Pradeshiya Sabha
Trincomalee	Trincomalee Municipal Council Council
	Kinniya Urban Council

Objective:

1. To ensure safe lives in the urban areas of Eastern Province by the construction of rainwater drainage systems taking prioritized measures and resultantly, enhance the life styles of the communities of such areas.

2. To prevent breakout of diseases in the Eastern Province and create a healthy society free of diseases.

Major Activities	To construct rainwater drainage systems in urban areas of 11 Local Authorities in the Eastern Province.
Provisions for 2017	Rs. 90.00 Mn
Amount approved for 2017 (Rs.)	Rs. 98.17 Mn.
Expenditure for 2017 (As at 31.12.2017)	Rs. 10.12 Mn.

3.2. Projects & Planning Division

This is a new Division which was attached to the Ministry from the year 2017. It basically consists of three main units; Project Management Unit, Planning Unit and Information Technology Unit.

Vison:

Our Vison is to be Strategic Planner for All the Activities of this Ministry and to be the Ambassador for all Foreign Funded Projects activities.

Main Objectives:

1. To support to provide services and infrastructure facilities of Local Authorities in an accountable and responsive manner.
2. To mobilize resources in order to uplift living standards of the rural communities.

3.2.1. Major Role :

3.2.1.1. Project Management Unit

1. To assist to achieve project objectives, coordination with Line Ministries, project Management Units and other Agencies.
2. Monitoring of Progress of the Ongoing Projects.
3. Conducting of the National Steering Committee Meetings.
4. Preparation of Cabinet Memorandums in relation to the Projects.
5. Recruitment and Management of the staff which are working under the projects.
6. Maintenance of a due coordination mechanism with other Divisions and Institutes of the Ministry.

3.2.1.2. Planning Unit

1. Preparation of Annual Action Plan and Strategic Plan of the Ministry and submit them to required institutes.
2. Preparation of Monthly Progress Report, Quarterly Progress Report and Annual Progress Report of the Ministry and submit them to required institutes.
3. Conducting of the Progress Review Meetings.
4. Identification of the Forthcoming Projects.
5. Submit new project proposals coordination with Provincial Councils and Local Authorities.
6. Preparation of Annual Performance Report including Future Plan of the Ministry to be submitted to the Parliament at Committee stage of the Budget
7. Organizing and facilitating of workshops.

3.2.1.3. Information Technology Unit

1. Updating of the Official Website of the Ministry.
2. Maintaining of a Ministry Database and Collecting Information.
3. Provide technical assistance to smooth connection of the Internet.
4. Afford Information Technology support to all Divisions and staff of the Ministry.

This division implemented around 12 foreign funded projects in the year 2017. Around 500 employees have been serving for these projects and they are implemented through the Provincial Councils covering all the provinces. The total investment of these foreign funded projects is Rs. 20,000 Mn and it has been gained as loans and grants of various financial institutes.

3.2.2. Foreign Funded Projects

3.2.2.1. Puraneguma

Objective

Restructure of Local Authority activities and improvement of infrastructure facilities within 383 sub projects of 137 backward Local Authority areas.

	Funding agency	Asian Development Bank	
	Total Project Cost	16.800.00	
	(Rs. Mn)	16,800.00	
	Project Period	2011 – 2020	
	Overall Physical Progress	100%	
	Physical Progress of Additional Allocation	9%	
	Overall Financial progress (Rs. Mn)	8780.00	
	2017 Allocation	1892.00	
	Financial targets / progress at the 4th quarter of 2017	1892.00	1532.00
	Physical Targets / Progress as at 31.12.2017	10%	9%

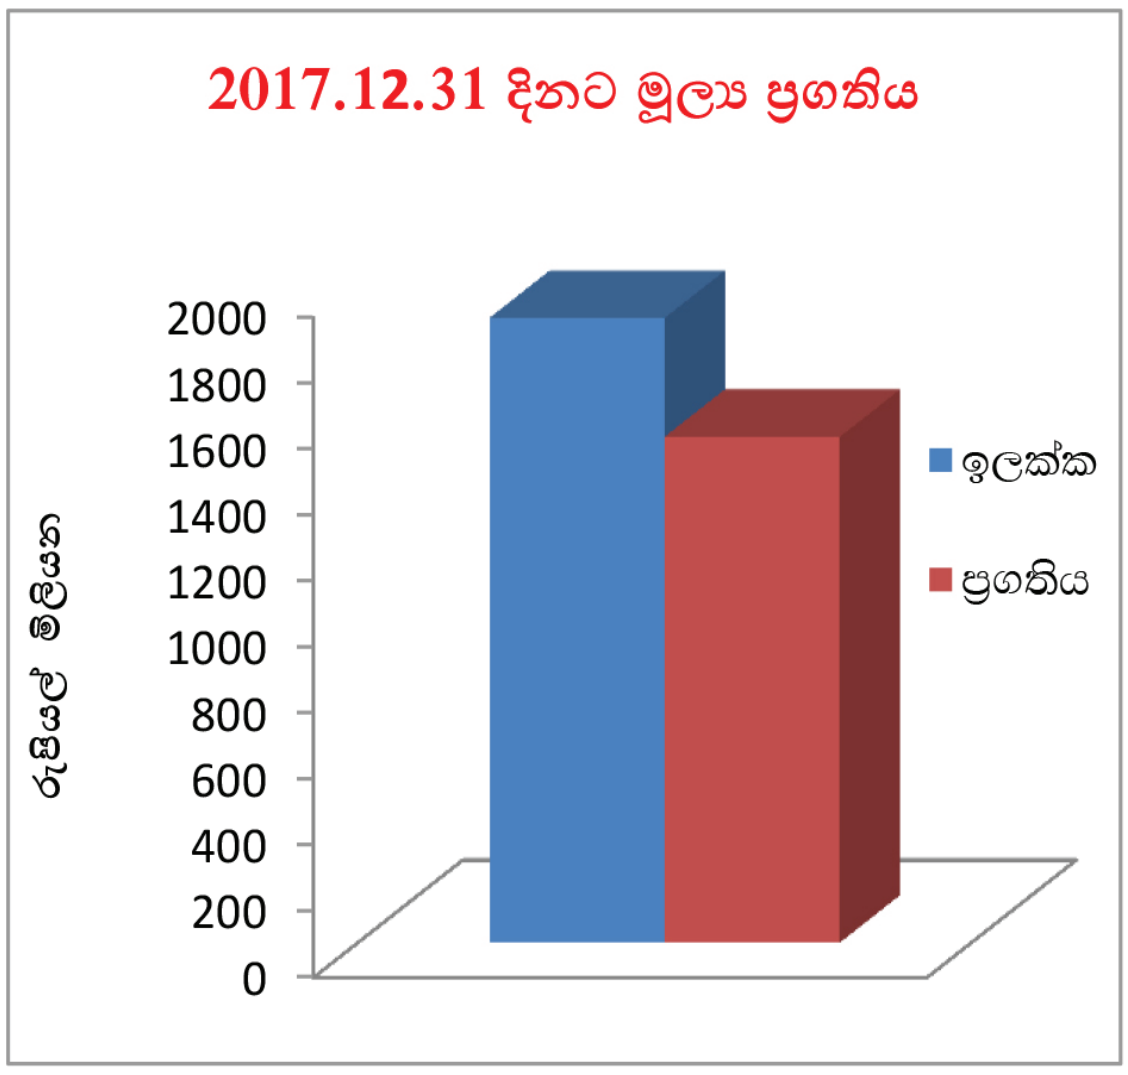

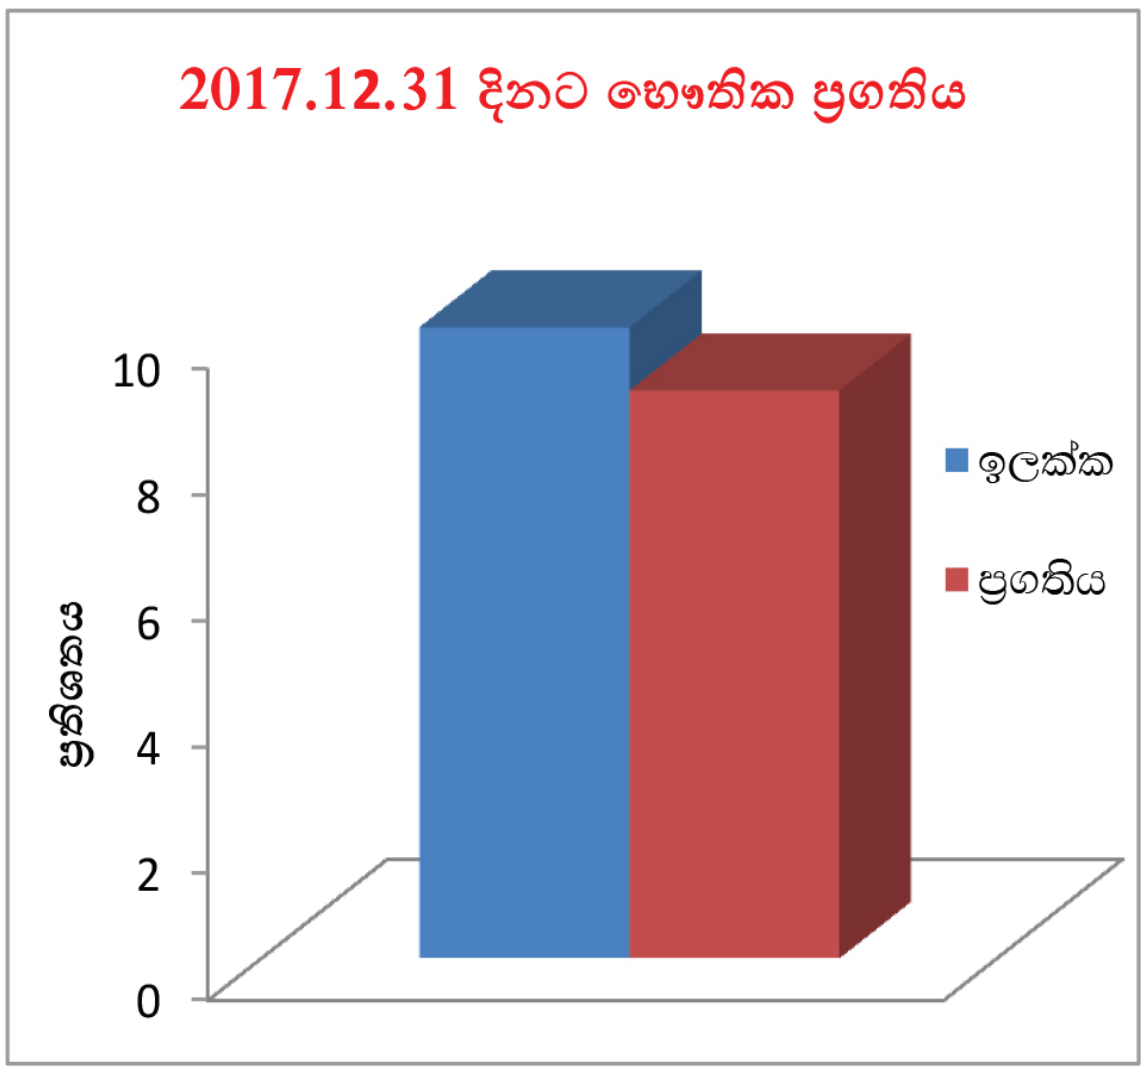

Table 14 - Programmes conducted under Puraneguma Project

Projects implemented under the original allocation	Number of Completed Projects	Projects implemented under the additional allocation	Proposed Number to be constructed
Health Centres	31	Awarded Projects (Drinking Water Scheme)	08
Day Care Centres	19		
Comfort Centres	28	Projects at Planning Stage (Drinking Water Scheme)	17
Solid Waste Management Centres	03		
Crematorium	02	Awarded Projects (Infrastructe Facilities)	05
Drinking Water Scheme	23		
Weekly Fair	45		
Libraries	40	Projects at Inviting Bids (Infrastructure Facilities)	05
Bus Stands	14		
Multi Purpose Building	74	Projects at Planning Stage (Infrastructure Facilities)	19
Roads/Bridges	23		
Total	302	**Total**	49

In addition policies of Pradeshiya Sabhas have been reformed by improving infrastructure, simplifying the procedures of levy of assessment tax and other procedures of issuing license and make transparent the method of giving approval for them in order to make efficient the service delivery of Local Authorities while machinery is also distributed among Local Authorities.

Siyambalanduwa Pradeshiya Sabha

Multipurpose Building – Minipe Pradeshiya Sabha

Other Project Activities:

- Designing a website for the project - www.puraneguma.lk
- To develop and implement the mechanism of airing grievances
- To implement the action plan on gender issue
- To take protective measures

3.2.2.2. Greater Colombo Waste Water Management Project

The Greater Colombo Wastewater Management Project has been designed to improve the wastewater management services for 838,000 urban and sub urban residents in the project area. It is also expected to enhance the urban environment of Greater Colombo which is home for 2.5million residents.

The Project area consists of three local authorities; Colombo, Dehiwala Mount Lavinia and Kollonnawa. This Ministry is mandated to execute the work in Colombo Municipal Council area while Colombo Municipal Council is the implementing agency for the said work.

The Project designed to address numerous technical, institutional, managerial and operational problems identified on priority basis for investment. A total investment of Rs. 12,171million (including contingency budget) is financed by the Government of Sri Lanka from a loan of Rs. 10,455 million received from the Asian Development Bank (ADB) for the system within Colombo Municipal limits. The remaining is funded by the Government.

Objective

To create a healthy environment for the residents of Colombo city and suburbs by providing them a proper drainage system through rehabilitation of Waste Water system in Colombo city

Funding Agency	Asian Development Bank / Government of Sri Lanka	
Project cost (Rs. Mn)	12,171.00	
Project duration	2010-2019	
Project Area	Colombo Municipality	
Total Financial progress (Rs. Mn)	8156.44	
Total physical progress	77%	
Provisions for 2017 Rs. Mn.	3380.00	
Financial Targets as at 31.12.2017 (Rs. Mn)	3380.00	1775.74
Physical Targets / Progress as at 31.12.2017	85%	77%

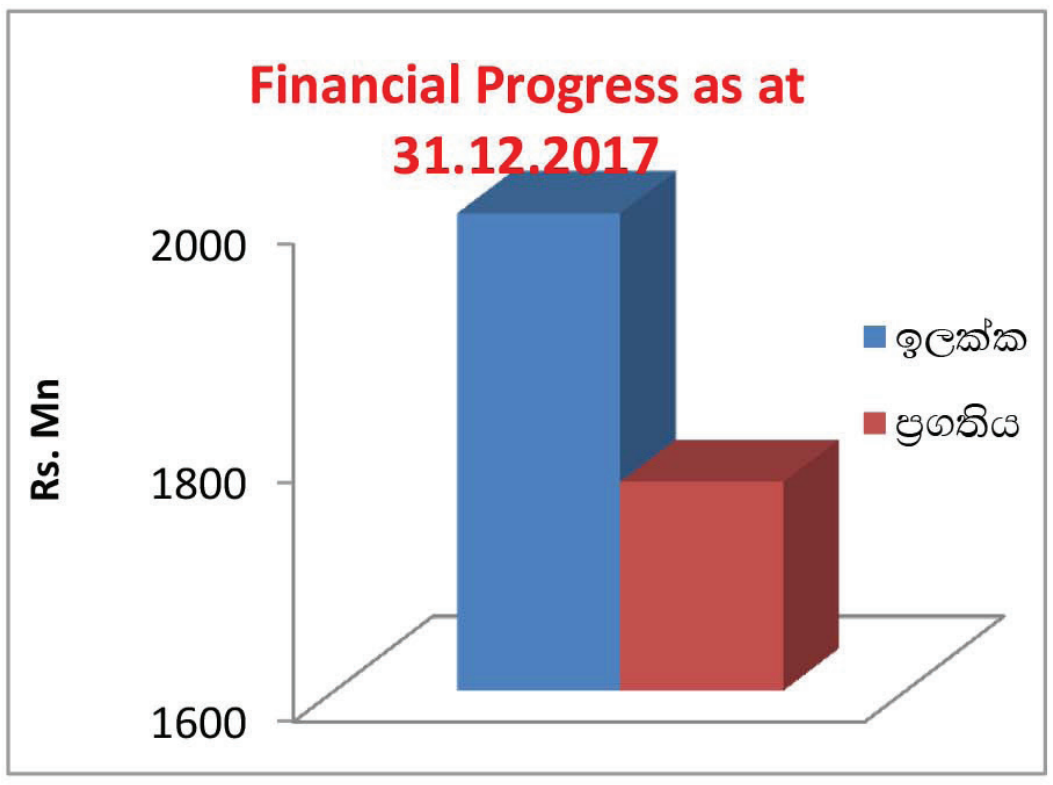

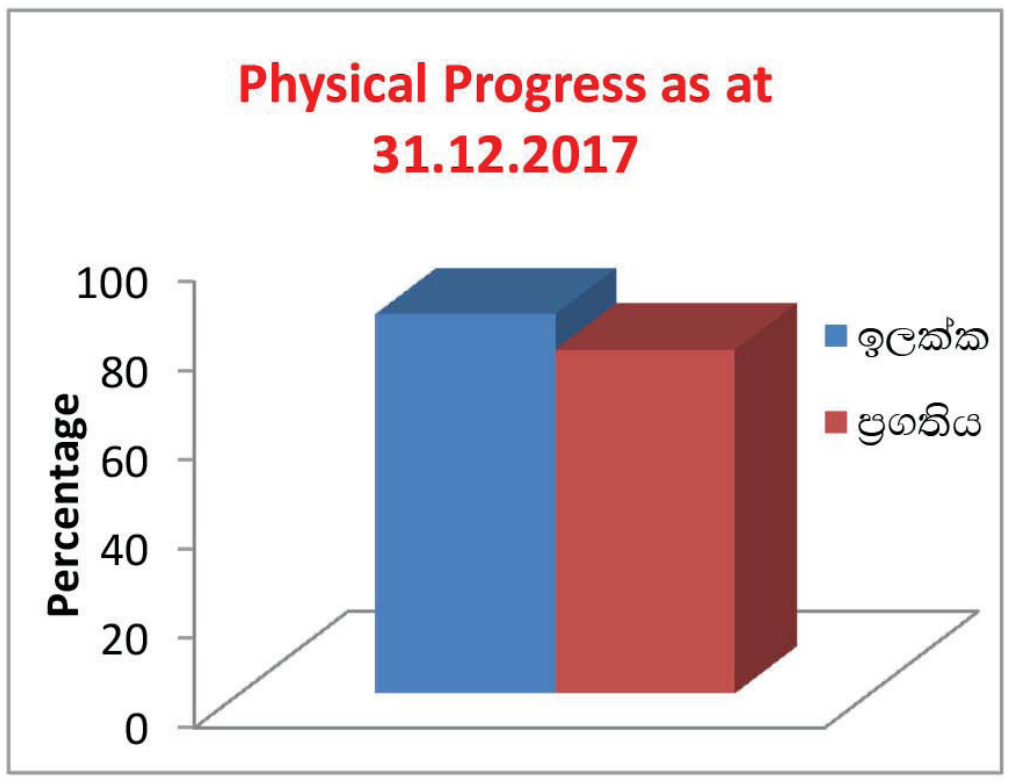

Expected Progress and Action Plan - 2017

No.	Description	Progress Achieved by 30th December 2017	Action Plan for 2018
01	Civil works contracts for restoring long sea outfalls at Wellawatta and Mutual	Work completed	Civil works contracts for restoring long sea outfalls at Wellawatta and Mutwal
02	Civil works contract for upsizing 10km length of under capacity sewers and carrying out of condition assessment of 125km length of sewers	wSewer cleaning and CCTV investigation 100% completed. U1, U3, T36 and T34 sites rehabilitation work completed. T1 site fully completed. Pipe joining at M26 is 93.4% completed Completed drainage pipe laying in 3.3. Km of Samudra Mawatha and Queen's Avenue using Micro tunneling technology.	Renovation of waste water drainage M26 up to Maligawatta PS.
03	Civil works contract for upgrading the 2 km length of sewers system in Wanathamulla area to solve frequent overflow of wastewater from Prison	662 meters of Sewer construction work along the Seevali Mawatha and Saranapalahimi Mawatha Completed and 27 number of manhole construction completed. Physical achievement 65% Contract terminated	Contract terminated

04	Rehabilitation of 14 waste water PS within Colombo Municipality	Physical progress of construction of new PS and rehabilitation are given below. Central Operation Unit and 4 new pump houses have been started. 84.4% works of main work station completed Wanathamulla PS 50% Maligawatta - 34.4% Borella - 2.7% Bambalapitya - 53.3% Wistwick- 40.7% Thimbirigasyaya - 32.4% CS3 - 19.5% SlaveIsland - 17.3% Total Physical Progress 28.9%	Construction of PS and laying of pipes in Wistwick, Wanathamulla
05	Rehabilitation of CS19 sewer and balance work of wanathamulla sewer upgrading contract	Procurement Process	Awarding the contract
06	Resettlement Activities	Under Gravity Sewer Contract, 11 of encroached families at railway quarters road and Mallikarama road are to be relocated at “Ran Diya Uyana” at Gonamulla	Resettlement is completed.

3.2.2.3. Greater Colombo Water & Waste Water Management Improvement Investment Programme- (GCWWMIIP)

Project 2 & 3

Greater Colombo Water and Wastewater Management Improvement Investment Programme aims at delivering efficient and reliable urban water supply and sewerage services in Greater Colombo area.

The Government, following the on-going finances for the urgent rehabilitation work of Colombo sewer system continues to fund for water and wastewater facilities in the city under multi tranche financing facility of the ADB. These funds for upgrading the system in the south catchment, expansion to facilitate the new developments, expansion of sewers to non-served areas and treatment of wastewater prior to sea disposal. Government has sought co-financing from the EIB to supplement the finances from the ADB.

Objectiv

To provide Efficient and Continuous water supply and proper waste water service within Colombo municipality.

Funding Agency	Asian Development Bank, Government of Sri Lanka	
Overall Project Cost (Rs.Mn)		
Project 2	1396.0	
Project 3	26,061.00	
Project Duration		
Project 2	2014-2019	
Project 3	2015-2020	
Implementing area	Colombo Municipality	
Total Financial Progress (Rs. Mn.)	902.53	
Total Physical Progress	6.8%	
Project 2		
Provisions for 2017 Rs. Mn.	280	
Financial target / progress as at 31.12.2017 (Rs. Mn)	280	74.3%
Physical target / progress as at 31.12.2017 (Rs. Mn)	26.9%	22.5%
Project 3		

Provisions for 2017 Rs. Mn.	2456	
Financial target / progress as at 31.12.2017 (Rs. Mn)	2456	776.1
Physical target / progress as at 31.12.2017 (Rs. Mn)	7.6%	5.9%

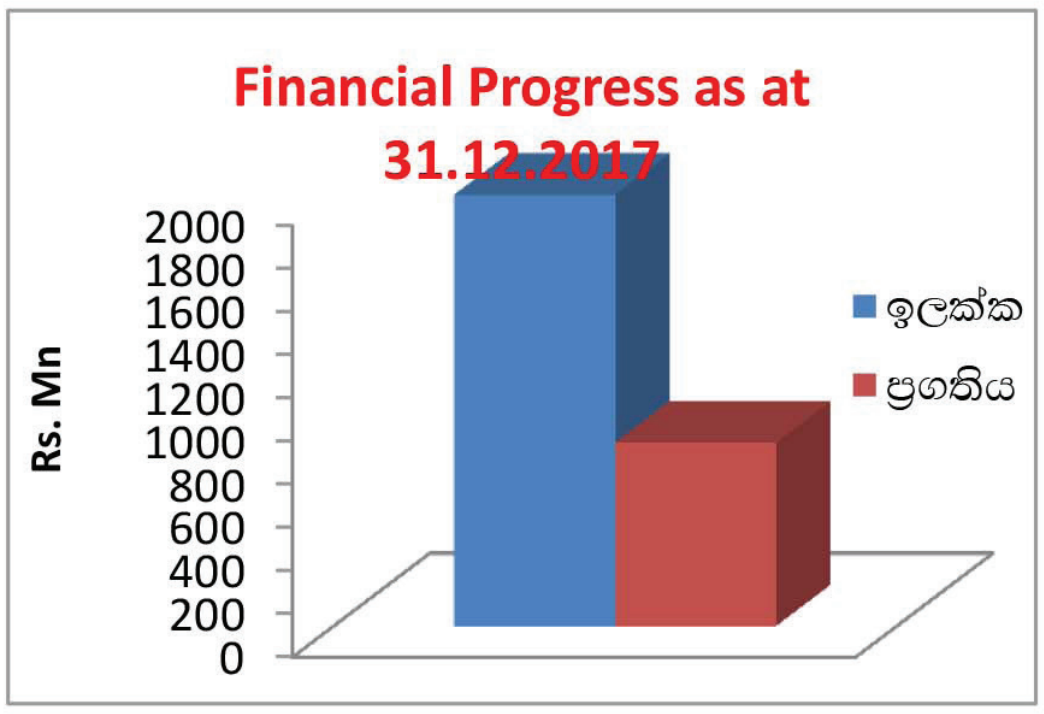

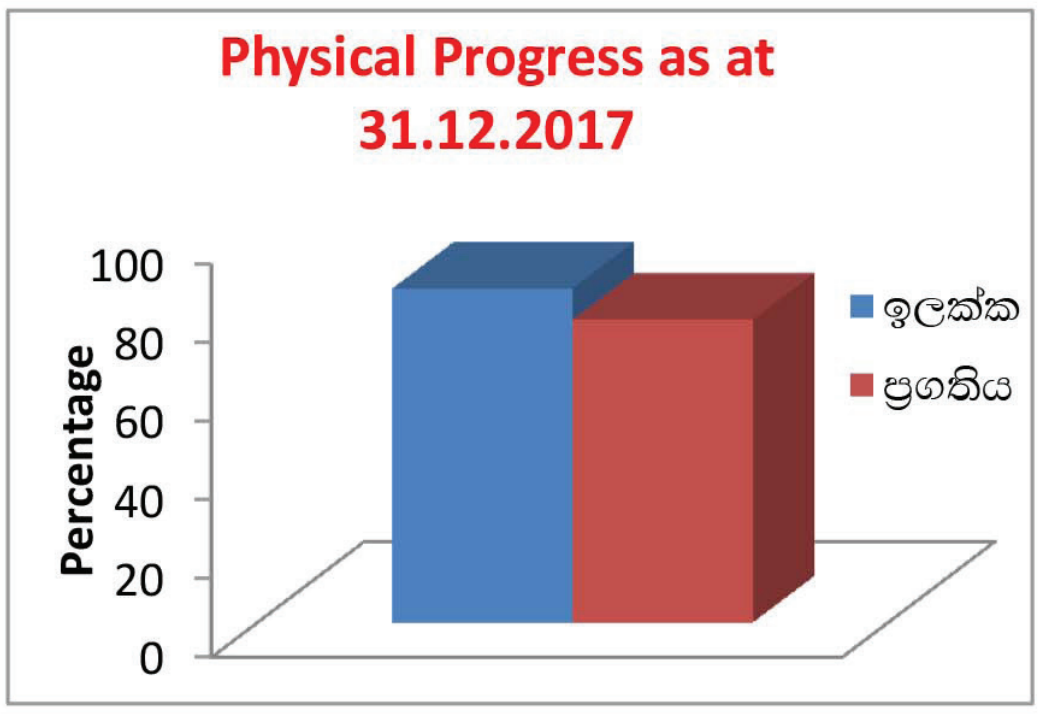

Expected Progress and Action Plans - 2018

No.	Description	Progress Achieved by 30th September 2017	Planned Activities for year 2018
01	Support of Design, Supervision and Institutional Development Consultants	Designing of Northern catchment Designing of Southern Catchment Physical Progress 16.5%.	Detailed design of sewer rehabilitation of southern catchment. Supervision of construction of Kirulapone sewer network and Wellawatta Waste Water Treatment Plant Expanded due to the Port City Project
02	Sewer cleaning, CCTV investigation and Condition Assessment in 125 Km of Waste Water Drainage System	Identifying required quantity surveying in waste water drainage system and procurement.	fmdïmd.dr iy wmc, mjdyk moaO;sfha bÈlsÍu

03	Laying 29.40 km of sewer network and constructing three pump stations to cover currently unserved Kirulapona area in the south catchment area of Colombo	Works in progress. Physical Progress 7.4%.	fldka;%d;a m%odkh lsÍu iy wmc, mjdyk moaO;sfha w¨;ajeähd lghq;= lsÍu
04	Rehabilitation, replacement, repair and cleaning of sewer reticulation system of 15.61 km in South catchment area of Colombo to address sewer damages, blockages and siltation problems, under capacity issues and realignment needs	Designing Process is on going Progress 10.4%.	Award the Contract and rehabilitation of sewers.
05	Laying 6.22 km of sewer network and the construction of three pump stations to cover two other unserved areas in the south catchment area of Colombo	Investigation of soil samples, field inspections, designing of sewers and PS Physical Progress 22%.	Award the Contract and construction of sewers
06	Construction of 50,000 cubic meters per day capacity secondary treatment plant at Wellawatta on a Design-Build-Operate basis	Procurement is in progress. Physical Progress 5%.	Award of the contract, investigation and designing.
07	Resettlement	Making arrangements for resettlement of 10 families in Kolonnawa “Laksiri Sewana” under Kirulapana waste water project.	Resettlement of the families.

19.6.2017 08:52

12.5.2017 08:22

D.P. JAYASINGHE
7.6.2017 11:14

3.2.2.4. Northern Road Connectivity Project (Original)

Objective

Improvement of the relationships within the province by upgrading the road network of the two districts; Vavuniya and Mannar in Northern Province and strengthening the Northern Provincial Road Development Department.

Funding Agency	Asian Development Bank	
Project Cost (Rs. Mn)	3600.00	
Project Duration	2010 - 2016	
Project Area	උතුරු පළාත	
Total Physical Progress	100%	
Total Financial Progress (Rs. Mn)	3281.11	
Allocation for 2017	200.31	
Financial Targets/ Progress as at 31.12.2017	200.31	149.78
Physical Targets/ Progress as at 31.12.2017	100%	100%

On the request made by the Government of Sri Lanka, the Asian Development Bank (ADB) has provided a loan equivalent of US$ 173 Million to the Government of Sri Lanka for rehabilitation of both National and Provincial roads in the Northern region. Under Provincial Component, with a loan provision of US$ 24.4, it is expected to rehabilitate approximately 154km of provincial roads and enhanced project management capability of Northern Provincial Road Development Department (NPRDD) achieving efficient project implementation.

Implementing Agency

Provincial Road Development Department of Northern Province

Physical Progress

08 contracts of roads and 01 building contract of Northern Province has been awarded under the provincial component of this project and all contracts have been completed.

eLibrary Project

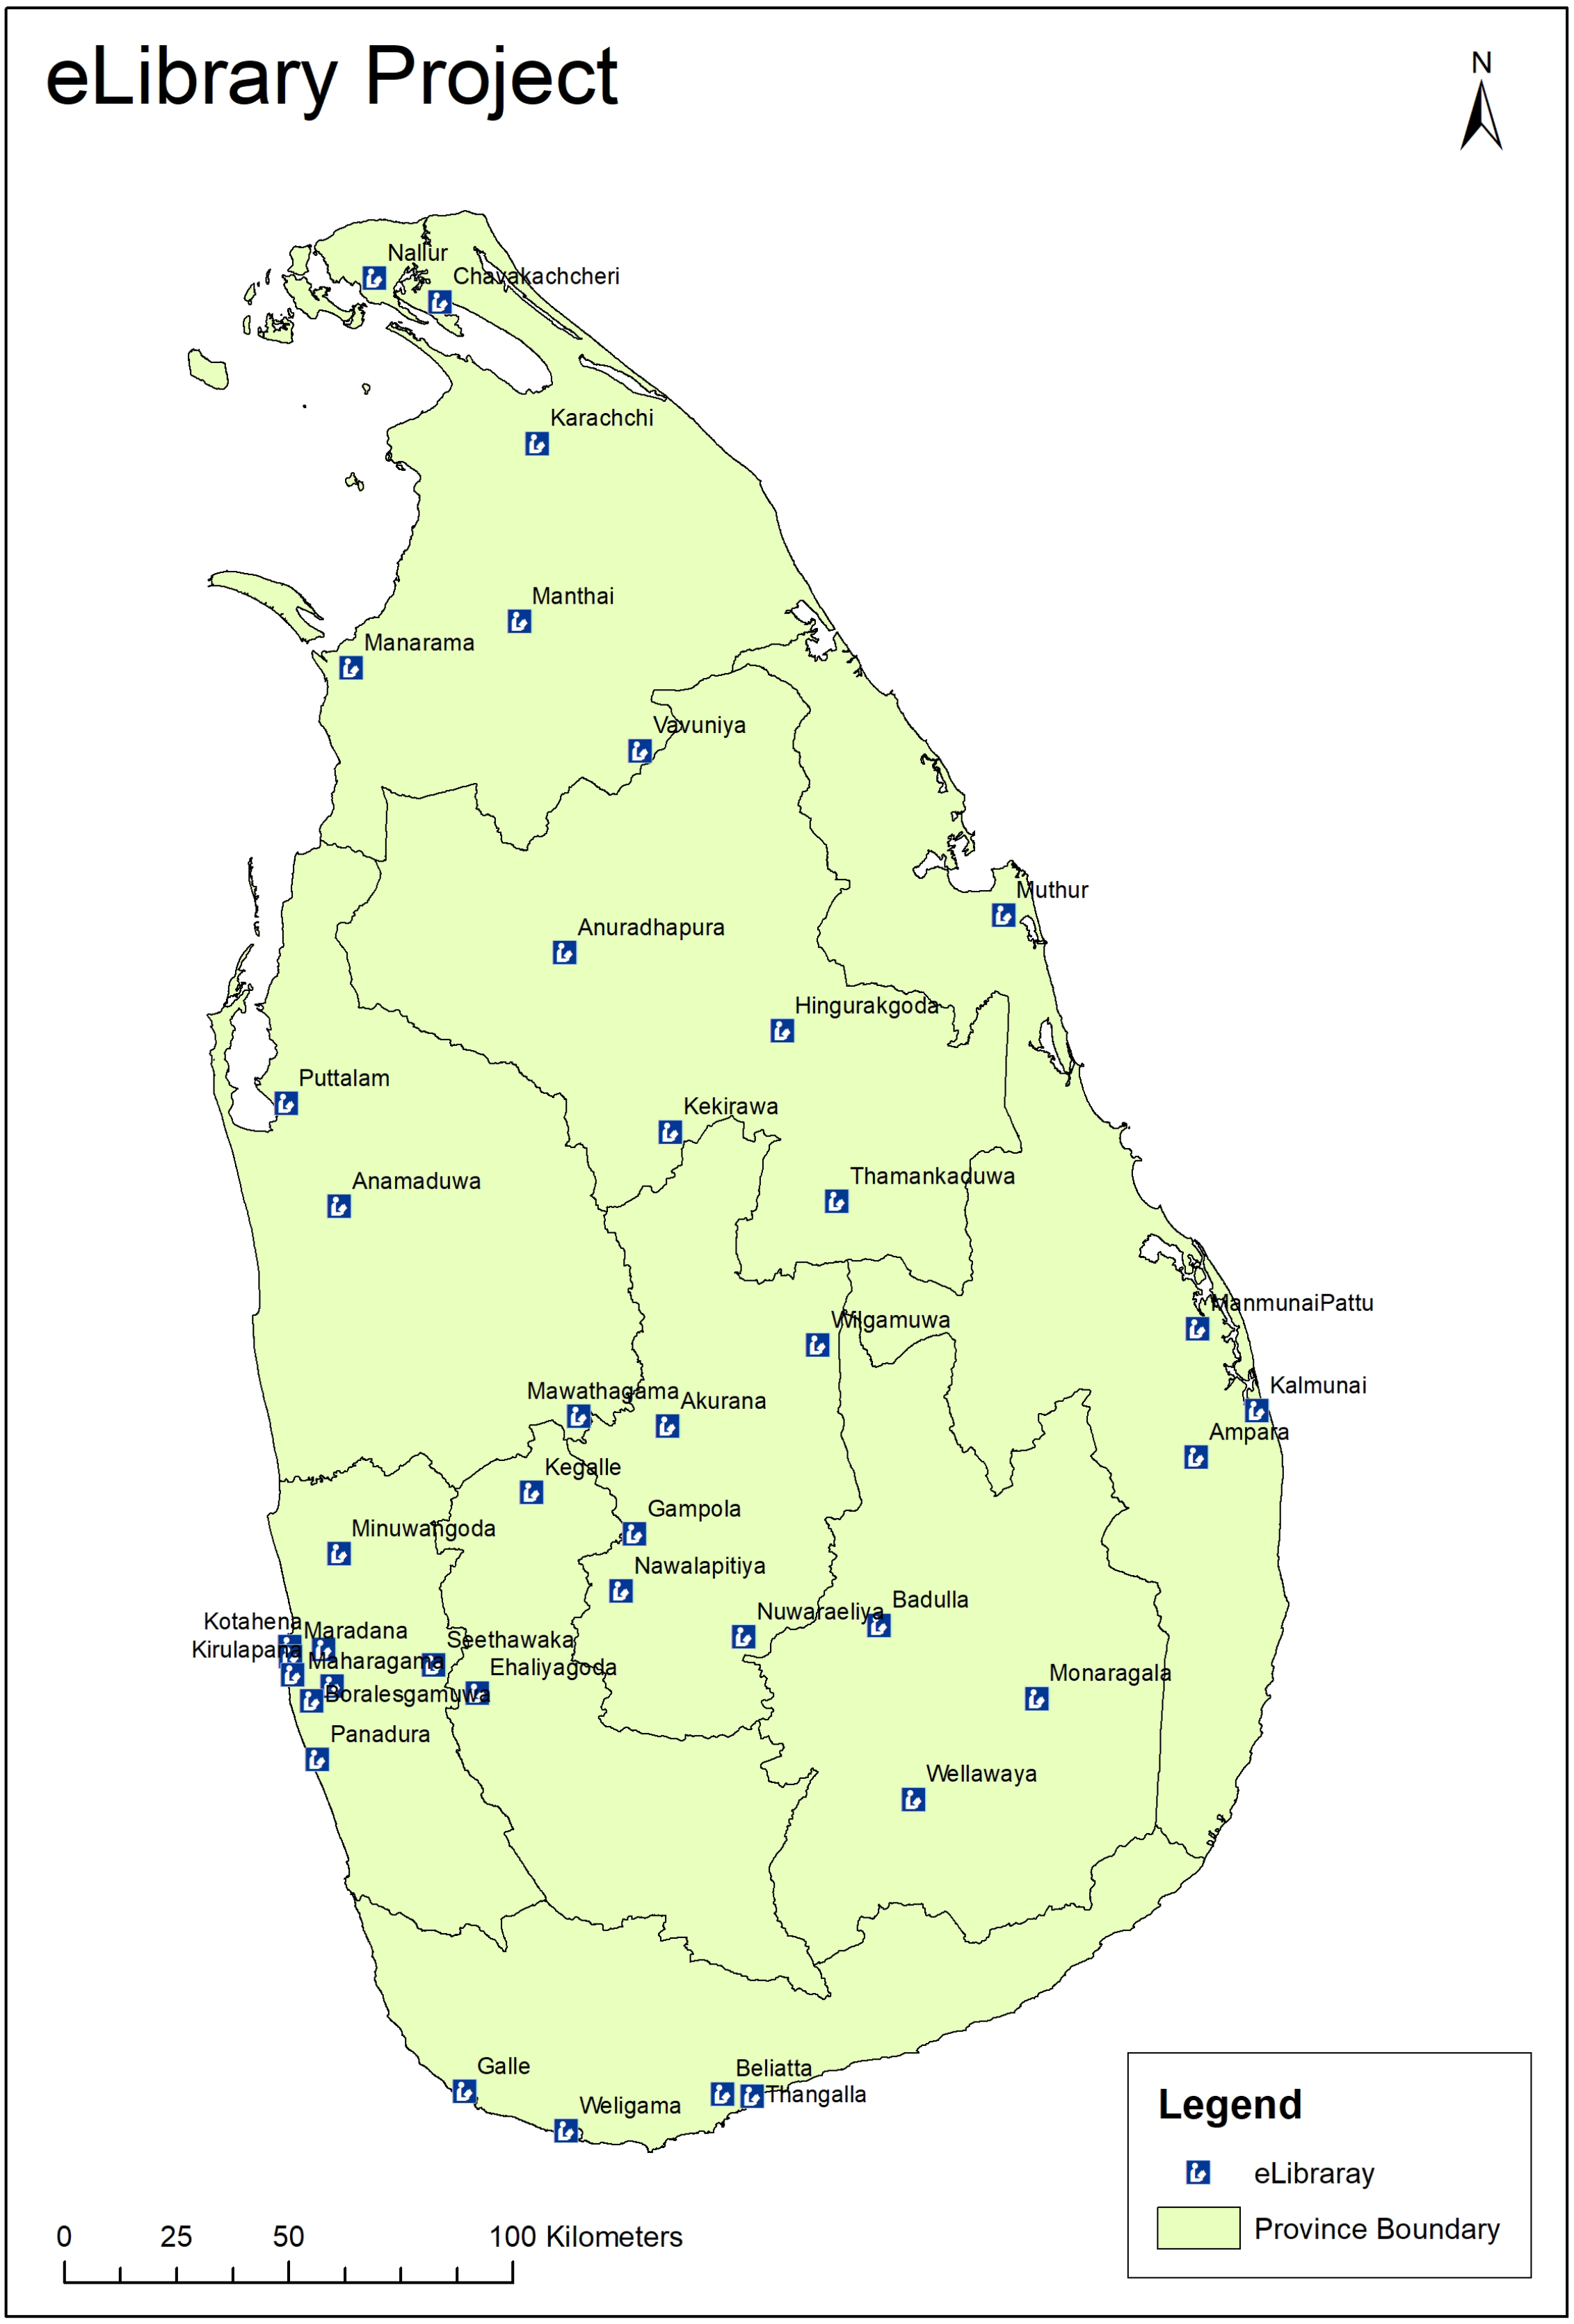

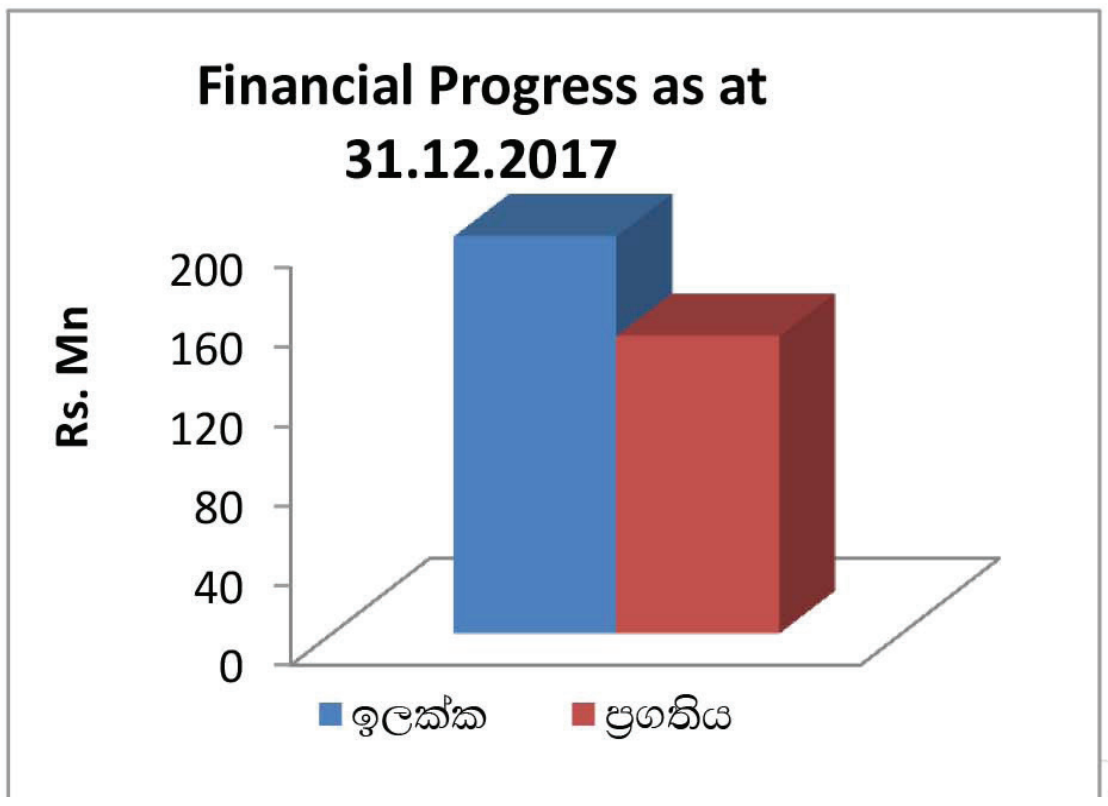

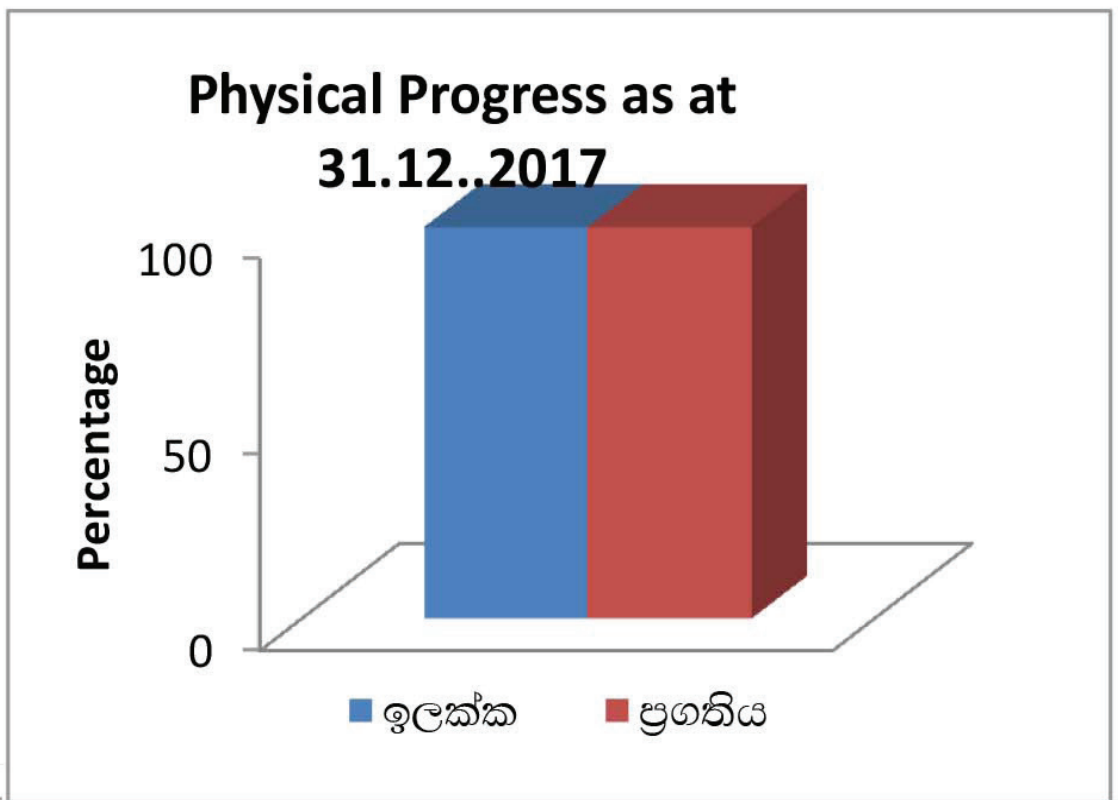

Table 17 - Progress – Northern Roads Connectivity Project (Original) - (As at 31.12.2017)

Contract Number	District	Contract Value	Revised BOQ	Actual expenditure	Financial Progress (%)	Project Period		Physical Progress	
						Date of Start	Date of completion		
NP - 01	Mannar	414.06	457.93	437.12	95.46%	2011-10-02	21/06/2013	100%	100%
NP - 02		413.23	454.72	448.03	98.53%	2011-11-02	31/05/2014	Mutually Terminated	
NP - 03		371.68	378.32	364.34	96.31%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 02R		345.54	345.54	313.67	90.78%	24/02/2015	31/07/2016	100%	100%
NP - 09		507.69	507.69	455.84	89.79%	16/03/2015	30/09/2016	100%	100%
NP - 04	Vavuniya	351.92	351.92	312.40	88.77%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 05		390.64	448.44	426.08	95.02%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 06			279.11	263.38	94.36%	2011-10-02	31/05/2014	100%	100%
NP - 07	Jaffna PRDD Building	76.69	88.24	83.32	94.42%	2014-10-06	2015-09-06	100%	100%
Total		3,227	3,312	3,104.18					

Source – Northern road Connectivity Project (Original

NP- 03 - Uinkulama-Mankulama Nanattan Culvert Construction

NP- 03 – Uinkulama-Mankulama Nanattan Culvert Construction

NP- 02R - Veppankulam Periyamurippu Road (MAC029)

NP- 02R - Veppankulam Periyamurippu Road (MAC029)

NP- 09 - Mahilankulam Pallamadu Road (MAC028)

NP- 09 - Mahilankulam Pallamadu Road (MAC028)

NP- 04 - Iretperiyakulam Puthoor Road (VAC027)

NP- 04 - Pandichurichan Andiyappuliyankulam Road (VAC034)

Development Projects 2015 -2018

Ministry of Provincial Councils & Local Government

	Projects	Funding Source	Project Value (LKR Mn)
	Puraneguma	ADB	10,184.00
	Rural Bridges	UK, Netherland	44,100.00
	Rural Infrastructure Development in Emerging Region (RIDEP)	JICA	21,186.00
	Second Health Sector Development Project (SHSDP)	World Bank	26,000.00
	Northern Road Connectivity Project (NRCP)	ADB	4,600.00
	Transforming the School Education System (TSEP)	World Bank	13,000.00
	General Education Modernization Project (GEM)	World Bank	15,500.00
	Grater Colombo Waste Water Management Project (GCWWMP)	ADB,EIB	43,006.00
	North East Local Services Improvement Project	World Bank	13,600.00
	Iranamadu Irrigation Development Project	IFAD	3,250.00
	Jaffna Kilinochchi Water Supply & Sanitation Project (JKWS&SP)	ADB	1,881.00
	Total Project Value		**196,307.00**
	Local Funded Development Project	GOSL	6567.00

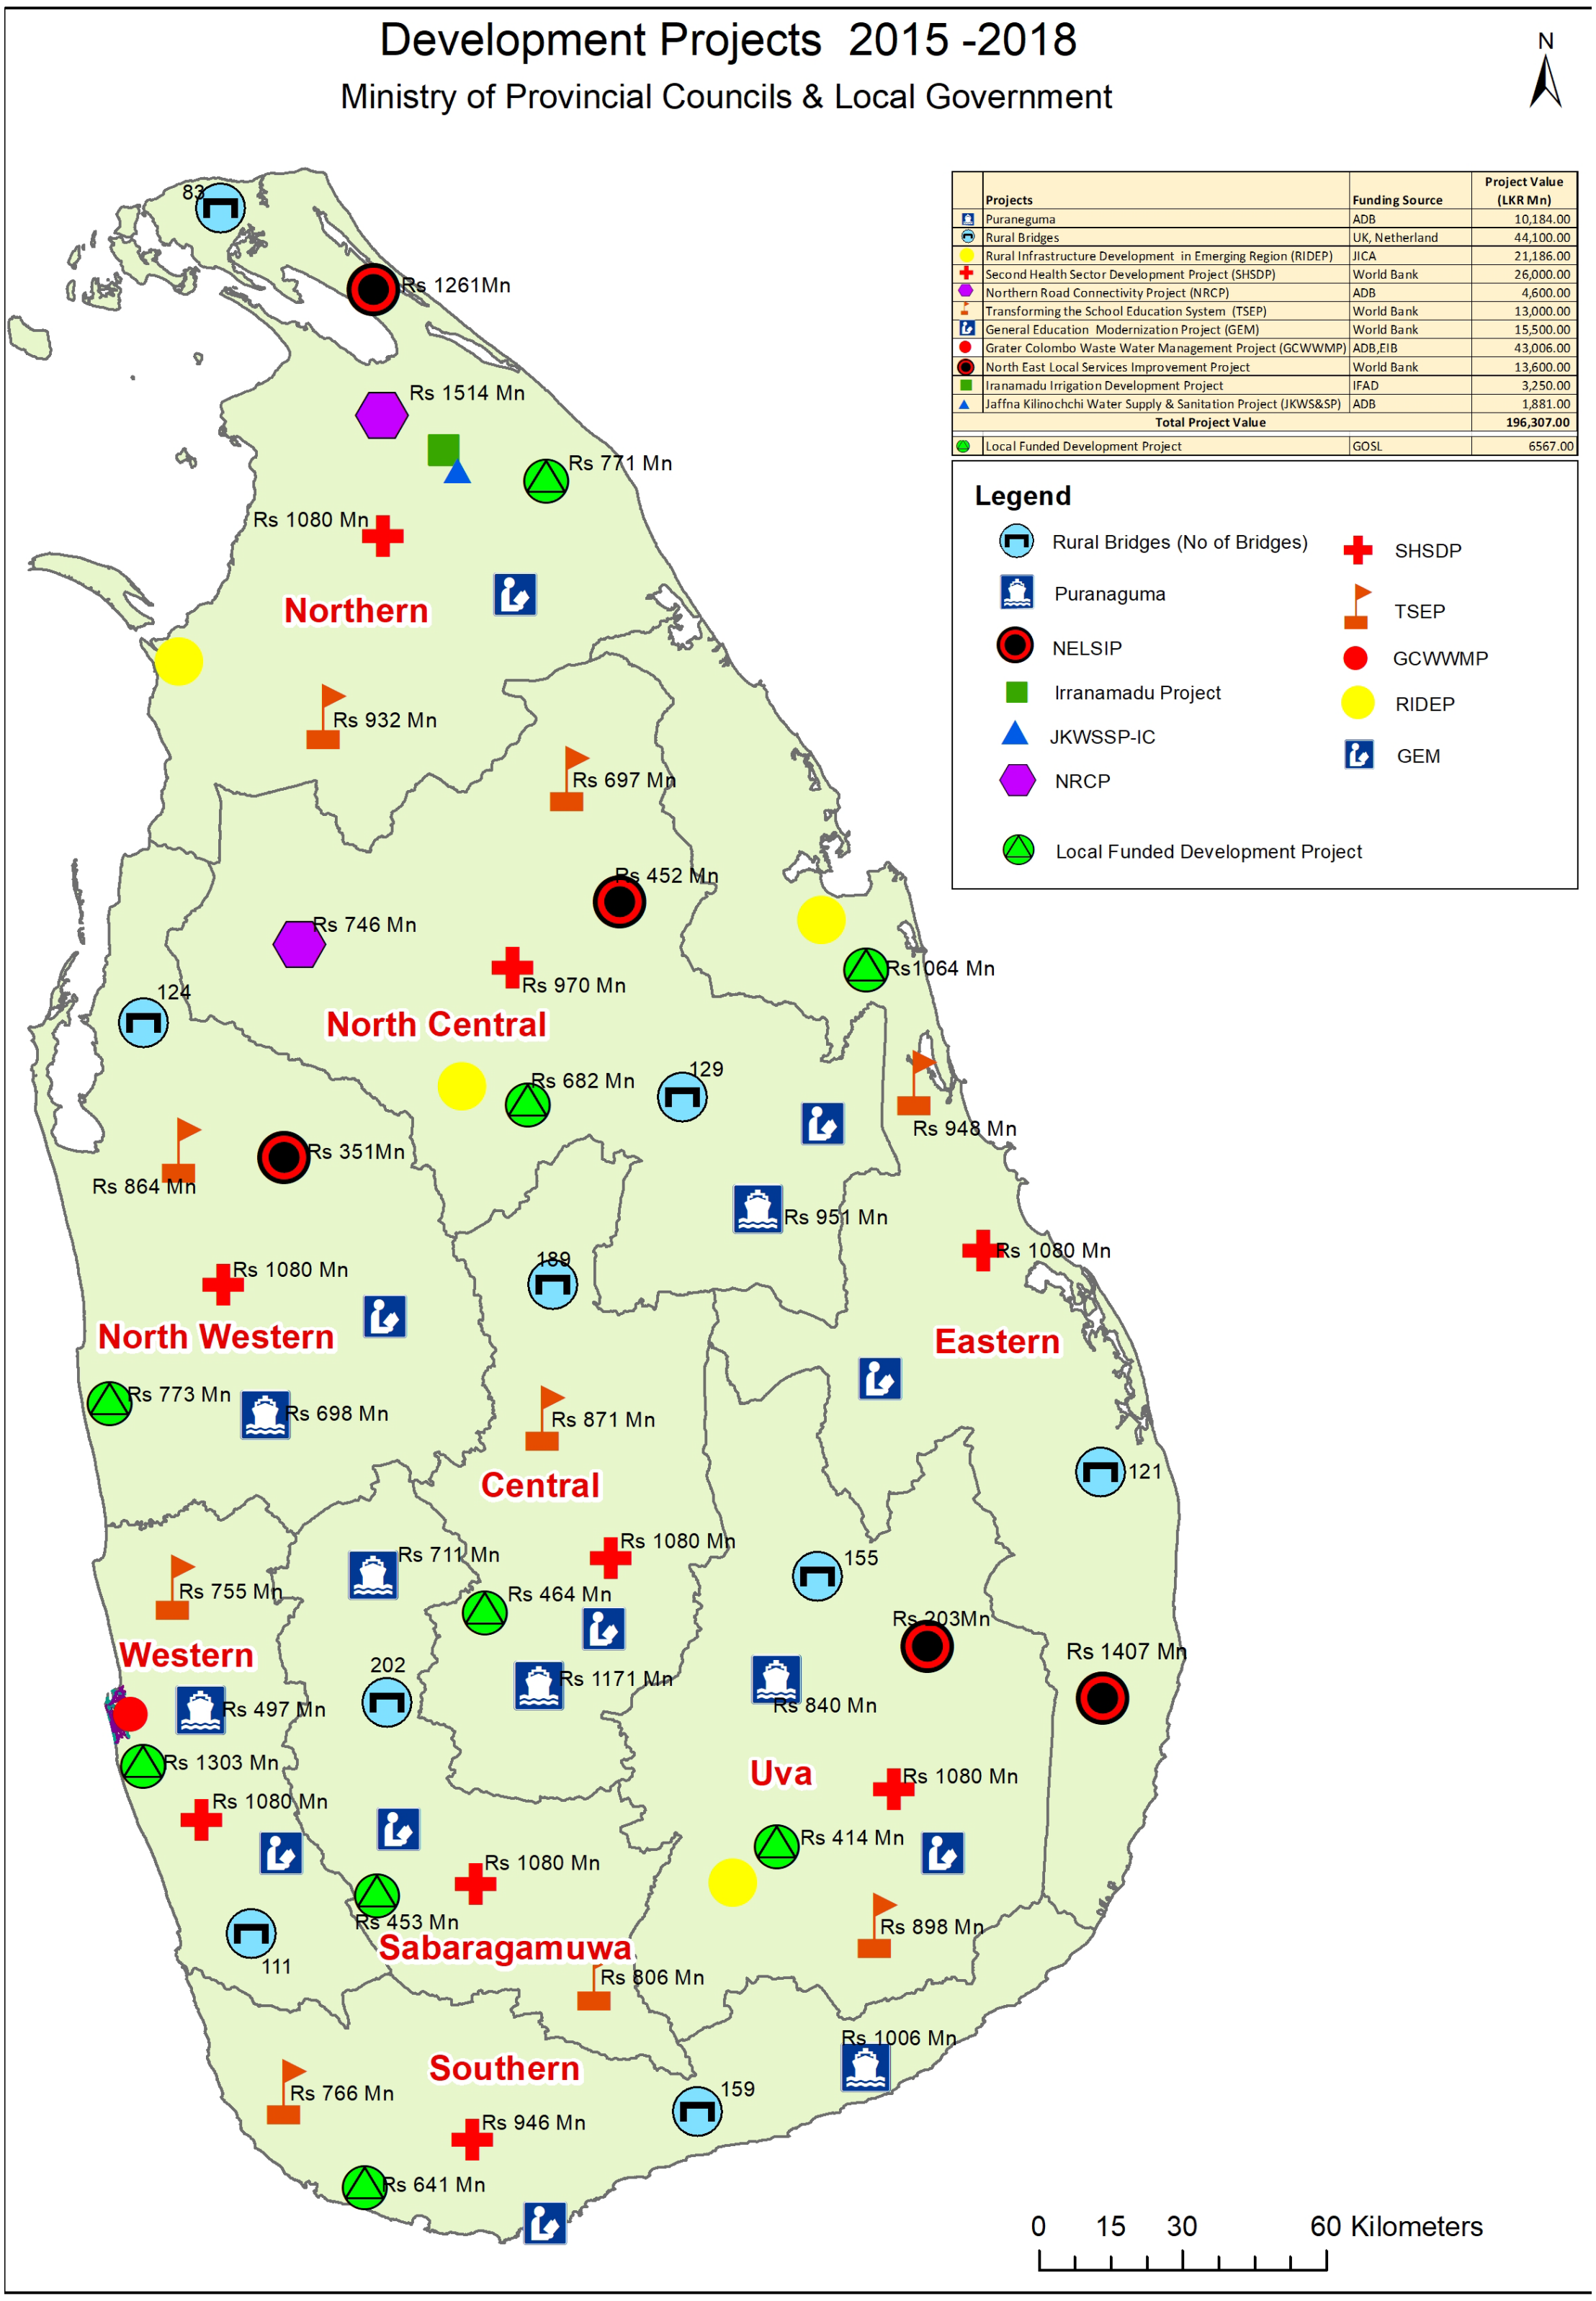

NP- 05 - Madukanthai Iretperiyakulam Road (VAC007)

NP- 05 - Mahilankulam Pallamadu Road (VAC010)

NP- 5 – Mahilanulam Pallmadu Road

NP- 05 – Madukanda Irattaperiyakulam Road

NP- 06 - Mankulam Maruthamadu Mingettigama Road (VAC032)

NP- 06 - Puthoor Palamoddai Road (VAC014)

3.2.2.5. Northern Road Connectivity Project (Additional Financing)

Objective:
Improvement of the internal relationships within the province through the enhancement of the road network in Killinochchi and Mullaitivu districts in Northern Province and Anuradhapura District in North Central Province and strengthening Provincial Road Development institutes.

Funding Agency	ASIAN Development Bank	
Project Cost (Rs.Mn)	4,600.00	
Project Period	2013 - 2018	
Project Area	Northern and North Central Provinces	
Overall Physical Progress	98%	
Overall Financial Progress (Rs.Mn)	4104.26	
2017 Allocation (Rs. Mn)	600.72	
Financial Target/ Progress as at 31.12.2017	600.00	360.76
Physical Target/ Progress as at 31.12.2017	100%	98%

Puraneguma Project 2015-2017

Ministry of Provincial Councils & Local Government

N

Province	Year	No of Sub Projects
Central	2015	18
	2016	6
	2017	5
North Central	2015	14
	2016	12
	2017	4
North Western	2015	19
	2017	2
Sabaragamuwa	2015	9
	2016	15
Southern	2015	20
	2016	7
Uva	2015	23
	2016	4
	2017	2
Western	2015	10
	2016	4
	2017	3
Grand Total		177

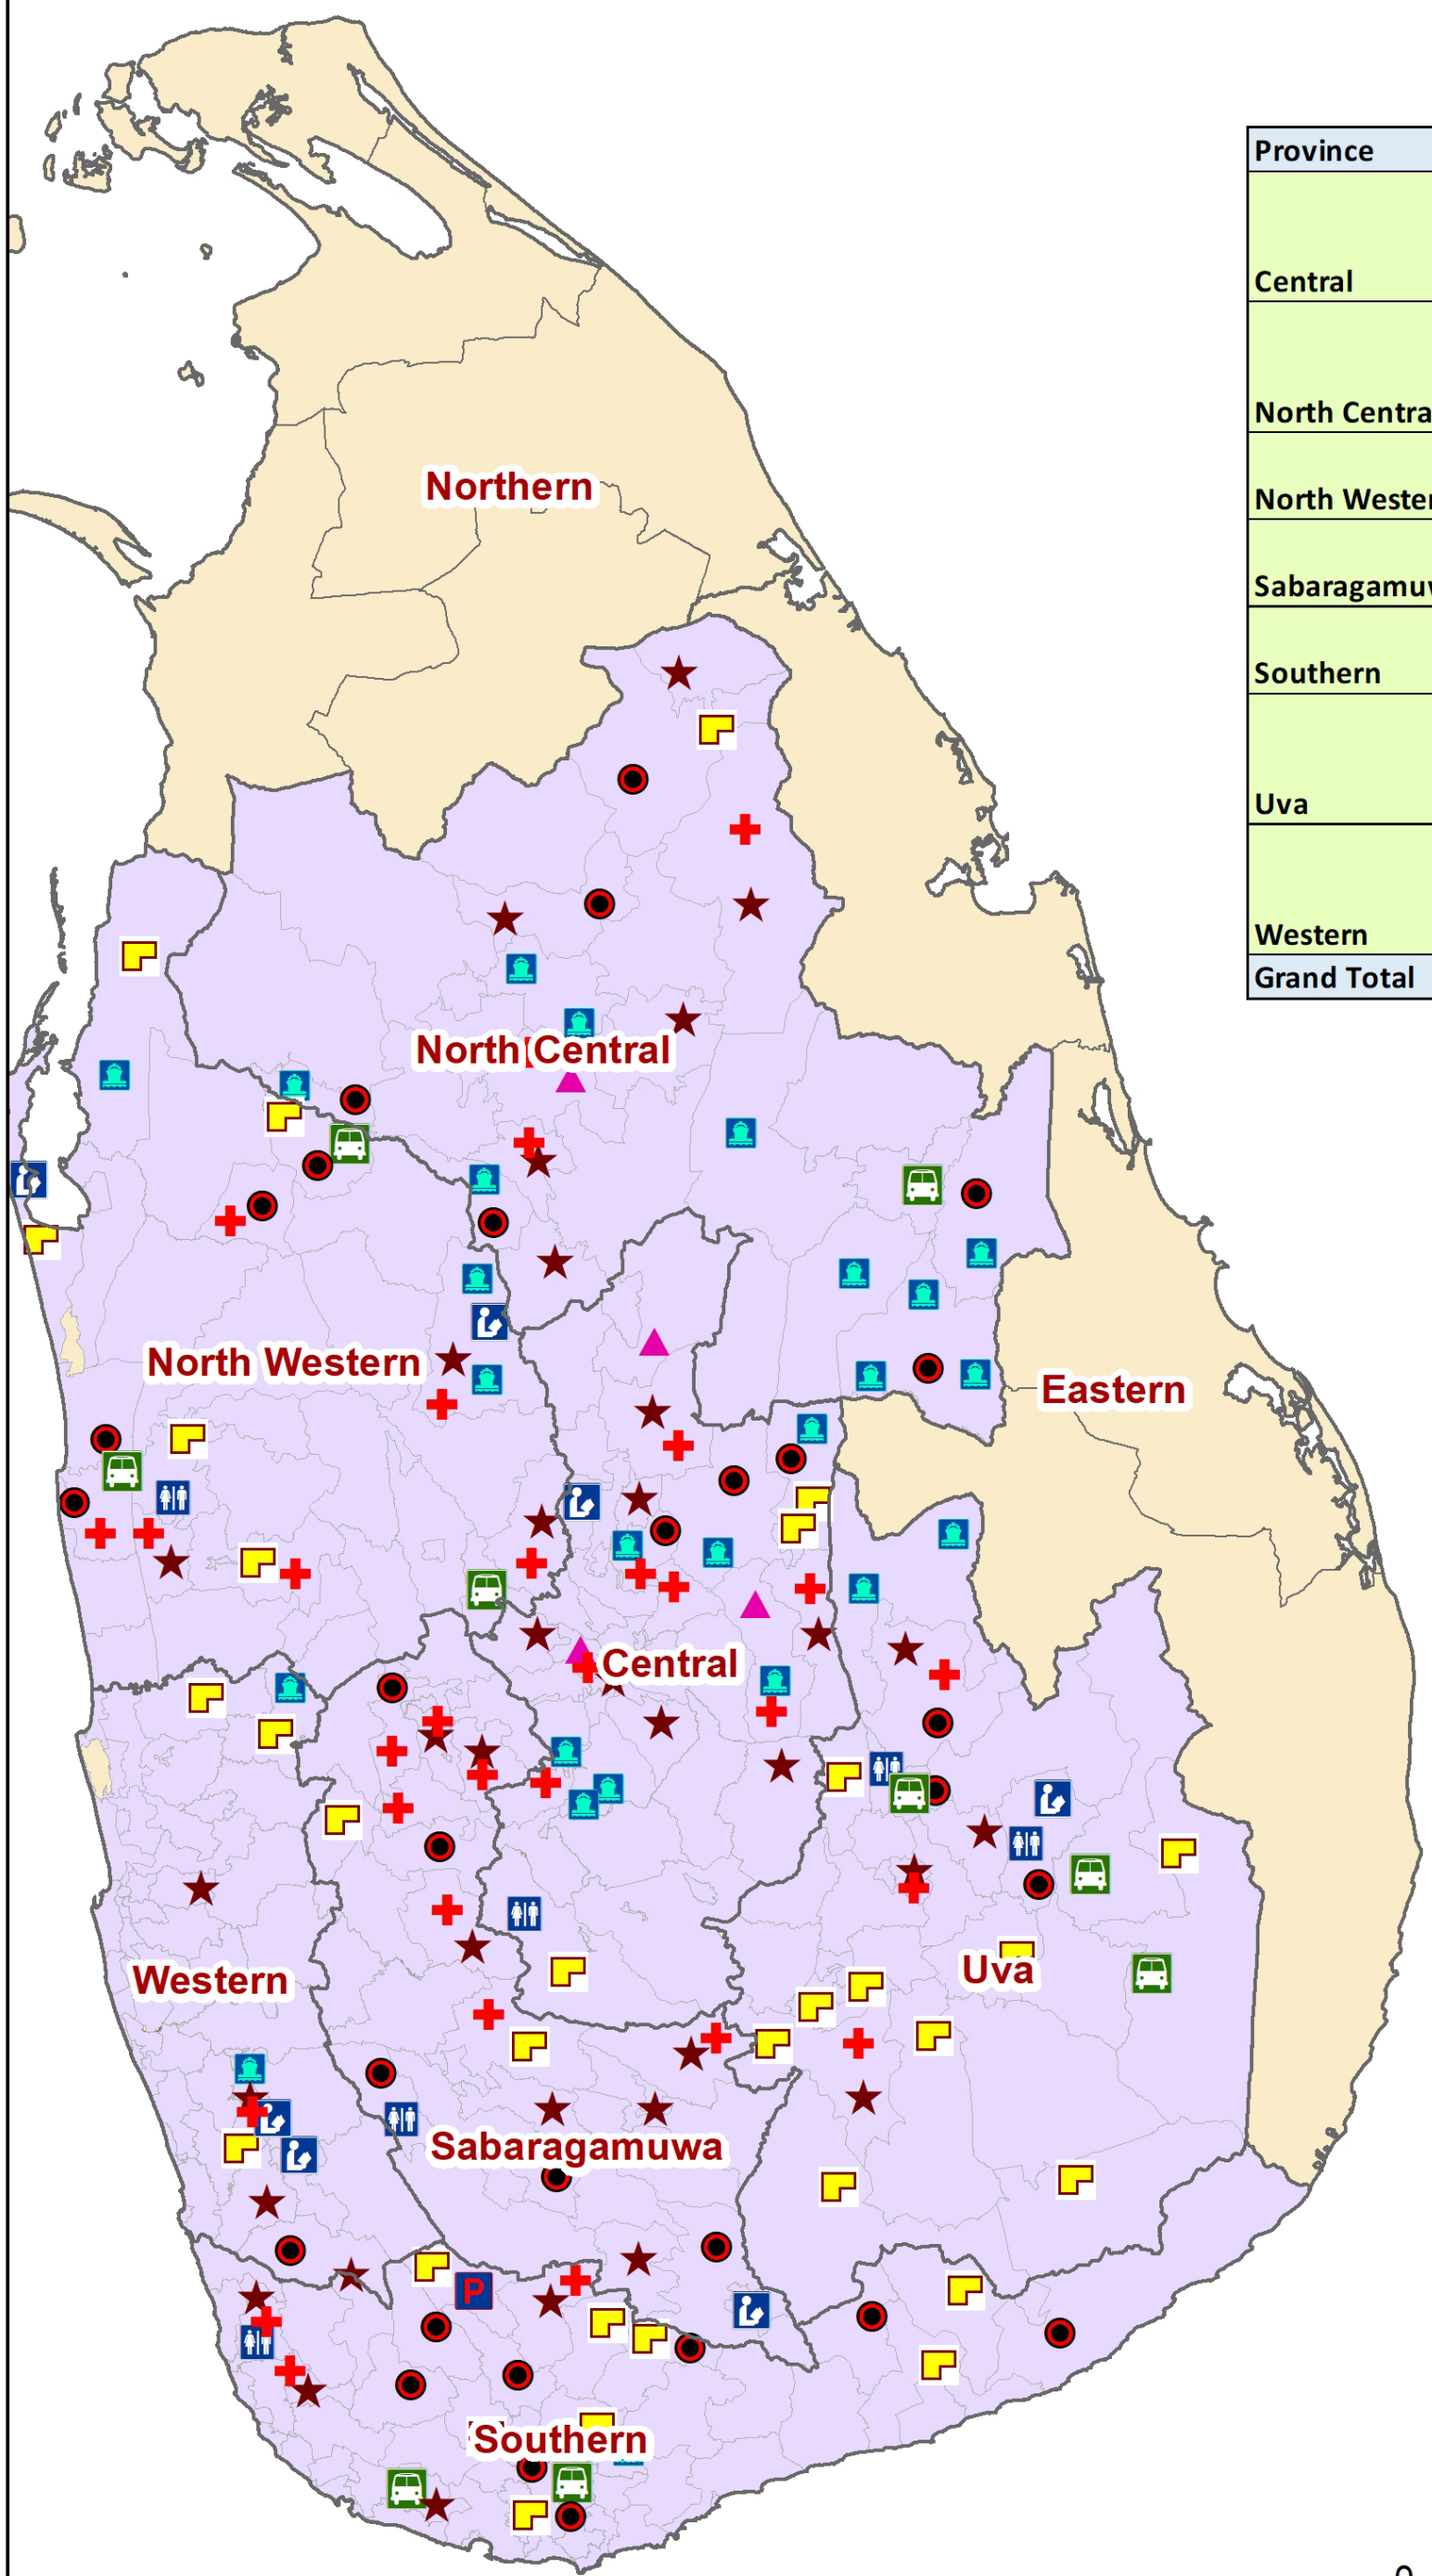

Legend

Puraneguma Projects

- Office Building
- Water Supply Project
- Weeky Fair
- Multipurpose Building
- Public Toilet
- Community Hall
- Library Building
- Bus Stand
- Health Center
- Vehicle Park
- Local Authority Boundary
- Province Boundary

0 15 30 60 Kilometers

Note: This Map shows selected main projects only

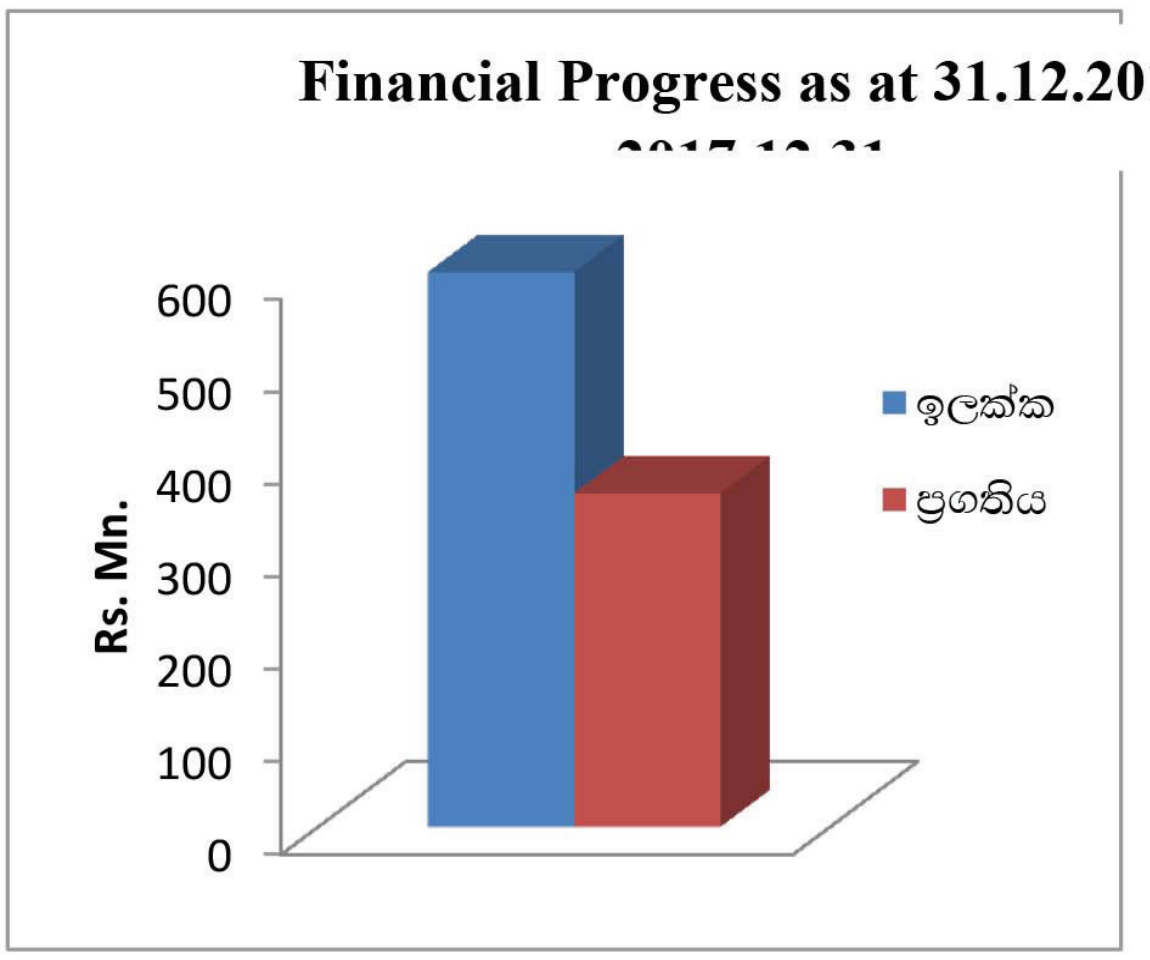

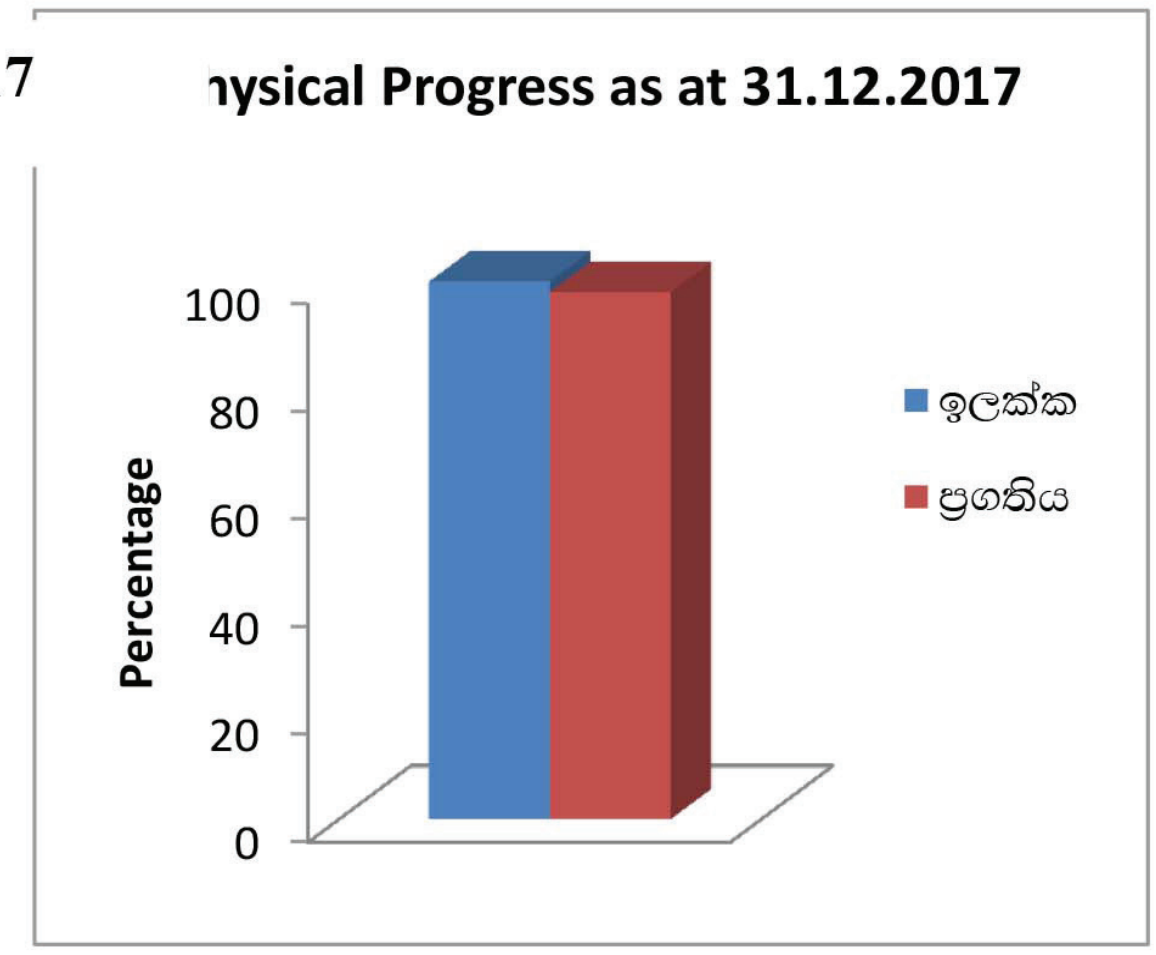

Because of better performance of the original project and with the request made by the Government of Sri Lanka, the Asian Development Bank decided to provide additional Financing to Northern Road Connectivity project of 68 million for rehabilitation of both national roads and provincial roads out of which US$ 30 million was allocated for rehabilitating further 125 km of provincial roads in Killinochchi, Mullitivu Districts in Northern Province and Anuradhapura District in North Central Province in addition to the capacity building of two provincial road agencies established under the two provincial councils.

Implementing Agency

Northern Provincial Road Development Authority and North Central Provincial Road Development Authority

Physical Progress

05 road contracts in North Central Province and 04 road contracts in Northern Province have been granted under additional financing. Among them all 05 contracts in North Central Province and 04 contracts in Northern Province have been completed. Further, the contractors will maintain the roads for five years continuously. It is support to sustainability of the roads constructed under the project.

NRCP/NP/NCB/MU-03
Vattapalai Keppaipilavu Puthukudiyiruppu Road (MUC011)

NRCP/NP/NCB/MU-03
Vattapalai Keppaipilavu Puthukudiyiruppu Road (MUC011)

NRCP/NP/NCB/KL-06
L.B Main Chl.Road Akkarayankulam Road
(KLC004)

NRCP/NP/NCB/KL-06
R.B Main Chl.Road Akkarayankulam Road
(KLC014)

Kennady Road

Oddusuddan – Pudukudirippu Mathalan Road

Table No 18 - on-going road constructions, Northern Road Connectivity Project (Additional Provisions)

Province	District	Road	Length (Km)	Estimate Rs. Mn	Expenditure Rs. Mn.	Financial Progress%	Physical Progress	
							Target	Progress %
Northern Province	Killinochchi	L B Main Road Akkarayankulam Road (7.06Km) R B Main Chi Road Akkarayankulam Road (6.6 Km)	13.66	473.19	307.45	64.97%	100%	78%
		Kennady Road(7.10Km) Access Road to Farm(3.35Km)	10.45	456.55	451.33	98.86%	100%	100%
	Mullaithivu	Vattapalai-Keppaipilavu Pudhukidiyiruppu Road Oddusuddan	12.85	647.63	566.21	87.43%	100%	97%
		Puthukudiyiruppu Pudumathalan Road	11.64	463.38	421.75	91.39%	100%	100%
North Central Province	Anuradhapura	Kebithigollewa-Hendagala Road	12.09	295.34	282.11	95.52%	100%	100%
		Dachchidamana-Paranahalmillewa Road (4.70Km) Thekkawatte-Pulleliya Road(5.65Km)	10.35	343.31	266.94	77.76%	100%	100%
		Kiriketiwewa-Bandaraulpotha-Kapugollewa Road	20.30	559.91	484.51	86.53%	100%	100%
		Yakawewa-Mahakongaskada Road	13.80	458.55	388.63	84.75%	100%	100%
		Ethaakada-Etambagaskada-Tonigala Road(6.80Km) Kirigollewa-Hirallugama Road(11.50Km)	18.30	408.80	356.25	87.15%	100%	100%
Total			**124.25**	**4104.81**	**853.98**	**85.88**		

3.2.2.6. Jaffna - Kilinochchi Water Supply and Sanitation Project

Objectives

This is the first irrigation project designed for the improvement of water supply service in Jaffna and Kilinochchi Districts and strengthening of the programmes on sanitation infrastructure in of the public within Jaffna Municipality and water supply in Jaffna peninsula. Among these approaches, water management, agriculture and marketing are outstanding. Major activities implemented under the above programmes are integrated irrigation management, allocation of finance for maintenance, planning of agricultural activities and establishment of project committees, distribution of water under the extensive water supply methodology, marketing promotions to enter into agreements and granting loans for agriculture.

Key outputs and impact of this project contributed to uplift the life standards of the public of Northern Province and to develop agriculture in and outstanding manner.

- Enhancement of project outputs and productivity of agriculture
- Rehabilitation of Irrigation System
- Increase of the productivity of lands(243 ha)
- Increase of the utilization of lands for cultivations
- Increase of growth of cultivation

Outputs and Impacts of the Project

Total production of agriculture mainly within the project area increased. Accordingly, the following impacts were on the agriculture of Northern Province.

1. Rehabilitation of the irrigation system
2. Extension of the entire irrigation system

Under this the following improvements were made;

- Increase of the production of the cultivations by 50%
- Increase of the cultivation area by 688 ha.
- Increase in growth of cultivations by 23%.

The following technology was used for the rehabilitation of Iranamadu reservoir.

Strengthening of the wall to control water leakage

Water capacity above 30m could not be maintained due to this leakage. Hence a moat was made through this wall strengthened it with a layer of clay. Afterwards, the moat was filled with Bentoit mixture and removed it later to strengthen it. Again the moat was filled with soil, cement, bentoit and water. This technology could stop the leakage of water. Such prepared wall was named as SCB

Implementation of Mechanical Radial Spills

A Mechanical Radial Spills was fixed in place of Non- Mechanical Radial Spills. Hence, functioning of spills could be increased from 0.025 to lift 2m by 3m.

Funding agency	Asian Development Bank	
Funding agency	2,178.57	
Project cost (Rs. Mn)	2012 - 2020	
Project Duration	Kilinochchi District	
project Area	87%	
Total Physical Progress	1,742.53	
Total Financial Progress (Rs. Mn)	909.00	
Allocation for 2017	909.00	940.52
Financial targets/progress as at fourth quarter of 2017	100%	80%

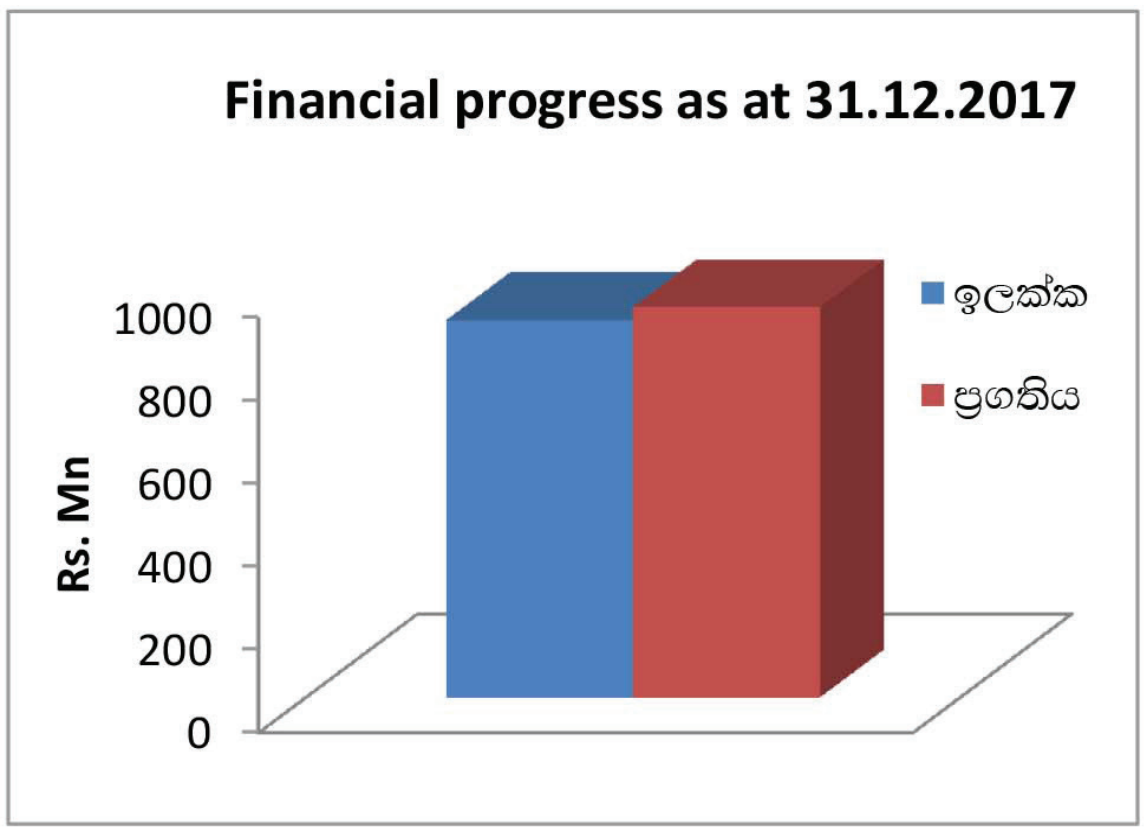

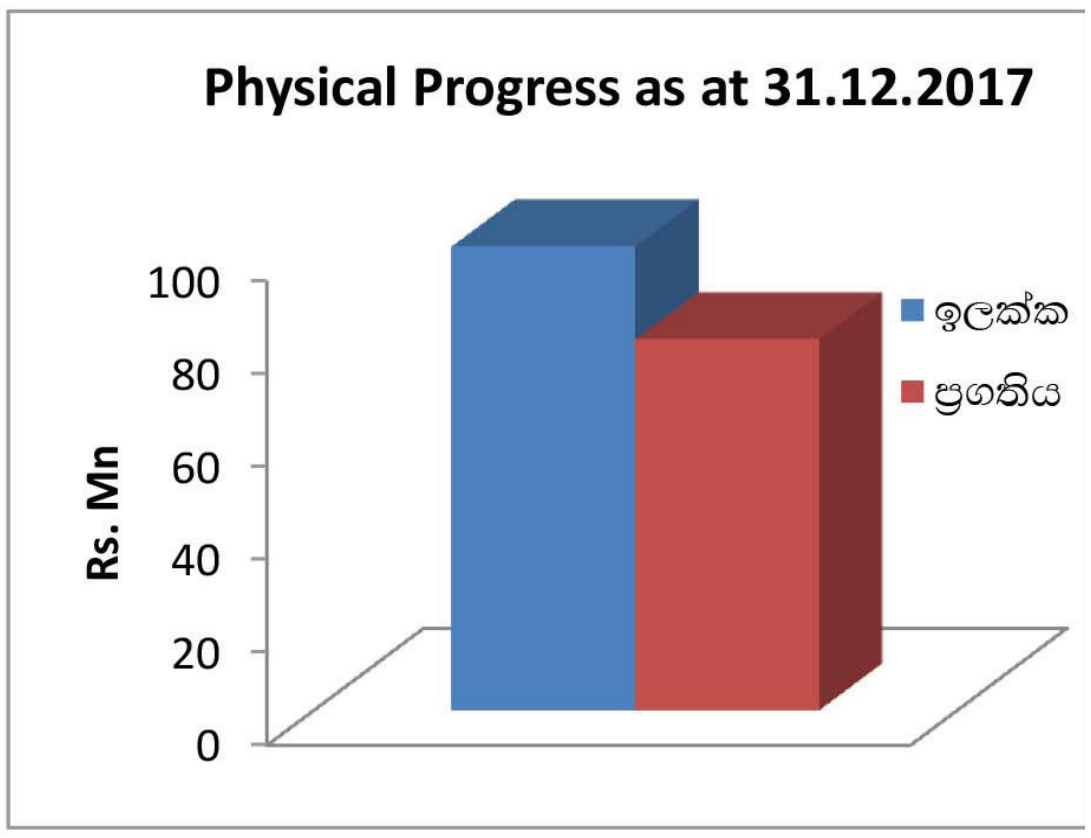

The Purpose of this project is to complete the broadened and rehabilitated Iranamadu reservoir and last irrigation system rehabilitated under Iranamadu reservoir.

This project would benefit 10,000 farming families and the agro area is 8455 ha. Although 447 of lands could be cultivated under Thiruvaiaru lift irrigation scheme it hasn't been implemented in the period of war. It has been calculated that this project would increase the paddy cultivation of 4000 Acres in Yala season.

3.2.2.7. Second Health Sector Development Project

Development Objectives:

Enhancement of the public health facilities enabling to face the challenges related to nutrition and non-communicable diseases successfully.

Funding agency	: World Bank
Project cost (Rs. Mn)	: Rs. 26,000 Mn (USD 200)
Expenditure for Provincial Health Sector	: Rs. 15163.20 Mn (USD 105.5)
Project Duration	: 2013 – 2018
Project Area	: Entire Island
Beneficiaries	: Total Population of the Country

- The poorest and most vulnerable people dependent on public health services
- Hazardous groups that are not Nutritious
- Children under 5 years of age, pregnant mothers and nursing mothers and teenagers;
- Maternal and Child Health issues;
- Infectious Diseases (tuberculosis, dengue, leptospirosis infection, HIV / AIDS, rabies and other infectious diseases of animals);
- Non communicable diseases faced by young people, working force and adult people

Thematic Areas and Activities

- Health System Improvement
- Maternal and Child Health and Nutrition
- Control and Prevention of Communicable diseases
- Prevention and Control of non-communicable diseases
- Workshops, health researches and surveys

Cumulative Physical Progress	: 94%
Cumulative Financial Progress (Rs.Mn)	: Rs. 11,086 Mn
Allocation for 2017 (Rs Mn)	: 3,260.00
Financial Progress in 2017	: Progress Rs. 3,130.50 Mn
Physical Progress in 2017	: Target: 100% Progress: 96%

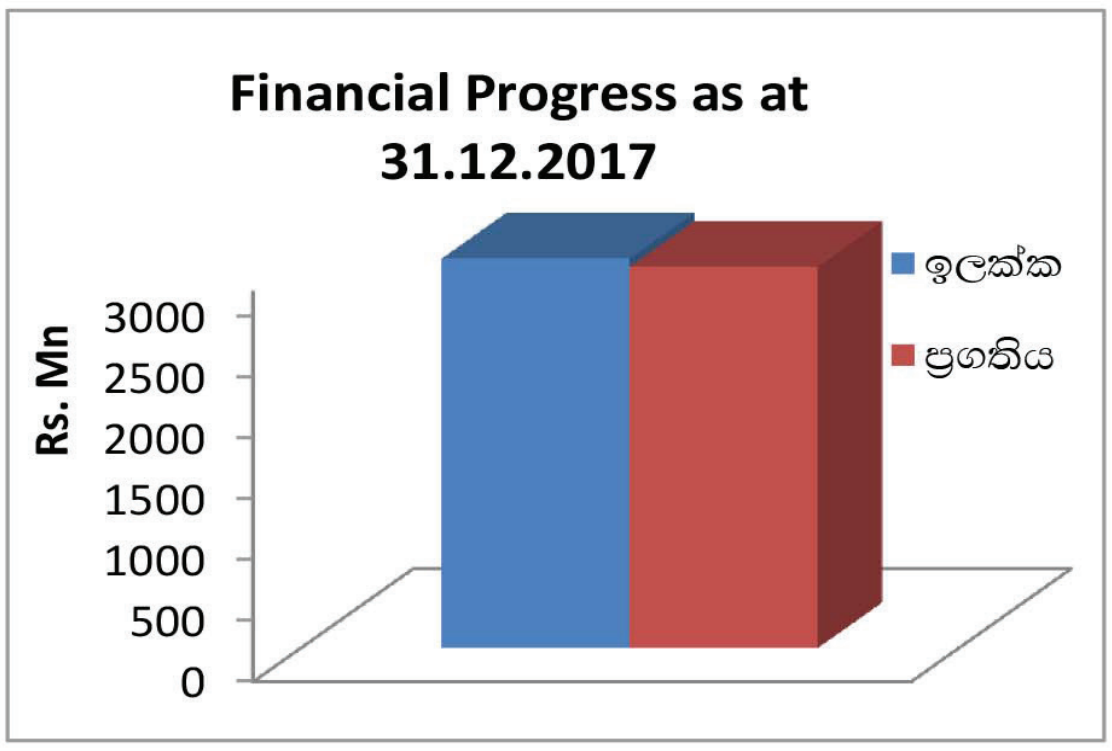

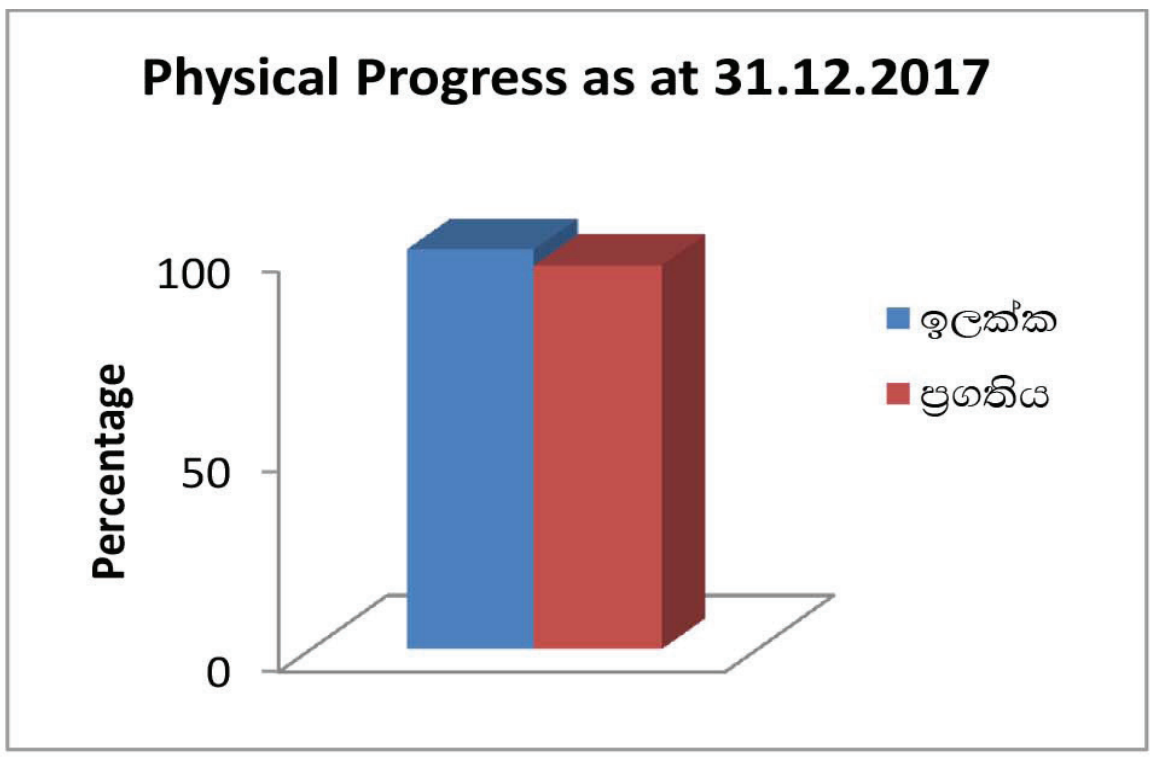

Projects Implemented at Provincial Level

Serial No.	Completed Projects	Physical Progress									Total
		Western Province	Northern Province	Eastern Province	North Central Province	Central Province	Uva Province	North Western Province	Sabaragamuwa Province	Southern Province	
01	Establishment / Improvement of Emergency Treatment Units (ETUs)	36	51	44	27	89	41	53	50	45	**436**
02	Provincial Hospitals that record morbidity and mortality (eIMMR)	40	49	46	51	85	40	49	35	48	**443**
03	Improvement of maternal and child emergency treatment clinics	434	274	370	220	598	381	494	372	492	**3635**
04	Establishment of Healthy Lifestyle Centres (HLCs)	36	30	44	28	46	24	39	29	46	**322**
05	Establishment of Quality Management Systems (QMS)	10	11	13	05	06	07	06	04	08	**70**
06	Rennovation of drug stores	-	04	76	08	35	20	16	28	-	**187**

Eastern Province

Completion of Main Building of Provincial Training Centre at Thiraimadu" Batticaloa

Central Province

Improvement of Emergency Treatment Unit –District Hospital - Rattota

North Western Province

Construction of Emergency Room - DH Kottukachchiya

Northern Province

Improvement of Emergency Treatment Unit – DH Karainagar, Punakari, Pudukuduirippu

Construction of MOH Office - MIlleniya

3.2.2.8. Construction of Rural Bridges

Objectives

1. To increase the mobility and enhance the quality of living standards of the Sri Lankan population with the aim of increasing economic growth of the communities and the country
2. To increase public safety in rural communities
3. To utilize the untapped and unexploited resources in villages and the use of indigenous knowledge of the rural communities for new production opportunities ultimately resulting betterment of living standards for these communities.

Table 19

	Stage I	Stage II	Stage III
Funding Agency	United Kingdom	United Kingdom	Neherland
Project cost (Rs. Mn)	7,400.00	20,200.00	16,500.00
Project Duration	2013 - 2016	2014 - 2017	2014 - 2017
Project Area	Entire island		
Total Physical Progress	100%	85%	85%
Total Financial Progress (Rs. Mn)	7,366.41	19,892.71	14,694.43
Financial targets/ progress as at the 4th quarter of 2017 (Rs. mn)	40.00 / 15.22	4205.00 / 5300.00	3100.00 / 2530.05
Physical targets/progress as at as at the 4th quarter of 2017	Completed	100% / 21%	100% / 34%

Table 20

Financial Aid	Total Cost	Provisions for 2017 (Rs. Mn)	Number of Bridges	Completed Bridges	Financial Progress 2017 (Rs. Mn)	Total Financial Progress (Rs. Mn)	Total Physical Progress
United Kingdom (Stage I)	7,400.00	20	210	210	15.22	7,372.87	100%
United Kingdom (Stage II)	20,200.00	3500	537	348	2,693.82	17,286.12	85%
Netherland (Stage III)	16,500.00	2800	463	241	1,751.76	13,550.44	78%
Total	**44,100.00**	**6320**	**1,210**	**799**	**4,460.80**	**38,209.43**	

First stage of this project has been completed. Construction works of 189 incomplete bridges under the second stage and 222 incomplete bridges under the third stage are in progress.

Before

After

Before

After

3.2.2.9. North East Local Services Improvement Project (NELSIP)

- **Objectives**

Main objective of the North East Local Government Service Improvement Project (NELSIP) is to improve service delivery of the Local Authority by providing the necessary infrastructure facilities, increasing people participation to create equal opportunities society and enhancing knowledge, skills of officials and community through capacity building programs.

- Project Results

1190 projects have been implemented under the infrastructure facilities of the Local Authorities. It is comprised of rural roads with 791.2 Km, 49.8 Km long drainage systems, 146 market development projects, 14 water supply projects, 74 playgrounds and children's parks and 36 multi-purpose buildings.

New construction and improvement of culverts, bridges and sewer lines, which are linked to road development projects has contributed to the increase in the efficiency of the transport sector. This will help increase investments, improve tourism activities and increase employment opportunities and improve the living standards of the people.

The Assessment Report of the Social, Environmental and Economic impacts of the NELSIP project has highlighted that the beneficiaries are satisfied with the road development as it is support to reduced travel time, road accidents and improve comfortable travelling. Further, report is mentioned that some of the indirect impact that have been derived from the development of roads are decreasing of maintenances and maintenance costs, increased business growth, increased agricultural output, land value, education, employment opportunities, and easy access for jobs and trainings , and the availability of tools for buying inputs and selling products.

The gutter system has improved the quality of the road system. As per the project report, it has also led to a reduction in flood risk, preventing breeding of mosquitoes and reducing road accidents.

Construction of children's parks and playgrounds contributed to increase the gathering of people, enhance contact through socialization, and reduce social and psychological pressure in establishing a sense of social cohesion and security as well as improving the mental and physical fitnes

Providing of drinking water scheme, market development, libraries, etc. have been contributed to significant social and economic progress. (The Social, Institutional, Environment & Economics Impact Assessment at NELSIP – P. 37, 38)

There are several programs and systems introduced by the NELSIP project to provide the better service to the public by the Local Authorities in a more timely and accurate manner. They are formulating a participatory development plan, setting up Social Audit Committees consisting of beneficiaries in relation to each project, and evaluating projects identified on priority basis, introducing of Project Appraisal Committees at district level. Further, establishment of Front Office system at Local Authorities, updating the methods of resolving public grievances, establishing good governance centers at district level, introducing of local government accounting system, introduction of the library automation program could be mentioned as innovative programs of the NELSIP.

- Project Coverage Area

The NELSIP Project was started in 2010 and it is in operation until the end of 2017. This project covers all five districts of Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya and Mannar covering all Local Authorities of the Northern Province (34 Local Authorities). All Local Authorities (45 Local Authorities) in three districts of Trincomalee, Batticaloa, and Ampara in the Eastern Province is covered by the Project. In addition to this, Selected 22 Local Authorities in the adjoining provinces of North Western, North Central and Uva is covered since 2014. It is consisted of 9 Local Authorities in Anuradhapura District, 3 Local Authorities in Polonnaruwa District, 07 Local Authorities in the Puttlam District and 03 Local Authorities from Monaragala District. Accordingly, 101 Local Authorities are covered by the NELSIP.

Bibila Drinking Water Project

Ampara Bus Stand

Neduntharaki Passenger Transport Ship granted to Delft Island

Marawila Public Market Complex

				Total	Municipal Councils	Urban Councils	Pradeshiya Sabha
1.	Northern	Jaffna	17	17	01	03	13
		Killinochchi	03	03	-	-	03
		Mullaitivu	04	04	-	-	04
		Vavuniya	05	05	-	01	04
		Mannar	05	05	-	01	04
2.	Eastern	Trincomalee	13	13	-	02	11
		Batticaloa	12	12	01	02	09
		Ampara	20	20	02	01	17
3.	North Central	Anuradhapura	19	09	01	-	08
		Polonnaruwa	07	03	-	-	03
4.	North Central	Puttlam	12	07	-	02	05
5.	Uva	Monaragala	10	03	-	-	03
Total			**127**	**101**	**05**	**12**	**84**

Funding Sources:

The total investment of the NELSIP Project is Rs. 13,522.90 million. 66% of the funds are from the International Development Agency (IDA), World Bank as a loan, 20% is contributed by Australian Foreign Affairs and Trade Department (DFAT) as a grant, 12% is born by the Government of Sri Lanka and 2% of the total project cost represents community contributions. These funds, both locally and internationally, are allocated to the project activities through the Provincial Councils to implement the project activities by each Local Authorities.

Table 22

Financial Sources	Project Value		Revised Allocation	
	USD	Rs. Mn	USD	Rs Mn.
International Cooperative Fund (WB)	50.00	6,175.00	70.00	9,464.44
Department of Foreign Affairs and	20.30	2,537.50	20.30	2,539.50
Government of Sri Lanka	34.00	3,740.00	14.35	1,661.55
Community contribution	2.00	220.00	2.00	220.00
Total	106.30	12,672.50	107.35	13,665.49

Table 23 - Total Financial Progress North East Local Services Improvement Project (As at 31.12.2017)

Component	Total Estimate Rs. Mn	Expenditure Rs. Mn.
Infrastructure Facilities	11,371.49	11,373.96
Institualization of accountability	57.00	56.93
Capacity building	1,805.50	1,791.50
Evaluation and Assessment	31.50	30.56
Project Management	400.00	377.58
Total	**13,630.53**	**13,630.53**

Accordingly, total financial progress of the project as at 31.12.2017 was 99.81%.

Table 24 – Projects implemented at Provincial Level

S/N	Category	Physical Progress					
		Eastern Province	Northern Province	North Central	North Western	Uva Province	Total
01	Access Roads	03	326	06	-	03	738
02	Ayurveda Centre/ Clinic	02	01	-	-	-	03
03	Bridges /Retaining Wall	10	04	-	-	-	14
04	Bus Stand	02	03	-	-	-	05
05	Cemetery/Crematorium	04	04	-	-	-	08
06	Community hall/ Cultural hall/ Multipurpose building	19	10	03	02	01	35
07	Children park	32	18	04	01	-	55
08	Playground/Pavilion	17	03	01	-	-	21
09	Drainage system	63	11	04	01	-	79
10	Rural electrification	12	-	-	-	-	12
11	Library building	11	03	-	-	01	14
12	Market places	64	57	09	04	01	135
13	Drinking water scheme	06	03	04	-	01	14
14	Town beatification / compactors	04	01	-	-	-	05
15	Slaughter house	-	09	-	-	-	09
16	Office building	25	13	01	02	02	43
	Total	**674**	**466**	**32**	**10**	**09**	**1190**

3.2.2.10. Transforming School Education as the Foundation of a Knowledge Hub Project (TSEP)

Objectives

To enhance access to, and quality of, primary and secondary education to provide a foundation for the knowledgebased economic and social development of the country.

Funding agency	World Bank	
Project cost (Rs. Mn)	13,000.00	
Project Duration	2012 - 2017	
Project Area	All Island	
Total Physical Progress	91%	
Total Financial Progress (Rs. Mn)	13,123.00	
Allocation for 2017	2730.00	
Financial targets/ progress as at 31.12.2017	2730.00	2035.00
Physical targets/ progress as at 31.12.2017	100%	96%

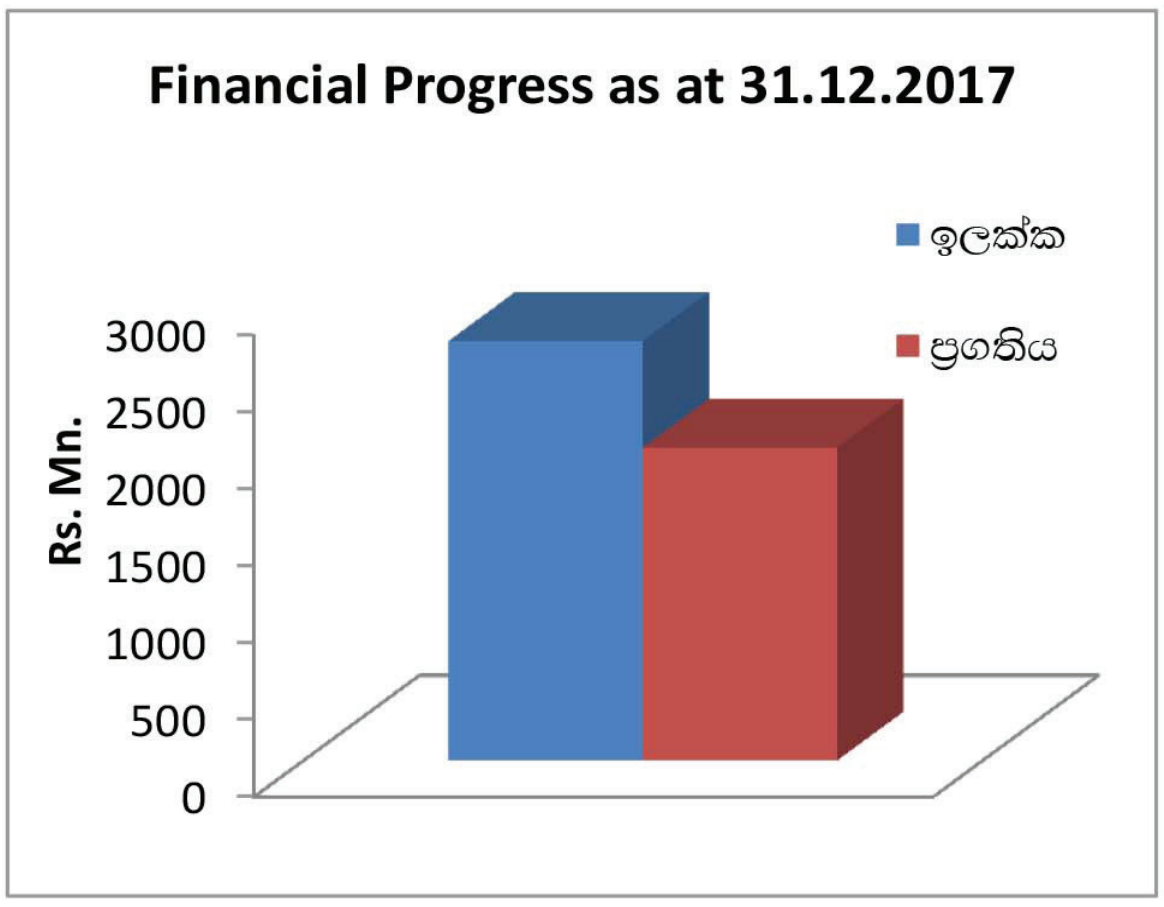

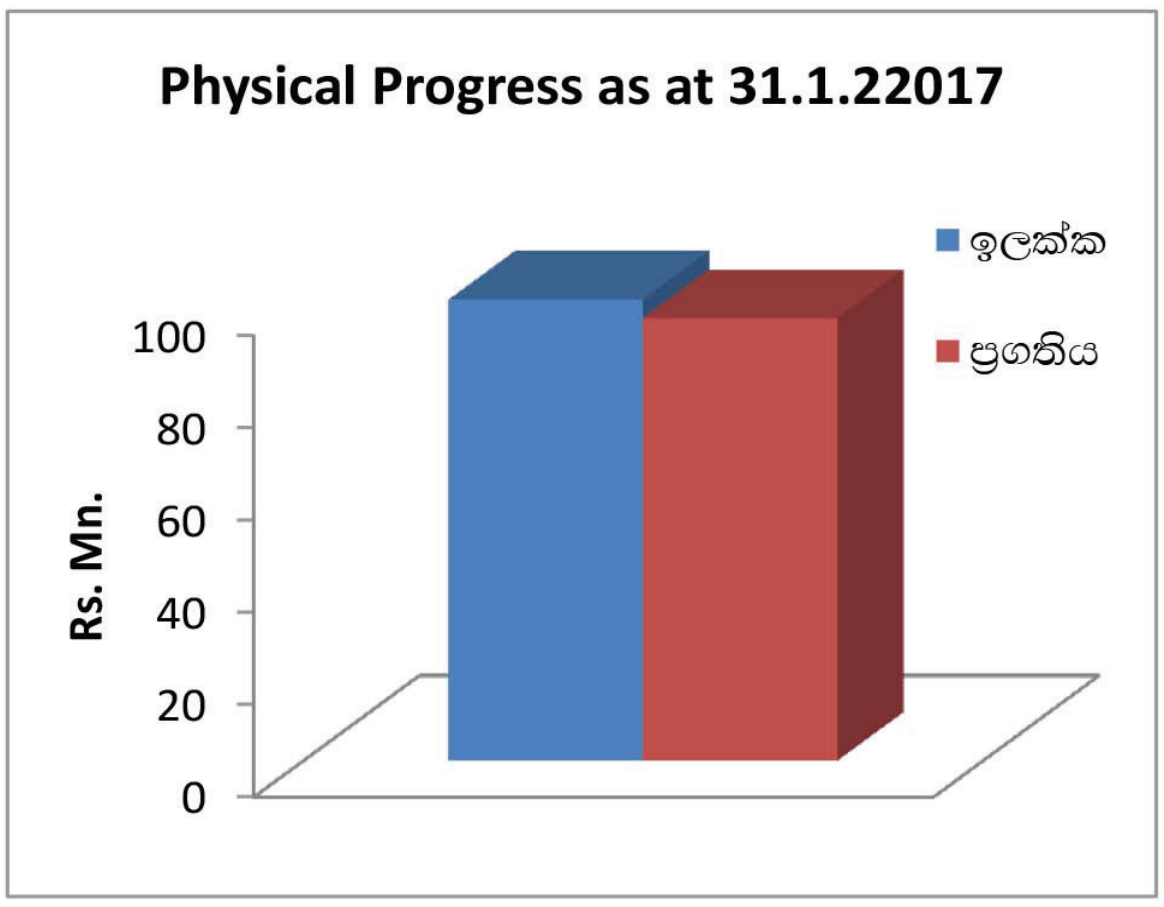

The total investment of this project is Rs, 13,000 Mn. under the World Bank funds and this covers the entire island. Objective of this project is to cover all the provinces of the island. Objective of this project is to promote access and quality for primary and secondary education as the knowledge based economic and social development. Overall physical progress records as 95% while achieving a 96% of financial progress.

The project is implemented by the Ministry of Education at the national level, and the Provincial Councils at the provincial level. The Ministry of Local Government and Provincial Councils (MLGPC) is the coordinating Ministry for the provincial component of the project. The MLGPC will coordinate and facilitate TSEP implementation by the Provincial Councils.

- At present under this project, 135 technology laboratory, 721 class room buildings and 65 divisional education offices have been constructed.

- 15936 computers, 13083 computer's accessories such as scanners, printers, 117795 desks and chairs for class rooms,18973 office desks and chairs and 3205 office equipment including photocopiers, faxes and multimedia's have been purchased and distributed to required places.

- 4726 provincial staff, principals and teachers have been trained under the theme of financial management, procurement, environment management and safeguard, school based teacher development.

Although the project is scheduled to be completed by June 2017, it was extended up to June 2018

North Central Province

Mahindodaya Technical Laboratory building -
A/ Deepani Maha Vidyalaya

Central Province

Mahindodaya Technical Laboratory
building
Kurunduwatta Royal College

Northern Province

Office Building -
Provincial Education Department

Southern Province

School Building Ga/ Muslim Ladies
College

Uva Province

Office Building -
Provincial Education Department

Eastern Province

Construction of Zonal Education Office -
Trincomalee North Zone

Western Province

School Building – Mahamaya Girls' College Colombo

Special Educational Resource Centre Building Udupila Primary College , Kelaniya

Uva Province

Construction of Kalpitiya Divisional Educational Office

Eastern Province

Construction of Balangoda Zonal Educational Office Building

Second Health Sector Development Project (SHSDP)

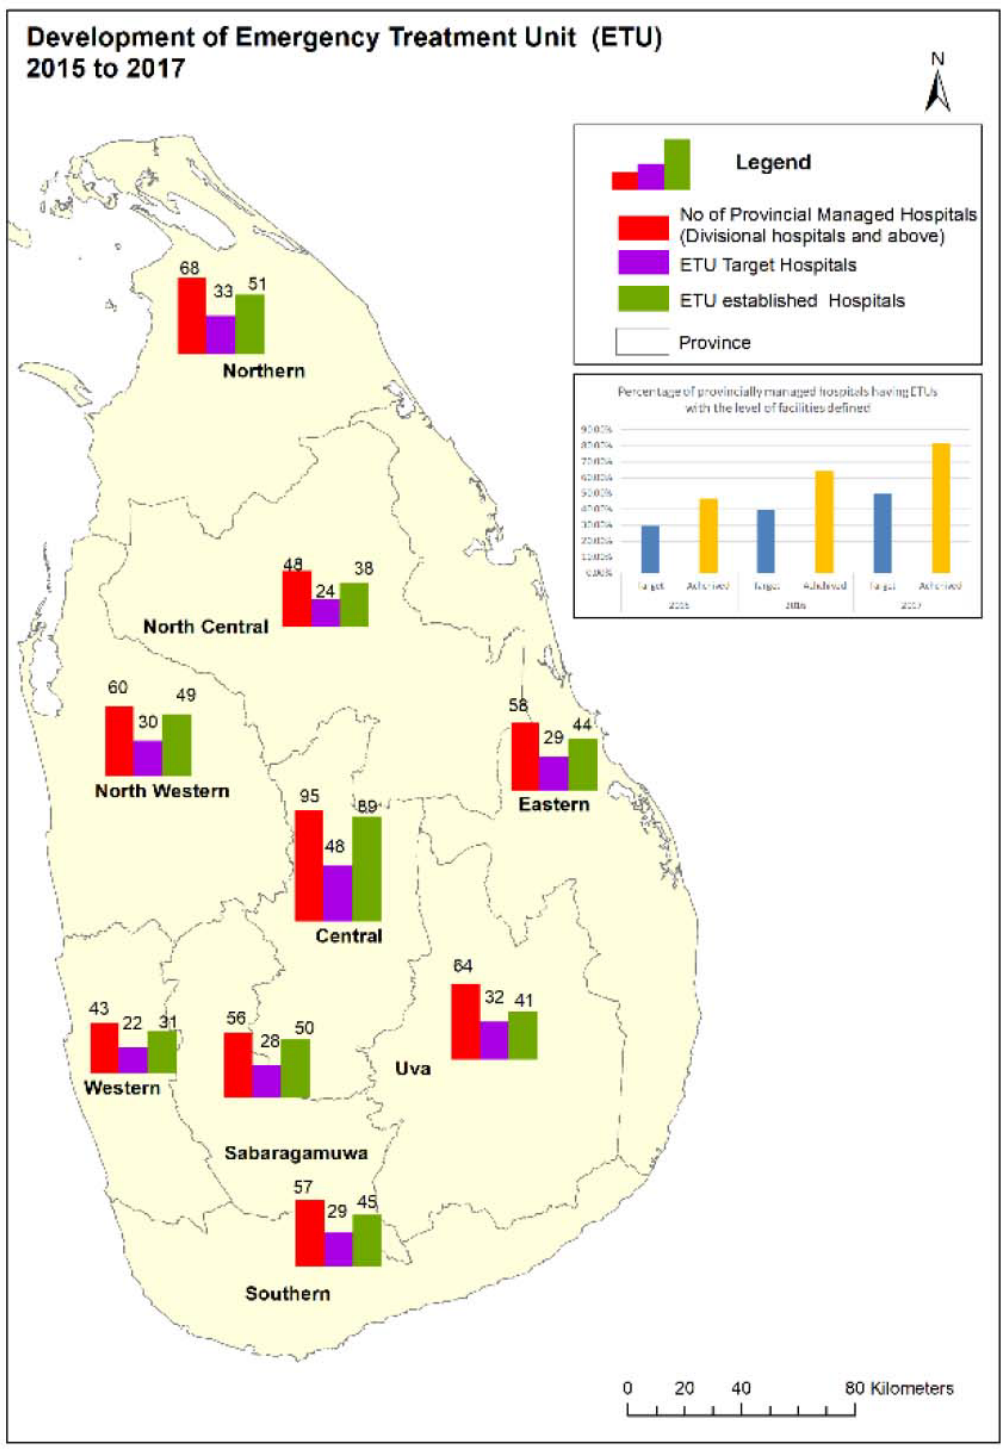

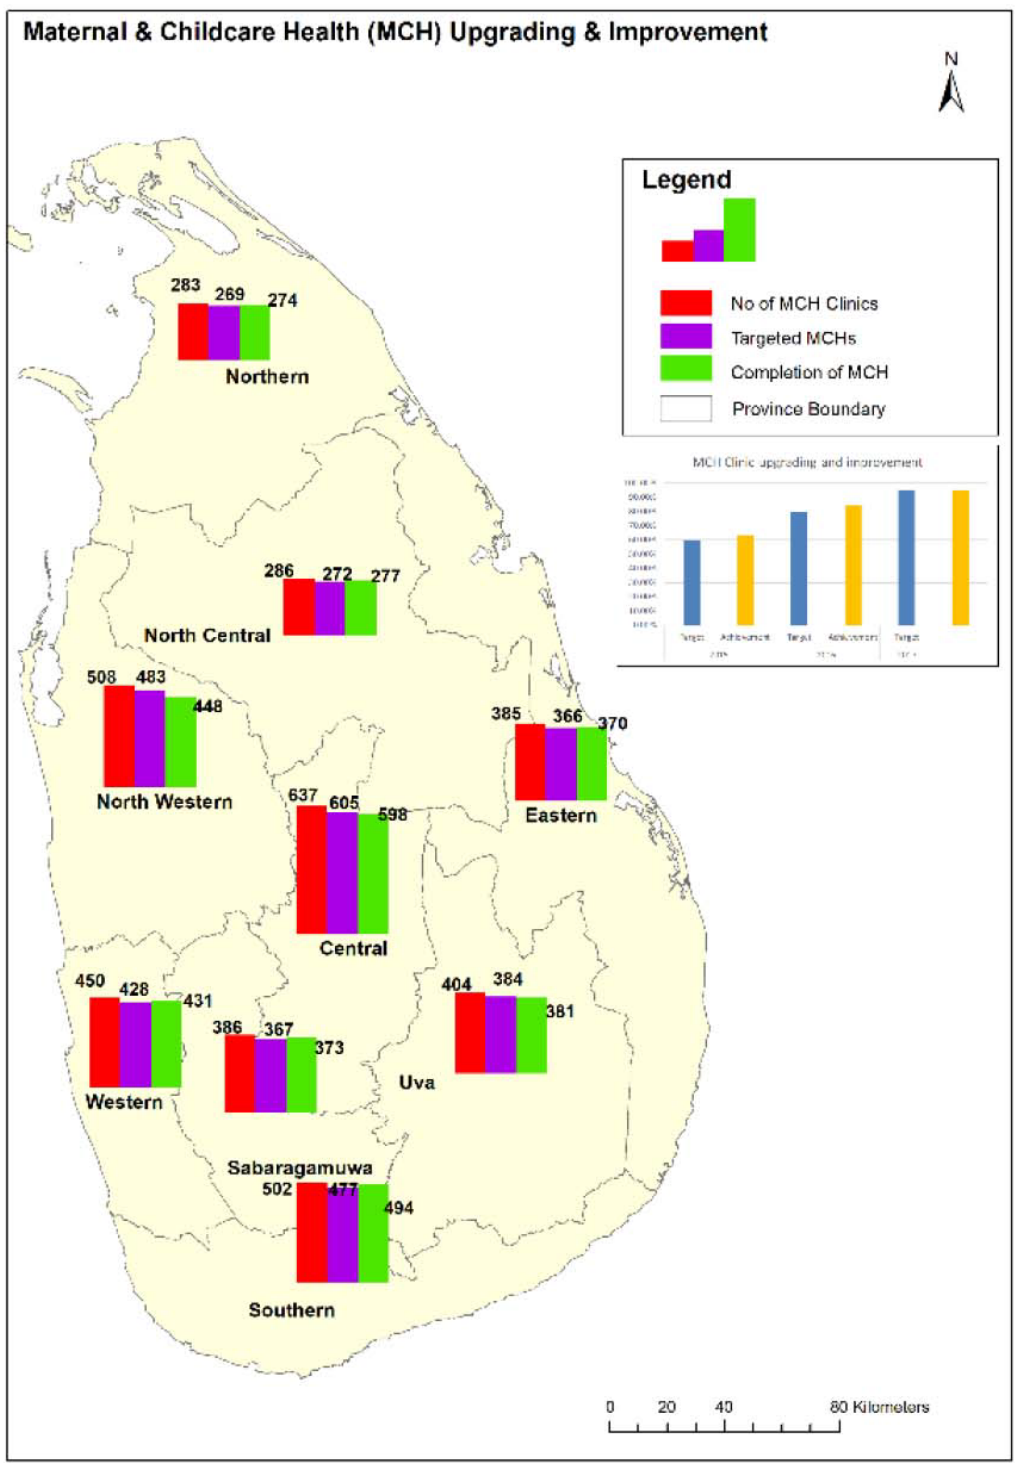

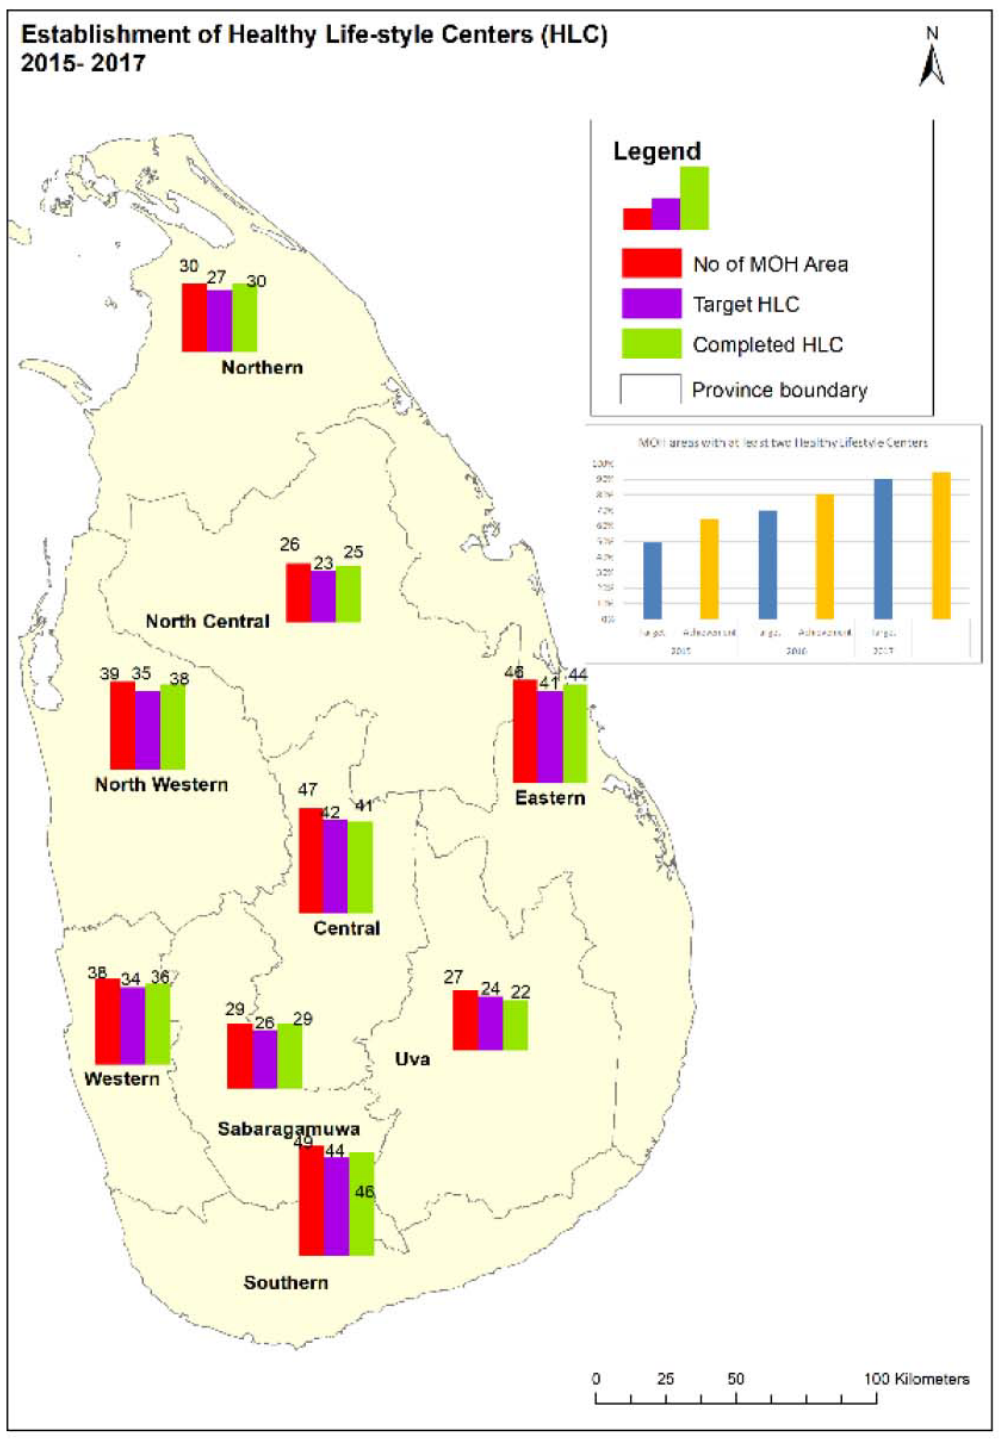

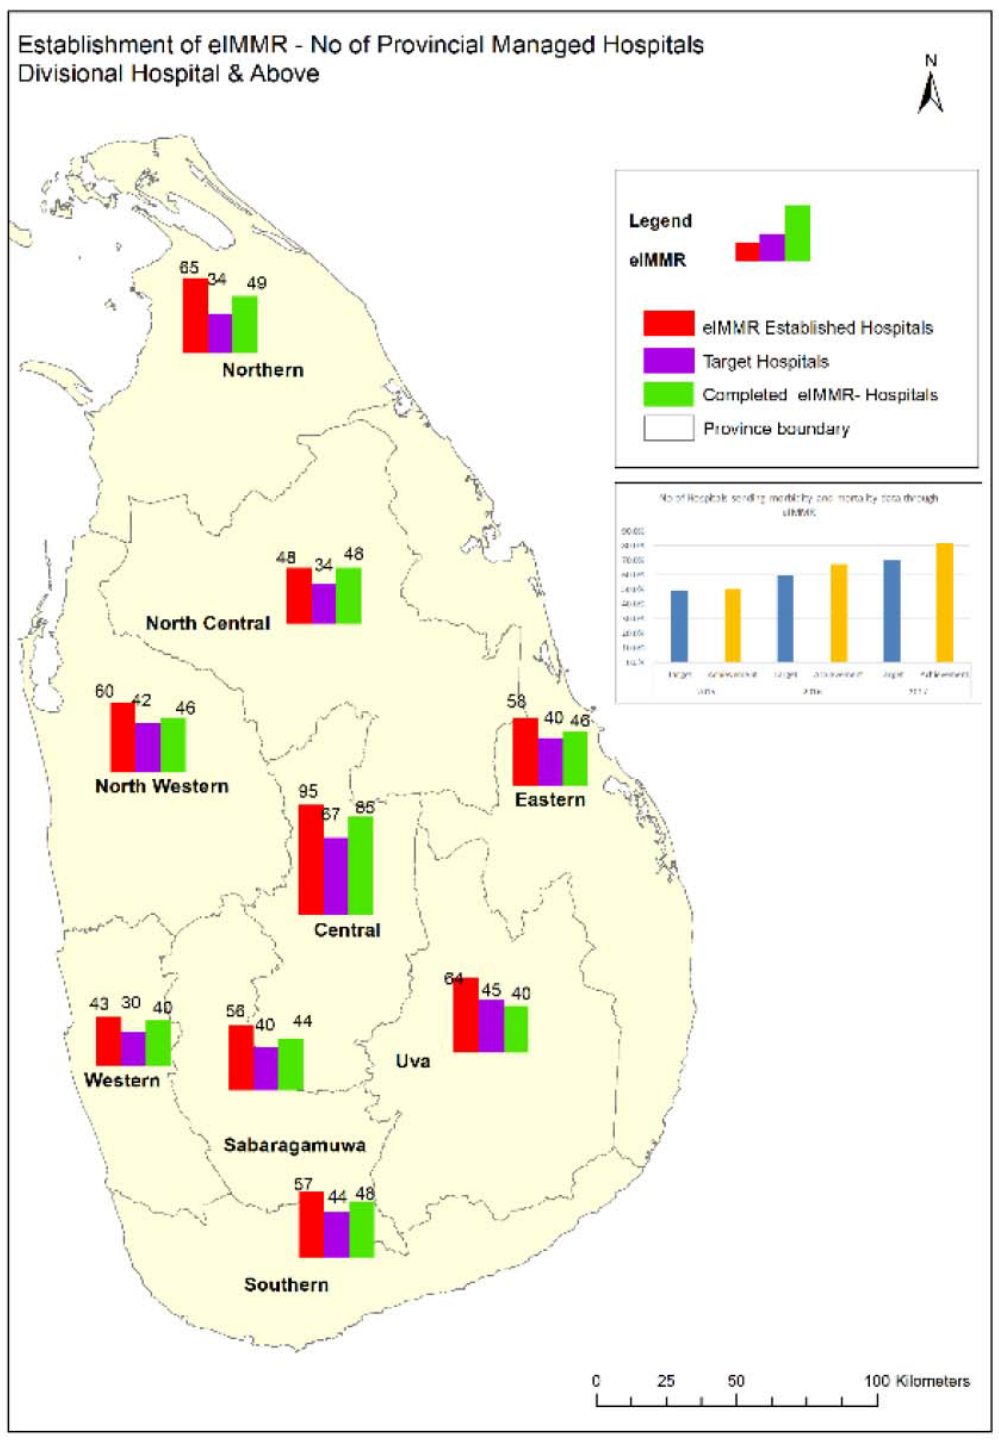

3.2.2.11. Iranamadu Irrigation Development Project

Objective

Improving irrigation infrastructure for an effective and sustainable management and improving the productivity of water and land in a sustainable manner.

Funding A	IFAD	
Project cost (Rs. Mn)	3,277.44	
Project duration	2012 - 2017	
Project Area	Kilinochchi District in Northern Province (Irrigation of 390 Km)	
Project Activities 1 Infrastructure development ◆ Rehabilitation of irrigation ◆ Development of other infrastructure facilities 2 Promotion of manufacturing and marketing affairs 3 Project management		
Overall physical progress	99.19%	
Total Financial progress (Rs. Mn)	3250.46	
Allocation for 2017 (Rs. Mn)	675.00	
Financial targets/ progress as at 31.12.2017	675.00	663.60
Financial targets/ progress as at 31.12.2017	100%	99.19%

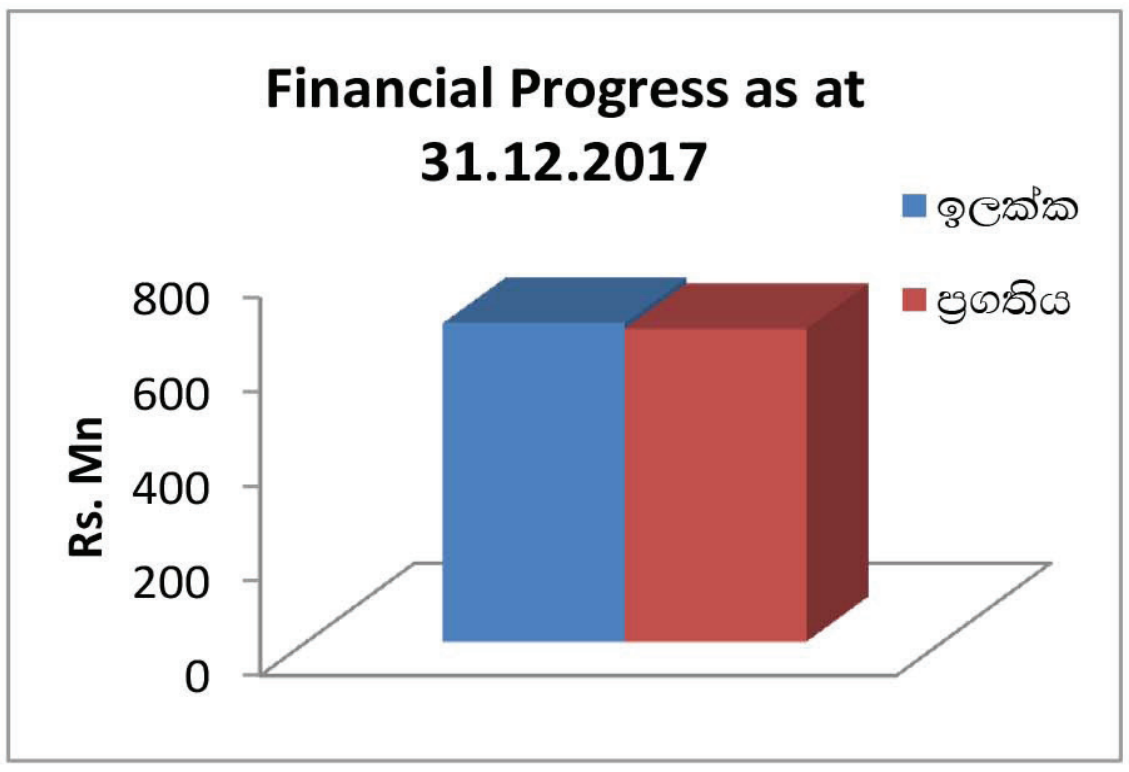

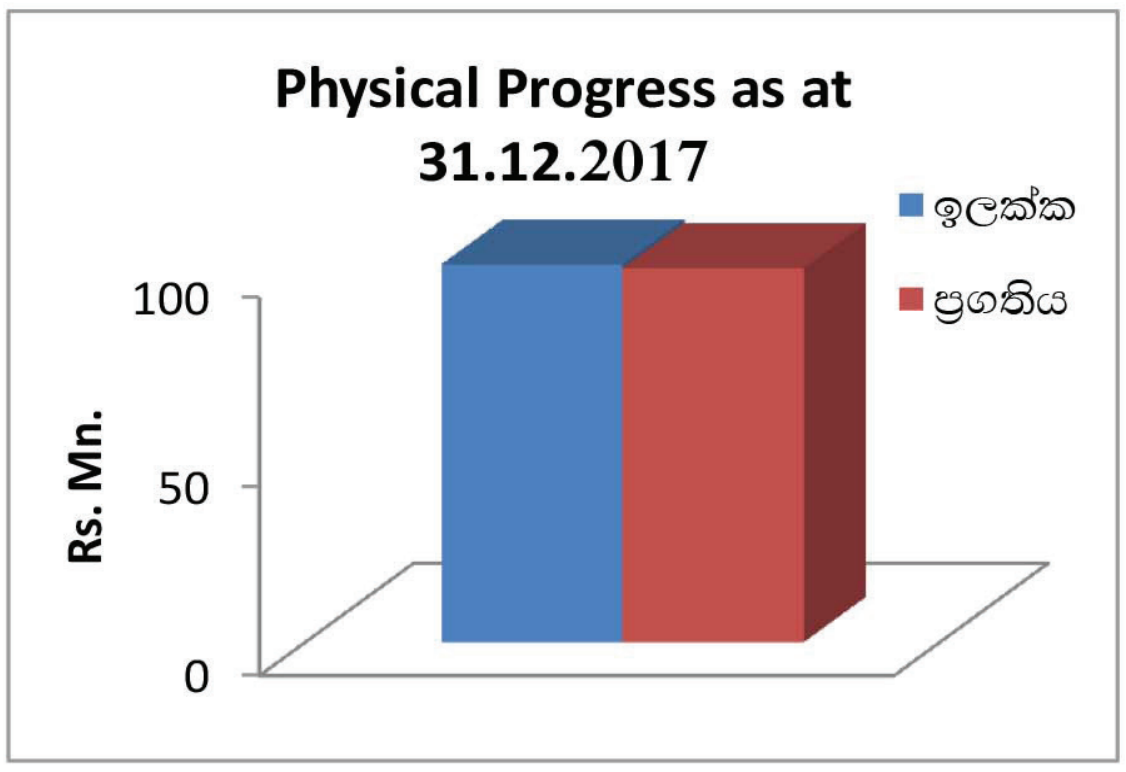

Table no 25 - Financial Progress of Iranamadu Irrigation Development Project

Funding Source	Accumulated Expenditure			Provisions and expenditure for the year 2017			
	Total Expenditure	Accumulated Expenditure as at September 2017 2017 Rs. Mn.	%	Provisions for 2017 Rs. Mn.	ගිවිසුම්ගත රු.මි.	වියදම 2017 දෙසැම්බර් මාසයට රු.මි.	%
IFAD	2883.44	2883.44	100	567.79	900.00	567.79	99.9
GOSL	394.00	367.82	93.66	119.57	100.00	118.49	99.09
Total	3277.44	3250.46	92.26	687.36	1000.00	985.90	99.78

Source- Iranamadu Irrigation Development Project

Table no 26 - Physical Progress of Iranamadu Irrigation Development Project

Irrigation Infrastructure Facilities	Units	Target	Actual	Accumulated Progress	%
Rehabilitation canals	Km	401	359	359	100
Rehabilitation of drains	Km	70	70	70	100
Construction of structures including culverts, safety dams, bridges, canals,)	Nos	426	1950	3000	100
Construction of buildings	Nos	05	05	05	100
Small agro wells 20 / tube wells 60 / making fence of 44 Km	Nos	930	66	68	100
Rehabilitation canals	Nos	21	21	21	100
Construction of paddy stores	Nos	06	03	03	100
Rehabilitation of agro based roads (concrete / gravel)	Km	150	45	45	100

Source - Iranamadu Irrigation Development Project

Rural Bridges in Sri Lanka 2015-2017

Ministry of Provincial Councils & Local Government

Year	Completed Bridges
2015	141
2016	334
2017	509
Grand Total	**1116**

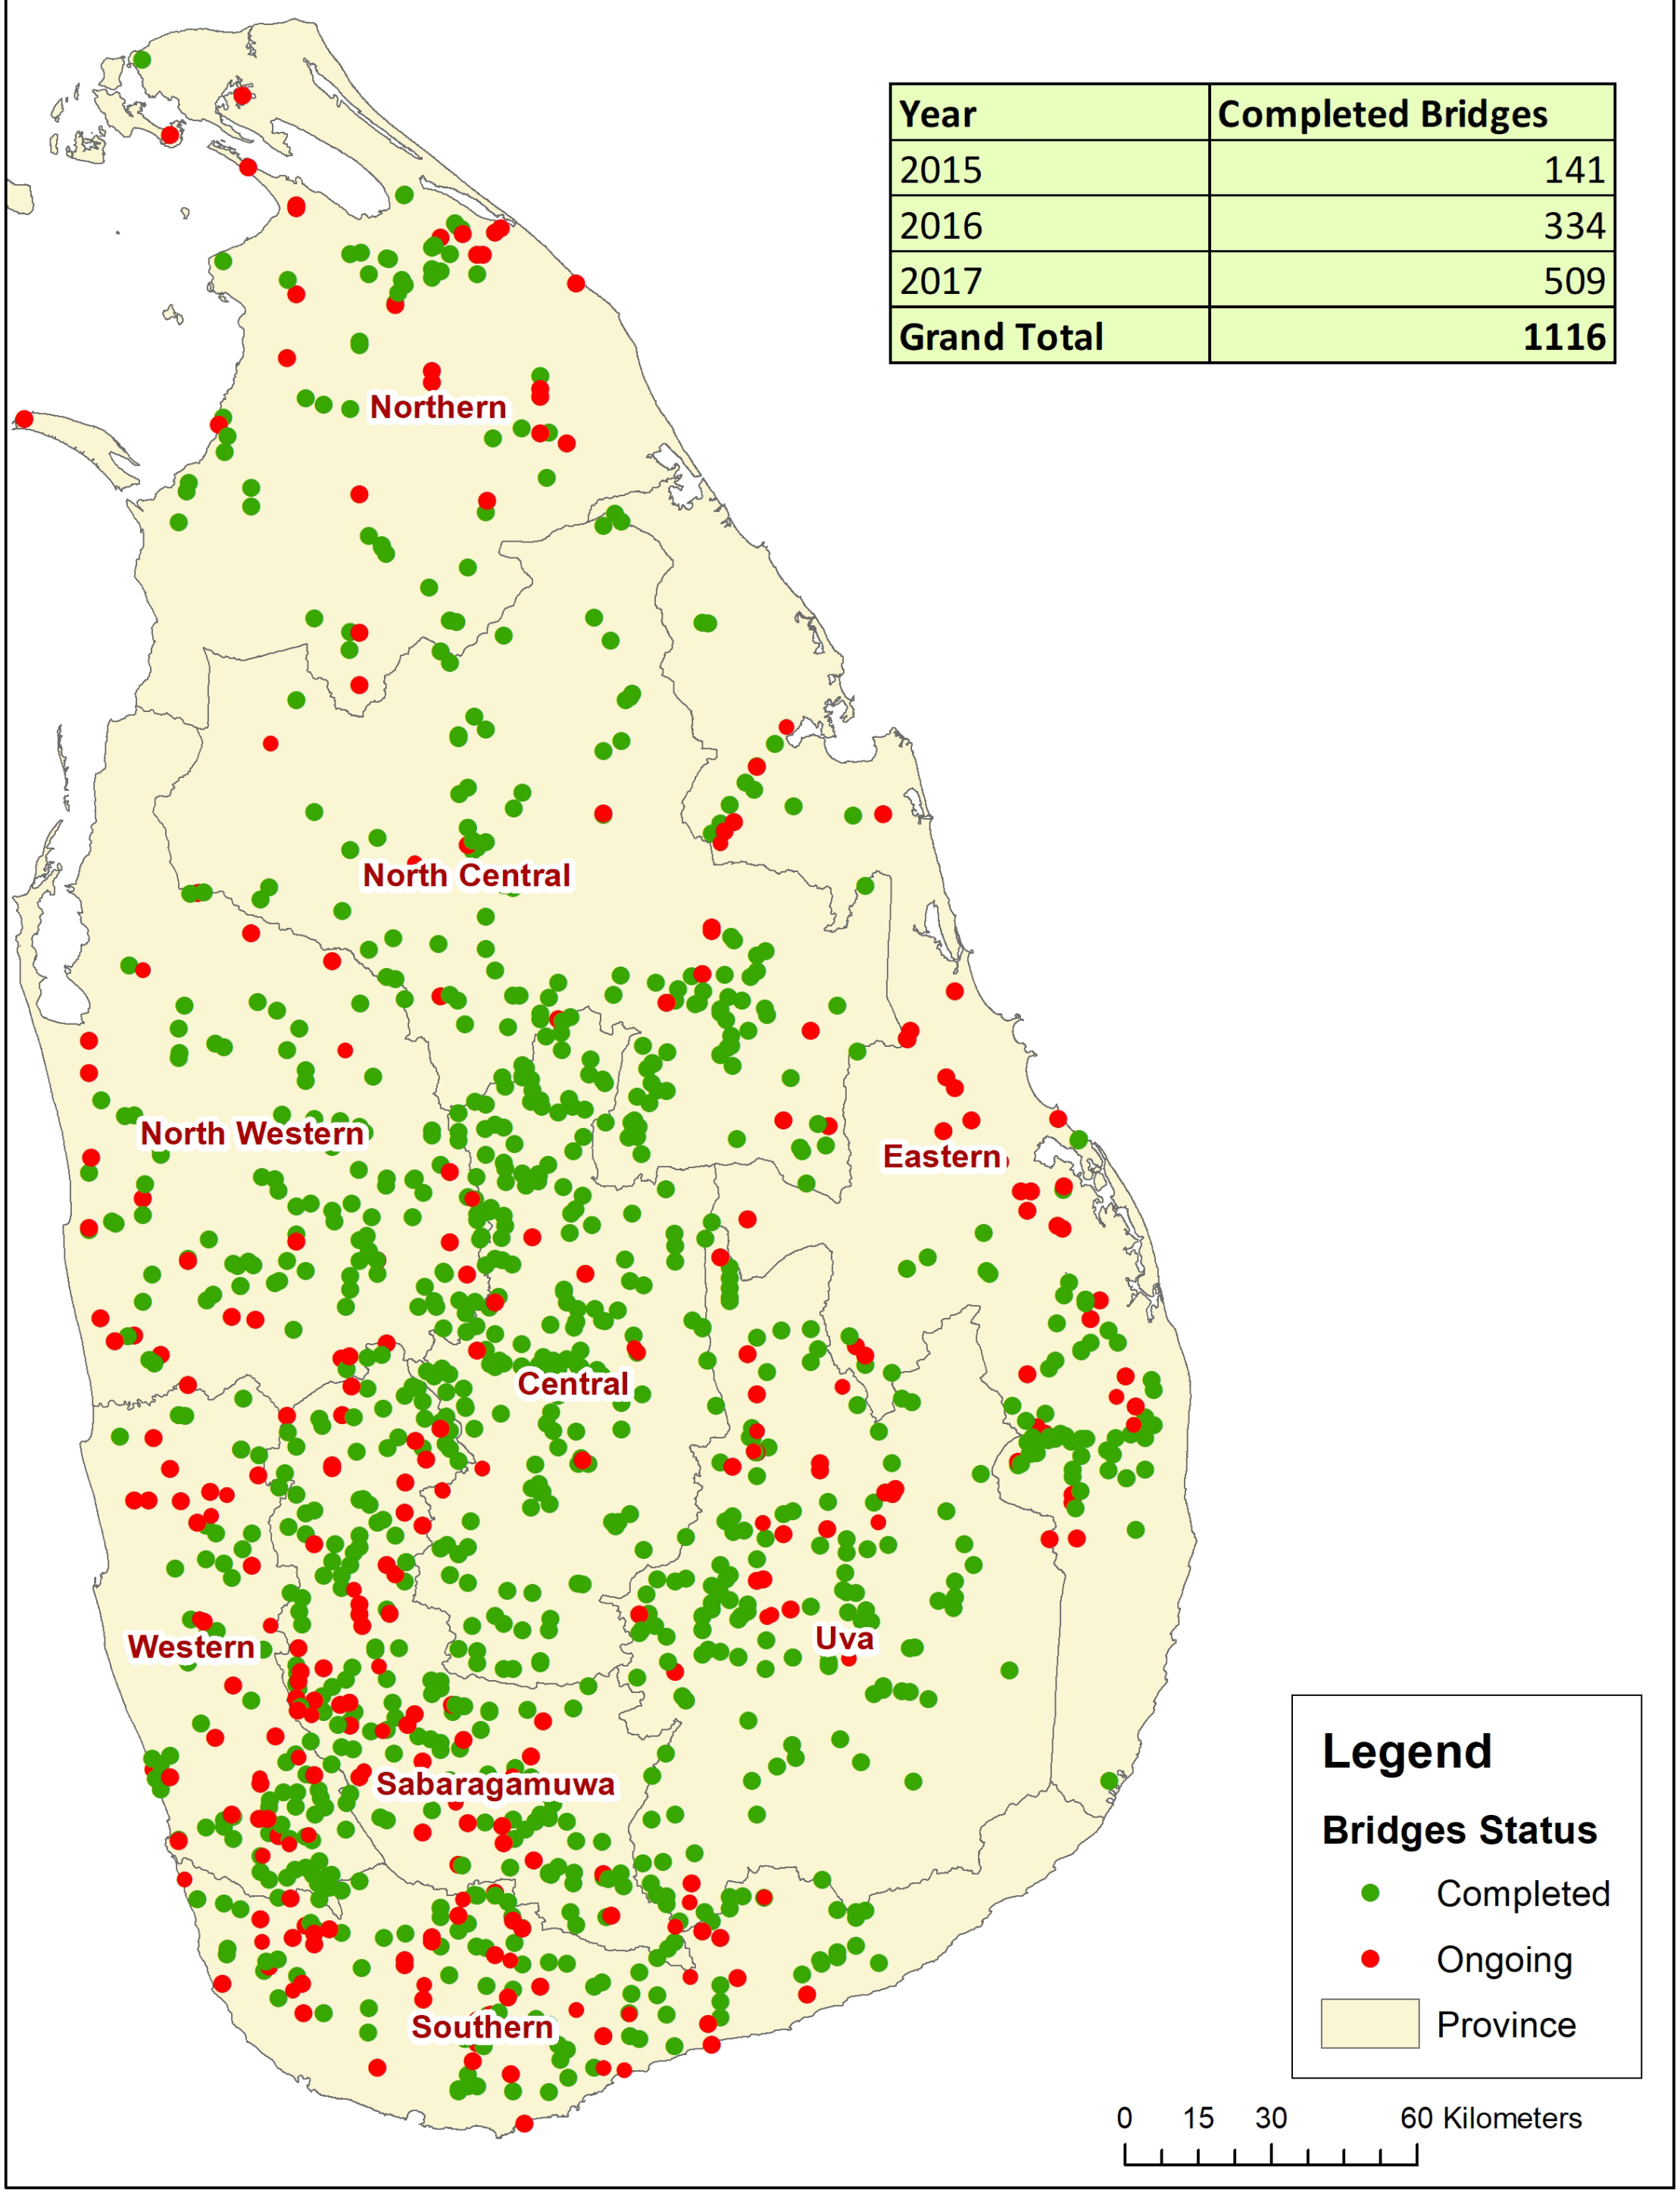

Table no 27 - Production and Market

Activity	Unit	Target	Progress	%
• **Mobilization and Training Programmes**				
Strengthening of FOs	Nos	83	83	100
No of farmers trained (all the fields)	Nos	14,000	14,929	100
No of farmers trained for Bulk Water allocation system	Nos	1675	1678	100
• **Production & Marketing**				
NPC- Crop Diversification Program				
Designed programmes	Sessions	460	425	92
Forming of groups	No of groups	423	423	100
No of farmers trained under Non-Paddy Crop	No of trainings	2220	3688	100
Program	No of trainings		1518	
Cultivated extent under NPC	Acres	200	200	100
No of farmers trained for Dairy management	Trainings	500	631	100
No of Demonstration plots established	Demonstrations	1672	2784	100
(Good Agricultural Practices)	Demonstrations	350	115	33
Demonstration for NCP Crop program	Demonstrations	350	98	28
No of farmers trained for contract farming	Groups	423	423	100
• **Micro Finance**				
No of programs planned for MF	Groups	80	60	75
No of Micro-Finance Groups Formed	Groups	150	150	100
(For group savings & Internal lending)	No of groups	750	1889	100
No of beneficiaries trained	Nos	200	180	90
• **Off – Farm Activities**				
No of farmers trained for Dairy management	Nos	200	200	100
Matching grant for women- Dairy development	No. of women	200	150	75
Matching grant for other off farm activities	No. Of grants	300	Not Implemented	

Source – Iranamadu Irrigation Development Project

Before

After

Before

After

3.2.2.12. Rural Infrastructure Development Project in Emerging Regions (RIDEP)

Objective: To raise living standards and to develop livelihoods of local people through basic infrastructure such as Rural Roads, medium and small size irrigation and potable water supply facilities in Northern, Eastern, North Central and Uva Provinces thereby contributing to development of rural economics and reducing regional disparities in the country.	
Funding agency	Japanese International Cooperative Agency (JICA)
Project cost (Rs. Mn)	Rs. 12.8 Bn (Rs. 3.2 Bn per each province)
Project Duration	2017 April - 2021 July
Project Areas	Northern, Eastern, North Central and Uva Province
Project Activities Sub Projects-524 ➢ Rehabilitation of rural roads -275 ➢ Construction of Irrigation Facilities and Rehabilitation -151 ➢ Drinking Water Supply-98	

Activities in 2017

- ➢ Signing of the Agreement on 2017.07.07.
- ➢ Obtaining of approval for project staff in order to establish Project Management Unit.
- ➢ Commencing Procurement activities to select consulting services for project construction activities.
- ➢ Obtaining of approval for the project staff to be established Provincial Project Implementation Units.

3.3. National Solid Waste Management Support Centre

Vision : More comfortable environment for all

Objective : Management of solid waste in administrative areas of Local Authorities

Role:

- ❖ Compilation of laws and provision of consultancy to introduce methodological and proper solid waste management activities for the Local authorities.
- ❖ Provision of proper technical support on solid waste management for the Local government institutions and organizing workshops
- ❖ Promoting the local authorities for the creating of local and foreign experience of solid waste management.
- ❖ Supporting to the Local authorities to obtain technical and financial assistance from the non-government organizations and financial institutions.
- ❖ To provide buildings, vehicles, machinery and infrastructure required for the waste management of Sri Lanka.
- ❖ Improvement of 3R methodology(Reduce, Reuse, Recycle)

3.3.3. Special Projects - Installation of composting machines with Japanese Technology

- ❖ Compost is produced within the estate sector with the labour of estate communities and making it more efficient using a mechanical method in lieu of that.
- ❖ It is expected to establish these machines covering the all 09 districts of the island this year. 50 Tonnes of waste is treated daily by these machines and problem of waste will be solved in fifty Local Authorities. Further, since the compost produced in these machines are with high quality measures are being taken to introduce them to the market.

North East Local Services Improvement Project (NELSIP) 2015-2017

Ministry of Provincial Councils & Local Government

Year	No of Sub Projects	Total Expenditure (Rs Mn)
2,015	44	479.21
2,016	295	1,921.79
2,017	131	1,068.82
Total	**470**	**3,470**

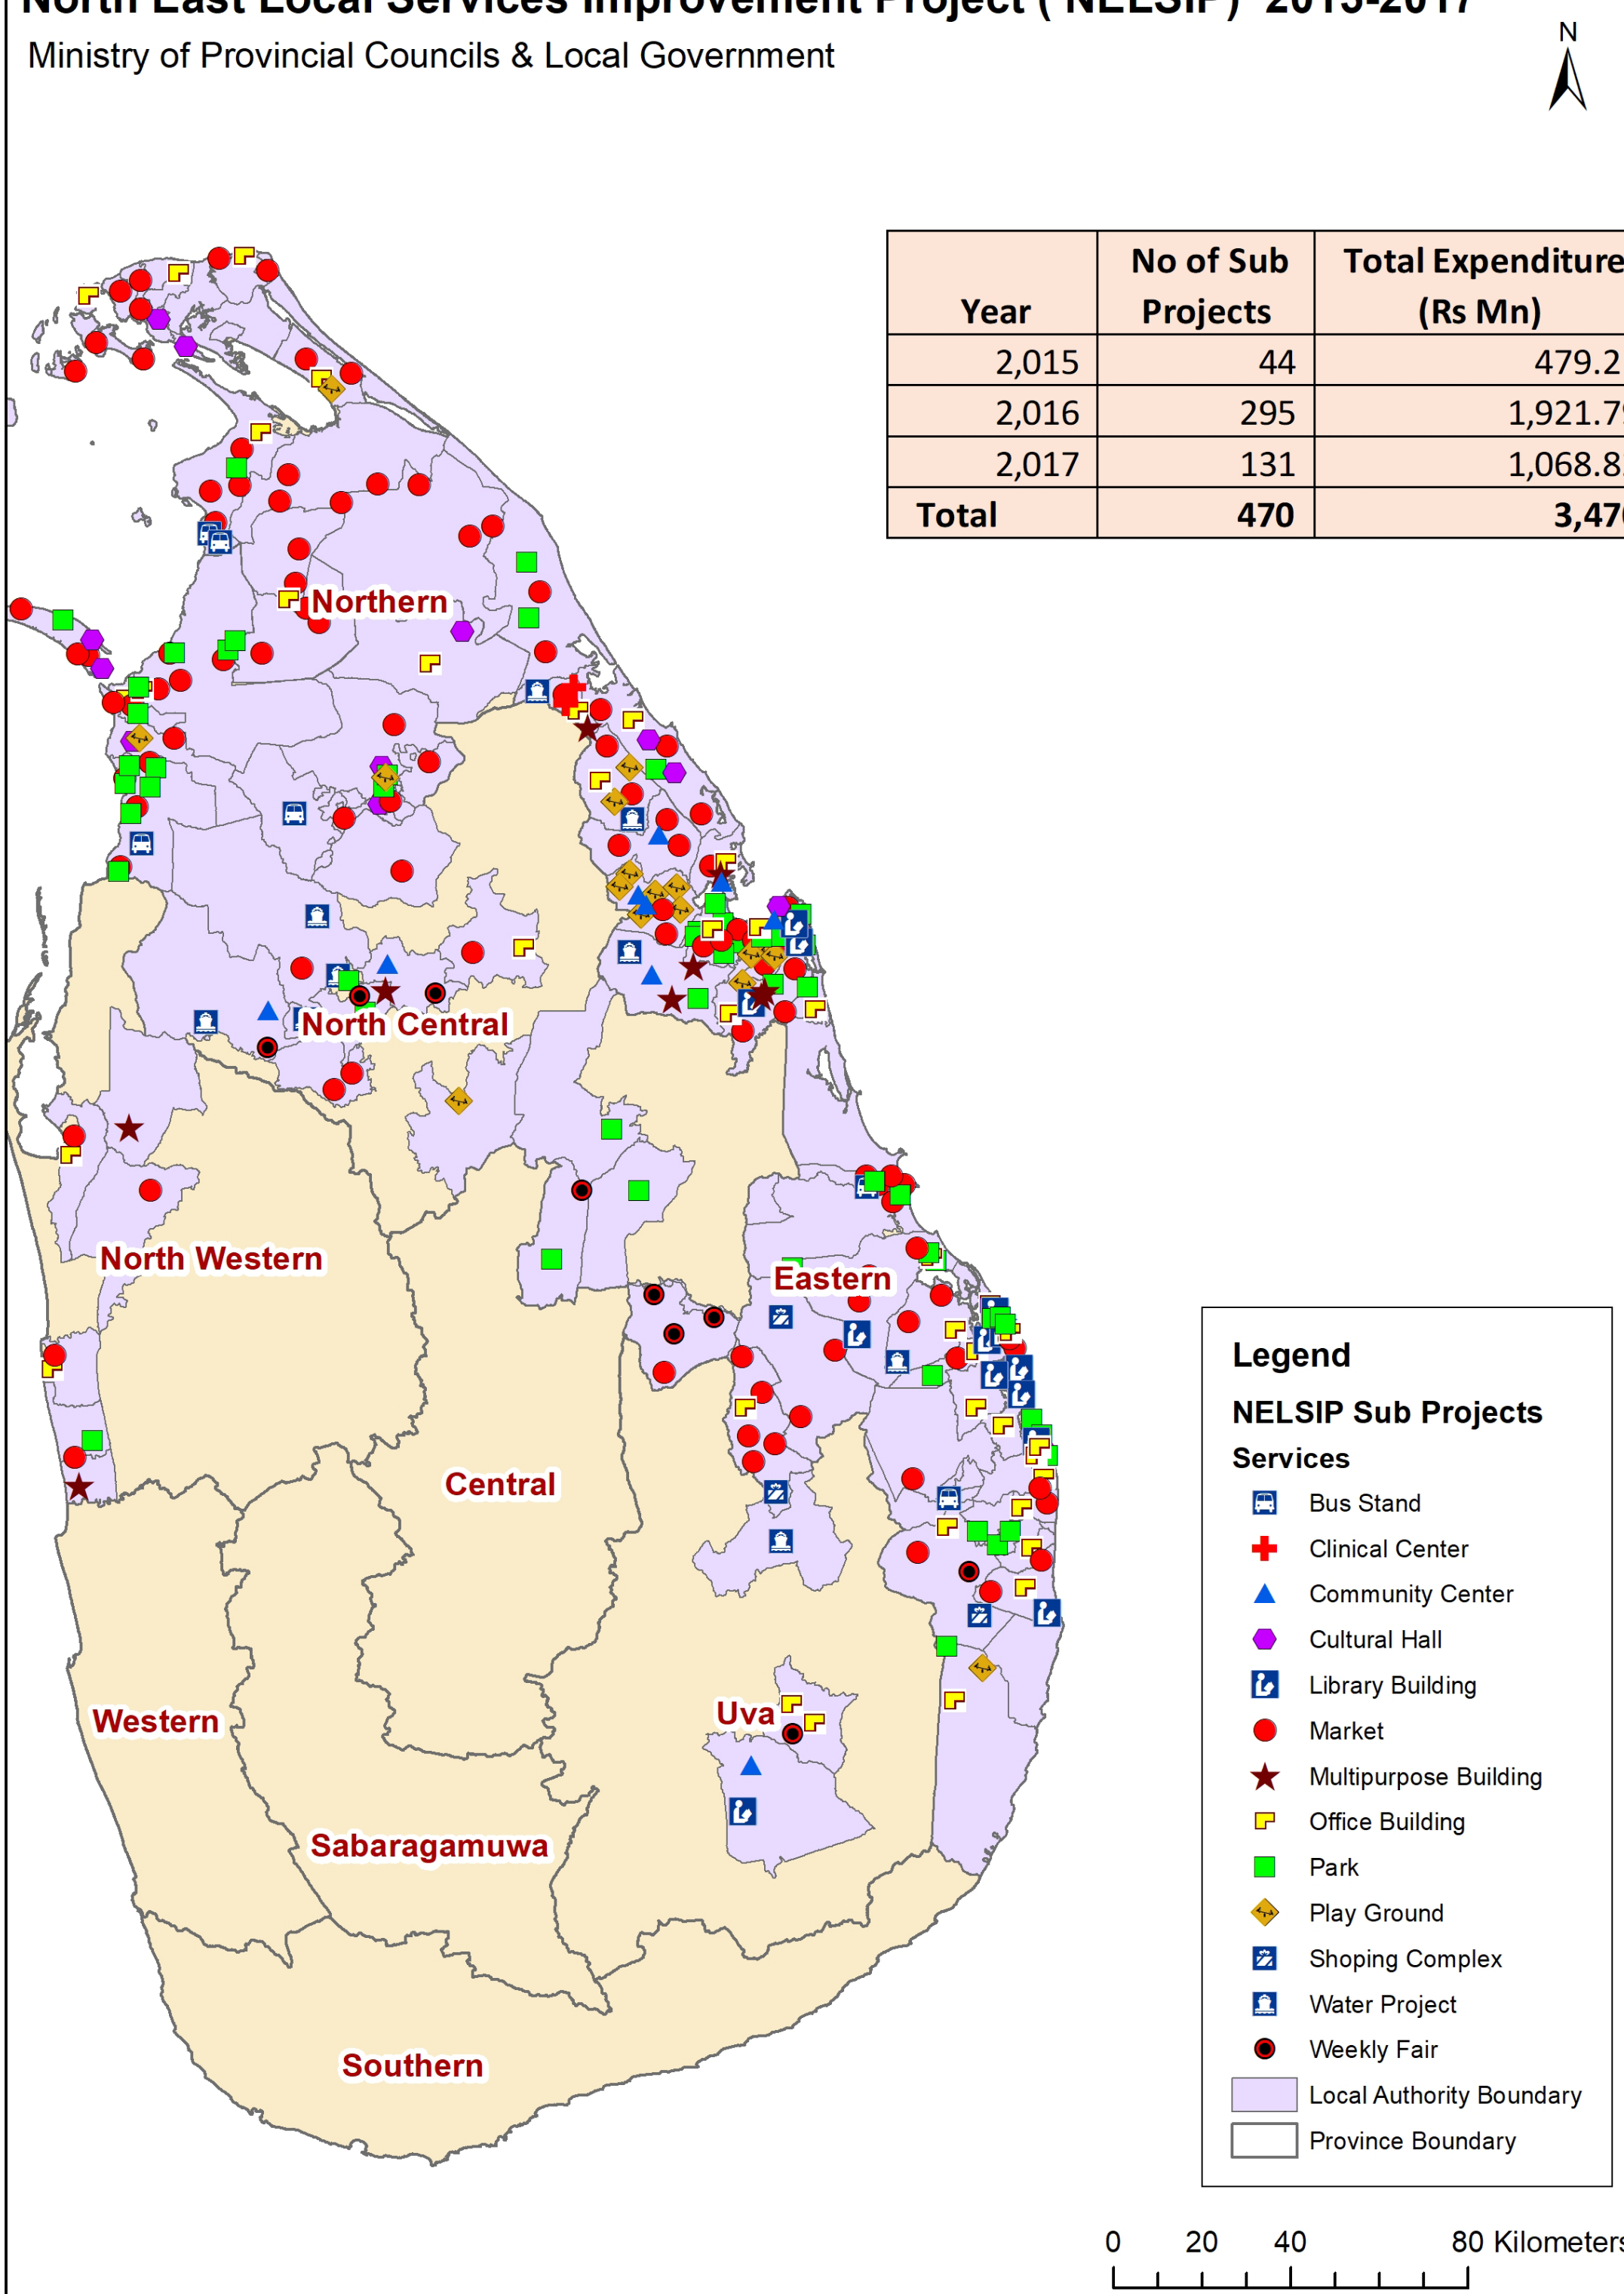

Note: "NELSIP has completed1190 sub projects during the period from 2012 to 2017.

Kundasale Pradeshiya Sabha – Compost plant with Japanese Technology

Provinces and Places that machines will be to be installed	Local Authorities that degradable waste is obtained
Western Province	Beruwala Urban Council, Beruwala Pradeshiya Sabha, Panadura Municipal Council, Panadura Pradeshiya Sabha
North Central Province Medirigiriya	Medirigiya PS, Dimbulagala PS, Welikanda PS, Hingurakgoda PS, Lankapura PS
Central Province Dambulla, Digampathaha	Dambulla MC, Galewela PS, Dambulla PS, Laggala Pallegama PS, Naula PS, Kekirawa PS, Kalugaswewa PS
Sabaragamuwa Province Kegalle	Kegalle UC, Kegalle PS, Mawanella PS, Aranayaka PS, Bulathkohupotiya PS, Dehiowita PS, Galigamuwa PS, Ruwanwella PS, Yatiyantota PS, Deraniyagala PS, Rambukkana PS, Warakapola PS
Sothern Province Hambantota	Hambantota UC, Hampantota PS, Ambalantota PS
North Western Province Ibbagamuwa	Ibbagamuwa Ps, Kurunegala PS, Mawathagama PS, Rideegama PS, Wariyapola PS
Eastern Province Addalachchenai	Addalachchena Pradeshiya Sabha, Samanthurai Pradeshiya Sabha, Akkaraipattu MC, Kalmunai MC, Karaitheevu PS, Ninthavur PS
Uva Province Badulla	Badulla MC, Meegahakivula PS, Badulla PS, Soranatota PS, Kandaketiya PS, Haliela PS
Northern Province Vadamarachchi North East	Wadamarachchi South East PS, Chawakachcheri Urban Council, Point Pedro UC, Welwetithurai UC, Chawakachchri PS, Valikamam PS (West) PS

Commencement of waste segregation of all the Local Authorities

- ❖ Waste segregation was introduced as an essential requirement of all the Local Authorities this year. Further, it has been initiated to line up Local Authorities as clusters for composting of segregated waste. Arrangements have been made to commence projects with private and public partnership to inspiring private institutions for recycling non degradable waste. Measures have been taken to direct non- degradable and non – recyclable waste to sanitary land fillings. Accordingly, establishment of Sanitary Land Fillings has been started.

- ❖ To establish a Task Force and An Operating Committee for waste management in Colombo and suburbs.

- ❖ Public complaints could be lodged through the telephone No. 1917.

- ❖ Necessary measures are taken by the Tri Forces and Environmental Police to give positive responses for the complaints immediately.

- ❖ To take legal action on the complaints of waste disposal by the environmental police.

- ❖ To submit a report on unauthorized waste disposal and possible accidents related to this by the officers of Tri Forces and refer to relevant authorities to get responses for them.

Dengue Control Programme

- ❖ To assist Local Authorities to build up a dengue free environment by making aware to reduce the risk of dengue in the island and formulation of programmes and providing assistance to implement them constantly.

Table No.33 – Progress of Solid Waste Management (as at 30.09.2017) National Solid Waste Management Project

Serial No	Project	Estimated Value (Rs.)	Actual Expenditure (Rs.)	Actual Physical Progress (%)
01	Establishment of compost machin es with Japanese Technology	748,000,000	662,016526	100%
02	Construction and improvement of compost yards, night soil treatment centres and non-degradable waste recycling centers.	235,000,000	118,042,670	100%
03	Purchase and distribution of machinery	116,000,000	--	50%
04	Segregation of waste at the source , improvement of household waste production and conduct awareness programmes	32,0 00,000	35,751,616	100%

05	Conduct of awareness programmes and training programmes through electronic media.	25,000,000	16,753,997	100%
06	Conduct of Waste Management Operations Room	44,000,0000	4,7335,74	100%
Total		**1200,000,000**	**837,298,383**	

Renovating gulley of Hambantota Municipal Council

fNon degradable waste recycling centre Kataragama Pradeshiya Sabha

3.4. Local Government Division

Objective:

Regulation at national level to create Local Authorities that successfully execute their functions and powers while achieving development goals with the objective of becoming a self-generative body safeguarding the regional identity utilizing regional resources and strengths.

Strategies:

01. To utilize human capital and environmental resources effectively in each province focusing the principles of good governance and thereby strengthen the sources of income.

02. To introduce appropriate policies and long term programmes to minimize migration (inward) rate is relatively at a high rate.

03. To ensure the utility of human resources in each province for the safety of entire social and economic process of Sri Lanka.

Implementation of the Front Office System at the Local Authorities in 2017

The programme of establishing front offices at 106 Local Authorities was started with the objective of make efficient the provision of the services with much importance such as paying assessment tax, obtaining necessary formats to the public who visit Local Authorities.

Accordingly, provisions have been allocated to establish front offices at selected Local Authorities and to purchase required computers, office accessories and furniture. Font offices facilitate to pay numerous tax and house rent, issue various license and street line certificates and clearance certificates efficiently.

Provisions for Front Offices

	Province	Number of selected Local Authorities	Provisions (Rs. Mn.)
1	Western	21	13.48
2	Central	10	6.87
3	Southern	05	3,69
4	North Western	13	8.41
5	Sabaragamuwa	13	8.56
6	Uva	06	4.44
7	Northern	03	2.25
8	Eastern	35	23'72
	Total	**106**	**71.42**

Photographs of some front offices

Determining Criteria for Constitution of New Local Authorities and Upgrading Existing Local Authorities

It has been observed that constitution of new Local Authorities and upgrading of existing Local Authorities in Sri Lanka is not properly executed due to the absence of a recognized methodology or a policy. Accordingly, Hon Minister appointed a committee of scholars consists of 12 members on 25.05.2016 with the objective of designing a recognized methodology to constitute new Local Authorities and upgrade existing Local Authorities.

Approval of the Cabinet of Ministers was received on 25.07.2017 to implement the recommendations of the report of the said committee that inclusive of the facts; appoint committees at Provincial / District level consists of the members covering all the fields, obtaining recommendations through Provincial Committees with regard to constitution and upgrading of Local Authorities following a scientific methodology based on the recognized criteria.

Accordingly, requests / proposals received by this Ministry were referred to each Chief Secretary as follows.

Proposals received for upgrading and constitution of Local Authorities

Serial No	Province	Proposals received for upgrading and constitution
01	Western Province	13
02	Central Province	06
03	Southern Province	09
04	North Western Province	15
05	Uva Province	06
06	Sabaragamuwa Province	03
07	North Central Province	05
08	Eastern Province	17
09	Northern Province	08
	Total	82

Accordingly, measures are taken to establish / upgrade Local Authorities based on the recommendations of provincial committees.

Thus Norwood and Maskeliya Pradeshiya Sabhas were established amending the boundaries of Ambagamuwa Pradeshiya Sabha and Kotagala and Agarapathana Pradeshiya Sabhas were established on the recommendation of the Central Provincial Committee. Accordingly, 04 new Pradeshiya Sabhas were established.

In addition, Thamankaduwa Pradeshiya Sabha was divided in to two as Polonnaruwa Urban Council and Polonnaruwa Pradeshiya Sabha.

Giving Relief for the Local Authorities which are under bad weather conditions.

Financial assistance and coordination required for the upliftment of infrastructure in the Local Authorities of Southern, Western and Sabaragamuwa Provinces affected by May and June in 2017.

Further, measures were taken to temporarily transfer the machinery of the Local Authorities not affected by the disasters, to the nearest Local Authority affected by the disaster.

Recognition of Backward Local Authorities on a Scientific Basis

When allocating provisions for the development activities, priority is given for the backward Local Authorities. Therein, precise recognition of their condition is very important. The mechanism used up to date was line up the annual revenue of Local Authorities (exclusive of grants) , name the Local Authorities below 10 Mn of annual revenue as backward Local Authorities and provide assistance for development Presently, Local Authorities are given marks based on criteria prepared by a committee of experts and prioritize Local Authorities.

Accordingly, assistance is given to 100 selected Local Authorities.

The following criteria are focused.

i. Access

ii. Urbanization

iii. Poverty

iv. Education

v. Roads

vi. Electricity

vii. Government Grants

viii. Earned revenue

ix. Vacancies

x. Office Equipment

xi. Risk for disaster

xii. Provincial Status

xiii. Unemployment

xiv. Health

xv. Water Supply

xvi. Libraries

xvii. External Funds

xviii. Major Staff

xix. Financial Management

xx. Office Building

Number of Local Authorities recognized as backward Local Authorities as per the above criteria.

Serial Number	Province	Number of Local Authorities	Number of backward Local Authorities
01	Western Province	48	08
02	North Western Province	33	10
03	Central Province	43	04
04	Uva Province	28	04
05	Sabaragamuwa Province	29	05
06	Southern Province	49	13
07	North Central Province	26	15
08	Northern Province	34	09
09	Eastern Province	45	32
	Total	335	100

Investigation of Public Complaints

General public and Civil Organizations who does not satisfy with the service delivered by the Local Authorities in the nine provinces of Sri Lanka, daily send their complaints to the Investigated Divisions attached to Sri Lanka. Such complaints are forwarded to the Chief Secretary / Commissioner of Local Government/ Heads of Local Authorities as appropriate to take measures to solve them.

2 3.1.6. Investigation of Public Complaints

General public and Civil Organizations who does not satisfy with the service delivered by the Local Authorities in the nine provinces of Sri Lanka, daily send their complaints to the Investigated Divisions attached to Sri Lanka. Such complaints are forwarded to the Chief Secretary / Commissioner of Local Government/ Heads of Local Authorities as appropriate to take measures to solve them.

No. of complaints received as at 31st of December 2017 -1805

Take Measures Regarding Cabinet Memoranda and Cabinet Decisions

I. Proposals are made by Local Government Division to the Cabinet of Ministers to take policy decisions with regard to the subject of Local Governance. Thus, 04 Cabinet Memoranda were submitted in 2017 and they were on delimitation of wards in Local Authorities and to constitution of new Local Authorities and upgrading of existing Local Authorities.

II. In addition, observations are made for the Cabinet Memoranda submitted by other Ministries with regard to the subject of Local Governance as suitable by obtaining necessary information and recommendations from each Province. Ten such observations have been presented in 2017.

III. In addition, measures will be taken to send the Cabinet Decisions to the Provincial Chief Secretaries.

Problems Submitted to the Parliamentary Members and General Public by Parliamentary Members and General Public

- **Parliamentary Questions**

Questions raised expecting answers from the Hon. Minister in charge of the subject of Provincial Councils and Local Government are forwarded to the Chief Secretary of the relevant Province and obtain observations. Subsequently, answers are prepared based on the observations received from the provinces and submitted to the Parliament. 23 Parliamentary questions have been submitted in 2017.

In addition answers shall be prepared immediately for the questions that replies are expected at the adjournment of the Parliament. Questions are sent to the relevant province, obtain recommendations within one or two days and replies are drafted. Number of such questions was 03.

- **Public Petitions Committee**

I. I. People or groups who are unable to get their requirements fulfilled by the Local Authorities send their petitions to the Public Petitions Committee and they are forwarded to this Ministry. This division plays as a mediator to get information from the provinces and grant them relief.

II. There are instances that some officers send petitions on the issues not solved at the institutional level as petitions to the Public Petitions Committee. This division obtains information of such issues from the relevant provinces and plays as a mediator in giving solutions.

46 Public Petitions have been forwarded to this Ministry by Public Petition Committee in 2017.

- Public Management and Sectorial Oversight Committee

This division is taking measures to address the issues forwarded through the Public Management and Sectorial Oversight Committee of the Parliament and herein observations and recommendations of the Provincial Chief Secretaries are considered.

Number of issues submitted to the Public Management Sectoral Oversight Committee in 2017 was 29.

Tax Levied by the Local Authorities

This division takes action to make consistent imposing license fee with the statutory provisions and to amend the relevant provisions in order to remove the obstacles and inconveniences faced by the general public because of the disparities in paying them.

A committee has been appointed on a cabinet decision to regularize tax and license fee levied by the Local Authorities and it may follow a formal methodology regarding tax and license fee.

Actions taken to prevent the inconveniences faced by the general public from the stray dogs

A National Steering Committee has been appointed on cabinet approval to design a suitable method to prevent the inconveniences faced by the general public from the stray dogs. This committee consists of the Secretaries to the Ministries of Provincial Councils and Local Government, Ministry of Health and Indigenous Medicine, and the Ministry of Rural Affairs. under the recommendations of this committee, it has been recommended to control the stray dog population, prevent rabies, to control dog bites at public places while to transfer the dog vaccination and sterilization presently carried out by the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine at regional level to the Ministry of Rural Economic Affairs. The following actions have been taken in this regard.

01. Dog Vaccination and sterilization programmes are being conducted at the Provincial Level and attention has been paid to establish a kennel for each district with the financial contribution of the Non-Governmental Organizations and Business Communities in order to provide shelter for stray dogs.

02. This programme was handed over from the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine with effect from 01.04.2018 to the Department of Animal Production and Health that comes under the purview of the Ministry of Rural Economic Affairs.

03. Arrangements have been made to allocate necessary provisions directly to the Ministry of Rural Affairs from next year.

04. I. In addition, cabinet approval has been received to amalgamate Rabies Ordinance and the Dog Registration the amended bill has been submitted to the Legal Draftsman.

III. To include a mechanism to punish those who leave dogs at public places to the new bill. (A fine of Rs .25000 or an imprisonment of 06 months)

05. I. To take measures to recruit 60 new veterinarians to the Department of Animal Production and Health and decide to authorize them to control dog population and prevent rabies.

II. To decide to attach vaccinators and other relevant officials to the Department of Animal Production and Health without changing their designation and salary.

III. To submit the requests on recruiting the staff further required to carry out dog vaccination and sterilization programme to the Department of Management Services.

3.5. Provincial Councils Division

Objective

To establish an effective and efficient system of Provincial Councils by facilitating for the functioning of Provincial Councils, Coordinating Central Government and Provincial Councils and developing Human Resources of Provincial Councils.

Strategies

1. To strengthen the provincial income sources utilizing the human capital and environmental resources in each province based on the principles of good governance.

2. To introduce policies and long term programmes to minimize the migration (inward) of the Provincial Councils where it is relatively high.

3. To ensure the utility of human resources in each province to safeguard the socio economic development process of Sri Lanka.

Table 3 – Progress of Provincial Councils Division - Up to the end of 2017

Serial No	Activity	Progress
01	Land Acquisition (For Provincial Councils and Local Authorities)	335 requests on land acquisition have been sent to this Ministry from all the provinces with the recommendation of Chief Secretaries.
		Among those requests 202 with errors were returned to relevant provinces. 27 requests have not been corrected and resent to this Ministry and reminders have been sent to the Chief Secretaries of such provinces.
		126 letters with the recommendations of Chief Secretary have been forwarded to the Ministry of Lands for further actions including the issue of order under Section 2.
		12 officers have been appointed to conduct inquiries on objections in terms of the Section 04 of the Land Acquisition Act No. 28 of 1964.

		08 recommendations have been submitted to the Ministry of Lands with regard to the acquisition under the by order 38(a).
		Among them 05 requests have been forwarded to the Hon. Minister of Lands and Parliamentary Reforms with the recommendation of Hon. Minister of this Ministry for abandonment / transfer.
02	Formulation of service minutes for the posts under the Provincial Public Service as per the Public Administrative Circular 06/2006.	Actions are being taken regarding the issues arisen with regard to the following Service Minutes completed in accordance with the Public Administrative Circular 06/2006. Technical Service Revenue Inspector service Textile Instructor Revenue Service Agricultural Instructor
		Recruitment Procedures for the posts of Sports Officer, Sports Instructor and Sports officer of the Headquarters received from The National Salaries and Cadre Commission have been forwarded to all the Provincial Councils and Sabaragamuwa, North Western and Southern Provinces have submitted amendments. Information will be forwarded to the National Salaries and Cadre Commission after receiving information from all the provinces.
	Establishment of Management Service in Local Authorities	Committee Report has been prepared by the committee chaired by Secretary to the Ministry of Public Administration and Management. A Cabinet Memorandum has been prepared to submit the committee report to the cabinet.
03	Quarterly update the contact information of the Members of Provincial Councils and Officers.	A catalogue consists of contact information have been prepared and distributed among all the divisions of this Ministry

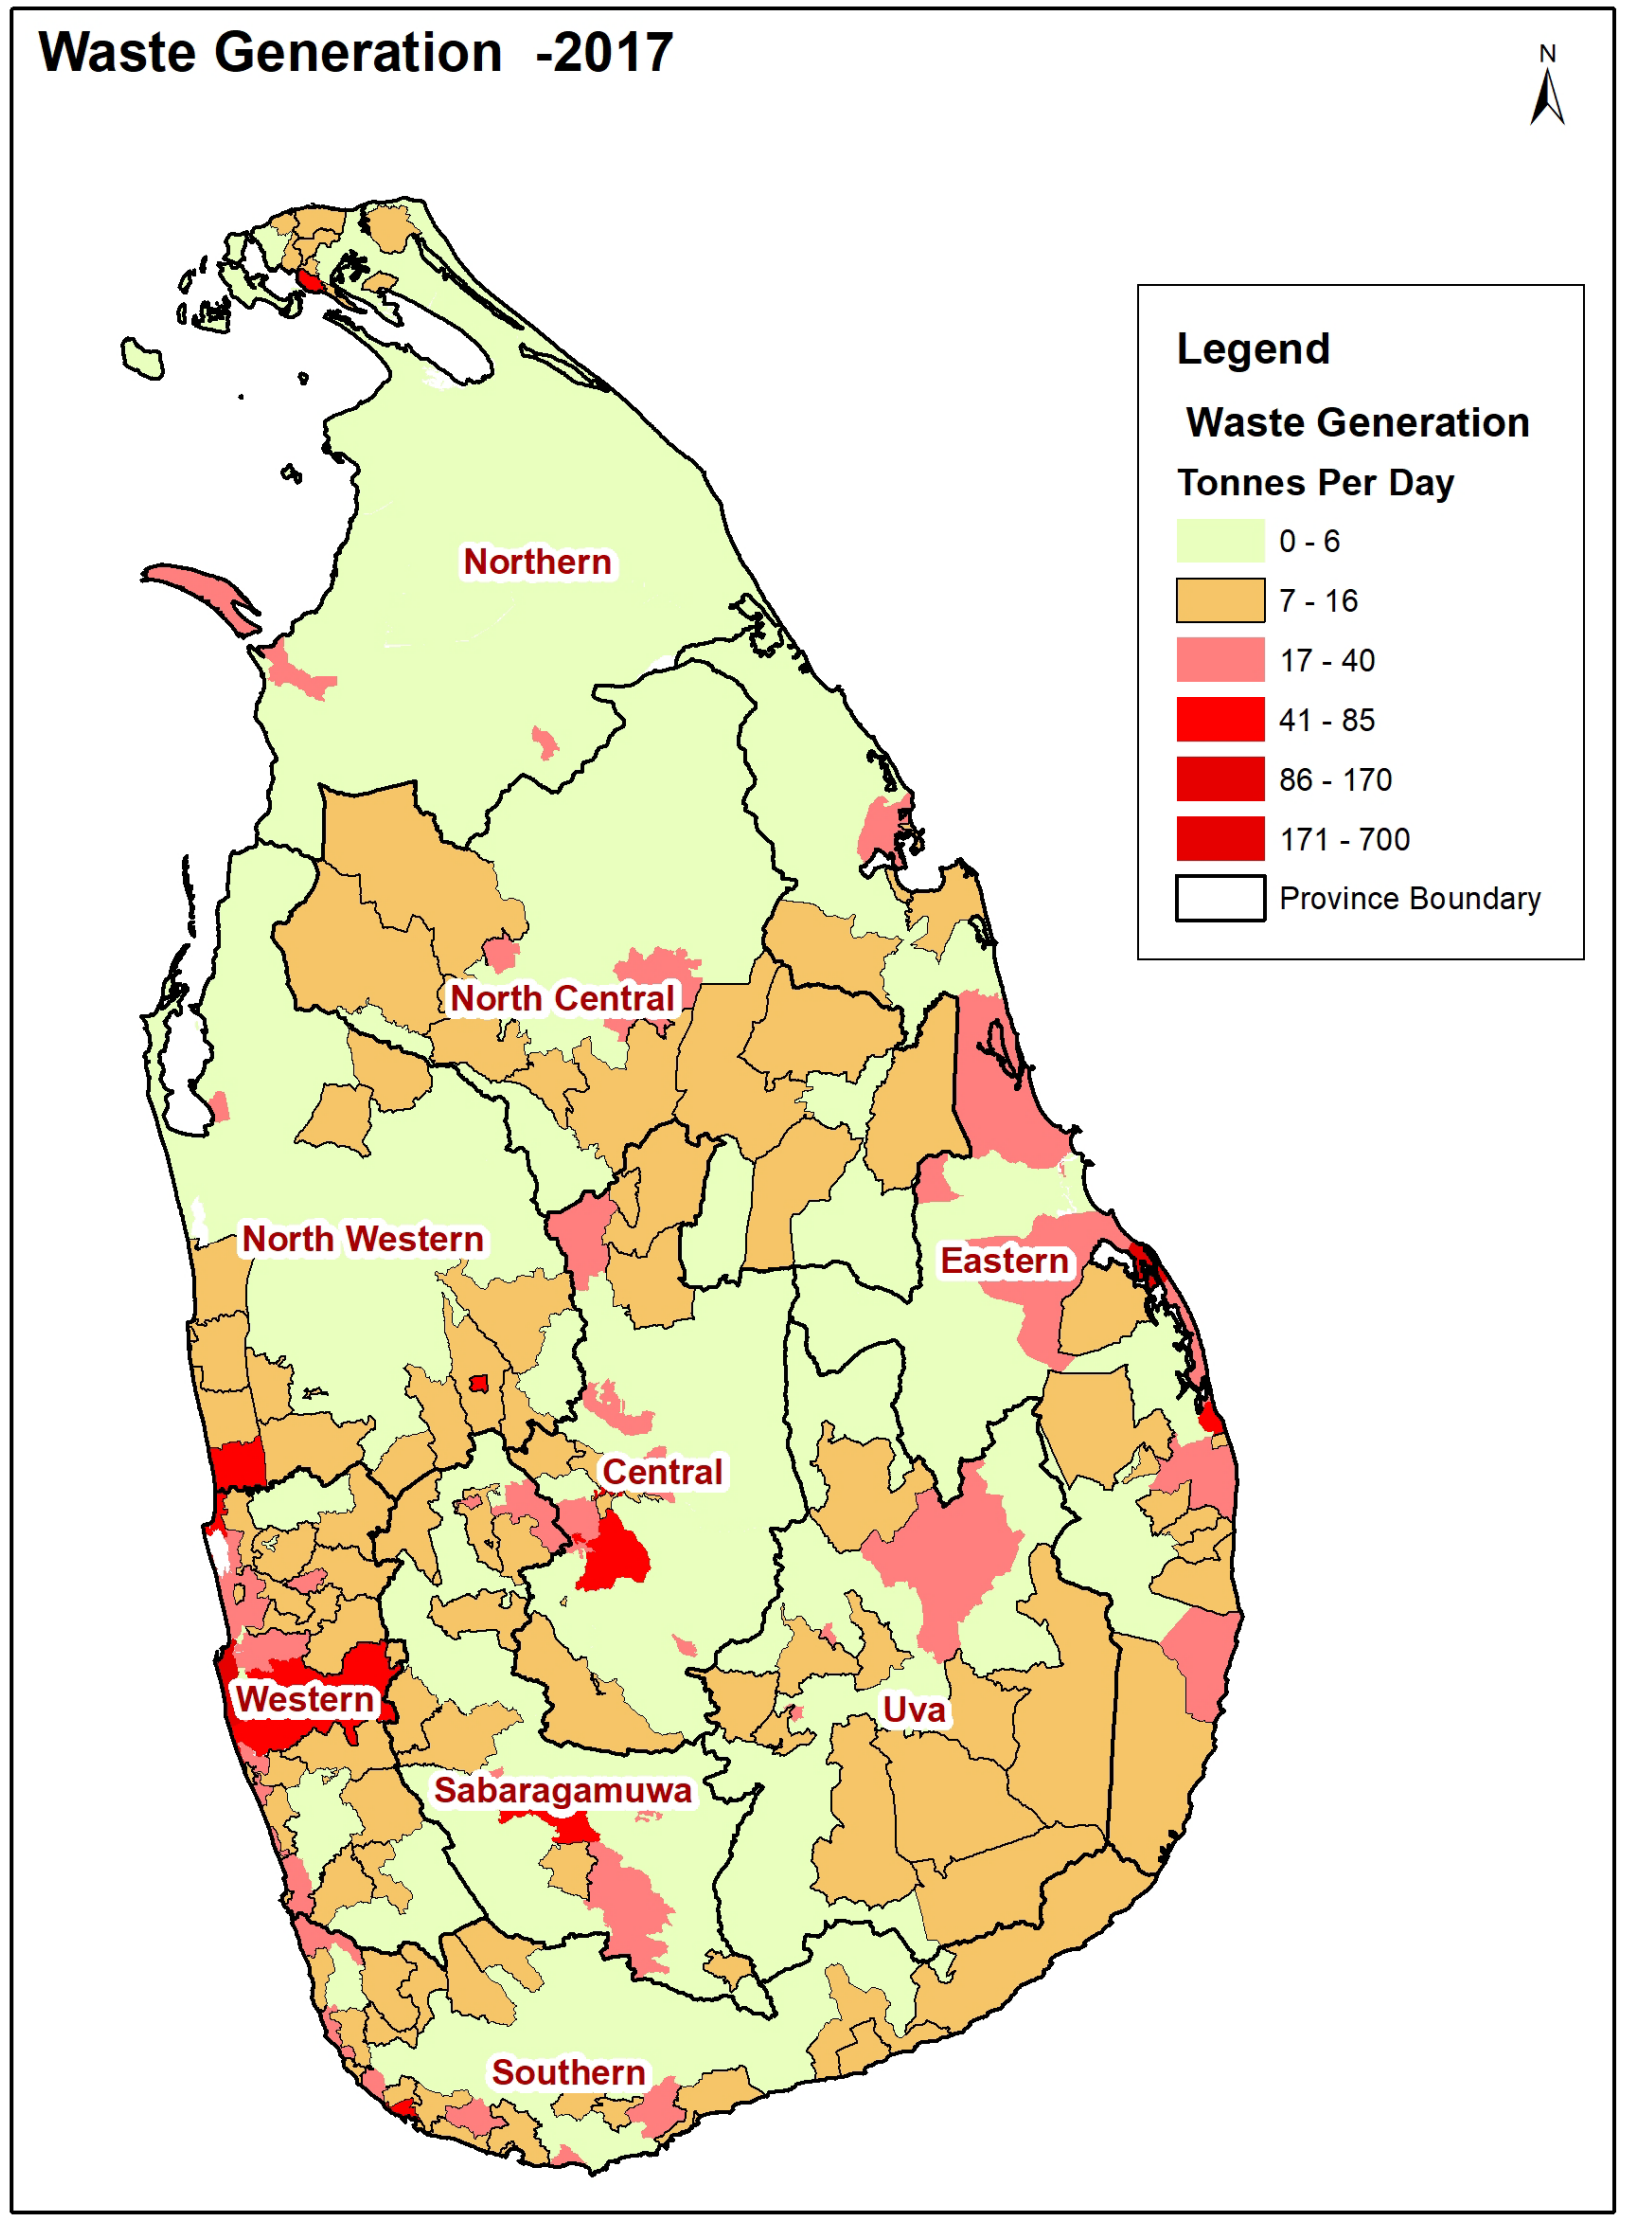
Waste Generation -2017
N
Legend
Waste Generation
Tonnes Per Day
0 - 6
7 - 16
17 - 40
41 - 85
86 - 170
171 - 700
Province Boundary
Northern
North Central
North Western
Eastern
Central
Western
Uva
Sabaragamuwa
Southern

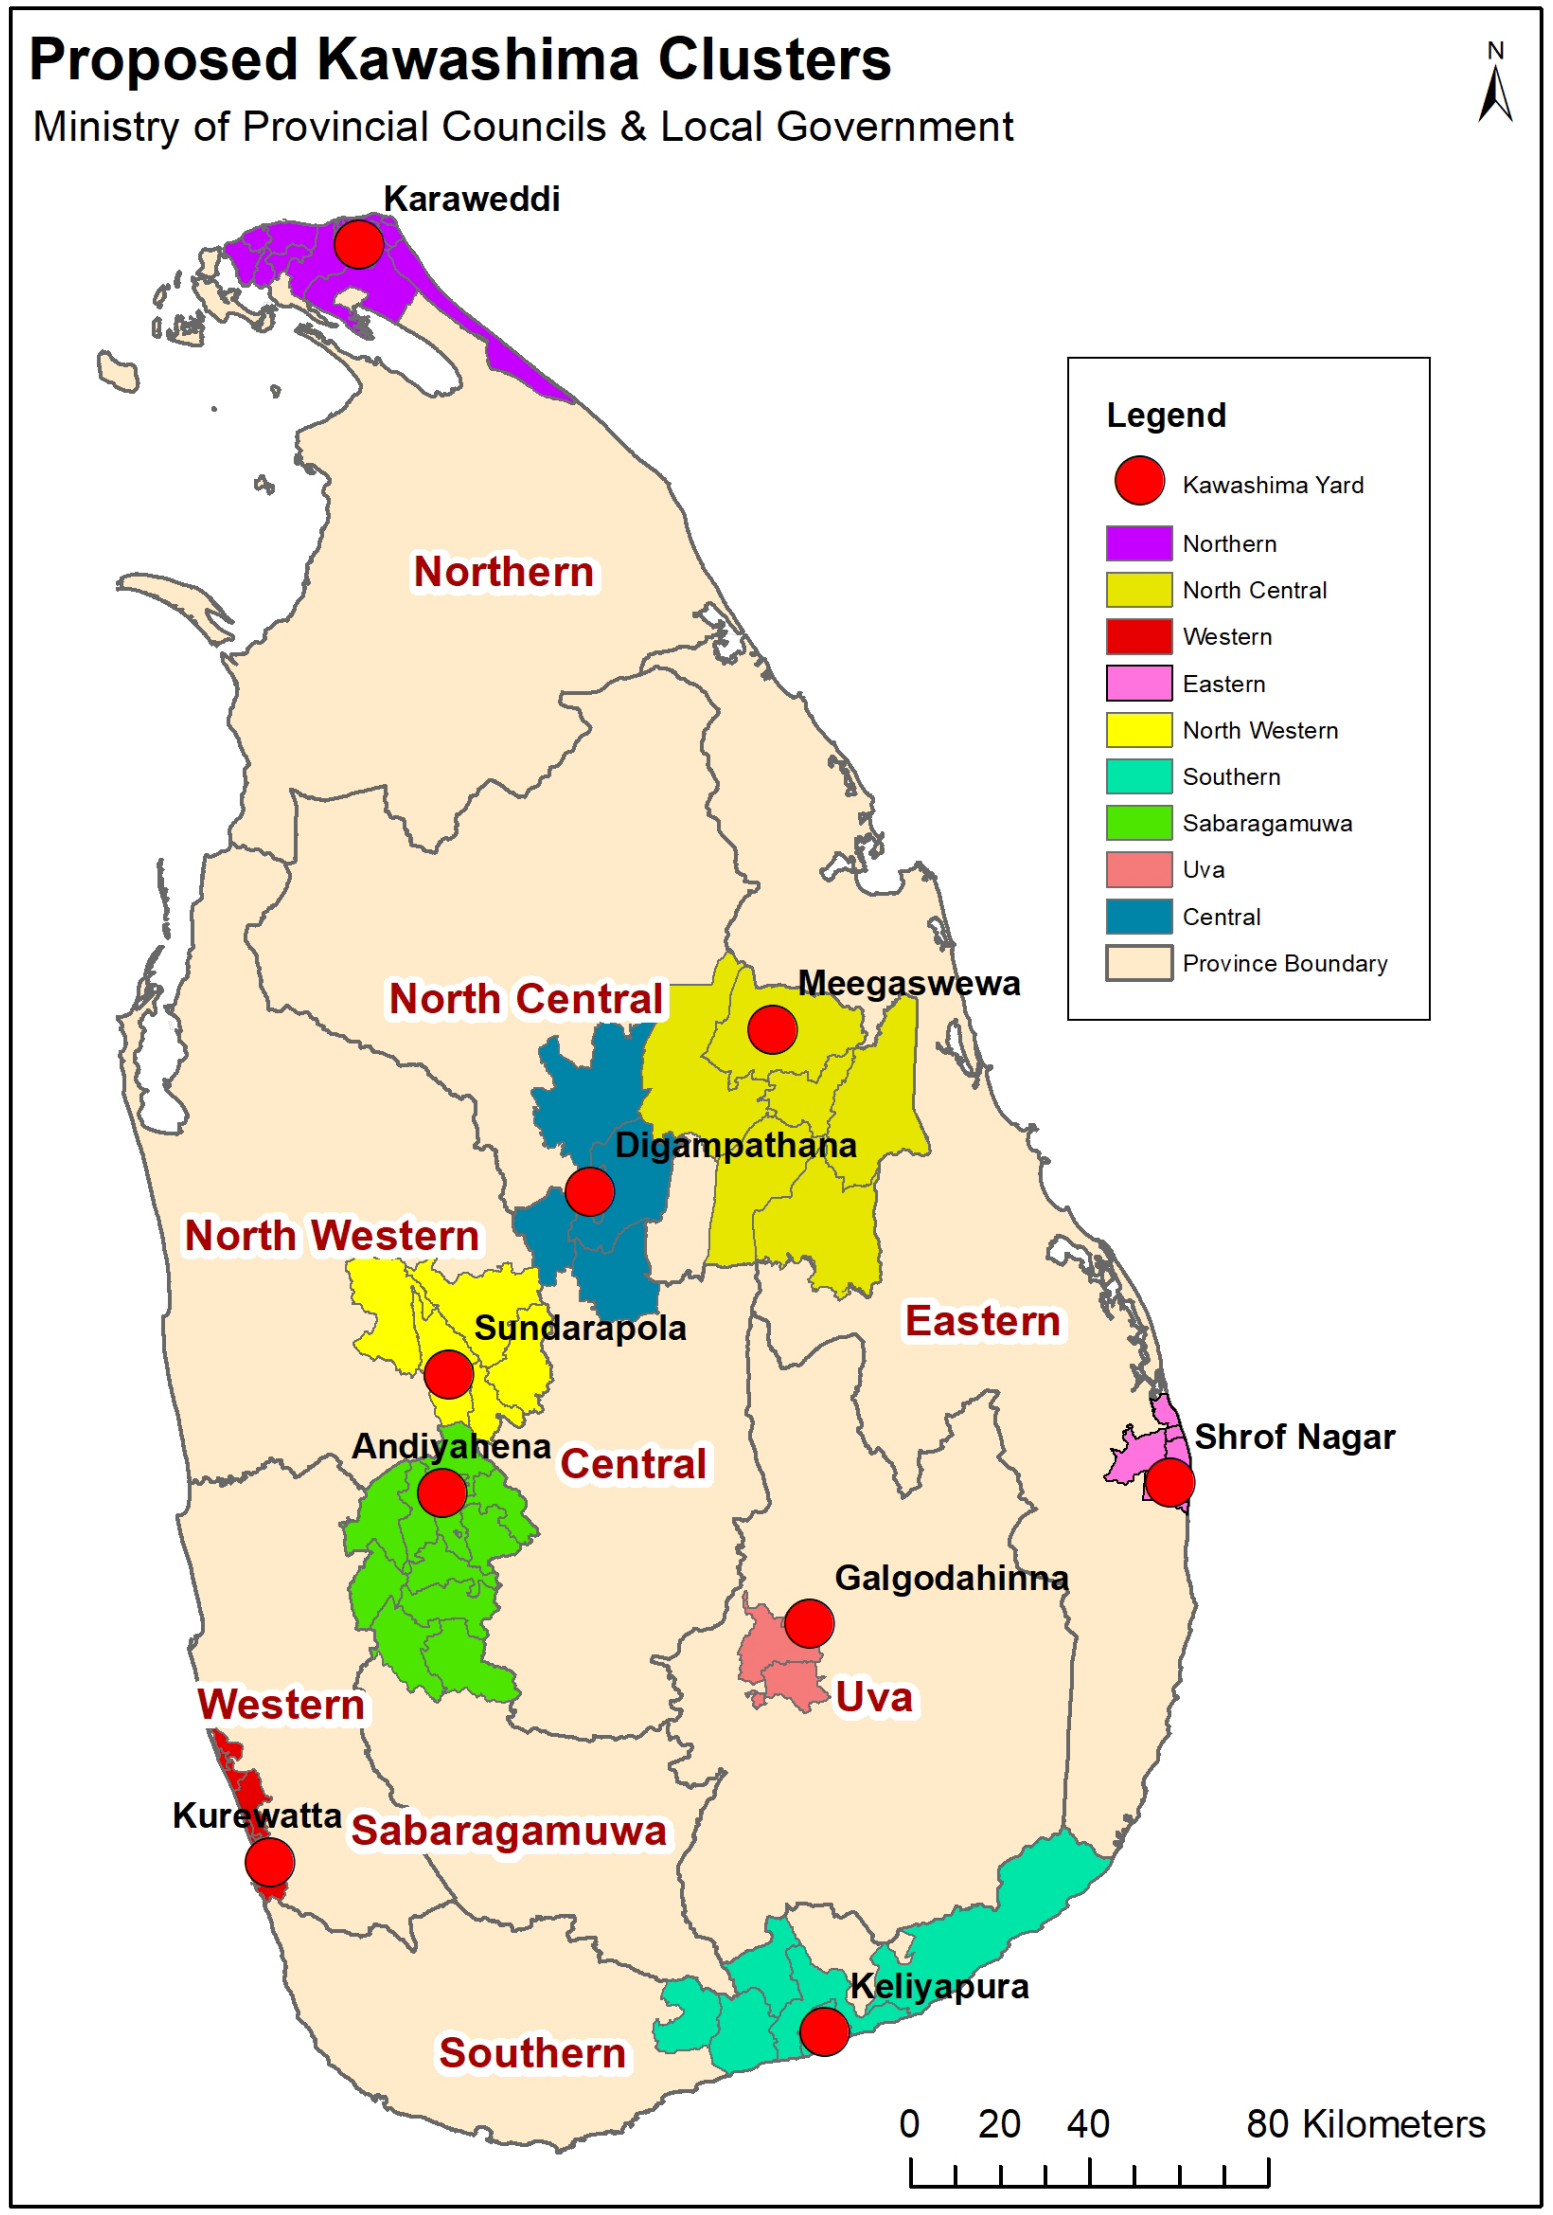
Proposed Kawashima Clusters
Ministry of Provincial Councils & Local Government
N
Legend
Kawashima Yard
Northern
North Central
Western
Eastern
North Western
Southern
Sabaragamuwa
Uva
Central
Province Boundary
Karaweddi
Northern
North Central
Meegaswewa
Digampathana
North Western
Sundarapola
Eastern
Andiyahena
Central
Shrof Nagar
Galgodahinna
Uva
Western
Kurewatta
Sabaragamuwa
Keliyapura
Southern
0 20 40 80 Kilometers

04	Cabinet Memoranda relevant to Provincial Councils and Local Government	I. I. 09 Cabinet Memoranda on the issues of Provincial Councils have been prepared. II. II. 07 observations for the Cabinet Memoranda of other Ministries have been submitted to the Cabinet Office III. III. Chief Secretaries have been made aware on 34 Cabinet Decisions.
05	Parliamentary Questions	Answers for 20 parliamentary questions have been submitted to the Parliament.
06	Public Petitions I. I. Petitions received from Parliamentary Commission on Public Petitions	20 petitions have been sent to relevant Provincial Councils. Recommendations of this Ministry on 16 reports regarding public petitions received from the Committee on Public Petitions have been sent to the Committee on Public Petitions.
07	m<d;a iNd i|yd jdyk ñ,§.ekSu iy §m Issue of vehicle permits to purchase vehicles for Provincial Councils and to import duty free vehicles for the retired officers of All Island Services. I. To give recommendations relevant to Public Administrative Circular 22/99. II. Purchase of vehicles for Provincial Councils as per the National Budget Circular 1/2016. III. To issue permits to import duty free vehicles for the Members of 01st Northern Provincial Council.	,40 received applications have been recommended and sent to the Department of Trade and Investment Policies. 23 applications have been sent for the approval of Expenditure Control Committee. Issued 38 permits to import duty free vehicles.

08	To create new posts	Recommended 752 requests received as per the Management Services Circular 03/2014 to create new posts for the Department of Local Government and sent to the Department of Management Services. Department of Management Services has informed relevant Provincial Councils that 601 posts have been approved.
09	To issue of visa for foreign volunteer workers / extend their term.	Forwarded 21 applications received from the Department of External Resources to obtain visa for volunteer workers to the provinces for their concurrence. 14 requests that have obtained provincial concurrence have been forwarded to the Department of External Resources.
10	Inter Provincial Subject Coordination Forum	Four meetings were held with the participation of Provincial Chief Secretaries and representatives of other relevant institutes
11	Allowances and Facilities of the Members of Provincial Councils	Observations were obtained from the Presidential Secretariat and the Finance Commission for the draft circular formulated by this Ministry to equalize allowances and privileges of the Members of Provincial Councils.
12	Giving relief for the persons who have faced problems on political grounds	Progress on 200 appeals out of 245 appeals received from the Ministry of Public Administration and Management has been sent to that Ministry to implement recommendations.
13	Public complaints and petitions	Necessary measures have been taken for the 52 complaints received from the Prime Minister's Office, Presidential Secretariat, other Ministries, institutes and general public.

14	Coordination of the projects conducted on the provisions of the Presidential Secretariat with the Provincial Councils		After receiving the letter confirming that provisions have been allocated for the relevant projects by the Presidential Secretariat, letters have been sent to respective provinces informing to send bills in order to send settle payments as per the Financial Regulations and arrangements will be made to make payments after receiving bills from the Provinces.
	I.	To plan food production within the variations of the rainfall and climate.	Provisions of Rs. 16,037,005.62, Rs. 1,235,520.03, Rs. 463,725.00 have been granted to North Western, Sabaragamuwa and Southern Provinces respectively.
	II.	National programme on sustainable school development	Provisions of Rs..684,410 has been paid to the Central Province.
	III.	National Programme on Protecting Children	Provisions of Rs. 4,097,365.65 and Rs. 2,999,187.62 have been granted to Central and Eastern Provincial Council respectively.
	IV.	National Programme on Food Production (Jathika Ahara Nishpadana Sangramaya)	Grants of Rs. 2,500,000, Rs. 2,470,000 and Rs. 1,178,750 were granted to Northern, North Western and North Central Provincial Councils respectively.
	V.	Environmental Conservation	Provisions have been allocated as Rs. 57,500, Rs 1,900,000 and Rs. 296,465 to the Central, North Western and Western Provincial Councils respectively.
	VI.	Grama Shakthi Programme	Provisions of Rs. 176,767.50 has been made to North Western Provincial Council.
	VII.	Development of 08 irrigations	Provisions of Rs.5, 000,000 have been made to North Western Provincial Council.

3.6. Legal Division

Introduction

Legal Division of this Ministry has been established in order to facilitate and advise to ensure an effective and efficient populist regional governance that fulfil general aspirations of the entire population of the island and to achieve equal sustainable human management .

Role

01. To update statutes of Local Authorities and Provincial Councils as per the timely requirement in association with them.
02. To introduce new laws relevant to Local Government and Provincial Councils
03. To address legal issues of the Local Authorities and Provincial Councils with the assistance of the Department of attorney General.
04. To take legal measures coordination with the Department of Attorney General in respect of judiciary affairs of Local Authorities and Provincial Councils.
05. To provide legal assistance to formulate relevant statutes and sub laws.

Performance

1. Urban Councils Ordinance was adopted around 7 decades ago and it has been already past three decades that Pradeshiya Sabha Act that is one of the principal statutes was adopted. Hence, outdated provisions of these acts have strongly affected on the effectiveness and efficiency of the public service. Even though the necessity of amending these acts and ordinances,

Even though the necessity of amending these acts and ordinances was recognized by the report of the Presidential Investigation Commission on Local Governance of 1999, still failed to make amendments. Therefore, having considered the necessity of amending these Acts present Minister of Provincial Councils and Local Government appointed a committee and this committee has studied all the matters involved by this Ministry in this regard, prepared set of timely required proposals and submitted to the Hon. Minister. Arrangements have been made to finalize the amendments during next year.

Committee on preparing proposals for the amendment of Local Government Statutes



Report of the Committee on Amending the Principal Act of Local Government

2. Formulation of laws to ensure the minimum 25% of female representation within Local Authorities and activities related to enforcement of the woman in politics have been completed. It was published in the government gazette on 1st of August 2017 as Local Authorities Elections (Amendment) Act No. 16 of 2017 and included to the Ministry website as well.

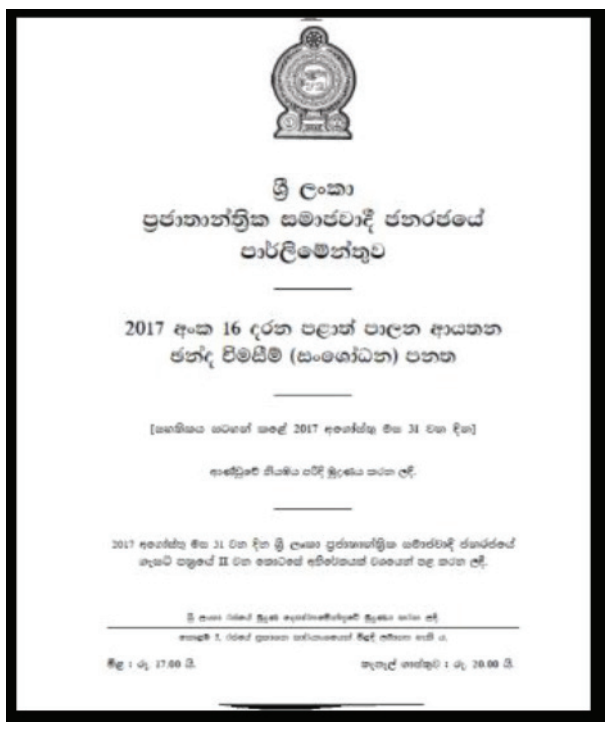

16 of 2017

Making aware women on the quota reserved for the female under the new electoral system

3. Formulation of laws to ensure the minimum 25% of female representation within Provincial Councils is completed. Further, alternations were made in the Provincial Council electoral system and amended the Provincial Council Electoral System. It was published in the gazette dated 22nd September 2017 as the Provincial Council Election (Amendment) Act and included to the Ministry website as well.

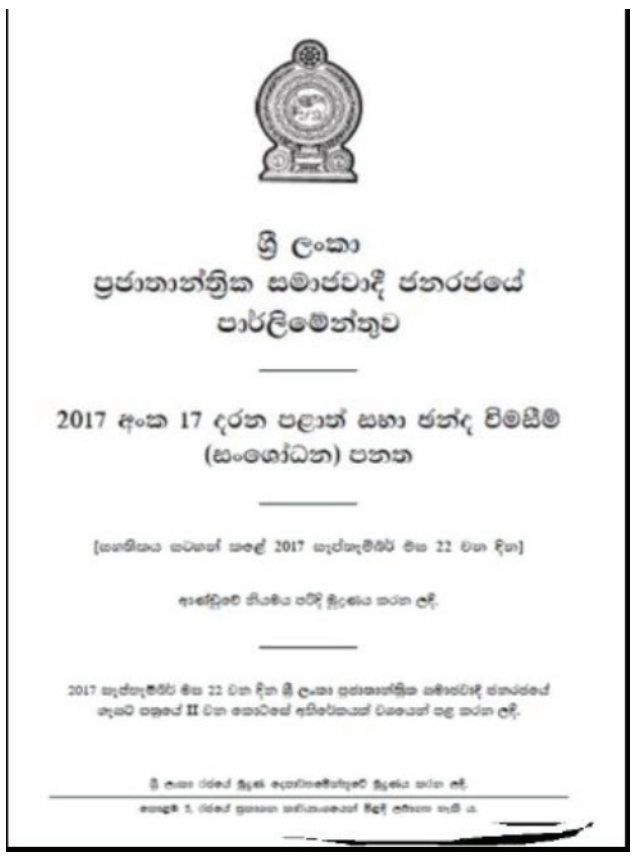

2017 of l 17

Female organization are in a discussion with the Hon. Minister on the quota reserved for female within Provincial Councils

4. The Code of Conduct drafted for the Members of Provincial Councils was submitted to the Cabinet of Ministers and forwarded to the Provincial Councils for approval on the order of HE the President.

5. Arrangements have been made to formulate a mechanism to recognize and prevent the inconveniences faced by the general public because of stray dogs. Further, a steering committee consists of Chief Secretaries has been appointed for its follow up action.

Committee meeting chaired by the Hon. Minister

6. The bill drafted to formalize and expedite the receipt of stamp duty on court fines and transfer of lands by the Local Authorities has been submitted for the certification of Attorney General. Hon. Minister has taken into consideration the request that has been made by the Local Authorities constantly for a long time and the amendments proposed by him may solve the issue of charging stamp duty and court fines by the Local Authorities in future.

7. A bill has been drafted to amend the Pradeshiya Sabha Act No. 15 of 1987 enabling to utilize Pradeshiya Sabha Fund to provide public utilities for the welfare of estate workers and it has been referred for the views of Provincial Councils.



Pradeshiya Sabhas (Amendment)

8. Arrangements have been made to introduce a more transparent and formal method to constitute and upgrade Local Authorities in future having identified the criteria required for the constitution of Local Authorities.

The committee appointed to identify the criteria for the constitution of Local Authorities

Gazette Notification on the number of members of the Local Authorities was published in terms of the amendments of the new Local Authority Election Ordinance. The Extra Ordinary Gazette Nos. 2043/56 and 2043/57 were published on 22nd of November 2017 in the gazette of the Democratic Socialist republic of Sri Lanka

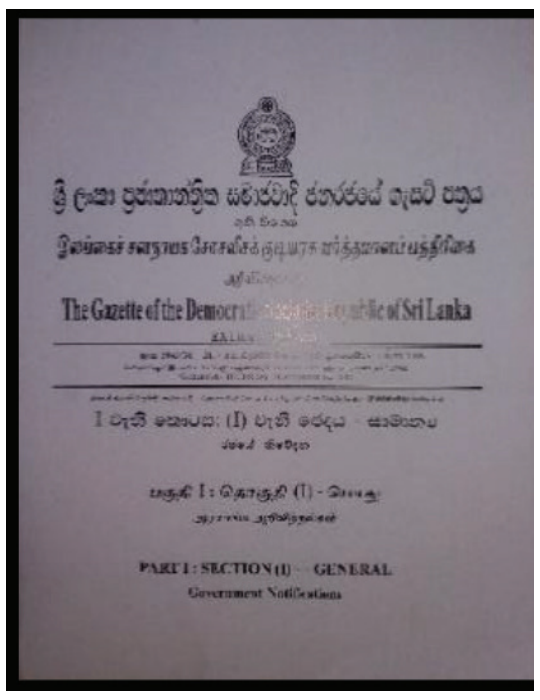
PART I : SECTION (I) — GENERAL
Government Notifications

2043/56

2043/57

3.7 Administrative Division

Key role of the Administrative Division is to Human Resource Management, Human Resource Development and Physical Resource Management. It carried out the following activities effectively in 2017.

	Task	Preliminary Activities
1	Human Resource Management	Maintaining and updating transfers
		Maintaining Leave particulars up to date
		Handling transfers
		Retirements
		Suppressed of redundant posts and creating new posts
		Obtaining staff for vacant positions.
2	Human Resource Development	Identification of training needs for efficient & effective service delivery
		Implementing local training programs
		Coordinating Foreign Training
3	Coordinating Parliamentary Affairs	Submission of 60 Cabinet Memoranda to the Cabinet in 2017
		Sending answers for 68 Parliamentary questions raised from the Hon. Minister of this Ministry
		Submission of observations of the Hon Minister for 41 Cabinet Memoranda
4	System Development	Identification of tasks specified for each division
		Works study for cadre review
5	Implementation of Right to Information Act	Appoint Information Officers
		Conduct Awareness Programs on Information Act
		Collecting information which shall be published by the sections
		Publish information in Web site of the Ministry

6	Application of Productivity Concept	Awareness programmes on 5S concept
		Appointment of Productivity Steering Committee
		Establish Quality circles in Divisions
		Submission of new proposals through quality circles and implementation of them.
		Conduct of Shramadana campaigns together with all the divisions and cleaning of the outside premises of the Ministry.
		Cultivation within the Ministry premises under the National Food Production Programme and make the place green
7	Physical Resource Management	Maintenance of Kandalama Circuit Bungalow / Machinery / Vehicles • Designing the lay out of the Ministry • Construction of the third floor of the Additional Secretary (Local Government & Provincial Councils Division) • Construction of a new building for Projects Division • Renovation of Development Division • Construction of a vehicle park • Renovation of the book binding room • Full reconstruction of the Minister's Quarters • Repair and colour washing of State Minister's Office • Renovation of bathrooms of Kandalama circuit bungalow Financial Management Affairs without source agencies

Cadre Summary

Level	No. of employees		Total
	Female	Male	
1. Senior Level	11	16	27
2. Tertiary Level	03	01	04
3. Secondary Level	107	25	132
4. Primary Level	05	68	73
Total	126	110	236

Expenditure at the end of 2017

Serial No	Task	Net Provisions (Rs. Mn)	Expenditure (Rs. Mn.)	Financial Progress	fN!;sl m%.;sh]
01.	Maintenance of buildings (New construction and rehabilitation)	34.3	31.8	93	90
02.	Maintenance of Machinery	3.3	2.5	76	90
03.	Vehicle maintenance	24.1	22.5	93	95
04.	Implementing Training Programmes	2.5	0.7	30	50

Implementation of Go Green Concept within the limited space of Ministry premises under the National Food Programme

Construction and renovation of buildings in 2017

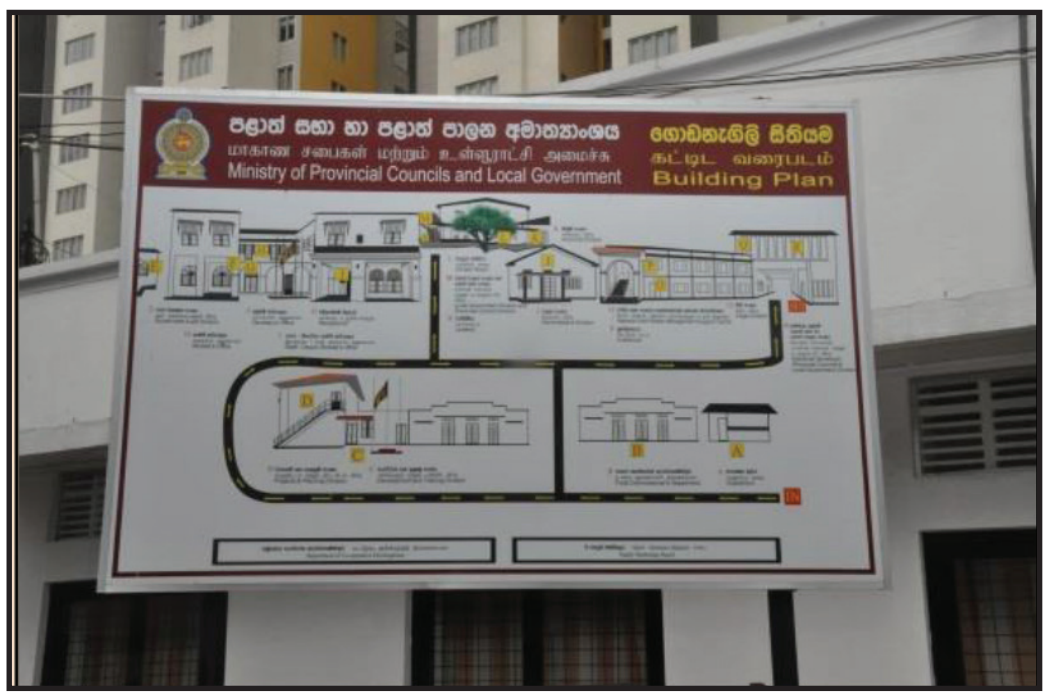

Conduct of Training Prorgrammes and Award of Scholaships

3.8 Expenditure Monitoring Division

Expenditure Monitoring Division was under the Additional Secretary (Provincial Councils and Local Government a) and its authority was handed over to the Chief Financial Officer with effect from September 2017. Date collection on financial performance of Provincial Councils and Local Government, preparing reports on them and providing information to the national level institutes are the major tasks of this division. This information is of much significance when providing facilities to the Provincial Councils and Local Government.

Role of the Monitoring Division

1. Preparation of Financial Performance Reports of Provincial Councils
   Collection information on grants of the central government, estimates of Provincial Councils, revenue, expenditure and cadre and preparation of monthly and quarterly reports on financial performance of Provincial Councils.

2. Preparation of Local Authority Financial Performance Reports
   Collecting information on estimates, revenue, expenditure, cadre and public utilities and preparation of biannual and annual reports on financial performance of Local Authorities.

3. Providing information for national level institutions

   Financial performance of Provincial Councils and Local Authorities are issued to the institutions such as Central Bank of Sri Lanka, Treasury, Finance Commission and the Department of Census and Statistics required for the future forecast and coming into national level policy decisions

4. Taking action on surcharge appeals of Local Authorities
   Financial affairs of Local Authorities are audited by the Auditor General and relevant officers present appeals to this Ministry on the surcharge imposed on the Members and official of them under the Local Authority Act. This division takes such appeals into consideration and take action in this regard.

Performance of 2017

- Monthly reports of Provincial Council Financial Performance for November and December of 2016, and January to November 2017 were completed in 2017 and Financial Performance reports of Provincial Councils for the 4th quarter of 2016 and first, second and third quarters of 2017 were prepared.

- Financial performance Report of 2016 was prepared in 2017.

- The said financial performance reports of Provincial Councils and Local Authorities were sent to Central Bank of Sri Lanka, General Treasury, Finance Commission and the Department of Census and Statistics.

- Member and officials of Local Authorities have sent 19 appeals in 2016 and 2017 and action was taken on 05 of them in 2017. Measures has been taken to obtain observations and recommendations to take action on them and the subject of surcharge has been handed over to the Internal Audit Division with effect from 01.01.2018.

- Reports on Imprest Release and Revenue and Expenditure for the years 2015, 2016 and 2017 prepared using the information of Provincial Councils and the reports on annual revenue and expenditure of Local Authorities are stated below.

Provicial Council and Local Authority Financial Performance Reports Prepared by the Expenditure Monitoring Division.

3.9. Internal Audit Division

Introduction

Objective of this division is to design the audit programme required for a successful audit examination at this time that the role of Internal Auditing for better Public Financial Management is stressed.

Approved estimate of 2018, action plan and new proposals were taken into consideration when preparing this and advice of the Auditor General also has been taken into consideration in terms of F.R. 134 (2).

Role

Assistance required from the Internal Auditor by the Chief Accounting Officer / Accounting Officer to utilize public resources efficiently, effectively and economically and complete the projects on time by accomplishing the responsibility assigned on them are specified under Financial Regulations 133 (I) a (II) as " To Assist the Accounting Officer and Progress අන්වේශන Committee to determine the progress of the development projects and plans assigned to the Department or taken over by the Department"

Accordingly, role of the Internal Audit Division of the Ministry of Provincial Councils and Local Government is to provide audit assistance to complete the development projects of all the divisions, projects, and affiliated institutes utilizing public resources efficiently, effectively and economically.

Activities in 2017

01' l<uKdlrK ú.Kk ätïta$2009^1& yd 2009'06'09 Èke;s pl%f,aLfhys weuqKqu 03 mßÈ 01. Preliminary report of the Ministry was prepared as per the Annexure 03 of the Management Auditing Circular No. DMA/2009(1) dated 09.06.2009 and has been sent to the Department of Management Auditing on 30.01.2017.

02. Audit plan of the Ministry was prepared as per the Annexure 02 of the Para .07 of the Management Auditing Circular No. DMA/2009/1 dated 09.06.2009 and submitted on 06.02.2016 However, due to the revision of the Action Plan of the Ministry, Audit Plan has been revised and submitted for the approval of the Secretary on 26.04.2016 and sent to the Department of Management and Auditing on 28.04.2017.

03. Four Audit and Management committee meetings have been held.

04. 3.8.4. In order to receive information for the Information Management System prepared for the evaluation of financial performance of the institutions which are supervised by the Public Accounts Committee of the Parliament of Sri Lanka., a meeting of all the Heads of Provincial Councils and Local Authorities were held on 27.10.2017, a report was prepared including all the revisions and sent to the Public Accounts Committee on Public Accounts on 31.10.2017

05. The formats prepared to evaluate financial performance of Provincial Councils, Local Authorities and statutory bodies by Public Accounts Committee under the supervision of the Parliament and the report prepared on its amendments under three strategies was sent to Public Accounts Committee on 24.11.2017.

06. An auditing was conducted on the internal administrative system and therein the following matters were revealed. The report on making aware the senior management regarding the weaknesses of the Internal Administrative System was sent on 24.11.2017.

07. Forward of the information received from the following Provincial Councils to the Public Accounts Committee.

Following information has been forwarded.

Serial No	Provincial Councils and Local Authorities that furnished information	Date of the Public Accounts Committee Meetings
01	Southern Provincial Council	2017.0125
02	Central Provincial Council	2017.02.23
03	Colombo Municipal Council	2017.03.10
04	Western Provincial Council –Ministry of Health Special Discussion on Dengue Disease	2017.03.08
05	North Central Provincial Council	2017.03.23
06	Uva Provincial Council	2017.03.23
07	Eastern Provincial Council	2017.04.05
08	Katutura Pradeshiya Sabha	2017.07.27
09	Colombo, Dehiwala, Mt Lavinia, Nugegoda, Galle, Matara and Hambantota Municipal Councils	2017.04.06
10	Panadura Urban Council	2017.07.04
11	Southern Provincial Council	2017.11.07
12	Northern Provincial Council	2017.09.07
13	Eravur Urban Council and Kaththankudy Urban Council	2017.09.19
14	Colombo Municipal Council	2017.10.20

08. To forward the answers received for the audit queries of this Ministry, affiliated institutes and foreign funded projects to the government audit division.

Relevant information has been sent for the following audit queries submitted by the government audit division.

Serial No.	Institutes	Received audit queries
01	Ministry	06
02	Sri Lanka Institute of Local Governance	03
03	Local Loan and Development Fund	01
04	Puraneguma Project	31
05	Greater Colombo Waste Water Management Project	01
06	Second Health Sector Development Project	02

09. Audit queries submitted by Internal Audit Division in 2017

Serial No.	Audited Institute	Audited Period	Date o0f Submission of the Audit Query
01	Project on Improvement of Local Authorities (Pura Neguma – North Western Province)	2017.01.01-2017.01.28	2017.01.30
02	Ministry of Provincial Councils and Local Government 2016 - III rd Quarter	2017.03.01-2017.03.28	2017.03.28
03	Ministry of Provincial Councils and Local Government 2016 – Ivth Quarter	2017.04.01-2017.06.16	2017.06.16
04	Ministry of Provincial Councils and Local Government 2017 - 1 st quarter	2017.06.16-2017.08.08	2017.08.08
05	Greater Colombo waste Water Management Project - 2015	2017.07.01-2017.08.09	2017.08.09
06	Greater Colombo waste Water Management Project - 2016	2017.07.01-2017.08.29	2017.08.29
07	Local Loan and Development Fund - 2016	2017.08.01-2017.09.30	2017.10.24.
08	North and East Local Authority Services Improvement Project (NELSIP)	2017.11.10-2017.12.11	2017.12.11
09	Ministry of Provincial Councils and Local Government 2017- IInd quarter	2017.09.01-2017.12.15	2018.01.06
10	Inspection of personal files	2017.12.15-2017.12.31	2018.01.05

10. Bank Reconciliation statements of the Ministry, Sri Lanka institute of Local Governance, Local Loan and Development Fund and projects have been audited.

11. 04 Internal circulars have been issued to formalize the internal administration of this Ministry / Provincial Councils and Local Authorities. 01/2017
    i. 01/2017
    ii. 02/2017
    iii. 03/2017
    iv. 04/2017

12. Implementation of the Recommendations of the Public Accounts Committee and Submission of the required reports .06 reports have already been sent.

i. Report on the number of sessions of the Accounts Committee held during last five years and the number of accounts that have been checked under No.09 of the Public Accounts Committee of Sabaragamuwa Provincial Council held on 04.10.2016

ii. Report on the amount of money collected from each Province within last 5 years and the way they have been credited in terms of Private Medical Intuition Registration Act

iii. Auditor Reports for the Years 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 of the North Central Provincial Council and the Report on the Examination of present Performance.

iv. Report on the minutes of the Central Provincial Council at the 97th meeting of Public Accounts Committee held on 10.03.2010.

v. Report on the minutes of the Eastern Provincial Council at the 107th meeting of Public Accounts Committee held on 05.04.2017

vi. Report on the minutes of the Uva Provincial Council at the 101th meeting of Public Accounts Committee held on 23.03.2017

13. Two special investigations have been conducted in addition to the Internal Audit Plan of 2017.

i. Make aware on the negligence of assigned responsibilities of Kotte Urban Council as revealed by the Auditor General's Report and the investigation report on this matter was sent on 27.09.2017.

ii. An investigation was conducted on the service delivered by the drivers of this Ministry to pay them overtime and travelling allowances and the report was submitted on 04.10.2017

3.10. Sri Lanka Institute of Local Governance (SLILG)

Introduction

In the report of the Commission of Local Government Reforms issued in 1999, measures that should be taken for the progress of the Local Government Sector of SriLanka was specified. Among them, one of the recommendations was the necessity of establishing a national level Local Government Training and Research Centre for Human Resource Development of Local Authorities. Accordingly, the Ministry of Provincial Councils and Local Government established The Sri Lanka Institute of Local Governance was established by Parliament Act No. 31 of 1999.

The Management of the affairs of the institute are vested in a Governing Council, which consists of 08 ex officio members and 05 others appointed by the Minister. The Chairman of the Governing Council is the Secretary to the Ministry of Local Government & Provincial Councils who is an ex officio member of the Council. The Director of the institute is the Chief Executive Officer.

The Key Role of Sri Lanka Institute of Local Governance the key

role assigned to this institute is to conduct training programmes for the Members and the officials of in the Provincial Council and Local Government Sector and researches in the relevant field. In addition, this institute stands to build up inter relations with the instates related to Local Governance at national and international level and nurture the Local Governance

SLILG carries out the following activities;

- National / Divisional level training workshops
- International / National level seminars
- Practical Sessions
- Diploma Programmes
- Certificate Courses
- Researches
- Consultations
- Publishing hand books and leaflets
- Publishing periodicals on Local Governance

SLILG consists of the following divisions to implement the above activities.

❖	Engineering Division	❖	Legal Division
❖	General Management and Human Resource Development Division	❖	Research Division
❖	Financial Management Division	❖	Academic Division
❖	Physical Planning Division	❖	Institutional Capacity Building Division

This institute studied the island wide training requirements last year and conducted selected training programmes in each province.

Progress of the Human Resource Development in 2017

Engineering Division

Serial	Workshop	Number of scheduled workshops	Number of workshops conducted	No. of Trainees
01	Management of Health and Safety Working Environment	09	10	417
02	Maintenance of Heavy Vehicles and Machinery	09	08	357
03	Skill development in Electric, wiring and aluminum fabrication	09	10	443
04	Skill development in environmental laws and acts	03	03	97

Academic Division

Serial	Workshop	Number of scheduled workshops	Number of workshops conducted	No. of Trainees
01	Workshop on coordinating Local Government Management, Development and Training Units (01day)	04	ගණන	All Commissioners of Local Government and Deputy Chief Secretary Training
02	Workshop on Provincial Coordinating Officers (01 day)	04	04	All Provincial Coordinating Officers
03	Higher Diploma Course on Local Governance 15 /16	Months 18	03	60

04	Higher Diploma Course on Local Governance 16 / 17	මාස 18	01	65
05	Local Government Newspaper – Sinhala / Tamil	Zones 04	01	All the Local Authorities
06	Divisional Level Training Programmes	35	Zones 04	2474
07	Programme on Training of Trainers	04	45	142
08	Publication Division	-	04	

General Management and Human Resource Management Division

Serial	Workshop	Number of scheduled workshops	Number of workshops conducted	No. of Trainees
01	Employee Motivation through the Improvement of Service Productivity and Attitudinal Change	09	13	588
02	Improvement of Communication skills to have effective Personal Relation Skills for Primary level staff	09	11	563
03	Workshop on Office Management	09	12	522

Financial Management Division

Serial	Workshop	Number of scheduled workshops	Number of workshops conducted	No. of Trainees
01	Preparation of Financial Statements of Local Authorities as per the Public Sector Accounting Standards	09	10	513
02	Salary Management	09	10	456

Legal Division

Serial	Workshop	Number of scheduled workshops	Number of workshops conducted	No. of Trainees
01	Court Affairs	09	09	448
02	Formulation and Implementation of by-laws	09	09	426
03	Local Government Law	09	09	424
04	Training of lawyers and trainers of Local Government Sector	01	01	20

Research Division

No	Workshop	No. of trainees
01	Research Study on imposing and levying of tax and assessment tax by the Local Authorities of Sri Lanka	Completed
02	Research Study on the contribution of Local Authorities for revenue generation using the powers vested under the object No. 21 of the Provincial Councils list.	Completed
03	Evaluation of the trainings conducted by SLILG	Completed
04	Local Government Magazine (Sinhala)	Completed
05	Model Local Authority	Homagama Pradeshiya Sabha

Computer Division

Serial	Workshop	Number of scheduled workshops	Number of workshops conducted	No. of Trainees
01	Accelerating the efficiency of Local Authorities through computer networking	09	09	370
02	Make aware public on social media networks	09	09	417
03	Workshop on making aware of Cyber law and information security	09	10	362

Physical Planning Division

Serial	Workshop	Number of scheduled workshops	Number of workshops conducted	No. of Trainees
01	Rules and regulations on city planning	09	07	343
02	Training programme on valuation and taxation	09	09	384
03	Workshop on Disaster Management	09	07	340

Regional Training Programmes

45 training programmes were organized at Provincial Level on the special requests made by each Provincial Council and Local Authorities.

Province	Institute	Number of Programmes
Western Province	Department of Local Government	05
Central Province	Department of Local Government	11
Central Province	Provincial Council	01
North Western Province	Department of Local Government	10
North Western Province	Provincial Council	05
Southern Province	Department of Local Government	05
North Central Province	Department of Local Government	03
Uva Province	Department of Local Government	03
Sabaragamuwa Province	Department of Local Government	02

Projects Executed by the Institute in 2017

•Five day workshop on community participation – SPACE Project

Province	No. of Workshops	Participation
Uva	04	180
Central	04	200
North – Tamil Medium	04	170

- Higher Certificate Course on Local Governance – NELSIP Project

Province	Participation
Uva, North Western, North Central and Central Provinces	54
Eastern Province – Tamil Medium	45
Northern Province – Tamil Medium	04

- sland wide Project on Increasing Female Participation in Politics

Endeavors in 2017

Annual Award Ceremony 2017

Annual Certificate Awarding Ceremony of SLILG held at BMICH on 03rd of October 2017 with the Participation of the Hon. Minister of Provincial Councils and Local Government Mr. Faiszer Musthapha, the Vice Chancellor of University of Sri Jayawardhanapura Mr. Sampath Amarathunga and the Secretary to the Ministry Mr. Kamal Pathmasiri. 380 trainees who followed 11 courses were awarded with certificates.

Training Programmes conducted by SLILG

Programme on formulating bylaws conducted on 22nd and 23rd July 2017 in Southern Province

Computer networking programme conducted on 16th and 17th of August 2017 in Uva Province

Newsletter

2017Programme on cyber law and internet security conducted on 21st of August in Sabaragamuwa Province

Programme conducted by General Management Division on 7th and 8th September 2017

11. Local Loan and Development Fund

3.11.1. Introduction

Local Loan and Development Fund has been established under the Commandment Act Number 22 of 1916 and currently operating as a state statutory body under Ministry of Provincial Councils and Local Government. This fund is the major government body that provides financial assistance for the long term income generative and development projects of Local Authorities.

Vision

To contribute to Economic Social Development of the country becoming the leading Financial Institution for infrastructure development of Local Authority areas.

Mission

To become an autonomous and sustainable financial institution providing long term financing for basic infrastructure facilities essential to social and economic development

3.11.2 අරමුදලේ ප්‍රධාන කාර්ය භාරය

To provide long term loan facilities under low interest rates, in order to facilitate the capital investments undertaken by 341 local authorities including 24 Municipal Councils, 41 Urban Councils and 276 Peradeniya Sabhas.

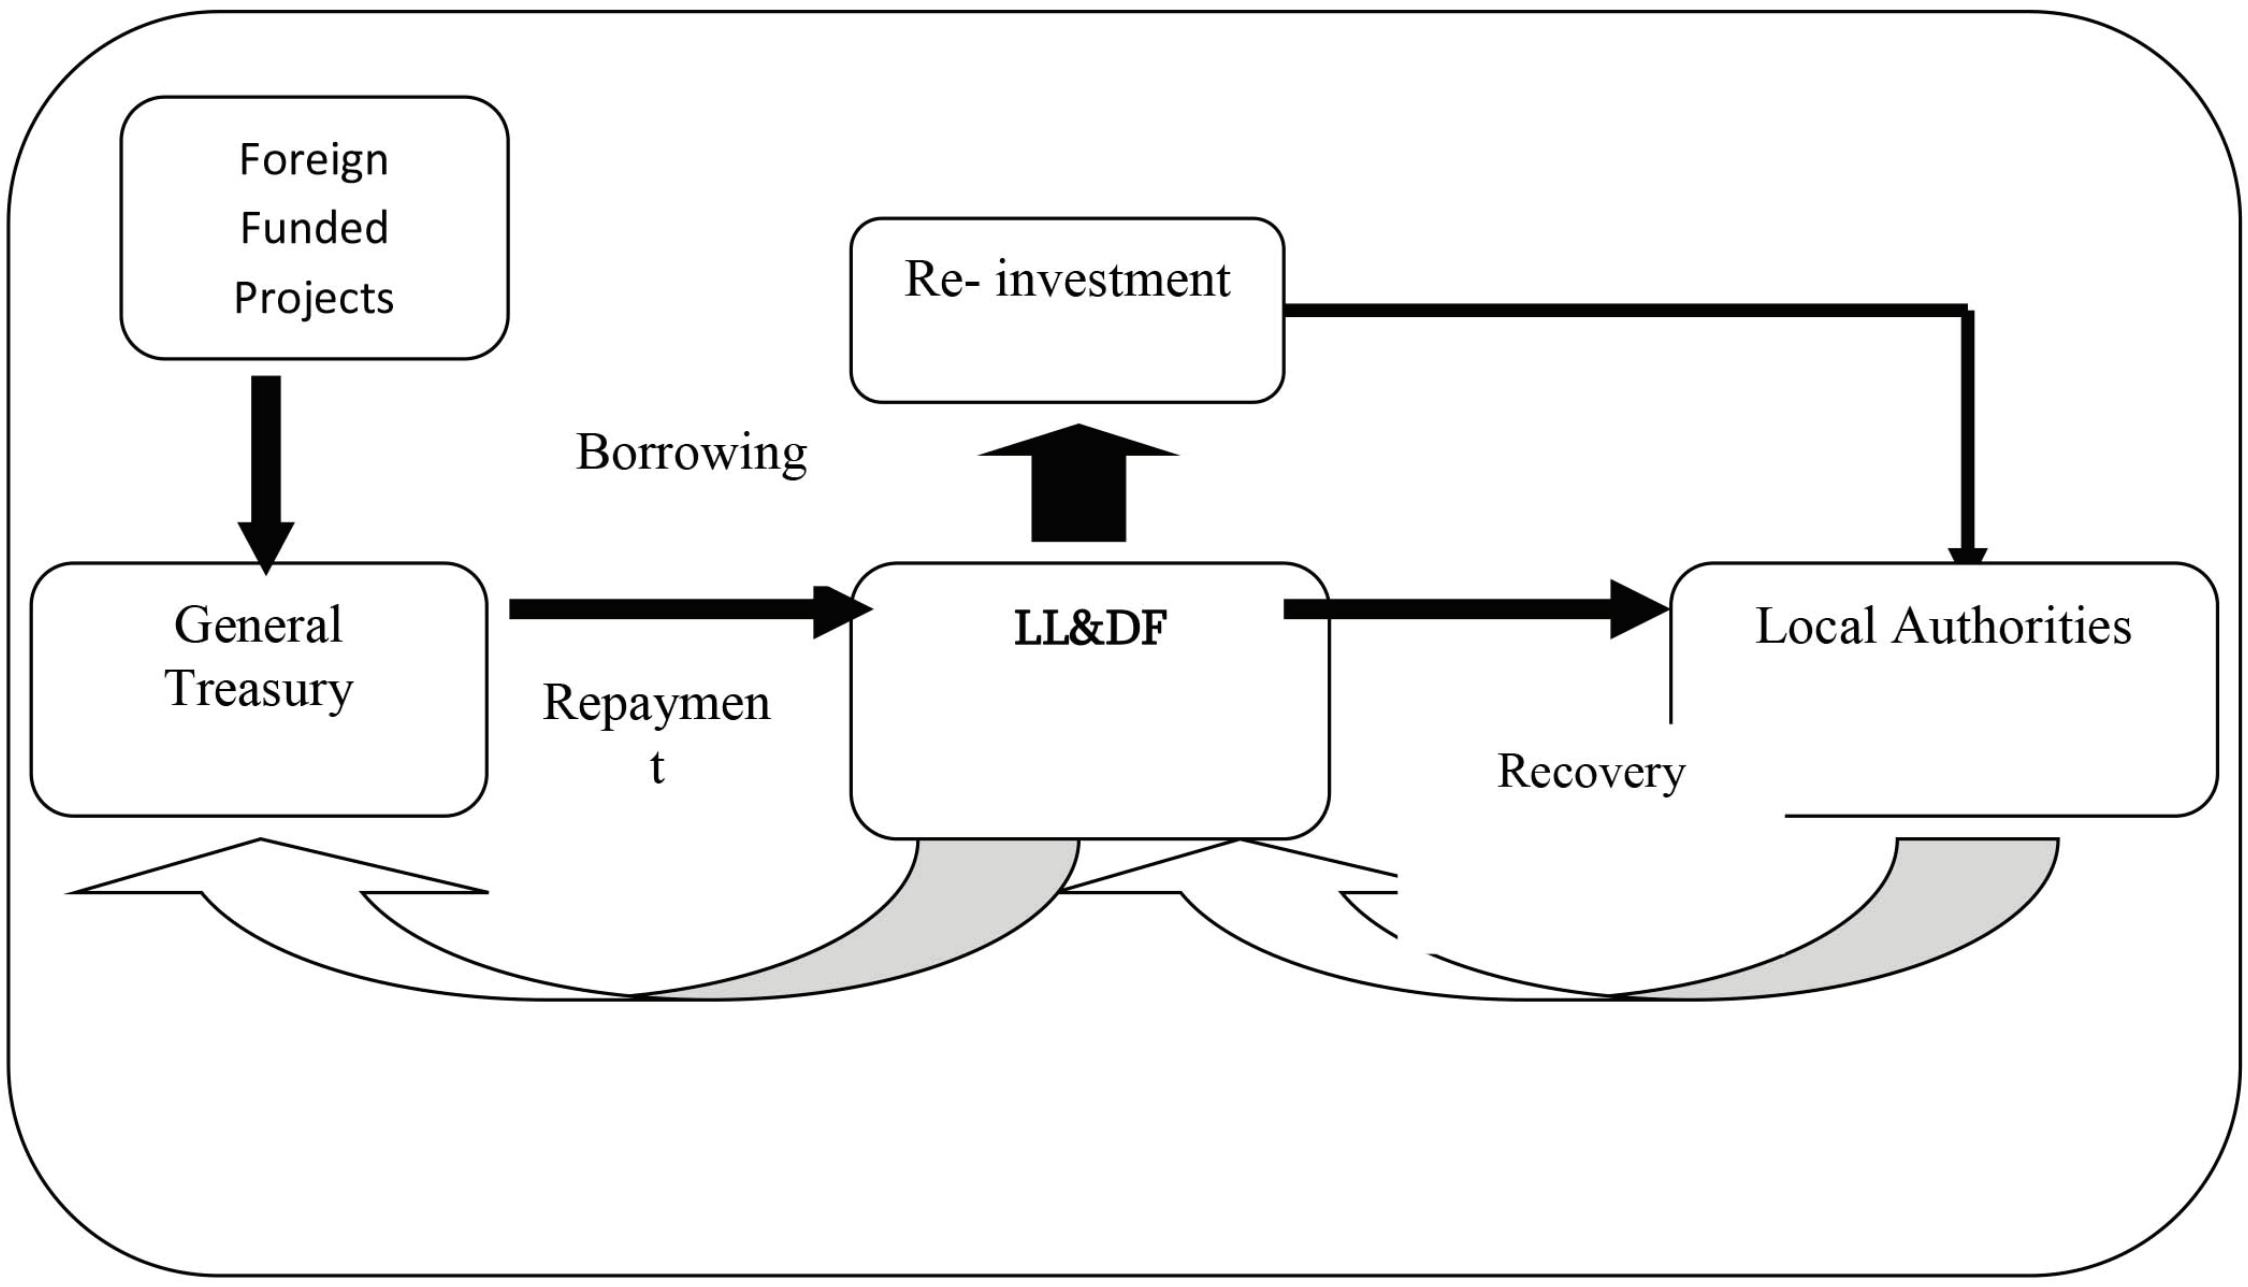

This fund obtains provisions and loans from the treasury and grants loans to Local Authorities on their request as a long term loan on an agreed rate. At the recovery of loans a certain percentage of interest is retained in the fund as a revenue. This fund is strengthened by giving loans again and making investments. Hence, LL&DF does not obtain provisions from the Treasury from 2010 and stands as self-generative body.

3.11.3. Role as Loan Recovery Agency of foreign funded projects

Local Loans and Development Fund are taking part as a repetitive in the projects of Local Government Improvement Incentive Program (LGIIP), Urban Development and Housing in Low Income areas project (UDLIHP) and Provincial Crop Development Project (PCDP). These projects have been commenced with the funds of Asian Development Bank in collaboration with the General Treasury and Public Institutes and LLDF stands as the loan recovery agency and it retains a service charge at an agreed rate.

3.11.4. Performance of 2017

3.11.4.1. Giving Approval and Release of Loans

Projects Approved in 2017

	Local Authority		Province	Project	Approved loan (Rs.)
1	Nuwaraelita	**PS**	**Central**	Construction of the office and the commercial building	40,000,000
2	Karatheevu	**PS**	**Eastern**	Construction of the community hall and the side wall	2,000,000
3	Nikaweratiya	**PS.**	**North Western**	Construction of the crematorium	5,660,000
4	Sri Jayewardenepura Kotte	MC	Western	Contruction of Janajaya City shopping complex	9,500,000
5	Passara	PS.	Uva	Construction of the Shopping Complex	300,000,000
6	Bingiriya	PS	North Western	Purchase of a backhoe	40,000,000
7	Kalmunai	MC	Eastern	LED Bill Boards	7,000,000
8	Hanguranketha	PS	Central	Purchase of a land for the public market	4,000,000
9	Maharagama	UC	Western	Purchase of two tippers, a single cab and a three wheeler	6,000,000
10	Kandeketiya	PS	Uva	Development of the weekly fair building	10,000,000
11	lkafoleáh	mard'i'	W!j	i;s fmdf,ys msysá f.dvke.s,a, ixj¾Okh lsÍu	3,600,000
12	Kurunegala	PS	North Western	Purchase of a JCB	19,000,000

13	Mamunaipattu	PS.	Eastern	Purchase of a tipper	4,400,000
14	Navinthanveli	PS.	Eastern	Purchase of a vehicle to transport dead bodies	1,120,000
15	Rambukkana	PS	Sabaragamuwa	Improvement of infrastructure in the weekly fair	14,308,000
16	Kegalle	PS.	Sabaragamuwa	Construction of the public market	15,000,000
17	Kotmale	PS.	Central	Renovation of the tourist observation centre at Ramboda Waterfalls	4,800,000
18	Chavakachcheri	UC	Eastern	Purchase of a compact loader and a backhoe	6,000,000
19	Jae la	UC	Western	Purchase of a vehicle for street lamp maintenance	6,000,000
20	Dehiwala Mt. Lavinia	MC	Western	Purchase of water bowser for extinguishing fire	8,000,000
21	Gampaha	PS	Western	Construction of the library building	151,000,000
22	Kebewa	UC	Western	Purchase of 02 tippers for waste management	8,800,000
				Total	**666,188,000**

Projects that Finance was Released in 2017

	Local Authority		**Province**	**Project**	**Approved loan (Rs.)**
1	Manmunai South Eruvi Pattu	PS	Eastern	Purchase of a backhoe	9,200,000
2	Negombo	MC	Western	Construction of the library building	22,148,000
3	Pathahewaheta	PS	Central	Construction of the crematorium	5,100,000
4	Koralaipattu West	PS	Eastern	Purchase of an excavator	8,760,000
5	Sri Jayewardenepura Kotte	MC	Western	Construction of Janajaya City Shopping Complex	300,000,000

6	Nikaweratiya	PS	North Western	Construction of the crematorium	5,660,000
7	Maharagama	UC	Western	Purchase of 02 tippers, a single cab and a three-wheeler	10,000,000
8	Passara	PS	Uva	Construction of the shopping complex	22,779,000
9	Medawachchi	PS	North Central	Construction of the shopping complex	12,000,000
10	Hanguranketha	PS	Central	Purchase of a land for the public market	6,000,000
11	Mahara	PS	Western	Construction of the crematorium	1,830,000
				Total	403,477,000

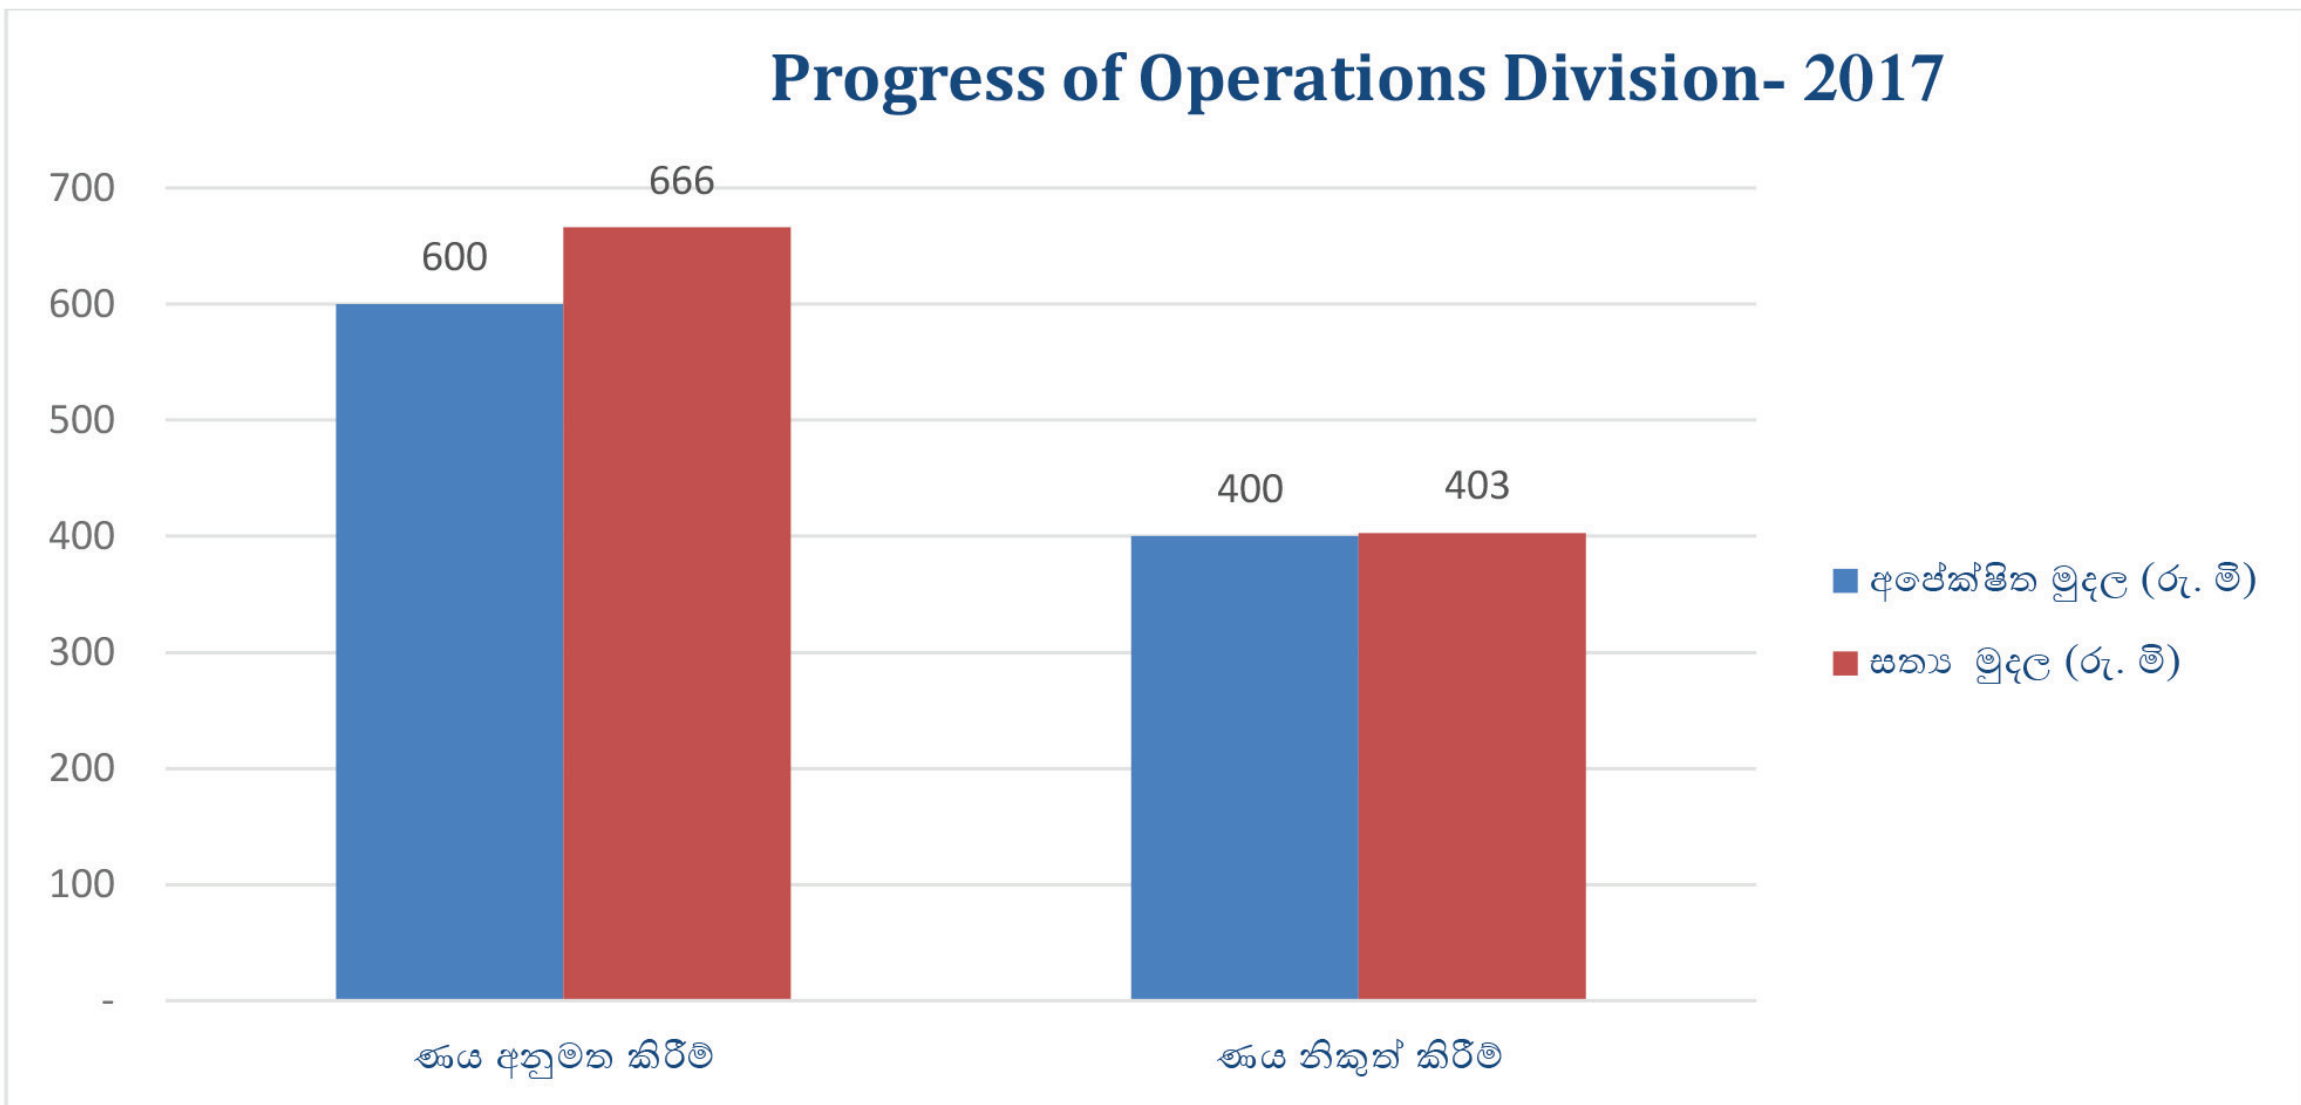

3.11.4.2 Recovery of Loans

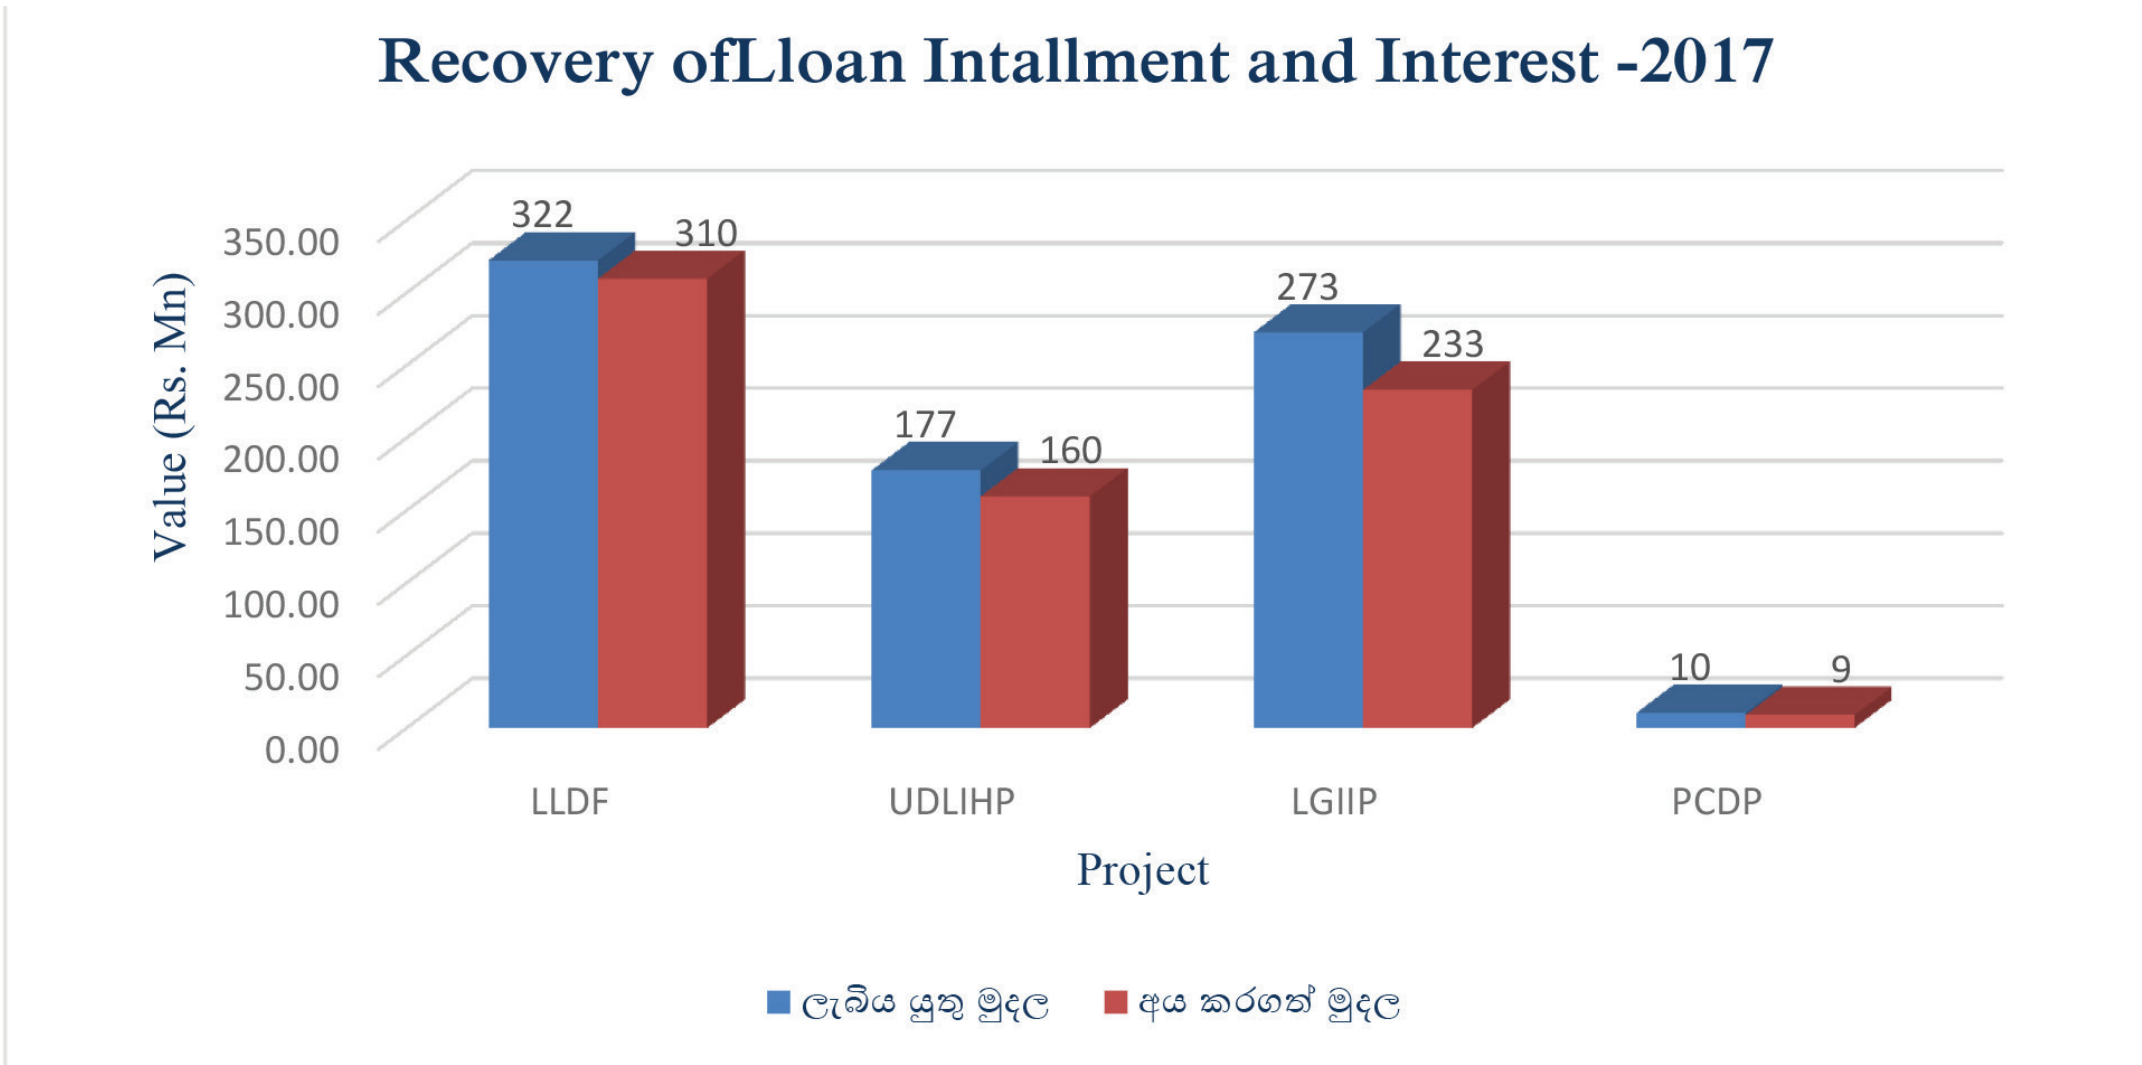

3.11.4.3 Propagation Programmes

"Naya Pola" (Loan Fair) concept was introduced in 2017 by LL&DF in collaboration with the Ministry of Provincial Councils and Local Government as a marketing propagation centre and three fairs successfully implemented in North, Uva and Sabaragamuwa Provinces successfully.

3.11.4.4 Recovery of Loans and Repayment to the General Treasury

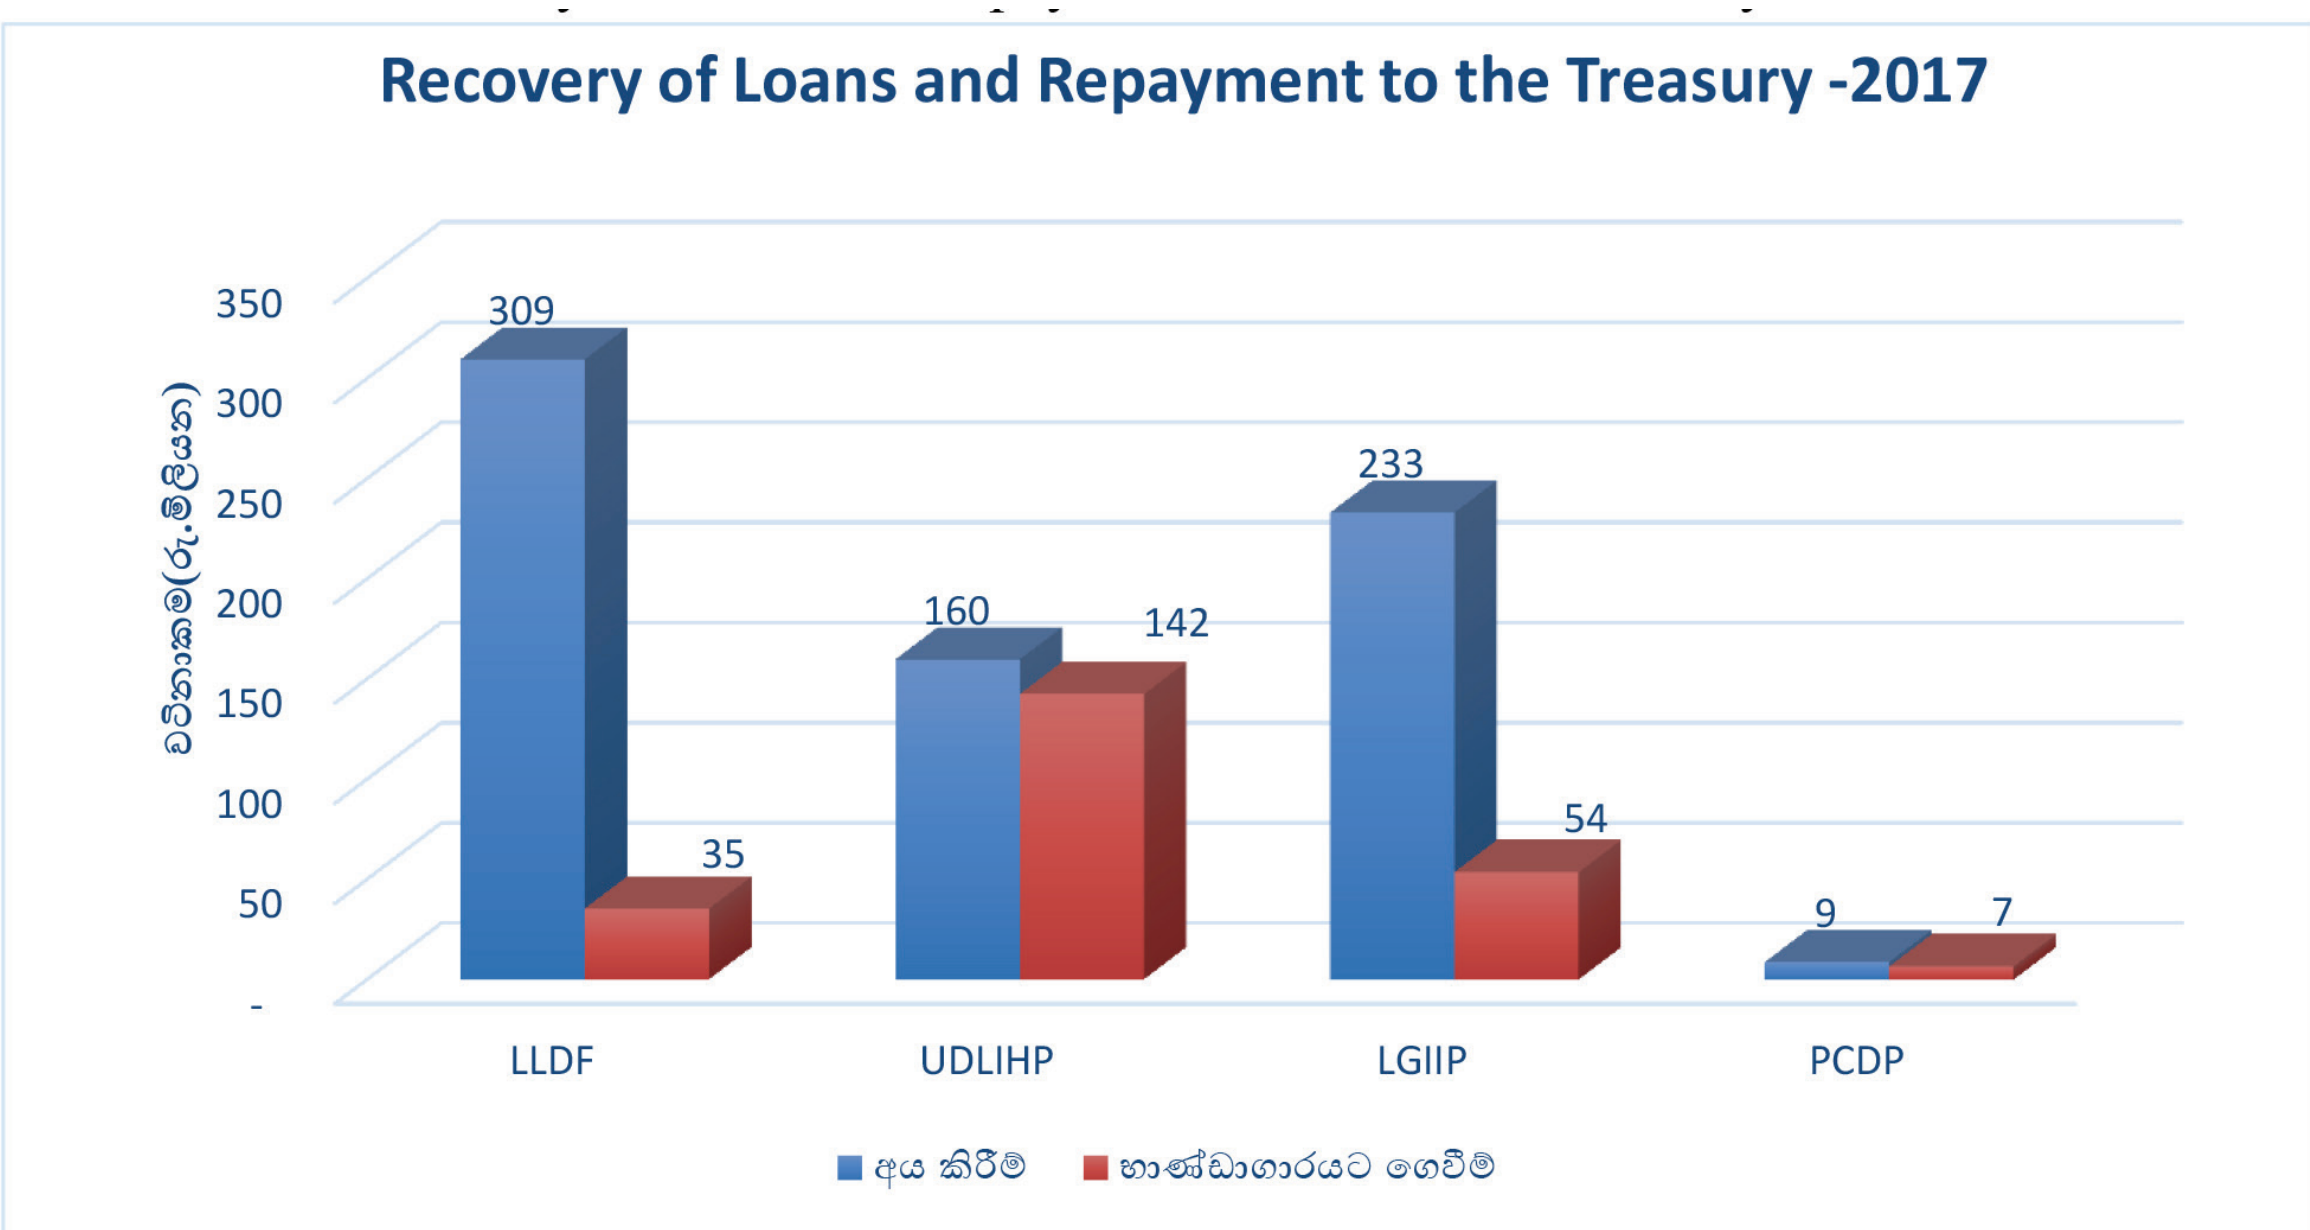

3.11.4.5 Projects that do not settle loans

Assistance of a legal officer is sought to recover the loans in arrears granted by LL&DF and as a result a considerable amount of loans could be recovered.

Total loans in arrears at 01-01-2017	=	Rs. 541,851,537
Total balance of loans recovered and r estructured as at 31.12.2017	=	Rs. 213,682,385
Percentage of loans that could not be recovered	=	39%

3.11.4.6 Projects Financed by the Fund

Sri JAYAWARDENEPURA Kotte Municipal Council – Janajaya City Project - (Loan Rs. 300 Mn)

Rideegama Pradeshiya Sabha – Rideegama Crematorium (Loan - Rs.6.5 Mn)

Chief Executive Officer	: -	Mr. Sumith Amarasiri
Office Address	: -	No. 24 A, Ward Place, Colombo 07.
Telephone No	: -	+94 112687514
Fax No	: -	+94 112691261
E mail	: -	lldf1916@gmail.com
Web Page	: -	www.lldf.gov.lk

4. Cabinet Memoranda -2017

The progress of the 52 Cabinet Memorandums submitted by each Division of this Ministry in year 2017 has been described under this section.

4.1 Provincial Councils Division

Serial No	Cabinet Memo.	Matter	Date of the Cabinet Decision	Cabinet Decision	Progress
01.	CP/2017/19	Request to release a plot of land owned by the Land Reforms Commission and under the National Livestock Development Board to Chillaw UC and Arachchikattuwa PS for a joint solid waste management project	2017.08.02	Grant approval for the second, third and fourth recommendations stated in the paragraph immediately before the last paragraph To Inform North Western Provincial Council to conduct a valuation of the social and environmental impact before the implementation of this project.	Referred to Chief Secretary of North Western Province on 17.08.2017 for necessary action
02.	CP/2017/20	To lessen the minimum educational qualifications for the special preliminary level employee for Local Authorities.	2017.07.26	To take measures as per the Public Administrative circular 36/2013	All Chief Secretaries have been informed.
03.	CP/2017/29	To obtain appropriate lands for Local Authorities for Solid Waste Management	2017.09.15	To take measures as per the Public Administrative circular 36/2013	All Chief Secretaries have been informed.

04.	CP/2017/50	To establish Management Services for Local Authorities		To prepare a joint Cabinet Memorandum	Submitted a Joint Cabinet Memorandum on 16.02.2018

4.2 Accounts Division

Serial No	Cabinet Memo.	Matter	Date of the Cabinet Decision	Cabinet Decision	Progress
01.	CP/2017/32	Submission of the Annual Report - 2015 SLILG	2017.11.01	Herewith attached a copy of the Cabinet Memorandum	
02.	CP/2017/47	To prepare a general accounting system for the Local Authorities as per the Public Sector Accounting Standards	2018.0105	Herewith attached a copy of the Cabinet Memorandum	Actions are being taken as per the Cabinet Decision

4.3 Solid Waste Division

Serial No	Cabinet Memo.	Matter	Date of the Cabinet Decision	Cabinet Decision	Progress
01	CP$2017$04	Establishment of Kawashima Compost Plants at Provincial Level	2017.04.04	Referred to Cabinet Sub Committee on Economic Affairs for observations	Received observations

02	8$2017	Taking Measures to Prevent lingering of Wild Elephants waste disposal yards (Joint Cabinet Memorandum with the Ministry of Sustainable Development and Wildlife)	2017.06.07	Grant approval for the proposals No. 1,2,3 of the last paragraph of the Order the Secretary to the Ministry of Wild Life to utilize the allocations made for the Ministry in 2017 to erect electric fences specified in the Cabinet Memorandum	Take measures to erect elephant fences at the places where Kawashima Plants are established
03	CP$2017$11	To Establish a Sanitary Land Filling for Waste Disposal in Colombo Municipal Council	2017.05.03	Approval has been received for the proposals.	Project was not implemented
04	CP$2017$12	To appoint a Task force and establish an operating office to maintain city beatification in Colombo and suburbs	2017.05.03	Approval has been received	Established the operating office.
05	CP/2017/14	Establishment of Kawashima Compost Plants at Provincial Level	2017.05.23	Officers have been appointed for procurement committees	Relevant Committee has been appointed
06	CP/2017/17	To obtain the assistance of Local Authorities to minimize the risk for disasters and respond them (A joint Cabinet Memorandum of the Ministry of Provincial Councils and Local Government and the Ministry of Disaster Management)	2017.07.19	(Referred to Local Government Division for further action,)	

07	CP/2017/18	Establishment of Kawashima Compost plants at provincial level	2017.07.19	Obtained approval for all the proposals	Establishment of Kawashima Plants is in progress
08	CP/2017/21	Establishment of a Sanitary Land Filling to dispose waste of Colombo Municipal Council (A note to the Cabinet)			
09	CP/2017/26	Measures to be taken to prevent improper waste disposal in Colombo and its suburbs and to control outbreak of Dengue disease.	2017.07.26	To take appropriate measures to implement the policy decisions of the government and establish an effective methodology for follow-up actions	Actions are taken by the Monitoring office
10	CP/2017/31	To use GPS software for the waste transportation vehicles of Colombo and its suburbs and fix wireless CCTV cameras. At waste disposal yards.	2017.09.13	To discuss the proposals in the cabinet memorandum with the Minister of Finance and Mass Media and consider his concurrence	Discussions are on Progress

11	CP/2017/36	Establishment of Sanitary Land Fillings and Kawashima Compost Plants for waste management			
12	CP/2017/42	To use GPS software for the waste transportation vehicles of Colombo and its suburbs and fix wireless CCTV cameras at waste disposal yards			

4.4 Legal Division

Serial No	Cabinet Memo.	Matter	Date of the Cabinet Decision	Cabinet Decision	Progress
01	CP/2017/01	By –Law of the Cabinet Sub-Committee appointed as per the cabinet decision to examine the bill of Local Authorities Election.	2017-06-28	Approval has been received to implement the proposals given in the Cabinet Memorandum	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
02	CP/2017/02	Code of Conduct for the Members of Provincial Councils -31.03.3017	2017-05-02	Decided to advise Secretaries of Provincial Councils and Local Authorities to take action considering the facts stressed in the observations of HE the President.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.

03	CP/2017/07	Amendment of the Dog Registration Act No. 25 of 1901 (Chapter 477) - To form a mechanism to prevent inconveniences faced by the general public due to stray dogs..	2017-03-21	To take immediate action to advise Legal Draftsman to draft amendment bills , to submit the drafted bill to the Cabinet through the Hon .Minister and to amend relevant laws to prevent the inconveniences faced by the general public because of stray cattle as proposed by the Hon. Minister of Mega Polis and Western Development	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
04	CP/2017/09	Amendment of the Local Authority Elections Ordinance (Chapter 262)	2017-05-16	To publish the bill in the gazette notification, submit to the Parliament for approval and advise to the Legal Draftsman to draft further amendments including the proposals of the Elections Commission.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
05	CP/2017/15	To design a monitoring mechanism regarding the tax and other fee levied by Local Authorities due to objections received from the general public.	2017-10-10	Decided to grant approval for the recommendations No. 1, 2 and 3 in the last paragraph of the Cabinet Memorandum.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.

06	CP/2017/28	Global Programme on Universal Programme on Enhancing Social Values and Psycho- Intellectual Values Based on Reconciliation and Equality through preschool education	2017-08-01	Decided to grant approval for the proposals 1 and 2 in the last paragraph of the Cabinet Memorandum	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
07	CP/2017/30	To amend Pradeshiya Sacha Act for the Welfare of Estate Communities	2017-09-26	To publish the Pradeshiya Sabha Amendment Bill in the Government Gazette and submit the bill to the Parliament in order to get approval for sending to the Provincial Councils to get their views as per the Article 154 g of the Constitution .	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
08	CP/2017/33	Set of Proposals to amend Municipal Councils Ordinance, Urban Councils Ordinance and Pradeshiya Sabha Act	2017-08-29	To advise Legal Draftsman to draft amendment Articles	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
09	CP/2017/34	Bill on amending Municipal Councils Ordinance, Urban Councils Ordinance and Pradeshiya Sabha Act	2017-08-29	Approval has been received to implement the proposals in the Cabinet Memorandum.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
10	CP/2017/35	To amend the existing Provincial Council Electoral System	2017-09-06	Decided to grant approval for the four recommendations in the last paragraph of the Cabinet Memorandum.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.

11	CP/2017/38	Calling the nominations of Pudukuduirippu and Maritime Pattu Pradeshiya Sabhas again	2017-09-26	Decided to send to the Parliament to obtain approval to publish in the Government Gazzete.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
12	CP/2017/39	Global Programme on Universal Programme on Enhancing Social Values and Psycho- Intellectual Values Based on Reconciliation and Equality through preschool education	2017-10-03	To appoint a committee and appoint the Secretary to the Ministry of Provincial Councils and Local Government as its convener and Hon. minister shall submit it to the Parliament within 03 weeks to consider the recommendations of the committee.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
13	CP/2017/41	To amend the Local Government Elections Act	2017-10-12	Decision has been received to advise Legal Draftsman to draft amendment bill and submit to the Parliament for approval.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
14	CP/2017/46	Programme on making aware general public and civil organizations on the New Electoral System and female representation in it.	2017-10-27	Decided to grant approval for the proposals (i), (ii) and (iii) in the paragraph 3 of the Cabinet Memorandum.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
15	CP/2017/49	Global Programme on Universal Programme on Enhancing Social Values and Psycho- Intellectual Values Based on Reconciliation and Equality through preschool education		A Cabinet Memorandum on this has been submitted even by the Ministry of Child and Woman Affairs.	Actions were taken as per the Cabinet Decision.

16	CP/2017/51	Amendment of the Local Authority Elections Act	2017-10-24	Decision has been received to submit to the Parliament to publish in the Government Gazette	Actions were taken as per the Cabinet Decision.
17	CP/2017/56	Global Programme on Universal Programme on Enhancing Social Values and Psycho- Intellectual Values Based on Reconciliation and Equality through preschool education			

4.5 Administrative Division

Serial No	Cabinet Memo.	Matter	Date of the Cabinet Decision	Cabinet Decision	Progress
01	CP$2017$45	Note to the Cabinet – To appoint a Ministerial Advisor to the Hon. Minister of Provincial Councils and Local Government	2017.11.08	Appointing Mr. P. Kodithuwakku as the Ministerial Advisor of the Hon. Minister of Provincial Councils and Local Government.	100%

02	CP$2017$54	Extension of the Term of Office of Director / Chief Executive Officer of Local Loan and Development Fund	Decision is pending
03	CP$2017$59	Banning of Spear Fishing by the Ministry of Fisheries and Ministry of Fisheries and Aquatic Resources	Decision is pending

4.6 Development Division

Serial No	Cabinet Memo.	Matter	Date of the Cabinet Decision	Cabinet Decision	Progress
01	CP/2017/27	To facilitate the Local Authorities of the districts that have faced floods and landslides in order to give relief for the affected communities.	2017.09.13	(i) Firstly, to discuss with the Minister of Finance and Mass Media on the recommendations given in the Cabinet Memorandum. (ii) Having discussed as in the above (i) and submit to the a nd submit to the Cabinet to consider the matters to be agreed .	
02	CP/2017/44	Cabinet Memorandum on renovation of the new building complex of Sri LANKA Institute of Local Governance at No. 17, Malalasekara Mawatha, Colombo 07.			

4.7 Local Government Division

Serial No	Cabinet Memo.	Matter	Date of the Cabinet Decision	Cabinet Decision	Progress
01	CP/2017/22	Constitution of New Local Authorities and Upgrading of Existing Local Authorities.	2017.07.25	Approval of the Cabinet of Ministers has been received to introduce a formal methodology with evaluation process through criteria for the Constitution of New Local Authorities and Upgrading of Existing Local Authorities.	Nuwaraeliya District Forwarded to Local Authorities to obtain recommendations for constitution based on the said mechanism. Accordingly, the following boundaries of Ambagamuwa Pradeshiya Sabha were changed on the recommendations of the District Secretary. Accordingly; • Ambagamuwa Pradeshiya Sabha • Maskeliya Pradeshiya Sabha • Norwood Pradeshiya Sabha Further, boundaeies of Nuwaraeliya Pradeshiya Sabha was amended as follows. • Nuwaraeliya Pradeshiya Sabha • Kotagala Pradeshiya Sabha • Agarapathana Pradeshiya Sabha Gzette Extra ordinary No. -57/2043 of 02.11.2017

02	CP/2017/40	To rectify the errors in the report of the appeal committee on delimitation of Local Authorities.	09.26.2017	To rectify the errors in the report of the appeal committee on delimitation of Local Authorities. Approval has been received to (i) appoint a committee consists of five members (ii) to bear total expenditure for the committee	Published the Extra Ordinary Gazette No. 51/2017 of 02.1.2.2017 with signature of HE the President Maithipala Sirisena and The Extra Ordinary Gazette No. 52/2017 of 02.12.2017 with the signature of the Hon. Minister in charge of the Hon. Minister in charge of the subject,,
03	CP/2017/43	To rectify the errors in the report of the appeal committee on delimitation of Local Authorities. (appointing two representatives)	06.10.2017	Approval has been received to appoint the proposed two representatives to Approval has been received to appoint two representatives to correct rectify the errors in the report of the appeal committee on delimitation of Local Authorities	Appointed two representatives

04	CP/2017/60	Issue arisen with regard to delimitation of Mahara Pradeshiya Sabha	2018.01.03	Since this issue has to be solved with the coordination of priests it was decided to report again to the Cabinet and inform the decision to the authorized persons considering that this decision has been adopted.	As per the recommendation of the committee the Gazette Extraordinary No. 2052/34 of 05.01.2018 was published with the signature of the Hon. Minister and amending “Akbar Town “ as “Enderamulla 1”
05	CP/2017/53	Proposal on holding the General Assembly and the Conference of Commonwealth Local Government Forum in 2019	16.11.2016	Approval of the Cabinet of Ministers was obtained to submit the proposal to the Commonwealth Local Government Forum 2017 – Molta. Advice was received to submit the action plan of the programmes specified in the para 2 of the Cabinet Memorandum which are to be introduced in the coming months to the Cabinet for consideration.	Preliminary discussions were held on the future actions to be taken.

06	CP/2017/48	Enter into agreements with the Local Authorities of Foreign Countries under the Sister City or Friendship City Concept of Sri Lanka.			Observations have been requested from the Ministry of Foreign Affairs for a draft Cabinet Memorandum on this Matter.

4.8 Project Division

Serial No	Cabinet Memo.	Matter	Date of the Cabinet Decision	Cabinet Decision	Progress
01	CP/2017/03	Asian Development Bank funded Investment Programme on Greater Colombo Drinking Water and Waste Water Management Project Contractor's Name: Contruction of a new gravity waste system, waste water pumping stations and major pipes for Kirulapane sewer catchment area of Colombo Municipal Council. Contract No : GCWWMIP-P3/ ADB/KS/01/ICB/ Works/01/2015	2017-03-22	1. I rescind the recommendation submitted against recommending the Larsen & Toubro Limited as the bidder that should submit least and comprehensive bids. 2. To rescind the recommendation given by the procurement appeal board to inform Secretary to the Ministry to bargain with the bidder JV of LTL Project (Pvt) Ltd and Prathiba Industries 3. Approval of the Cabinet of Ministers is hereby sought to grant the contact of project No 03 of the Asian Development Bank funded Investment Programme on Greater Colombo Drinking Water and Waste Water Management Project - Contruction of a new gravity waste system, waste water pumping stations and major pipes for Kirulapane sewer catchment area of Colombo Municipal Council to the Larsen & Toubro Limited at a cost of Rs. 7,015,919,086.00 + VAT on the agreement specified in the annexure 6 of ADB	

02	CP/2017/05	Project on replacing traditional street lamps with smart LED lights.	2017-03-22	1. To admit the technical proposal covering all the Local Authorities submitted by the Korean Telecom Company is a most appropriate proposal to lighten the streets with LED street lights. 2. To open the financial proposal submitted by the Telecom LTD and submit the recommendation to the Cabinet of Ministers.	
03	CP/2017/06	Rural Bridges Project – Stage II – Differentiation of contracts through the savings based on the exchange rate variations	2017-03-29	In consideration of the above matters, approval of the Cabinet of Ministers is sought to procure 63 additional bridges not exceeding the value of the loan facility of 128, 600,000 USD on the same rates agreed at the contract agreement signed on 06th May 2014 utilizing the loan balance emerged due to the change of exchange rates and to extend the loan agreement and construction agreement up to 08.03.2018 by three months.	

04	CP/2017/08	Project on replacing traditional street lamps with smart LED lights.	2017-03-29	1. To admit the technical proposal covering all the Local Authorities submitted by the Korean Telecom Company is a most appropriate proposal to lighten the streets with LED street lights. 2. To open the financial proposal submitted by the Telecom LTD and submit the recommendation to the Cabinet of Ministers.	
05	CP/2017/55	Request to extend the term of loan agreement of the Asian Development Bank for Greater Colombo Waste Water Management Project	2018-01-03	To extend the term of loan agreement up to 31st of March 2019 to complete the two contracts on renovation of the existing sewerage system and renovation of pumping stations.	

07	CP/2017/57	To obtain loan facility of 05 Mn USD to get technical support for proposed secondary city sustainable development project funded by ADB.	2018-01-10	1. To obtain loan facility of 05 Mn USD from ADB to obtain technical support for the initial activities such as designing sub projects, to identify basic procurement and procurement of consultancy required to identify formal administrative methodologies of the proposed secondary city sustainable development project. 2. 2. To appoint a Cabinet approved procurement committee to implement the above activities. 3. To hand over the tasks of designing and planning projects , procurement and implementation of activities with the consultancy of relevant stakeholders to the Ministry of Provincial Councils and Local Government.	

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

නො. 330, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02.

மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

330, யூனியன் பிளேஸ் கொழும்பு - 02

Ministry of Provincial Councils and Local Government

330, Union Place, Colombo 02.

Maga Print N Ads - 077 3 147 099
